ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**D1 REKONSTRUKCE CB VOZOVKY D1 km 220,2 - 229,5 VPRAVO - Harmonogram prací, technologických činností a předání RDS, TP a KZP**	**112 dny**	**1.5. 16**	**21.8. 16**
2	**Dokumentace**	**40 dny**	**1.5. 16**	**10.6. 16**
3	Zpracování RDS	35 dny	1.5. 16	5.6. 16
4	Zpracování TP a KZP	20 dny	21.5. 16	10.6. 16
5	**So 000**	**112 dny**	**1.5. 16**	**21.8. 16**
6	Vedlejší a ostatní náklady	112 dny	1.5. 16	21.8. 16
7	**SO 101**	**112 dny**	**1.5. 16**	**21.8. 16**
8	Úpravy přejezdů SDP	10 dny	1.5. 16	11.5. 16
9	Převedení dopravy do protisměru	14 dny	6.5. 16	20.5. 16
10	Odstranění svodidel a krajnic	10 dny	15.5. 16	25.5. 16
11	Odstranění betonové vozovky	15 dny	15.5. 16	30.5. 16
12	Frézování živičné vozovky	10 dny	25.5. 16	4.6. 16
13	Oprava drenáží	20 dny	30.5. 16	19.6. 16
14	Provedení oprav stabilizace	15 dny	9.6. 16	24.6. 16
15	Položení cementobetonové vozovky	35 dny	19.6. 16	24.7. 16
16	Položení živičné vozovky	5 dny	14.7. 16	19.7. 16
17	Provedení krajnic a osazení svodidel	9 dny	24.7. 16	2.8. 16
18	Převedení dopravy do obou pásů	6 dny	15.8. 16	21.8. 16
19	**SO 102**	**92 dny**	**21.5. 16**	**21.8. 16**
20	Úpravy přejezdů SDP	10 dny	21.5. 16	31.5. 16
21	Převedení dopravy do protisměru	14 dny	26.5. 16	9.6. 16
22	Odstranění svodidel a krajnic	10 dny	9.6. 16	19.6. 16
23	Odstranění betonové vozovky	10 dny	9.6. 16	19.6. 16
24	Frézování živičné vozovky	12 dny	14.6. 16	26.6. 16
25	Oprava drenáží	22 dny	19.6. 16	11.7. 16
26	Provedení oprav stabilizace	12 dny	1.7. 16	13.7. 16
27	Položení cementobetonové vozovky	21 dny	21.7. 16	11.8. 16
28	Položení živičné vozovky	25 dny	13.7. 16	7.8. 16
29	Provedení krajnic a osazení svodidel	9 dny	6.8. 16	15.8. 16
30	Převedení dopravy do obou pásů	6 dny	15.8. 16	21.8. 16
31	**SO 180**	**112 dny**	**1.5. 16**	**21.8. 16**
32	Dopravní opatření během výstavby	112 dny	1.5. 16	21.8. 16
33	**SO 190**	**30 dny**	**22.7. 16**	**21.8. 16**
34	Dopravní značení	30 dny	22.7. 16	21.8. 16
35	**SO 267**	**90 dny**	**1.5. 16**	**30.7. 16**
36	Frézování živičné vozovky	15 dny	1.5. 16	16.5. 16
37	Oprava mostních závěrů	15 dny	16.5. 16	31.5. 16
38	Oprava říms a příslušenství	50 dny	31.5. 16	20.7. 16
39	Položení obrusné vrstvy	10 dny	20.7. 16	30.7. 16
40	**SO 269**	**90 dny**	**16.5. 16**	**14.8. 16**
41	Frézování živičné vozovky	15 dny	16.5. 16	31.5. 16
42	Oprava mostních závěrů	15 dny	31.5. 16	15.6. 16
43	Oprava říms a příslušenství	50 dny	15.6. 16	4.8. 16
44	Položení obrusné vrstvy	10 dny	4.8. 16	14.8. 16
45	**SO 492; 492.1**	**30 dny**	**22.7. 16**	**21.8. 16**
46	Hlásky SOS, Kamera v km 220,3	30 dny	22.7. 16	21.8. 16

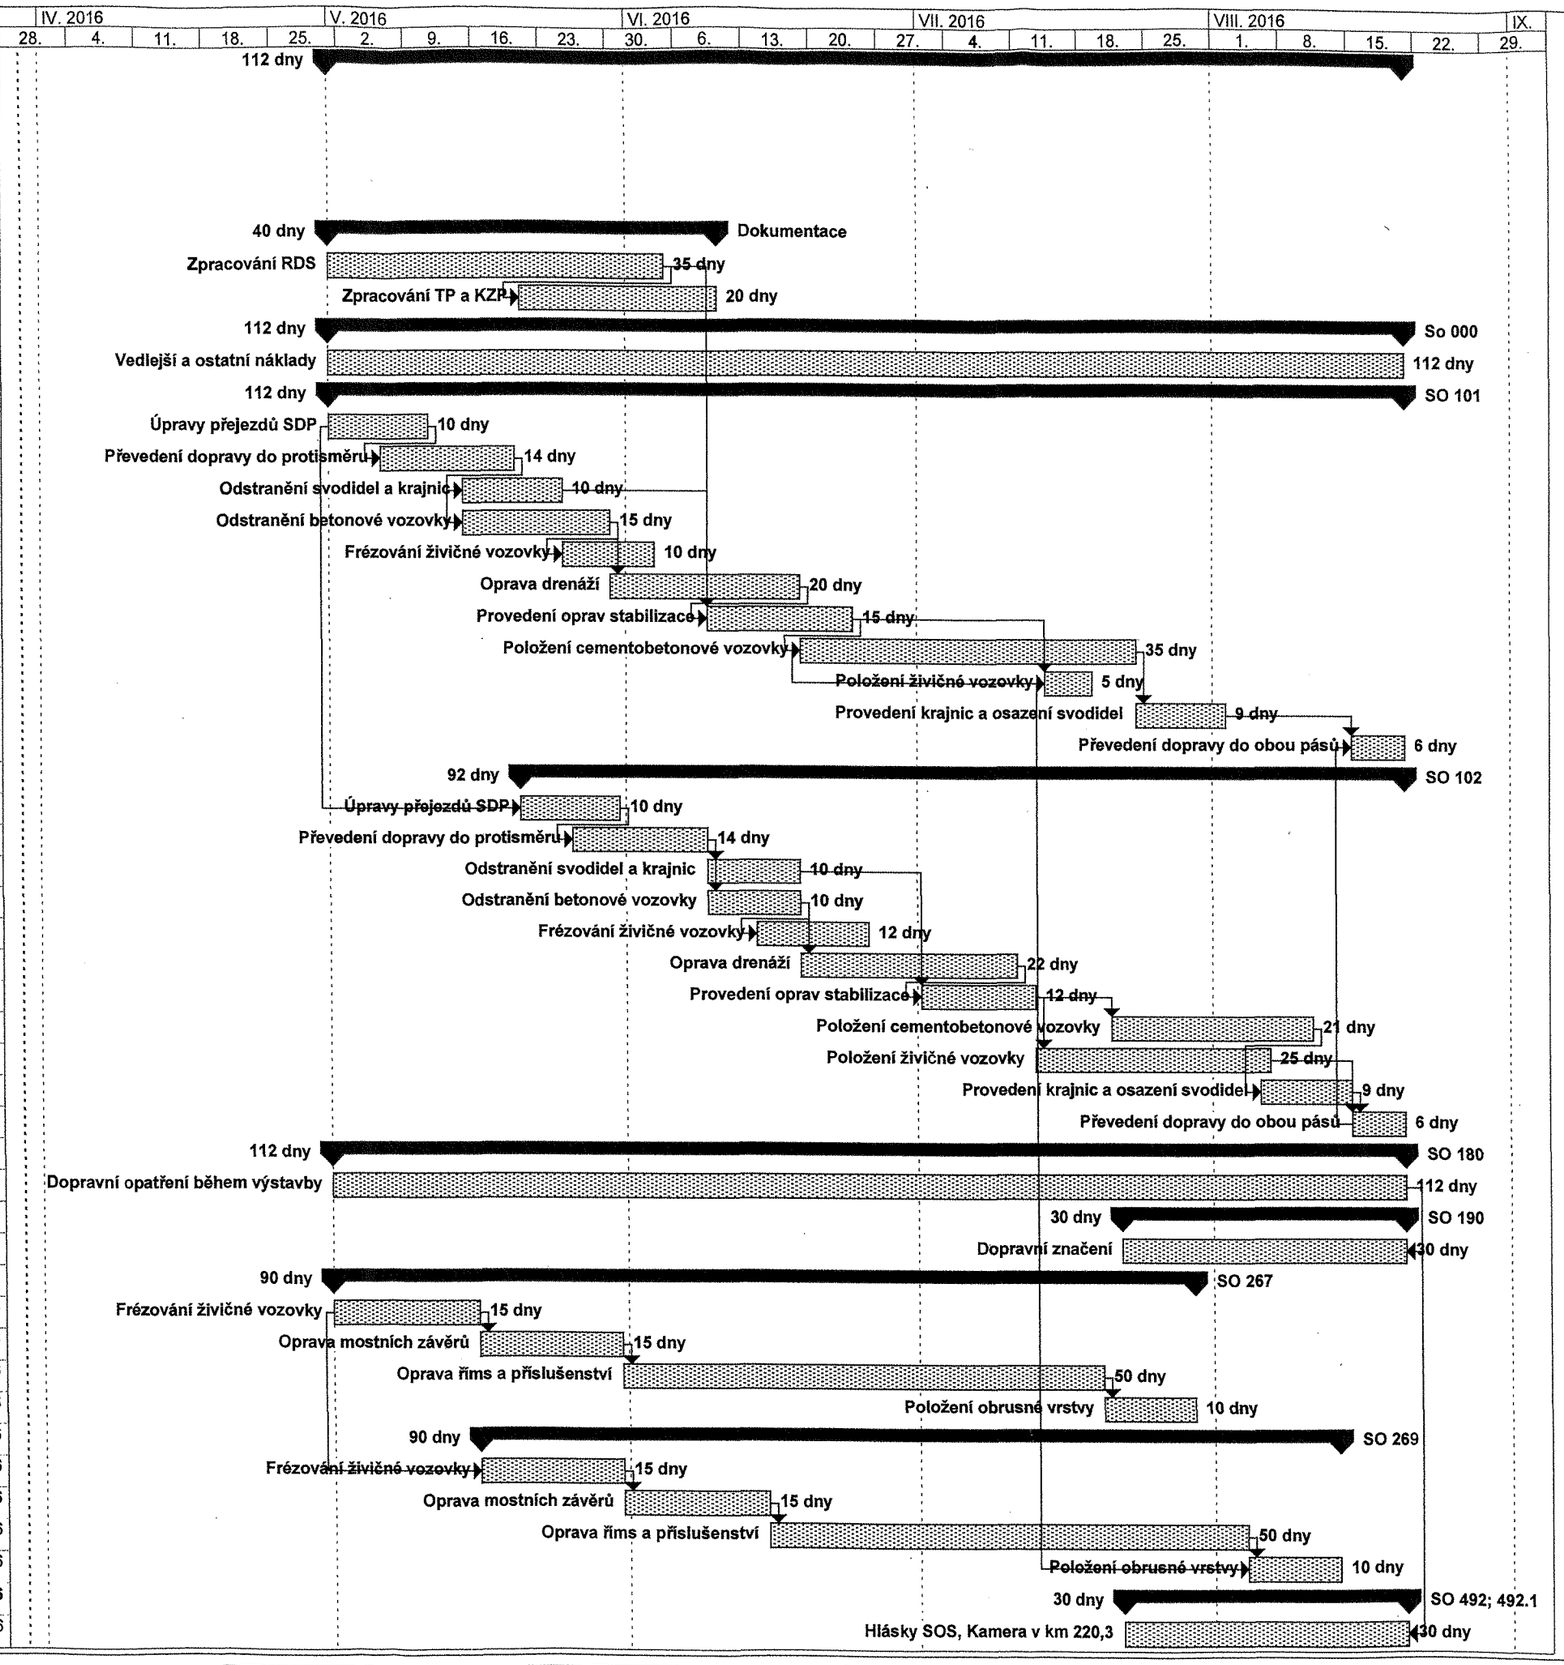

Úkol | Průběh | Souhrnný | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení | Milník | Souhrn projektu | Vnější milník

212
