ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1		**IDF4**	**214 dny**	**01.05. 19**	**21.02. 20**	
2		Podpis SoD	0 dny	01.05. 19	01.05. 19	
3		Předání staveniště	0 dny	10.05. 19	10.05. 19	
4		**Přípravné práce**	**182 dny**	**10.05. 19**	**17.01. 20**	
5		Zajištění dodávek	72 dny	10.05. 19	16.08. 19	2
6		Provizorní chlazení a větrání	10 dny	12.07. 19	25.07. 19	3;18
7		Demontáž provizorií	5 dny	13.01. 20	17.01. 20	34;29;41;48
8		**Stavba**	**148 dny**	**30.05. 19**	**20.12. 19**	
9		**Bourací práce**	**133 dny**	**30.05. 19**	**30.11. 19**	
10		zakrývací práce	2 dny	30.05. 19	31.05. 19	
11		stavební práce místnost č. 174	30 dny	22.10. 19	30.11. 19	
12		podhledy + elektro	5 dny	03.06. 19	07.06. 19	
13		příčky	7 dny	13.06. 19	21.06. 19	
14		**Nové konstrukce**	**125 dny**	**02.07. 19**	**20.12. 19**	
15		Výroba střešní konstrukce ocelové kce pro umístění klima jednotek	20 dny	08.07. 19	02.08. 19	5FF-10 dny
16		Doprava a montáž střešní konstrukce ocelové kce pro umístění klima jednotek	10 dny	05.08. 19	16.08. 19	15
17		Prostupy pro technologie	5 dny	26.07. 19	01.08. 19	6
18		Příčky	9 dny	02.07. 19	11.07. 19	
19		Dveře	5 dny	22.10. 19	28.10. 19	11SS
20		Dokončovací práce	8 dny	11.12. 19	20.12. 19	19;40FF;53FF;58F
21		**KLIMA_VZT**	**113 dny**	**26.07. 19**	**31.12. 19**	
22		Částečná demontáž stávajících rozvodů chladu a tepla	5 dny	26.07. 19	01.08. 19	6
23		Montáž venkovních jednotek	14 dny	22.10. 19	08.11. 19	6;15;5;11SS
24		**ZAŘIZENÍ č.1 – VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE SLABOPROUDÝCH MÍSTNOSTÍ U IDF 04 – C**	**5 dny**	**19.08. 19**	**23.08. 19**	
25		Doplnění klapek	5 dny	19.08. 19	23.08. 19	5;18
26		**Místnost č. 0175a ROZVODNA EPS**	**5 dny**	**19.08. 19**	**23.08. 19**	
27		Vnitřní klima jednotka	5 dny	19.08. 19	23.08. 19	6;16;18;5
28		**Místnost č.0175b ROZVODNA CCTV**	**5 dny**	**11.11. 19**	**15.11. 19**	
29		Vnitřní klima jednotka	5 dny	11.11. 19	15.11. 19	6;23
30		**Místnost č. 0174 SERVEROVNA**	**51 dny**	**22.10. 19**	**31.12. 19**	
31		Úprava stávajícího chlazení, zakrytí technologie	5 dny	22.10. 19	28.10. 19	10SS
32		Instalace nové chladící jednotky	10 dny	02.12. 19	13.12. 19	23FS-6 dny;16;31
33		Vyčištění nové provozované chladící jednotky	5 dny	16.12. 19	20.12. 19	13;32
34		Doplnění chladících jednotek	12 dny	16.12. 19	31.12. 19	18;23;32
35		Zkoušky, zaregulování , zprovoznění	5 dny	25.12. 19	31.12. 19	32;34FS-5 dny
36		**Systém řízení technologických procesů (SŘTP)**	**189 dny**	**03.06. 19**	**19.02. 20**	
37		Demontáže	5 dny	03.06. 19	07.06. 19	3;10
38		Úpravy rozvaděče	5 dny	19.08. 19	23.08. 19	5
39		Montáže SŘTP míst.č. 174	15 dny	13.12. 19	02.01. 20	32FS-1 den
40		Montáže dalších místnosti	10 dny	09.12. 19	20.12. 19	27;29;32FS-5 dny
41		Zkoušky, revize, zprovoznění	6 dny	03.01. 20	10.01. 20	38;40;39
42		**Silnoproudé rozvody**	**189 dny**	**03.06. 19**	**19.02. 20**	
43		Demontáže I	10 dny	03.06. 19	14.06. 19	3;10
44		Úpravy rozvaděče	10 dny	22.07. 19	02.08. 19	5FS-20 dny
45		Montáže	50 dny	17.06. 19	22.08. 19	5SF-30 dny;43
46		Demontáže II	10 dny	16.12. 19	27.12. 19	32
47		montáže m.č. 174	10 dny	25.11. 19	06.12. 19	11FS-5 dny
48		Zkoušky, revize , zprovoznění	10 dny	09.12. 19	20.12. 19	44;45;47
49		vyčištění rozvodů vč. Místnosti č. 174	28 dny	13.01. 20	19.02. 20	41
50		**ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)**	**146 dny**	**03.06. 19**	**20.12. 19**	
51		Doplnění rozvaděče koplerů	5 dny	19.08. 19	23.08. 19	5
52		demontáže v podhledu	2 dny	03.06. 19	04.06. 19	10
53		Montáže	10 dny	02.09. 19	13.09. 19	3;58
54		místnost č. 174	15 dny	02.12. 19	20.12. 19	11
55		Zkoušky, revize , zprovoznění	5 dny	16.12. 19	20.12. 19	51;53;54FS-5 dny
56		**Stabilní hasicí zařízení plynové (GHZ)**	**162 dny**	**03.06. 19**	**13.01. 20**	
57		Demontáž stávající GHZ	2 dny	03.06. 19	04.06. 19	3;10
58		Montáž GHZ	10 dny	19.08. 19	30.08. 19	5;18
59		Tlaková zkouška potrubích tras	1 den	02.09. 19	02.09. 19	58
60		Zkouška těsnosti místnosti (Door Fan Test)	2 dny	03.01. 20	06.01. 20	18;19;25;35FS+2
61		Výchozí kontrola provozuschopnosti a zkouška činnosti	5 dny	07.01. 20	13.01. 20	60;59
62		**STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (SCS)**	**147 dny**	**03.06. 19**	**23.12. 19**	
63		**JEDNOTNÝ ČAS, TVA_STA,**	**147 dny**	**03.06. 19**	**23.12. 19**	
64		Demontáže	3 dny	03.06. 19	05.06. 19	3;10
65		Montáže	9 dny	11.12. 19	23.12. 19	5;18;54FS-8 dny
66		**Bezpečnostní systémy (CCTV, EZS, ACS)**	**150 dny**	**03.06. 19**	**26.12. 19**	
67		Demontáže	5 dny	03.06. 19	07.06. 19	3;10
68		Montáže	12 dny	11.12. 19	26.12. 19	5;65FF;54FS-8 dny
69		**Dokončovací práce**	**30 dny**	**13.01. 20**	**21.02. 20**	
70		Komplexní zkoušky	10 dny	21.01. 20	03.02. 20	71;41;55;61;35;48
71		Průvodní technická dokumentace, skutečné provedení	6 dny	13.01. 20	20.01. 20	5;41;55FF;61FF;35
72		Předání	2 dny	20.02. 20	21.02. 20	70;49

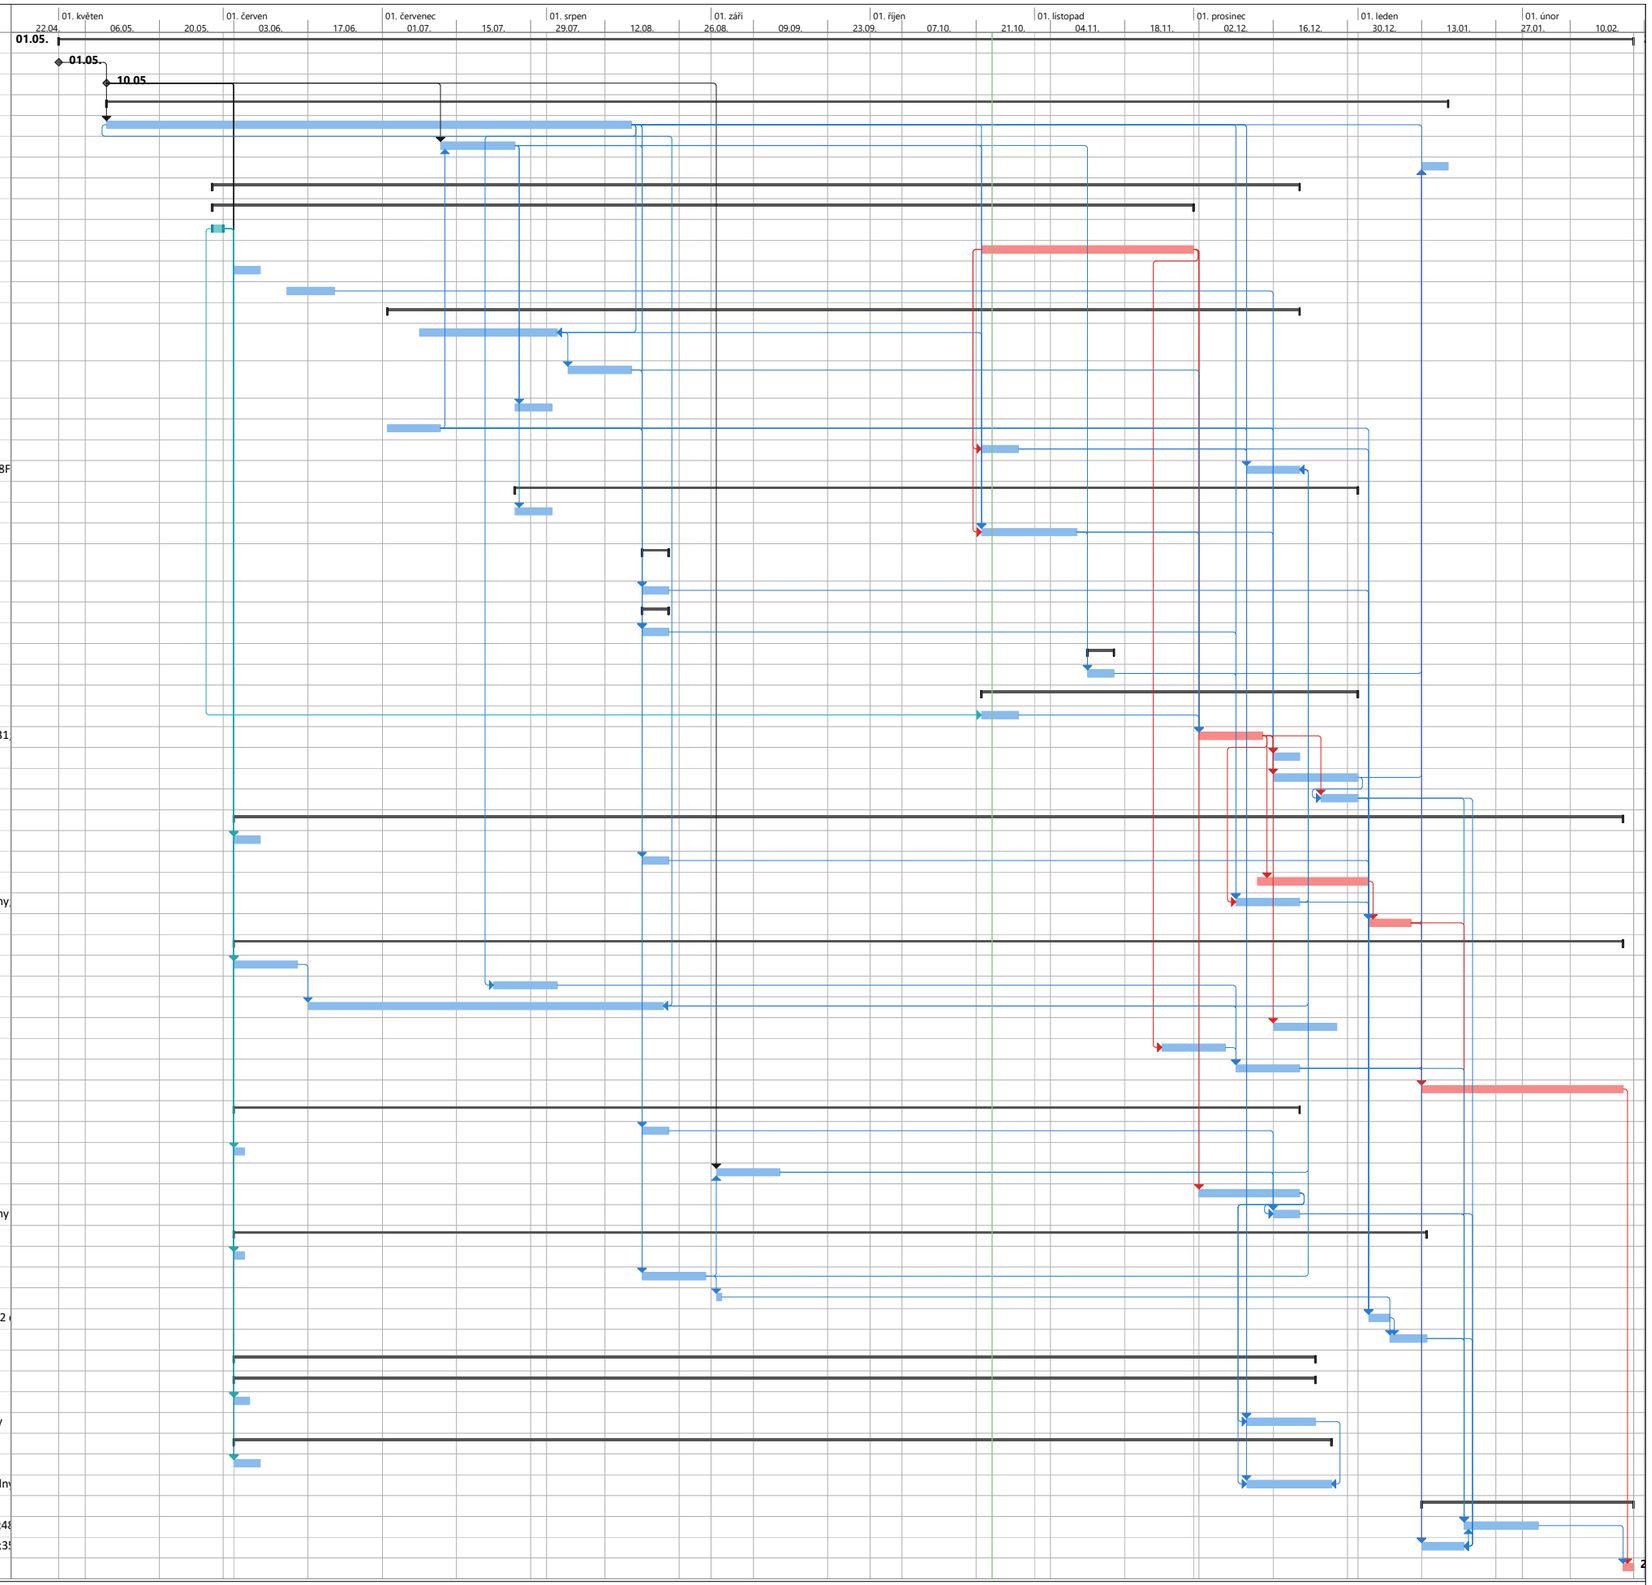

Projekt: IDF04_190501_aktual_1
Datum: 24.10. 19

Úkol · Rozdělení · Milník · Souhrnný · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Neaktivní milník · Neaktivní souhrn · Ruční úkol · Pouze s dobou trvání · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Ruční souhrn · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Vnější úkoly · Vnější milník · Konečný termín · Kritický · Kritické rozdělení · Průběh · Průběh ručně zadaného úkolu
