Příloha č. 2_ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

ID	Kód	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1					
2		Administrativní budova (Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v.	546 dny	14.04. 20	11.10. 21
3					
4		Milníky výstavby	546 dny	14.04. 20	11.10. 21
5		A - Přípravné práce	0 dny	11.05. 20	11.05. 20
6		B1 - Zemní práce a základy	0 dny	12.10. 20	12.10. 20
7		B2 - Hrubá stavba a střecha	0 dny	22.03. 21	22.03. 21
8		B3 - práce PSV a dokončovací práce	0 dny	13.09. 21	13.09. 21
9		C - Dokončení a předání stavby	0 dny	11.10. 21	11.10. 21
10		Stavební objekty	518 dny	14.04. 20	13.09. 21
11		Zhotovení ZS včetně staveništního oplocení	28 dny	14.04. 20	11.05. 20
12	SO 01	Příprava území	481 dny	14.04. 20	07.08. 21
13		Bourací práce	240 dny	14.04. 20	11.05. 21
14		Výměníková stanice	330 dny	12.09. 20	07.08. 21
15		Přeložka VO	51 dny	21.04. 20	10.06. 20
16	SO 02	HTU	195 dny	28.04. 20	25.05. 21
17	SO 03	Komunikace	180 dny	18.03. 21	13.09. 21
18	SO 04	Přípojka vody	90 dny	22.04. 21	20.07. 21
19	SO 05	Přípojka kanalizace	120 dny	22.04. 21	19.08. 21
20	SO 06	Vsakování (viz SO 05)	120 dny	22.04. 21	19.08. 21
21	SO 07	Přípojka NN a VO	149 dny	20.04. 20	20.07. 21
22	SO 08	Datová a telefonní přípojka	60 dny	22.05. 21	20.07. 21
23	SO 09	Hlavní budova	490 dny	12.05. 20	13.09. 21
24		Konstrukční část	282 dny	12.05. 20	17.02. 21
25		Piloty	45 dny	12.05. 20	25.06. 20
26		Základová deska	78 dny	27.07. 20	12.10. 20
27		Nosná konstrukce - žb skelet	150 dny	21.09. 20	17.02. 21
28		Vnější plášť	229 dny	28.01. 21	13.09. 21
29		Střešní plášť	33 dny	18.02. 21	22.03. 21
30		Obvodový plášť	229 dny	28.01. 21	13.09. 21
31		hrubé konstrukce obvodového plášťě	54 dny	28.01. 21	22.03. 21
32		obvodový plášť	196 dny	02.03. 21	13.09. 21
33		Lešení stavební	210 dny	18.01. 21	15.08. 21
34		Stěny a příčky	203 dny	20.12. 20	10.07. 21
35		Zděné	93 dny	20.12. 20	22.03. 21
36		Sádrokartonové	110 dny	23.03. 21	10.07. 21
37		Podlahy	130 dny	07.05. 21	13.09. 21
38		Plovoucí podlahy	80 dny	07.05. 21	25.07. 21
39		Povlakové podlahy	60 dny	16.07. 21	13.09. 21
40		Dlažby	60 dny	06.07. 21	03.09. 21
41		Povrchy stěn a stropů	148 dny	19.04. 21	13.09. 21
42		Podhledy	140 dny	19.04. 21	05.09. 21
43		Povrchové úpravy stěn	134 dny	03.05. 21	13.09. 21
44		Obklady	90 dny	03.05. 21	31.07. 21
45		Výplně otvorů	265 dny	23.12. 20	13.09. 21
46		Okna a okenní sestavy	180 dny	23.12. 20	20.06. 21
47		Dveře	99 dny	21.02. 21	13.09. 21
48		Zámečnické konstrukce	208 dny	18.02. 21	13.09. 21
49		Zařízení silnoproudé elektrotechniky	238 dny	06.10. 20	13.09. 21
50		Zařízení slaboproudé elektrotechniky	217 dny	09.02. 21	13.09. 21
51		Zařízení pro zdravotně technických instalací	238 dny	10.07. 20	13.09. 21
52		Zařízení ústředního vytápění	217 dny	09.02. 21	13.09. 21
53		Zařízení vzduchotechniky a chlazení	217 dny	09.02. 21	13.09. 21
54		Výtahy	120 dny	10.03. 21	07.07. 21
55		Vybavení interiéru	90 dny	16.06. 21	13.09. 21
56		Audiovizuální vybavení	60 dny	16.07. 21	13.09. 21
57	SO 10	Spojovací lávka	246 dny	11.01. 21	13.09. 21
58	SO 11	Sadové úpravy	60 dny	16.07. 21	13.09. 21
59	SO 12	Venkovní architektura a oplocení	120 dny	14.06. 21	11.10. 21
60		Měření a zkoušky	28 dny	14.09. 21	11.10. 21
61		Předání dokumentace skutečného provedení a všech dokladů	28 dny	14.09. 21	11.10. 21
62		Přejímka stavby včetně odstraňování zjištěných vad	28 dny	14.09. 21	11.10. 21

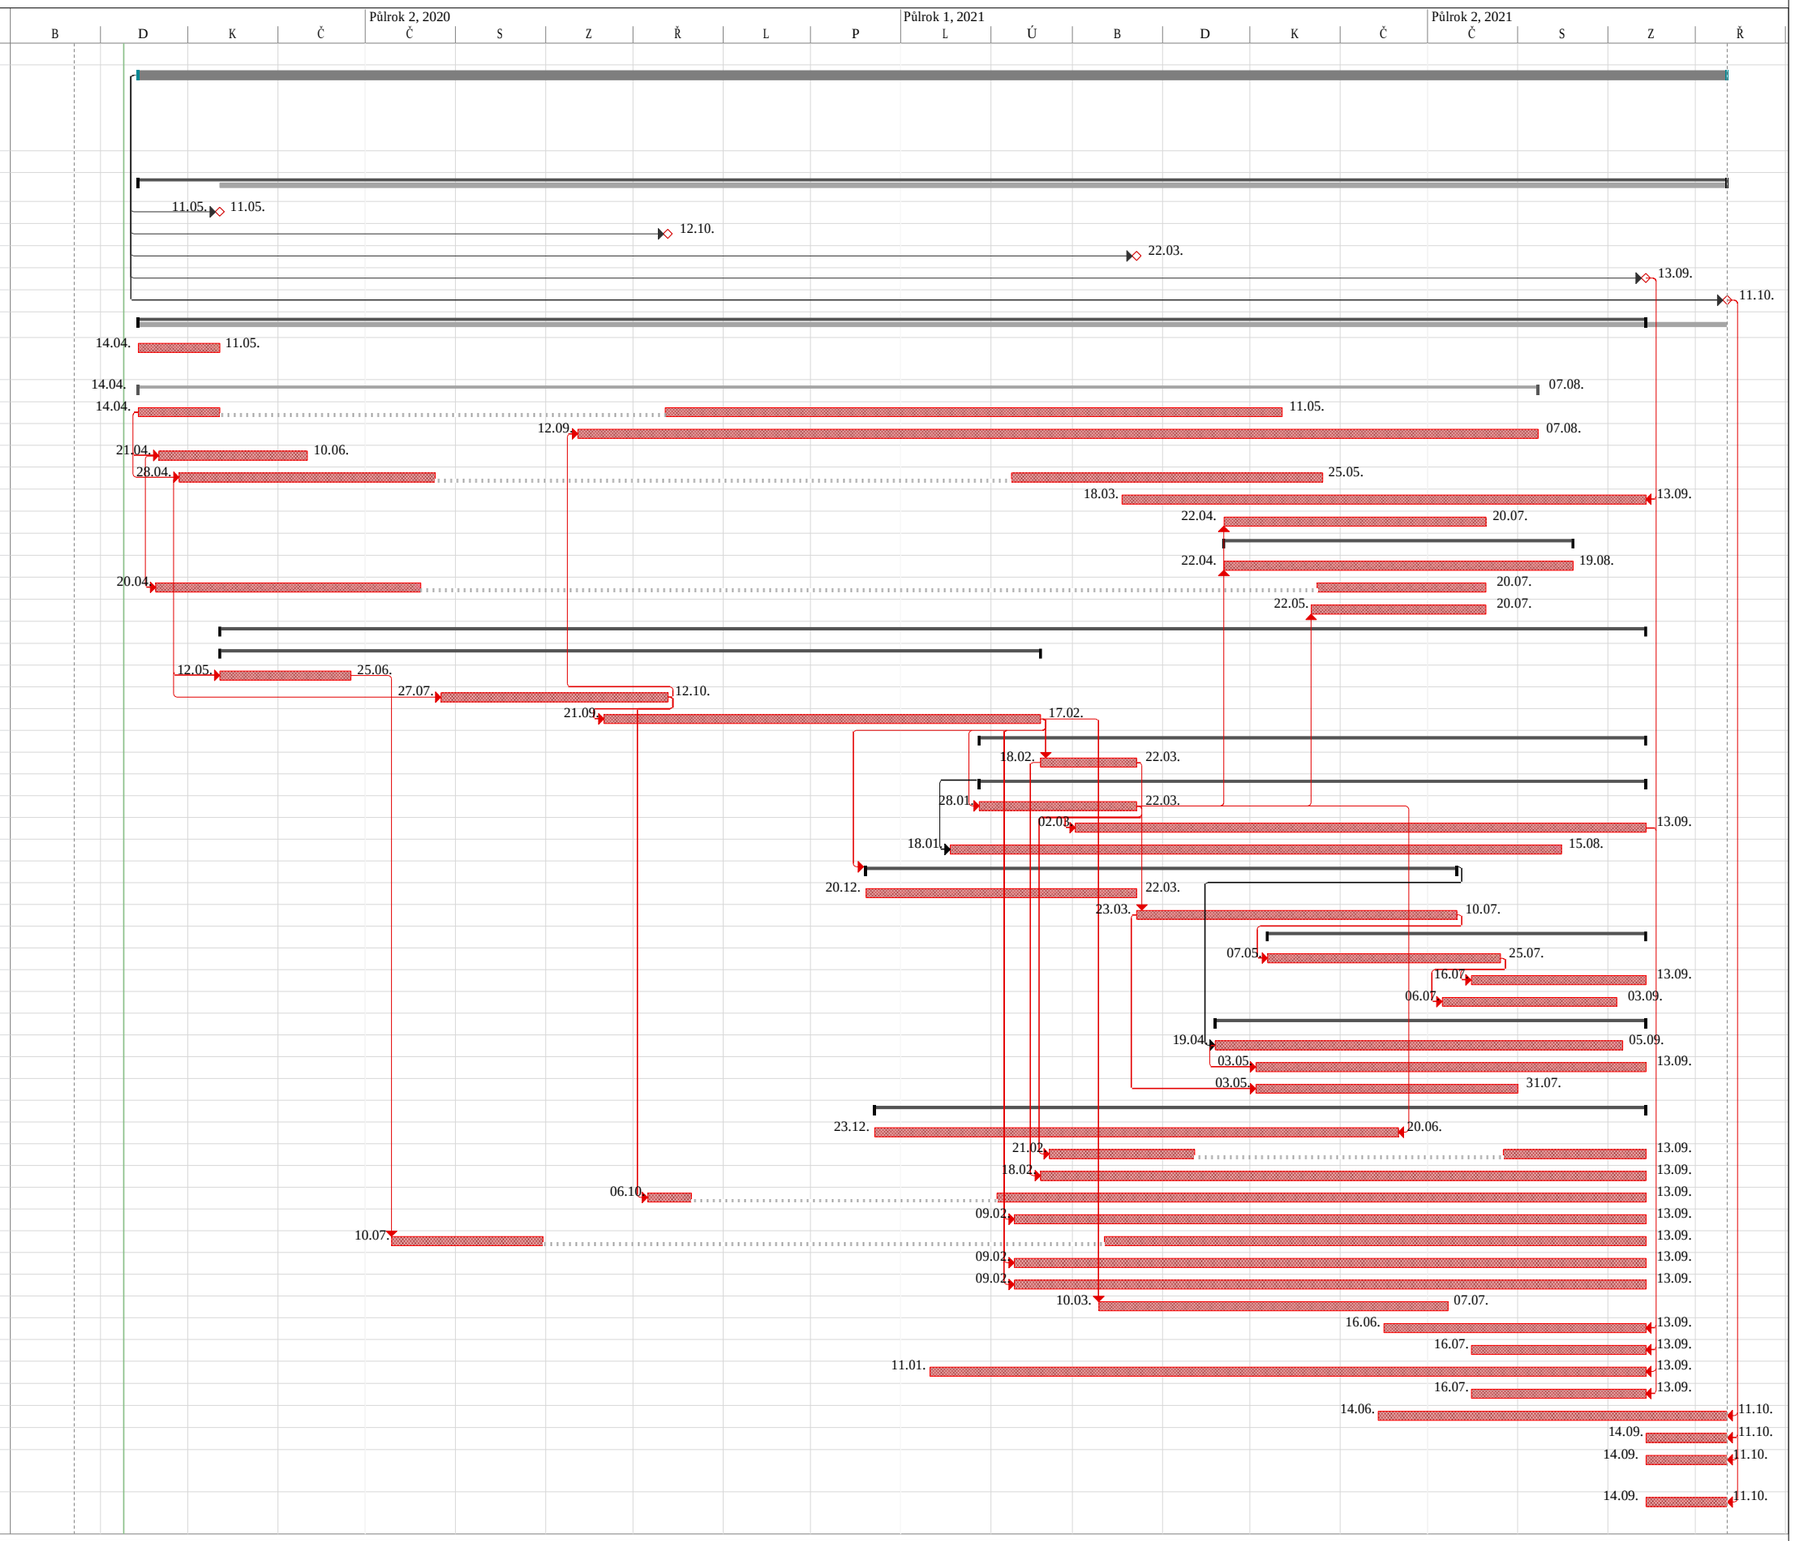

V Brně 6.04.2020
