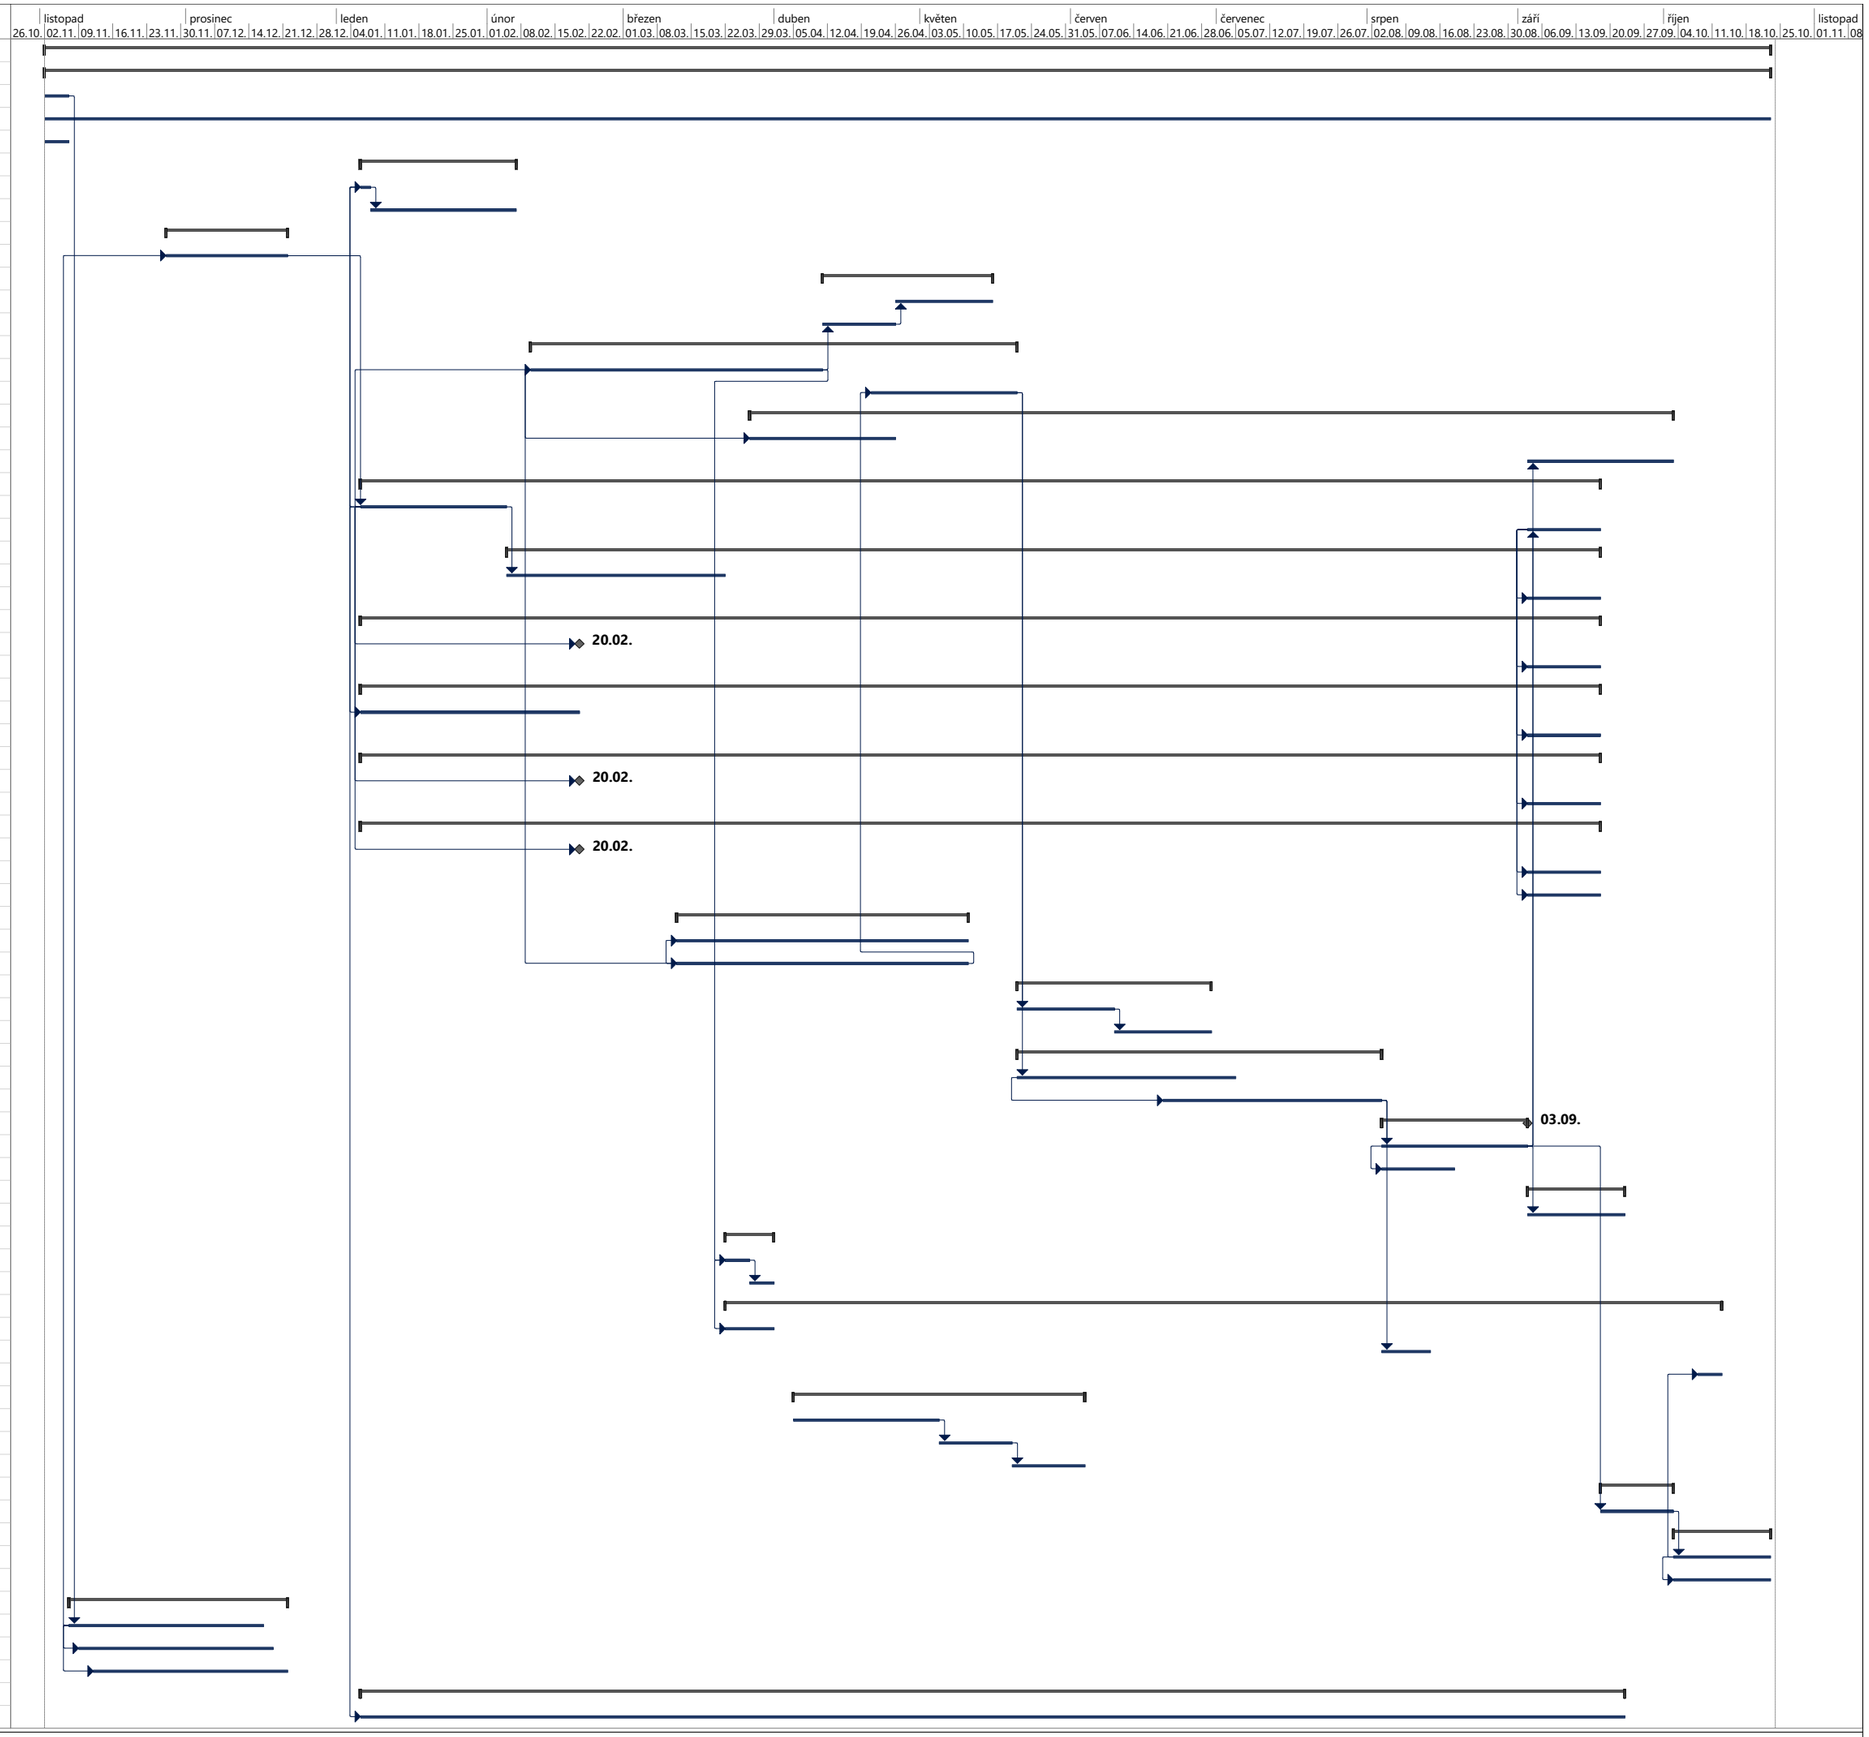ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**LÉKAŘSKÁ FAKULTA**	**355 dny**	**02.11. 20**	**23.10. 21**
2		**VRN**	**355 dny**	**02.11. 20**	**23.10. 21**
3		Zařízení staveniště	5 dny	02.11. 20	07.11. 20
4		Provoz	355 dny	02.11. 20	23.10. 21
5		Odstranění zařízení staveniště	5 dny	02.11. 20	07.11. 20
6		**SPODNÍ STAVBA**	**32 dny**	**06.01. 21**	**07.02. 21**
7		Spodní stavba_zemní práce	2 dny	06.01. 21	08.01. 21
8		Spodní stavba_hydroizolace	30 dny	08.01. 21	07.02. 21
9		**SVISLÉ KCE**	**25 dny**	**27.11. 20**	**22.12. 20**
10		Dozdívky	25 dny	27.11. 20	22.12. 20
11		**VODOROVNÉ KCE**	**35 dny**	**11.04. 21**	**16.05. 21**
12		Vodorovné kce_mazaniny	20 dny	26.04. 21	16.05. 21
13		Vodorovné konstrukce_izolace	15 dny	11.04. 21	26.04. 21
14		**ÚPRAVY POVRCHŮ_OMÍTKY**	**100 dny**	**10.02. 21**	**21.05. 21**
15		Hrubé omítky	60 dny	10.02. 21	11.04. 21
16		Finální omítky	30 dny	21.04. 21	21.05. 21
17		**POVRCHY PODLAH_POVLAKOVÉ**	**190 dny**	**27.03. 21**	**03.10. 21**
18		Příprava podkladů	30 dny	27.03. 21	26.04. 21
19		Povlakové krytiny	30 dny	03.09. 21	03.10. 21
20		**ZTI**	**255 dny**	**06.01. 21**	**18.09. 21**
21		Hubé rozvody	30 dny	06.01. 21	05.02. 21
22		Kompletace	15 dny	03.09. 21	18.09. 21
23		**ÚT**	**225 dny**	**05.02. 21**	**18.09. 21**
24		Hubé rozvody	45 dny	05.02. 21	22.03. 21
25		Kompletace	15 dny	03.09. 21	18.09. 21
26		**VZT**	**255 dny**	**06.01. 21**	**18.09. 21**
27		Hubé rozvody	45 dny	06.01. 21	20.02. 21
28		Kompletace	15 dny	03.09. 21	18.09. 21
29		**VZT_CHLAZENÍ**	**255 dny**	**06.01. 21**	**18.09. 21**
30		Hubé rozvody	45 dny	06.01. 21	20.02. 21
31		Kompletace	15 dny	03.09. 21	18.09. 21
32		**ELEKTRO_SILNOPROUD**	**255 dny**	**06.01. 21**	**18.09. 21**
33		Hubé rozvody	45 dny	06.01. 21	20.02. 21
34		Kompelatce	15 dny	03.09. 21	18.09. 21
35		**ELEKTRO_SLABOPROUD**	**255 dny**	**06.01. 21**	**18.09. 21**
36		Hubé rozvody	45 dny	06.01. 21	20.02. 21
37		Kompelatce	15 dny	03.09. 21	18.09. 21
38		MAR	15 dny	03.09. 21	18.09. 21
39		**SUCHÁ VÝSTAVBA**	**60 dny**	**12.03. 21**	**11.05. 21**
40		Tesařské práce	60 dny	12.03. 21	11.05. 21
41		SDK konstrukce	60 dny	12.03. 21	11.05. 21
42		**VÝTAH**	**40 dny**	**21.05. 21**	**30.06. 21**
43		Stavební část	20 dny	21.05. 21	10.06. 21
44		Kompelatce	20 dny	10.06. 21	30.06. 21
45		**DLAŽBY OBKLADY**	**75 dny**	**21.05. 21**	**04.08. 21**
46		Obklady	45 dny	21.05. 21	05.07. 21
47		Dlažby	45 dny	20.06. 21	04.08. 21
48		**MALBY A NÁTĚRY**	**30 dny**	**04.08. 21**	**03.09. 21**
49		Malby	30 dny	04.08. 21	03.09. 21
50		Nátěry	15 dny	04.08. 21	19.08. 21
51		**ZÁMEČNICKÉ KCE**	**20 dny**	**03.09. 21**	**23.09. 21**
52		Záměčnícké kce_stěny	20 dny	03.09. 21	23.09. 21
53		**VÝPLNĚ OTVORŮ_VNĚJŠÍ**	**10 dny**	**22.03. 21**	**01.04. 21**
54		Stavební připravenost	5 dny	22.03. 21	27.03. 21
55		D+M	5 dny	27.03. 21	01.04. 21
56		**VÝPLNĚ OTVORŮ_VNITŘNÍ**	**205 dny**	**22.03. 21**	**13.10. 21**
57		Stavební připravenost	10 dny	22.03. 21	01.04. 21
58		D+M	10 dny	04.08. 21	14.08. 21
59		Žaluzie	5 dny	08.10. 21	13.10. 21
60		**STŘEŠNÍ KCE**	**60 dny**	**05.04. 21**	**04.06. 21**
61		Tesařské práce	30 dny	05.04. 21	05.05. 21
62		Klempířské práce	15 dny	05.05. 21	20.05. 21
63		Povlakové krytiny	15 dny	20.05. 21	04.06. 21
64		**INTERIÉR**	**15 dny**	**18.09. 21**	**03.10. 21**
65		D+M interiéru	15 dny	18.09. 21	03.10. 21
66		**KOMPLETACE**	**20 dny**	**03.10. 21**	**23.10. 21**
67		Úklid, vyčistění budov	20 dny	03.10. 21	23.10. 21
68		Komplatce	20 dny	03.10. 21	23.10. 21
69		**BOURÁNÍ**	**45 dny**	**07.11. 20**	**22.12. 20**
70		Bourání konstrukcí	40 dny	07.11. 20	17.12. 20
71		Přesun suti	40 dny	09.11. 20	19.12. 20
72		Uložení odpadů	40 dny	12.11. 20	22.12. 20
73		**PŘESUN HMOT**	**260 dny**	**06.01. 21**	**23.09. 21**
74		Přesun hmot	260 dny	06.01. 21	23.09. 21
