„Rekonstrukce Zimního stadionu Kladno“ - podrobný harmonogram výstavby

ID	Režim úkolu	Dílčí stavební procesy	Doba trvání kal. Dny	Zahájení	Dokončení
1		**CELKEM**	**302 dny**	**02.11. 20**	**30.08. 21**
2		**Zahájení předmětu veřejné zakázky**	0 dny	02.11. 20	02.11. 20
3		**Ukončení předmětu veřejné zakázky**	0 dny	30.08. 21	30.08. 21
4		**Uzlový bod č. 1 - dokončení retenční nádrže bez zásypů a komunikací (vlastní konstrukce - pol. 899R00006)**	0 dny	09.04. 21	09.04. 21
5		**Uzlový bod č. 2 - dokončení demontáže střešní kce (pol. 966071135)**	0 dny	30.05. 21	30.05. 21
6		**Uzlový bod č. 3 - dokončení montáže OK zastřešení (pol. 301, 302, 303)**	0 dny	14.08. 21	14.08. 21
7		Ukončení provozu zimního stadionu	1 den	25.04. 21	25.04. 21
8		Výroba ocelových konstrukcí	217 dny	02.11. 20	06.06. 21
9		Práce spojené s VRN - příprava staveniště	14 dny	02.11. 20	15.11. 20
10		Práce spojené s VRN - zařízení staveniště - zřízení - 1. část	7 dny	02.11. 20	08.11. 20
11		Práce spojené s VRN - zařízení staveniště - zřízení 2. část	14 dny	01.02. 21	14.02. 21
12		Práce spojené s VRN - zařízení staveniště - provoz + odstranění	200 dny	12.02. 21	30.08. 21
13		Ostatní práce spojené s VRN	299 dny	04.11. 20	29.08. 21
14		**Práce v předstihu**	**79 dny**	**15.02. 21**	**04.05. 21**
15		Přeložka CETIN	21 dny	08.03. 21	28.03. 21
16		**Přístavba vrátnice a rozšíření prostor stávající Husqvarny**	**79 dny**	**15.02. 21**	**04.05. 21**
17		Výkopy + základy	14 dny	15.02. 21	28.02. 21
18		Svislé a vodorovné konstrukce	21 dny	01.03. 21	21.03. 21
19		Zastřešení	14 dny	22.03. 21	04.04. 21
20		Hrubé úpravy povrchů, PSV	21 dny	22.03. 21	11.04. 21
21		Dokončovací práce	30 dny	05.04. 21	04.05. 21
22		Výměny oken ve stávající fasádě + dozdívky v 1.PP a v 1.NP /zázemí a	77 dny	15.02. 21	02.05. 21
23		**Retenční nádrž a venkovní dešťová ka**	**70 dny**	**15.02. 21**	**25.04. 21**
24		Bourání a výkopy	14 dny	15.02. 21	28.02. 21
25		Zhotovení retenční nádrže + pokládl	40 dny	01.03. 21	09.04. 21
26		Zásypy a komunikace	16 dny	10.04. 21	25.04. 21
27		Přípravné práce pro demontáž + montáž	21 dny	08.03. 21	28.03. 21
28		Přípravné práce uvnitř objektu, demontáže vybavení, zakrývání ledové plochy, provizorní zastřešení	21 dny	26.04. 21	16.05. 21
29		Bourání, demontáže OK	35 dny	26.04. 21	30.05. 21
30		Sanace	28 dny	17.05. 21	13.06. 21
31		Montáž OK	71 dny	07.06. 21	16.08. 21
32		Opláštění střecha	21 dny	10.08. 21	30.08. 21
33		Fasády	28 dny	03.08. 21	30.08. 21
34		Montáž oken (zbývající), dveří	14 dny	10.08. 21	23.08. 21
35		Klempířské konstrukce	10 dny	21.08. 21	30.08. 21

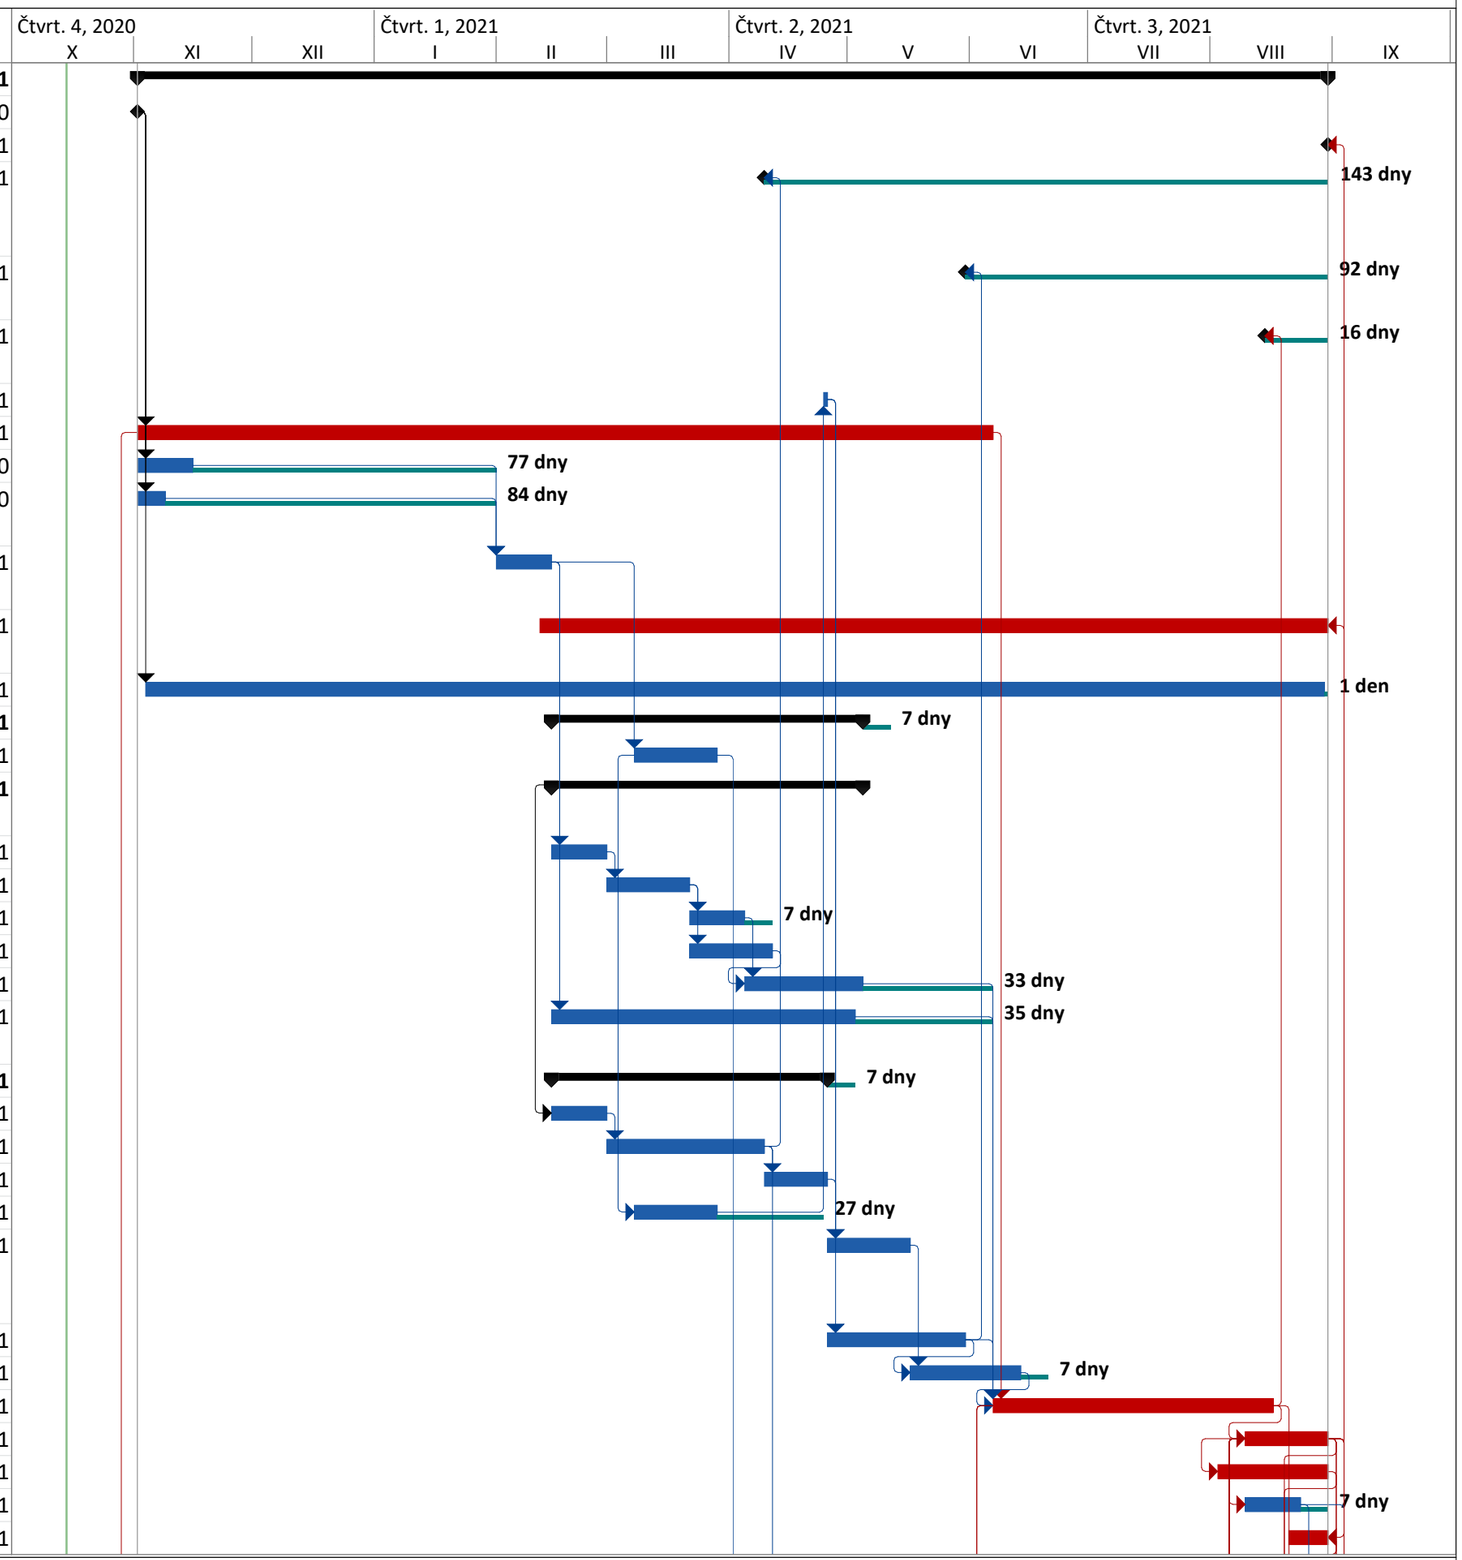

Kritická cesta červeně, rezerva vedle pruhu

Subterra, a.s.

„Rekonstrukce Zimního stadionu Kladno“ - podrobný harmonogram výstavby

ID	Režim úkolu	Dílčí stavební procesy	Doba trvání kal. Dny	Zahájení	Dokončení
36		Zámečnické konstrukce	14 dny	10.08. 21	23.08. 21
37		Vnitřní zdravotechnika	21 dny	10.08. 21	30.08. 21
38		Vzduchotechnika	21 dny	10.08. 21	30.08. 21
39		Silnoproud	21 dny	10.08. 21	30.08. 21
40		Slaboproudá elektronika	21 dny	10.08. 21	30.08. 21
41		Audiovizuální technika	21 dny	10.08. 21	30.08. 21
42		Akustický podhled a absorbéry	21 dny	10.08. 21	30.08. 21
43		EPS	21 dny	10.08. 21	30.08. 21
44		Přípravné práce - odstranění	14 dny	17.08. 21	30.08. 21
45		Zkoušky, revize, odstraňování vad a nedc	7 dny	24.08. 21	30.08. 21
46		Předání díla	1 den	30.08. 21	30.08. 21
47		**Funkční zkoušky a revize (zde neplatí vazby a rezervy)**	**302 dny**	**02.11. 20**	**30.08. 21**
48		Revize a zkoušky CETIN (zajišťuje vlastı	7 dny	22.03. 21	28.03. 21
49		Retenční nádrž - zkouška těsnosti potrubí - 2 zkoušky	1 den	07.04. 21	07.04. 21
50		Revize + zkouška namontované klimatizace (101) - 2	3 dny	24.08. 21	26.08. 21
51		Nedestruktivní zkoušky svarů a materiálů (VT, MT, UT, rentgen) exponovaných svarů a materiálů - 98	210 dny	02.11. 20	30.05. 21
52		Tenzometrická, frekvenční a ostatní měření - průběžně	60 dny	07.06. 21	05.08. 21
53		Odtrhové zkoušek u nátěrů provedených na stavbě - 12	15 dny	02.08. 21	16.08. 21
54		Geodetické sledování a záměry - 12	71 dny	07.06. 21	16.08. 21
55		Výchozí prohlídka konstrukce podle požadavků ČSN 73 2604 - 11	14 dny	17.08. 21	30.08. 21
56		Požární ucpávky - 20	2 dny	24.08. 21	25.08. 21
57		Zkouška kotev - 14	7 dny	17.08. 21	23.08. 21
58		Zkouška pevnosti spojů - zastřešení - 1	14 dny	17.08. 21	30.08. 21
59		Zkouška těsnosti - zastřešení - 2	2 dny	25.08. 21	26.08. 21
60		Zkouška dle ČSN EN 795:2013	1 den	30.08. 21	30.08. 21
61		Zkoušky hutnění - 3	3 dny	02.11. 20	04.11. 20
62		Zkouška těsnosti kan. - 2	2 dny	17.08. 21	18.08. 21
63		Zkouška tlak. Vodovod - 1	2 dny	24.08. 21	25.08. 21
64		Proplach + desinfekce - 1	1 den	30.08. 21	30.08. 21
65		Zaregulováví VZT - 6	2 dny	29.08. 21	30.08. 21
66		Komplexní zkoušky - 3	3 dny	25.08. 21	27.08. 21
67		Funkční zkoušky EPS - 1kpl	2 dny	24.08. 21	25.08. 21
68		Měření hluku - 1 kpl	2 dny	24.08. 21	25.08. 21
69		Revize elektro - 6 kpl	4 dny	24.08. 21	27.08. 21
70		Proškolení obsluhy - 6	4 dny	27.08. 21	30.08. 21

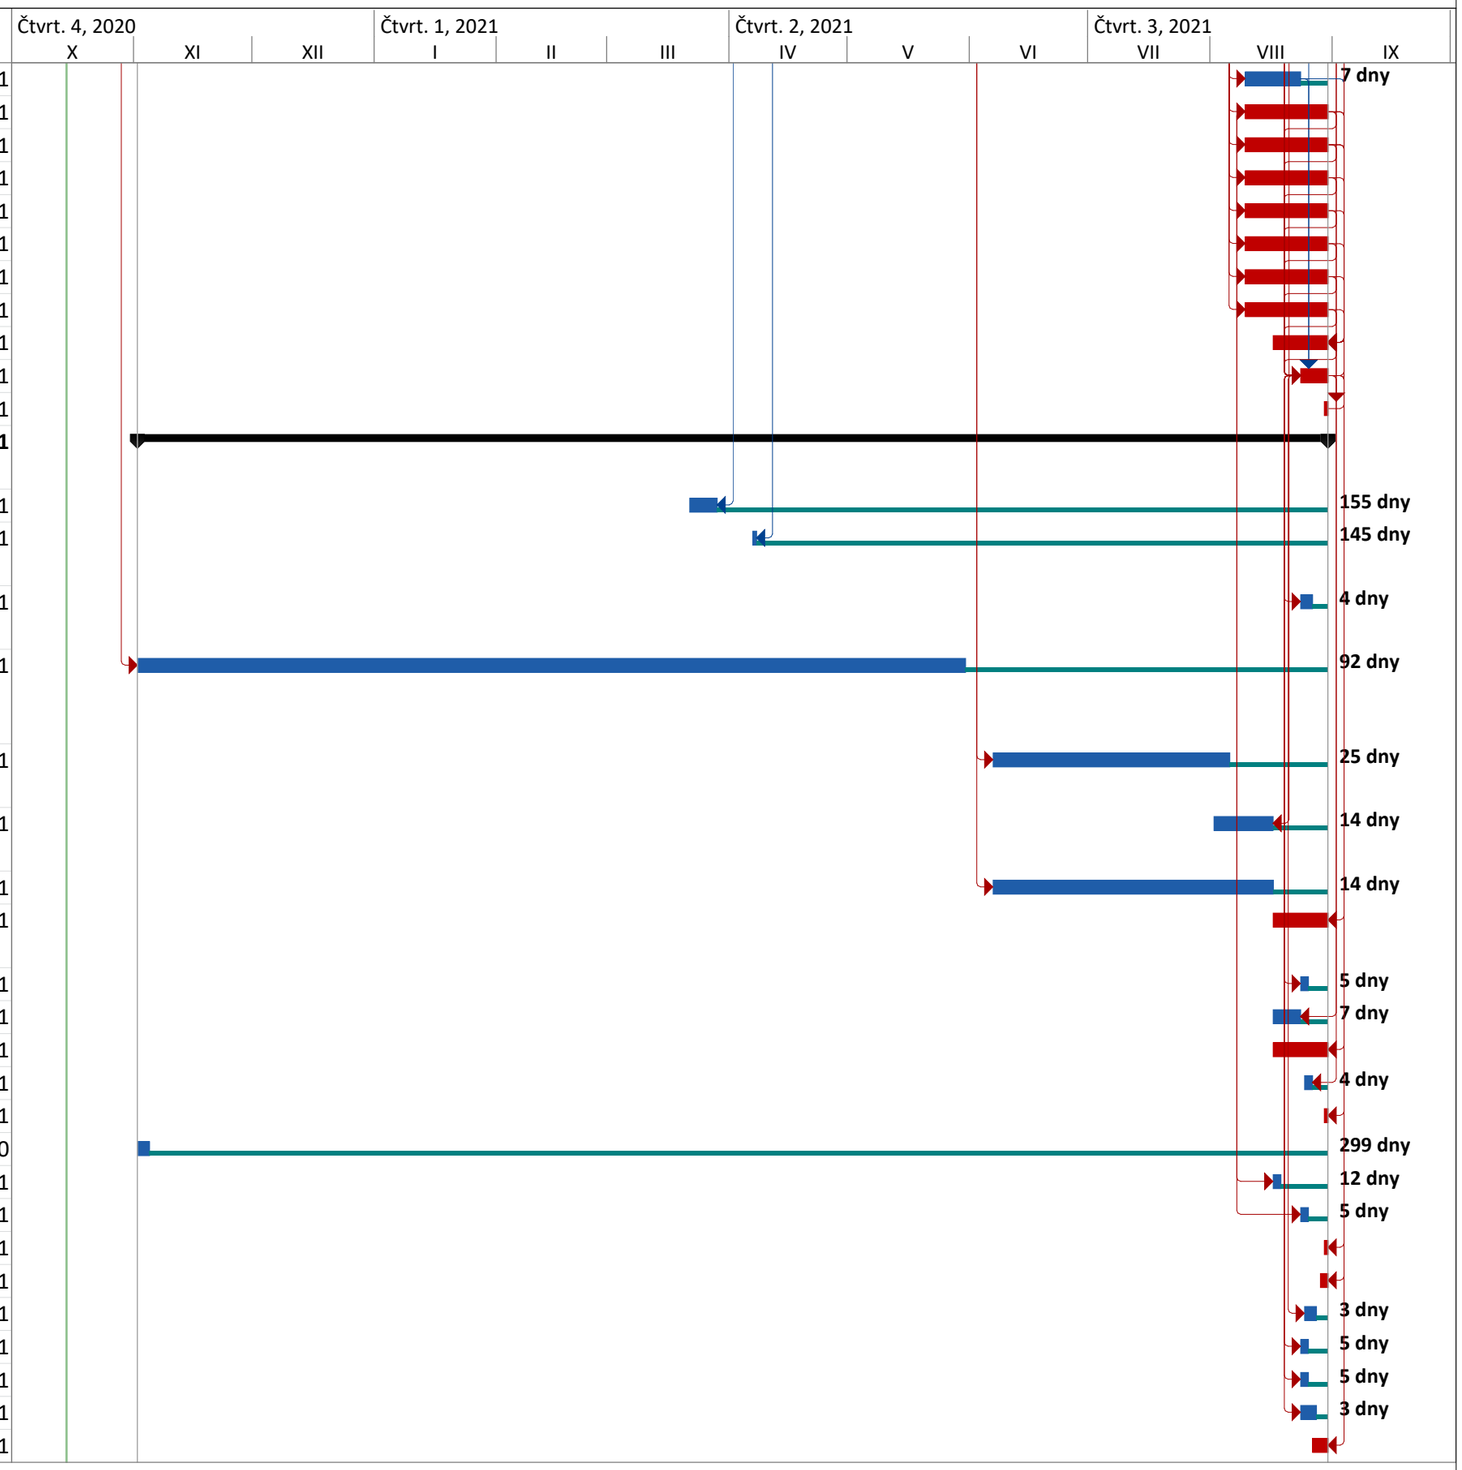

Kritická cesta červeně, rezerva vedle pruhu

Subterra, a.s.
