HARMONOGRAM VÝSTAVBY

HMG dodatek č.12 - stavba PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 – Bubeneč

ID	Název úkolu	Doba trvání - aktuální plán	Zahájení - aktuální	Dokončení - aktuální plán
1	**PNP - Rekonstrukce bývalé Petschkovy vily**	**117 dny?**	**10.11. 20**	**22.03. 21**
2	**Dodatek k SOD č. 12**	**105 dny?**	**10.11. 20**	**08.03. 21**
3	**podpis dodatku č.12**	0 dny	10.11. 20	10.11. 20
4	Provedení prací v rámci ZL č. 76	53 dny?	10.11. 20	09.01. 21
5	Provedení prací v rámci ZL č. 78	53 dny?	10.11. 20	09.01. 21
6	Provedení prací v rámci ZL č. 81	53 dny?	10.11. 20	09.01. 21
7	Provedení prací v rámci ZL č. 82	53 dny?	10.11. 20	09.01. 21
8	Provedení prací v rámci ZL č. 84	53 dny?	10.11. 20	09.01. 21
9	Provedení prací v rámci ZL č. 86	53 dny?	10.11. 20	09.01. 21
10	**Provedení prací v rámci ZL č. 87**	**103 dny?**	**10.11. 20**	**06.03. 21**
11	vnitřní kamenné dlažby	60 dny?	10.11. 20	18.01. 21
12	venkovní kamenné dlažby	86 dny	30.11. 20	06.03. 21
13	Provedení prací v rámci ZL č. 88	53 dny?	10.11. 20	09.01. 21
14	**Provedení prací v rámci ZL č. 89**	**105 dny**	**10.11. 20**	**08.03. 21**
15	bourací práce	21 dny	13.11. 20	07.12. 20
16	dodávka tercových parapetů	65 dny	08.12. 20	19.02. 21
17	zemní práce	10 dny	10.11. 20	20.11. 20
18	betonáž základu chybějících polí	3 dny	21.11. 20	24.11. 20
19	vyzdění konstrukcí chybějících polí	20 dny	25.11. 20	17.12. 20
20	provedení perlinky na všech polích	8 dny	20.02. 21	28.02. 21
21	provedení finální barevné omítky	8 dny	01.03. 21	08.03. 21
22	**Rekonstrukce hlavního objektu**	**101 dny**	**10.11. 20**	**04.03. 21**
23	Komunikace pozemní	85 dny	10.11. 20	15.02. 21
24	Konstrukce suché výstavby	26 dny	10.11. 20	09.12. 20
25	Konstrukce klempířské	8 dny	10.11. 20	19.11. 20
26	Konstrukce truhlářské	93 dny	18.11. 20	03.03. 21
27	Podlahy z dlaždic	53 dny	10.11. 20	09.01. 21
28	Podlahy z litého teraca	24 dny	10.11. 20	07.12. 20
29	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	53 dny	10.11. 20	09.01. 21
30	Podlahy povlakové	15 dny	11.01. 21	27.01. 21
31	Dokončovací práce - obklady	26 dny	10.11. 20	09.12. 20
32	Dokončovací práce - obklady z kamene	80 dny	04.12. 20	04.03. 21
33	Dokončovací práce - nátěry	12 dny	10.11. 20	23.11. 20
34	Dokončovací práce - malby a tapety	31 dny	26.12. 20	30.01. 21
35	Generální klíč	15 dny	12.02. 21	28.02. 21
36	Informační systém	15 dny	07.12. 20	23.12. 20
37	První vybavení	15 dny	26.01. 21	10.02. 21
38	Zařízení pro vytápění staveb - kompletace a nastavení	19 dny	10.11. 20	01.12. 20
39	Zařízení pro ochlazování staveb - kompletace a nastavení	19 dny	10.11. 20	01.12. 20
40	Zařízení vzduchotechniky - kompletace a nastavení	89 dny	10.11. 20	19.02. 21
41	Pobočková telefonní ústředna (PBX) - kompletace a nastavení	89 dny	10.11. 20	19.02. 21
42	Datové a telefonní rozvody - strukturovaná kabeláž (SSK) - kompletace a nastavení	85 dny	10.11. 20	15.02. 21
43	Místní rozhlas MR (nepožární) - kompletace a nastavení	85 dny	10.11. 20	15.02. 21
44	Společná televizní anténa STA - kompletace a nastavení	85 dny	10.11. 20	15.02. 21
45	Nouzové volání invalidů (NVI) - kompletace a nastavení	85 dny	10.11. 20	15.02. 21
46	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - kompletace a nastavení	85 dny	10.11. 20	15.02. 21
47	Elektrická kontrola vstupu (EKV) a intercom - kompletace a nastavení	85 dny	10.11. 20	15.02. 21
48	Kamerový systém (CCTV) - kompletace a nastavení	85 dny	10.11. 20	15.02. 21
49	Elektrická požární signalizace (EPS) - kompletace a nastavení	85 dny	10.11. 20	15.02. 21
50	AV technika - kompletace a nastavení	85 dny	10.11. 20	15.02. 21
51	Měření a regulace (ASŘ) - kompletace a nastavení	96 dny	10.11. 20	27.02. 21
52	Sesuvné regály - kompletace	53 dny	10.11. 20	09.01. 21
53	Samočinné hasební zařízení - kompletace a nastavení	20 dny	10.11. 20	03.12. 20
54	Gastronomická zařízení	80 dny	10.11. 20	09.02. 21
55	Kašna architektonicko-stavební a konstrukční řešení	66 dny	10.11. 20	25.01. 21
56	Technologie kašny	35 dny	26.01. 21	04.03. 21
57	Oplocení	89 dny	10.11. 20	19.02. 21
58	Přemístění plastiky lva s čs. znakem	17 dny	11.01. 21	29.01. 21
59	Komunikace	97 dny	17.11. 20	06.03. 21
60	Rekultivace plochy po odbourání objektu kina	97 dny	17.11. 20	06.03. 21
61	Sadové úpravy	97 dny	17.11. 20	06.03. 21
62	Venkovní vodovod (areálový)	97 dny	10.11. 20	28.02. 21
63	Venkovní osvětlení	71 dny	01.12. 20	19.02. 21
64	Kapacitní slaboproudé propojení s objektem Pelléova č.p. 20	97 dny	10.11. 20	28.02. 21
65	**Oprava fasádního pláště**	**6 dny?**	**10.11. 20**	**16.11. 20**
66	oprava omítek fasády	6 dny?	10.11. 20	16.11. 20
67	trubkové lešení	6 dny?	10.11. 20	16.11. 20
68	dokončení a předávací fasádního pláště	0 dny	16.11. 20	16.11. 20
69	**Dokončení díla, předání stavby**	**2 dny**	**09.03. 21**	**10.03. 21**
70	**demontáž ZS**	**10 dny**	**11.03. 21**	**22.03. 21**

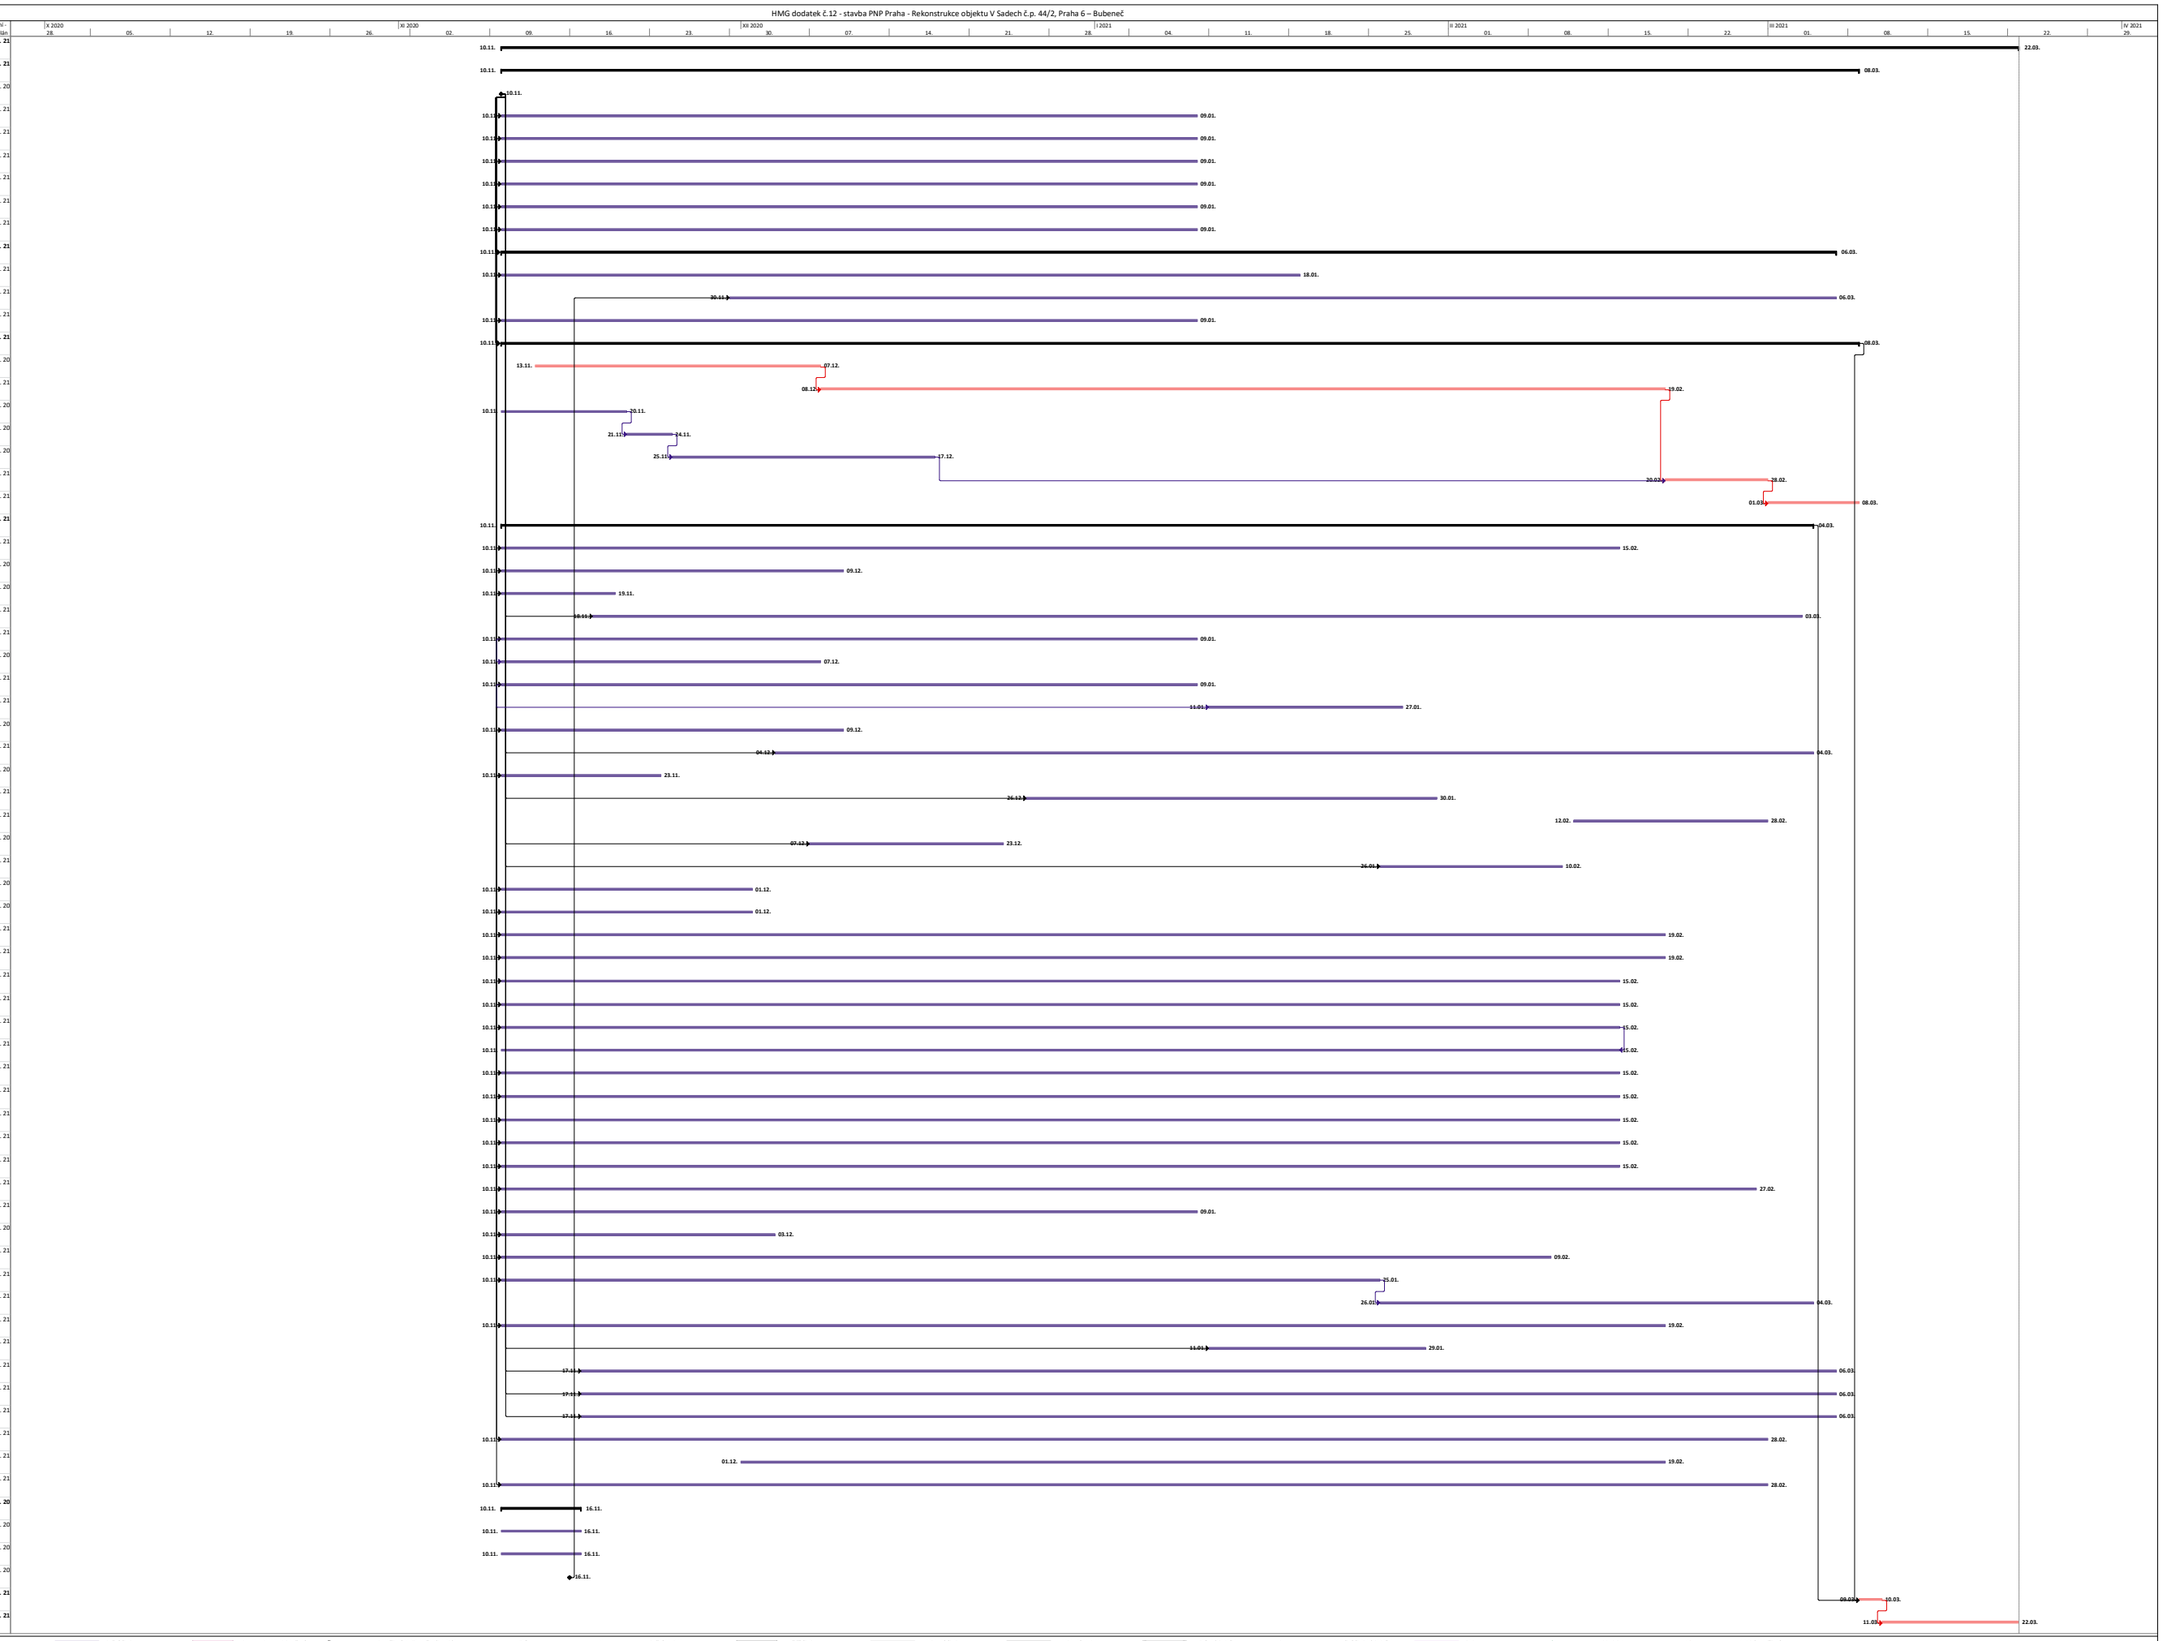

Souhrnný úkol směrného plánu | Úkol | Ruční úkol | Pouze s datem dokončení | Rozdělení podle směrného plánu | Milník | Ruční souhrn | Vnější úkoly | Neaktivní úkol | Neaktivní souhrn | Milník následníka | Normální úkol následníka | SoD | OBJ DOK | Kritické rozdělení
Rozdělení kritického úkolu | Rozdělení | Pouze zahájení | Pouze s dobou trvání | Milník podle směrného plánu | Souhrnný | Souhrn projektu | Vnější milník | Neaktivní milník | Konečný termín | Souhrnný úkol následníka | PD | OBJ ZAH | Kritický | Směrný plán
