Nadjezd Závodní - Třinec
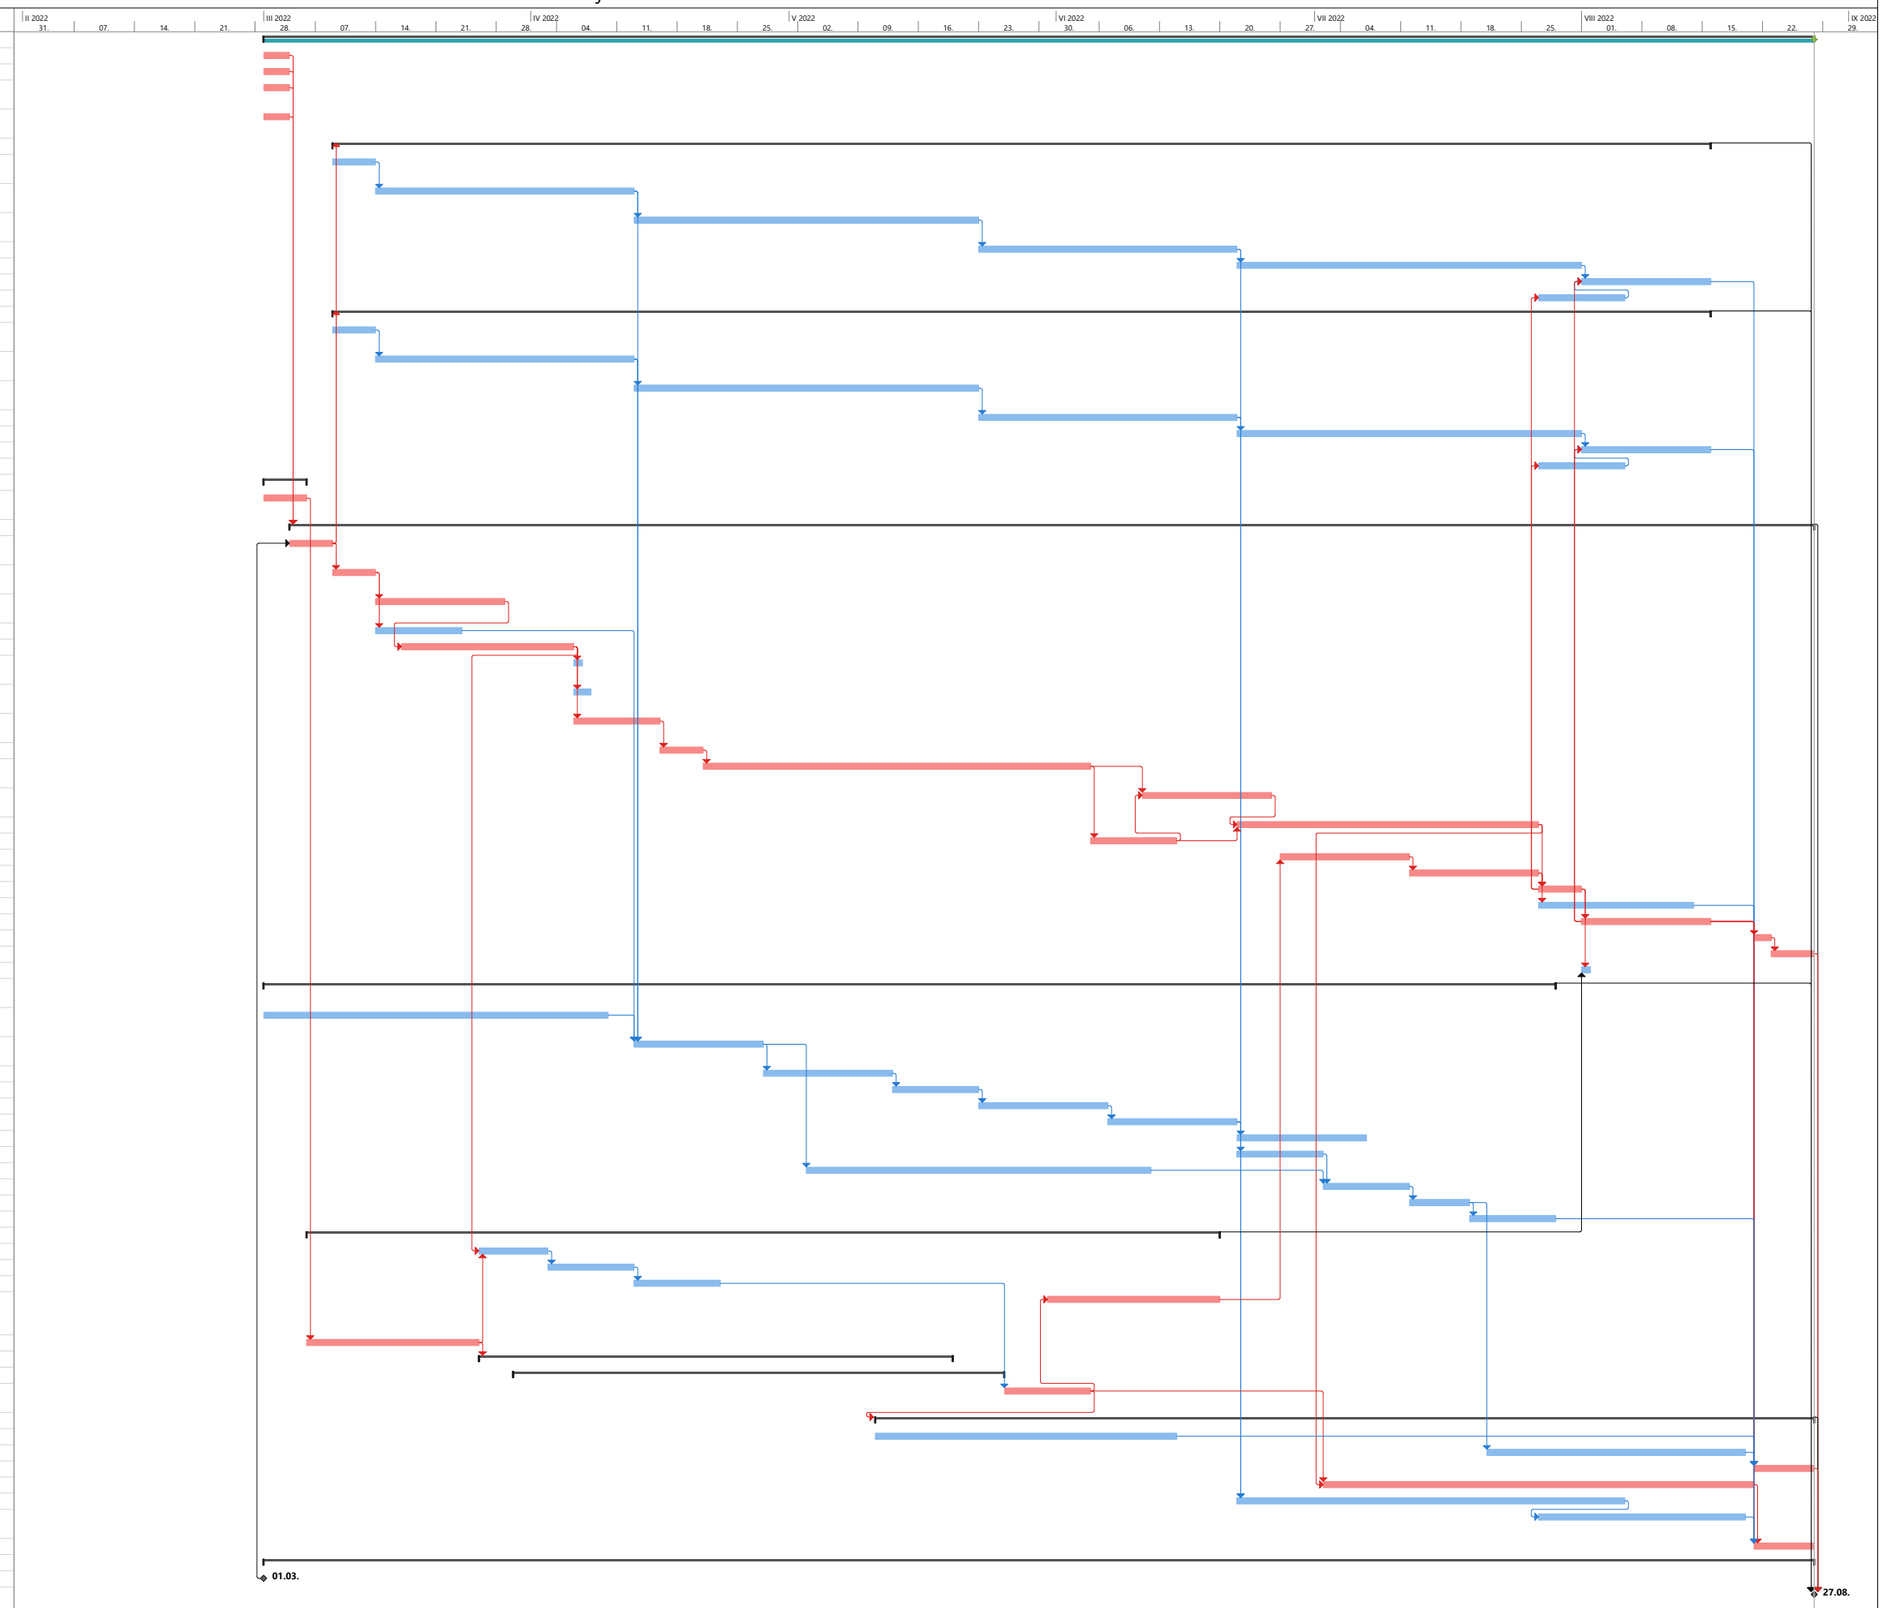
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		Třinec Závodní	180 dny	01.03. 22	27.08. 22
2		Přípravné práce, zřízení zařízení staveniště	3 dny	01.03. 22	03.03. 22
3		Vytyčení všech stávajících IS + jejich ochrana	3 dny	01.03. 22	03.03. 22
4		Kompletní zaměření nosné konstrukce s detailním přeměřením vozovky (požadovaný rastr stanoví projektant RDS)	3 dny	01.03. 22	03.03. 22
5		Osazení měřických bodů na podhledu NK a zaměření nultého stavu NK před demolicí	3 dny	01.03. 22	03.03. 22
6		**SO 201 - 1. Rekonstrukce opěrných zdí před a za mostem vpravo**	**160 dny**	**09.03. 22**	**15.08. 22**
7		Demontáž zábradelních svodidel na opěrných zdech vpravo před i za mostem (po přechodové oblasti)	5 dny	09.03. 22	13.03. 22
8		Demolice koruny navazujících opěrných zdí vpravo před i za mostem (po přechodové oblasti)	30 dny	14.03. 22	12.04. 22
9		Armování a betonáž koruny nových opěrných zdí vpravo před i za mostem (po přechodovou oblast)	40 dny	13.04. 22	22.05. 22
10		Armování a betonáž nových říms na opravených opěrných zdech	30 dny	23.05. 22	21.06. 22
11		Izolace opěrných zdí vpravo před a za mostem a zásypy	40 dny	22.06. 22	31.07. 22
12		Vozovkové vrstvy včetně obrusné vrstvy	15 dny	01.08. 22	15.08. 22
13		Osazení zábradelního svodidla na nově provedené římsy	10 dny	27.07. 22	05.08. 22
14		**SO 201 - 2. Rekonstrukce opěrných zdí před a za mostem vlevo**	**160 dny**	**09.03. 22**	**15.08. 22**
15		Demontáž zábradelních svodidel na opěrných zdech vlevo před i za mostem (po přechodové oblasti)	5 dny	09.03. 22	13.03. 22
16		Demolice koruny navazujících opěrných zdí vlevo před i za mostem (po přechodové oblasti)	30 dny	14.03. 22	12.04. 22
17		Armování a betonáž koruny nových opěrných zdí vlevo před i za mostem (po přechodovou oblast)	40 dny	13.04. 22	22.05. 22
18		Armování a betonáž nových říms na opravených opěrných zdech	30 dny	23.05. 22	21.06. 22
19		Izolace opěrných zdí vpravo před a za mostem a zásypy	40 dny	22.06. 22	31.07. 22
20		Vozovkové vrstvy včetně obrusné vrstvy	15 dny	01.08. 22	15.08. 22
21		Osazení zábradelního svodidla na nově provedené římsy	10 dny	27.07. 22	05.08. 22
22		**SO 201 - 3. Přípravné práce pod mostem**	**5 dny**	**01.03. 22**	**05.03. 22**
23		Přípravné práce pro provizorní podepření mostu u P7, P8 a v místě vloženého pole (založení stojek nad nábřežní zdí)	5 dny	01.03. 22	05.03. 22
24		**SO 201 - 4. Práce na mostě**	**177 dny**	**04.03. 22**	**27.08. 22**
25		Frézování vozovkových vrstev na mostě a v přechodových oblastech mostu	5 dny	04.03. 22	08.03. 22
26		Demontáž zábradelního svodidla na mostě a v přechodové oblasti mostu	5 dny	09.03. 22	13.03. 22
27		Demolice mostních říms na mostě a v přechodové oblasti mostu (zahájeno v místě vloženého pole)	15 dny	14.03. 22	28.03. 22
28		Vybourání odvodňovačů a mostních závěrů	10 dny	14.03. 22	23.03. 22
29		Odstranění vyrovnávacího betonu (zahájeno v místě vloženého pol	20 dny	17.03. 22	05.04. 22
30		Přeměření měřických bodů na podhledu nosné konstrukce po odstranění příslušenství a frézování	1 den	06.04. 22	06.04. 22
31		Zaměření skutečného stavu povrchu mostovky po očištění a projekční práce na úpravě nivelety	2 dny	06.04. 22	07.04. 22
32		Dodatečná diagnostika předpjatých nosníků a dodatečně předpjaté desky (před O2), včetně čel	10 dny	06.04. 22	15.04. 22
33		Injektáž kabelových kanálků	5 dny	16.04. 22	20.04. 22
34		Provedení spřažené desky v nutném rozsahu (přednostně v rozsahu pro nutné provizorního podepření O1, O2, P7, P8)	45 dny	21.04. 22	04.06. 22
35		Izolace spřažené desky mimo oblast opěr a zvedaného pole, ochrana izolace pod římsami	15 dny	11.06. 22	25.06. 22
36		Armování a betonáž mostních říms (mimo opěr a zvedaného pole)	35 dny	22.06. 22	26.07. 22
37		Osazení mostních závěrů	10 dny	05.06. 22	14.06. 22
38		Izolace v oblasti opěr a vloženého pole	15 dny	27.06. 22	11.07. 22
39		Armování a betonáž mostních říms nad opěrami a u zvedaného pol	15 dny	12.07. 22	26.07. 22
40		Osazení záchytného systému	5 dny	27.07. 22	31.07. 22
41		Osazení svodů	18 dny	27.07. 22	13.08. 22
42		Vozovkové vrstvy na mostě a v rozsahu přechodové oblasti	15 dny	01.08. 22	15.08. 22
43		vodorovné dopravní značení	2 dny	21.08. 22	22.08. 22
44		hlavní mostní prohlídka	5 dny	23.08. 22	27.08. 22
45		Zaměření měřických bodů po dokončení příslušenství	1 den	01.08. 22	01.08. 22
46		**SO 201 - 5. Práce na krajních opěrách a zdech v rozsahu přechodových oblastí**	**150 dny**	**01.03. 22**	**28.07. 22**
47		Práce na provizorním podepření před opěrami, provizorní podepření před opěrami	40 dny	01.03. 22	09.04. 22
48		Demolice spodní stavby krajních opěr a opěrných zdí v rozsahu přechodové desky	15 dny	13.04. 22	27.04. 22
49		Založení krajních opěr - mikropiloty	15 dny	28.04. 22	12.05. 22
50		Armování a betonáž základů krajních opěr	10 dny	13.05. 22	22.05. 22
51		Armování a betonáž části opěrných zdí v oblasti přechodové desky	15 dny	23.05. 22	06.06. 22
52		Armování a betonáž krajních opěr mimo závěrné zídky	15 dny	07.06. 22	21.06. 22
53		Izolace a přechodová oblast mostu po úložný práh	15 dny	22.06. 22	06.07. 22
54		Podložiskové bloky, ložiska na opěrách	10 dny	22.06. 22	01.07. 22
55		Sanace čel a zesílení oblasti koncových příčníků	40 dny	03.05. 22	11.06. 22
56		Armování a betonáž závěrné zídky	10 dny	02.07. 22	11.07. 22
57		Armování a betonáž přechodové desky	7 dny	12.07. 22	18.07. 22
58		Zrušení provizorního podepření u opěr	10 dny	19.07. 22	28.07. 22
59		**SO 201 - 6. Práce u zvedaného pole, zesílen podpěr P7, P8**	**106 dny**	**06.03. 22**	**19.06. 22**
60		Zvednutí vloženého pole	8 dny	26.03. 22	02.04. 22
61		Diagnostika vloženého pole	10 dny	03.04. 22	12.04. 22
62		Sanace vloženého pole (včetně injektáže kabelových kanálků)	10 dny	13.04. 22	22.04. 22
63		Provedení spřažené desky na spuštěném vloženém poli (vrtání a vlepování spřahovací výztuže + vázání výztuže + bednění na zvednutém poli)	20 dny	31.05. 22	19.06. 22
64		Provizorní podepření u podpěr P7 a P8	20 dny	06.03. 22	25.03. 22
65		**Zesílení u P7**	**55 dny**	**26.03. 22**	**19.05. 22**
75		**Zesílení u P8**	**57 dny**	**30.03. 22**	**25.05. 22**
85		Zpětné uložení vloženého pole, včetně montáže ložisek + demontáž skruže	10 dny	26.05. 22	04.06. 22
86		**SO 201 - 7. Sanační práce a úpravy kolem a pod mostem**	**109 dny**	**11.05. 22**	**27.08. 22**
87		Oprava obrub u ostrůvků za mostem	35 dny	11.05. 22	14.06. 22
88		Zásypy a provedení vozovkových vrstev vpravo před a za mostem	30 dny	21.07. 22	19.08. 22
89		Trvalé dopravní značení	7 dny	21.08. 22	27.08. 22
90		Sanace podhledu a spodní stavby	50 dny	02.07. 22	20.08. 22
91		Sanace povrchu opěrných zdí	45 dny	22.06. 22	05.08. 22
92		Úpravy kolem a pod mostem (průběžně s postupem sanačních prací v jednotlivých polích)	24 dny	27.07. 22	19.08. 22
93		Odstranění zařízení staveniště, úprava ploch do původního stavu	7 dny	21.08. 22	27.08. 22
94		SO 182	180 dny	01.03. 22	27.08. 22
95		Uzavření provozu na mostě	0 dny	01.03. 22	01.03. 22
96		dokončení prací pro zahájení místního šetření pro uvedení mostu do provozu	0 dny	27.08. 22	27.08. 22
