Společnost Osvětlení tunelů Kačerov-Háje HOCHTIEF CZ – BREMA
Modernizace Osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov – Háje

Příloha č. 3

ID		Kód WBS	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		1		Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Kačerov - Háje (KC-HA)	1016 dní	07.10.2019	21.11.2022
2		1.1		1. realizační etapa (termín ovlivněn epidemií covid-19)	206 dny	07.10. 19	29.04. 20
3		1.1.1		Předání staveniště k provedení 1. etapy	1 den	07.10. 19	07.10. 19
4		1.1.2		Osvětlení - 04_OP_HA_SPO - úsek Opatov - Háje	206 dny	07.10. 19	29.04. 20
5		1.1.3		Silové rozvody - 05_HA_SPO - stanice Háje	206 dny	07.10. 19	29.04. 20
6		1.1.4		Silové rozvody - 04_OP - stanice Opatov 1./2 (tunel směr Háje)	206 dny	07.10. 19	29.04. 20
7		1.2		2. realizační etapa	278 dny	22.06. 20	26.03. 21
8		1.2.1		Předání staveniště k provedení 2. etapy	1 den	22.06. 20	22.06. 20
9		1.2.2		Osvětlení - 01_KC_RO - úsek Kačerov - Roztyly	278 dny	22.06. 20	26.03. 21
10		1.2.3		Silivé rozvody - 01_KC - stanice Kačerov	278 dny	22.06. 20	26.03. 21
11		1.2.4		Silové rozvody - 02_RO - stanice Roztyly 1./2 (tunel směr Kačerov)	278 dny	22.06. 20	26.03. 21
12		1.3		3. realizační etapa	272 dny	09.05. 21	04.02. 22
13		1.3.1		Předání staveniště k provedení 3. etapy	1 den	09.05. 21	09.05. 21
14		1.3.2		Osvětlení - 02_RO_CH - úsek Roztyly - Chodov	272 dny	09.05. 21	04.02. 22
15		1.3.3		Silové rozvody - 02_RO - stanice Roztyly 2./2 (tunel směr Chodov)	272 dny	09.05. 21	04.02. 22
16		1.3.4		Silové rozvody - 03_CH - stanice Chodov 1./2 (tunel směr Roztyly)	272 dny	09.05. 21	04.02. 22
17		1.4		4. realizační etapa	260 dny	07.03. 22	21.11. 22
18		1.4.1		Předání staveniště k provedení 4. etapy	1 den	07.03. 22	07.03. 22
19		1.4.2		Osvětlení - 03_CH_OP - úsek Chodov - Opatov	260 dny	07.03. 22	21.11. 22
20		1.4.3		Silové rozvody - 03_CH - stanice Chodov 2./2 (tunel směr Opatov)	260 dny	07.03. 22	21.11. 22
21		1.4.4		Silové rozvody - 04_OP - stanice Opatov 2./2 (tunel směr Chodov)	260 dny	07.03. 22	21.11. 22

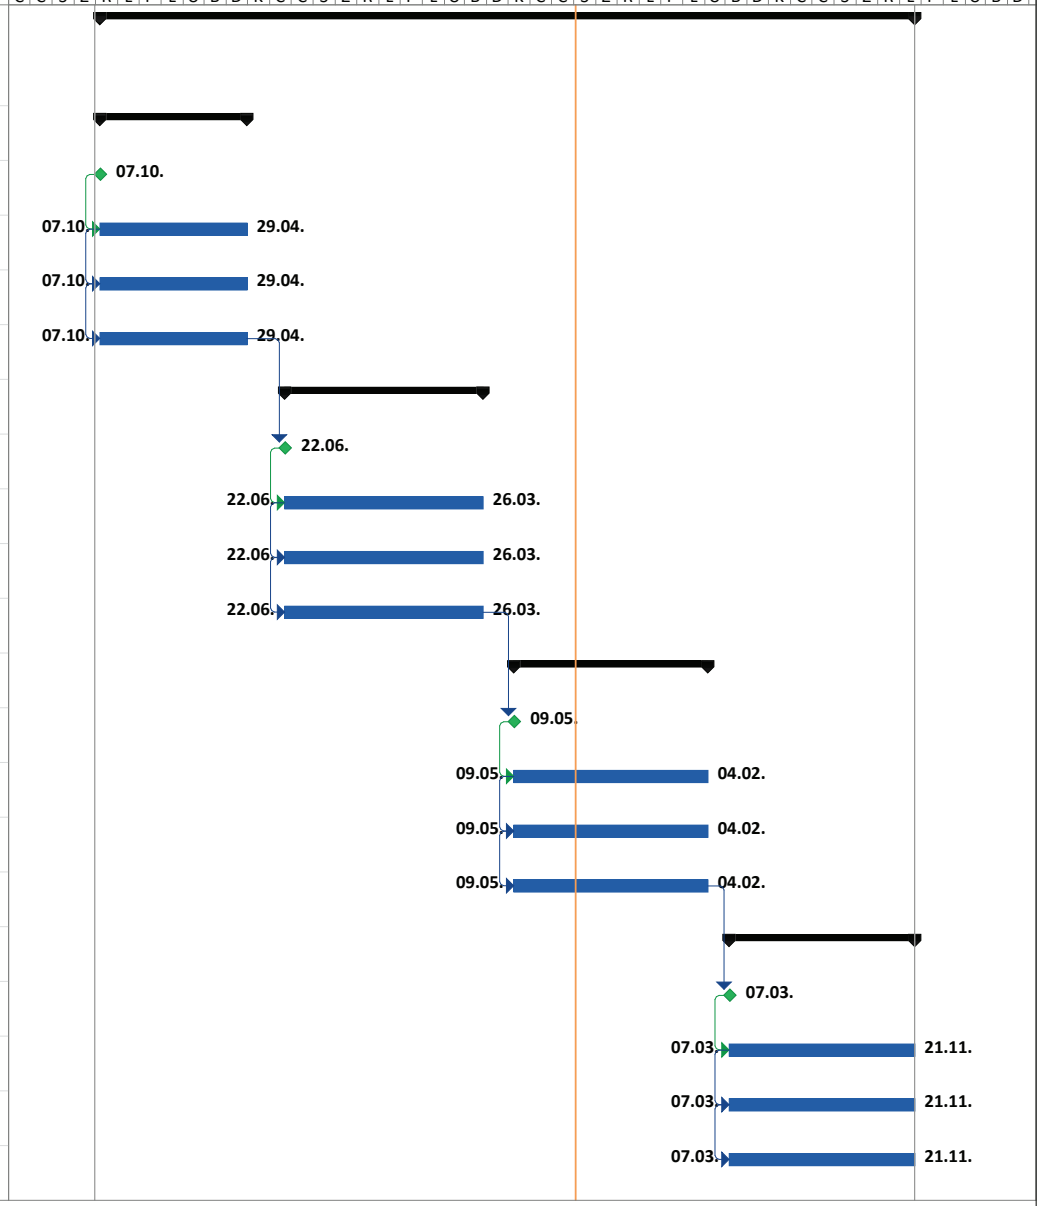

HMG dle dodatku č. 1 (746 dní) + navýšení časové náročnosti ze ZL02 (RU +30 dní)) a ZL03 (LŘS +240 dní)
1. Etapa - 194 dní + 2x 6 dní (2x RU) = 206 dní, 2. Etapa - 186 dní + 2x 6 dní (2x RU) + 80 dní (LŘS) = 278 dní
3. Etapa - 186 dní + 6 dní (RU) + 80 dní (LŘS) = 272 dní, 4. Etapa - 180 dní + 80 dní (LŘS) = 260 dní

Platnost výše uvedeného harmonogramu je podmíněna poskytováním veškeré nezbytné součinnosti objednatele k řádnému provedení díla.
