Rekonstrukce sportovního areálu Poruba – II. etapa

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Celková doba výstavby**	400 dny	04.10. 21	16.04. 23
2				
3	**Zahájení prací na díle, v termínu dle SOD**	0 dny	04.10. 21	04.10. 21
4				
5	**Vedlejší rozpočtové náklady**	401 dny	04.10. 21	16.04. 23
6	Přípravné práce, ZS atd...	11 dny	04.10. 21	17.10. 21
7	**SO 01 - Kácení zeleně, sadové úpravy, zatravnění**	79 dny	18.10. 21	10.04. 23
8	Přípravné práce na začátku stavby - kácení atd...	54 dny	18.10. 21	30.12. 21
9	Sadové úpravy řed dokončením	26 dny	06.03. 23	10.04. 23
10	**SO 02 - Demolice, demontáž oplocení**	55 dny	18.10. 21	31.12. 21
11	**SO 03 - Přeložky**	120 dny	18.10. 21	04.04. 22
12	SO 03.1 - Přeložka NN (řeší ČEZ) _ NENÍ PŘEDMĚTEM PD			
13	SO 03.2 - Přeložka jednotné kanalizace	120 dny	18.10. 21	01.04. 22
14	SO 03.3 - Odstranění vodovodu a kanalizace	120 dny	18.10. 21	01.04. 22
15	**SO 04 - Vstupní objekt**	270 dny	15.03. 22	26.03. 23
16	1 - Zemní práce	35 dny	15.03. 22	30.04. 22
17	2 - Zakládání	49 dny	25.04. 22	30.06. 22
18	3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 dny	01.07. 22	20.08. 22
19	4 - Vodorovné konstrukce	23 dny	01.08. 22	31.08. 22
20	**Uzlový bod č.1 - Dokončení hrubé stavby SO 04**	0 dny	31.08. 22	31.08. 22
21	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	65 dny	01.09. 22	30.11. 22
22	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 dny	02.01. 23	26.03. 23
23	998 - Přesun hmot	241 dny	25.04. 22	26.03. 23
24	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	170 dny	10.05. 22	31.12. 22
25	712 - Povlakové krytiny	65 dny	01.09. 22	30.11. 22
26	713 - Izolace tepelné	65 dny	01.09. 22	30.11. 22
27	762 - Konstrukce tesařské	16 dny	10.08. 22	31.08. 22
28	763 - Konstrukce suché výstavby	87 dny	15.11. 22	15.03. 23
29	764 - Konstrukce klempířské	43 dny	01.09. 22	30.10. 22
30	766 - Konstrukce truhlářské	24 dny	15.02. 23	20.03. 23
31	767 - Konstrukce zámečnické	34 dny	01.02. 23	20.03. 23
32	771 - Podlahy z dlaždic	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
33	776 - Podlahy povlakové	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
34	781 - Dokončovací práce - obklady	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
35	783 - Dokončovací práce - nátěry	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
36	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
37	N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
38	Požárně bezpečnostní řešení	90 dny	15.11. 22	20.03. 23
39	VZT, klimatizace	148 dny	01.09. 22	26.03. 23
40	Silnoproudá elektrotechnika	148 dny	01.09. 22	26.03. 23
41	Slaboproudá elektrotechnika	148 dny	01.09. 22	26.03. 23
42	Vytápění a rozvody chladu	148 dny	01.09. 22	26.03. 23
43	Zdravotně technické instalace	148 dny	01.09. 22	26.03. 23
44	Gastrotechnologie	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
45	Interiér	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
46	MaR	61 dny	02.01. 23	26.03. 23
47	**Uzlový bod č.6 - Dokončení SO04 Vstupní objekt (3 týdny před konečným termínem)**	0 dny	26.03. 23	26.03. 23
48	**SO 06 - Sklady a pergola**	270 dny	15.03. 22	26.03. 23
49	1 - Zemní práce	35 dny	15.03. 22	30.04. 22
50	2 - Zakládání	49 dny	25.04. 22	30.06. 22
51	3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 dny	01.07. 22	20.08. 22
52	4 - Vodorovné konstrukce	23 dny	01.08. 22	31.08. 22
53	**Uzlový bod č.2 - Dokončení hrubé stavby SO 06**	0 dny	31.08. 22	31.08. 22
54	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	65 dny	01.09. 22	30.11. 22
55	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 dny	02.01. 23	26.03. 23
56	998 - Přesun hmot	241 dny	25.04. 22	26.03. 23
57	PSV - Práce a dodávky PSV	170 dny	10.05. 22	31.12. 22
58	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	65 dny	01.09. 22	30.11. 22
59	712 - Povlakové krytiny	65 dny	01.09. 22	30.11. 22
60	713 - Izolace tepelné	65 dny	01.09. 22	30.11. 22
61	762 - Konstrukce tesařské	16 dny	10.08. 22	31.08. 22
62	763 - Konstrukce suché výstavby	87 dny	15.11. 22	15.03. 23
63	764 - Konstrukce klempířské	43 dny	01.09. 22	30.10. 22
64	766 - Konstrukce truhlářské	24 dny	15.02. 23	20.03. 23
65	767 - Konstrukce zámečnické	34 dny	01.02. 23	20.03. 23
66	771 - Podlahy z dlaždic	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
67	777 - Podlahy lité	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
68	781 - Dokončovací práce - obklady	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
69	783 - Dokončovací práce - nátěry	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
70	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
71	N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky	19 dny	01.03. 23	26.03. 23
72	Požárně bezpečnostní řešení	90 dny	15.11. 22	20.03. 23
73	Silnoproudá elektrotechnika	148 dny	01.09. 22	26.03. 23
74	Slaboproudá elektrotechnika	148 dny	01.09. 22	26.03. 23
75	Zdravotně technické instalace	148 dny	01.09. 22	26.03. 23
76	VZT, klimatizace	148 dny	01.09. 22	26.03. 23
77	**Uzlový bod č.7 - Dokončení SO06 Sklady a pergoly (3 týdny před konečným termínem)**	0 dny	26.03. 23	26.03. 23
78	**SO 07 - Stavební úpravy centrální sportovní plochy**	299 dny	26.01. 22	19.03. 23
79	Konstrukce opěrné stěny a tribun	221 dny	26.01. 22	30.11. 22
80	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	221 dny	26.01. 22	30.11. 22
81	Atletický ovál + sektory	209 dny	01.06. 22	19.03. 23
82	**Uzlový bod č.4 - Dokončení SO07 Atletická dráha (4 týdny před konečným termínem)**	0 dny	19.03. 23	19.03. 23
83	Vnitřní travnaté hřiště	209 dny	01.06. 22	19.03. 23
84	**Uzlový bod č.3 - Dokončení SO07 Fotbalové hřiště (4 týdny před konečným termínem)**	0 dny	19.03. 23	19.03. 23
85	**SO 08 - Travnatá tréninková plocha**	209 dny	01.06. 22	19.03. 23
86	**Uzlový bod č.5 - Dokončení SO08 Tréninkové hřiště (4 týdny před konečným termínem)**	0 dny	19.03. 23	19.03. 23
87	**SO 09 - Workout hřiště**	127 dny	01.10. 22	26.03. 23
88	**SO 10 - Dětské hřiště**	127 dny	01.10. 22	26.03. 23
89	**SO 11 - Víceúčelové hřiště**	127 dny	01.10. 22	26.03. 23
90	**SO 12 - Brána borců**	127 dny	01.10. 22	26.03. 23
91	**SO 13 - Oplocení**	127 dny	01.10. 22	26.03. 23
92	**SO 14 - Přípojky**	109 dny	01.04. 22	31.08. 22
93	Vodovodní přípojka	109 dny	01.04. 22	31.08. 22
94	Kanalizační přípojka jednotná	109 dny	01.04. 22	31.08. 22
95	Kanalizační přípojka splašková	109 dny	01.04. 22	31.08. 22
96	Odlučovač tuku	109 dny	01.04. 22	31.08. 22
97	**SO 15 - Dešťová kanalizace**	197 dny	01.04. 22	31.12. 22
98	Kanalizační přípojka dešťová	109 dny	01.04. 22	31.08. 22
99	Kanalizace dešťová areálová	109 dny	01.04. 22	31.08. 22
100	Retenční nádrž	197 dny	01.04. 22	31.12. 22
101	**SO 16 - Areálové osvětlení**	105 dny	01.11. 22	26.03. 23
102	**SO 17 - Areálové rozvody slaboproudu**	109 dny	01.04. 22	31.08. 22
103	**SO 18 - Areálové rozvody NN**	109 dny	01.04. 22	31.08. 22
104	**SO 19 - Areálové komunikace a zpevněné plochy**	105 dny	01.11. 22	26.03. 23
105				
106	*Předávací a dokončovací proces, včetně dokuemntace a dokladů*	21 dny	20.03. 23	16.04. 23
107	**Termín dokončení a předání díla dle článku VI.2. Smlouvy o dílo - 80 týdnů od zahájení prací**	0 dny	16.04. 23	16.04. 23

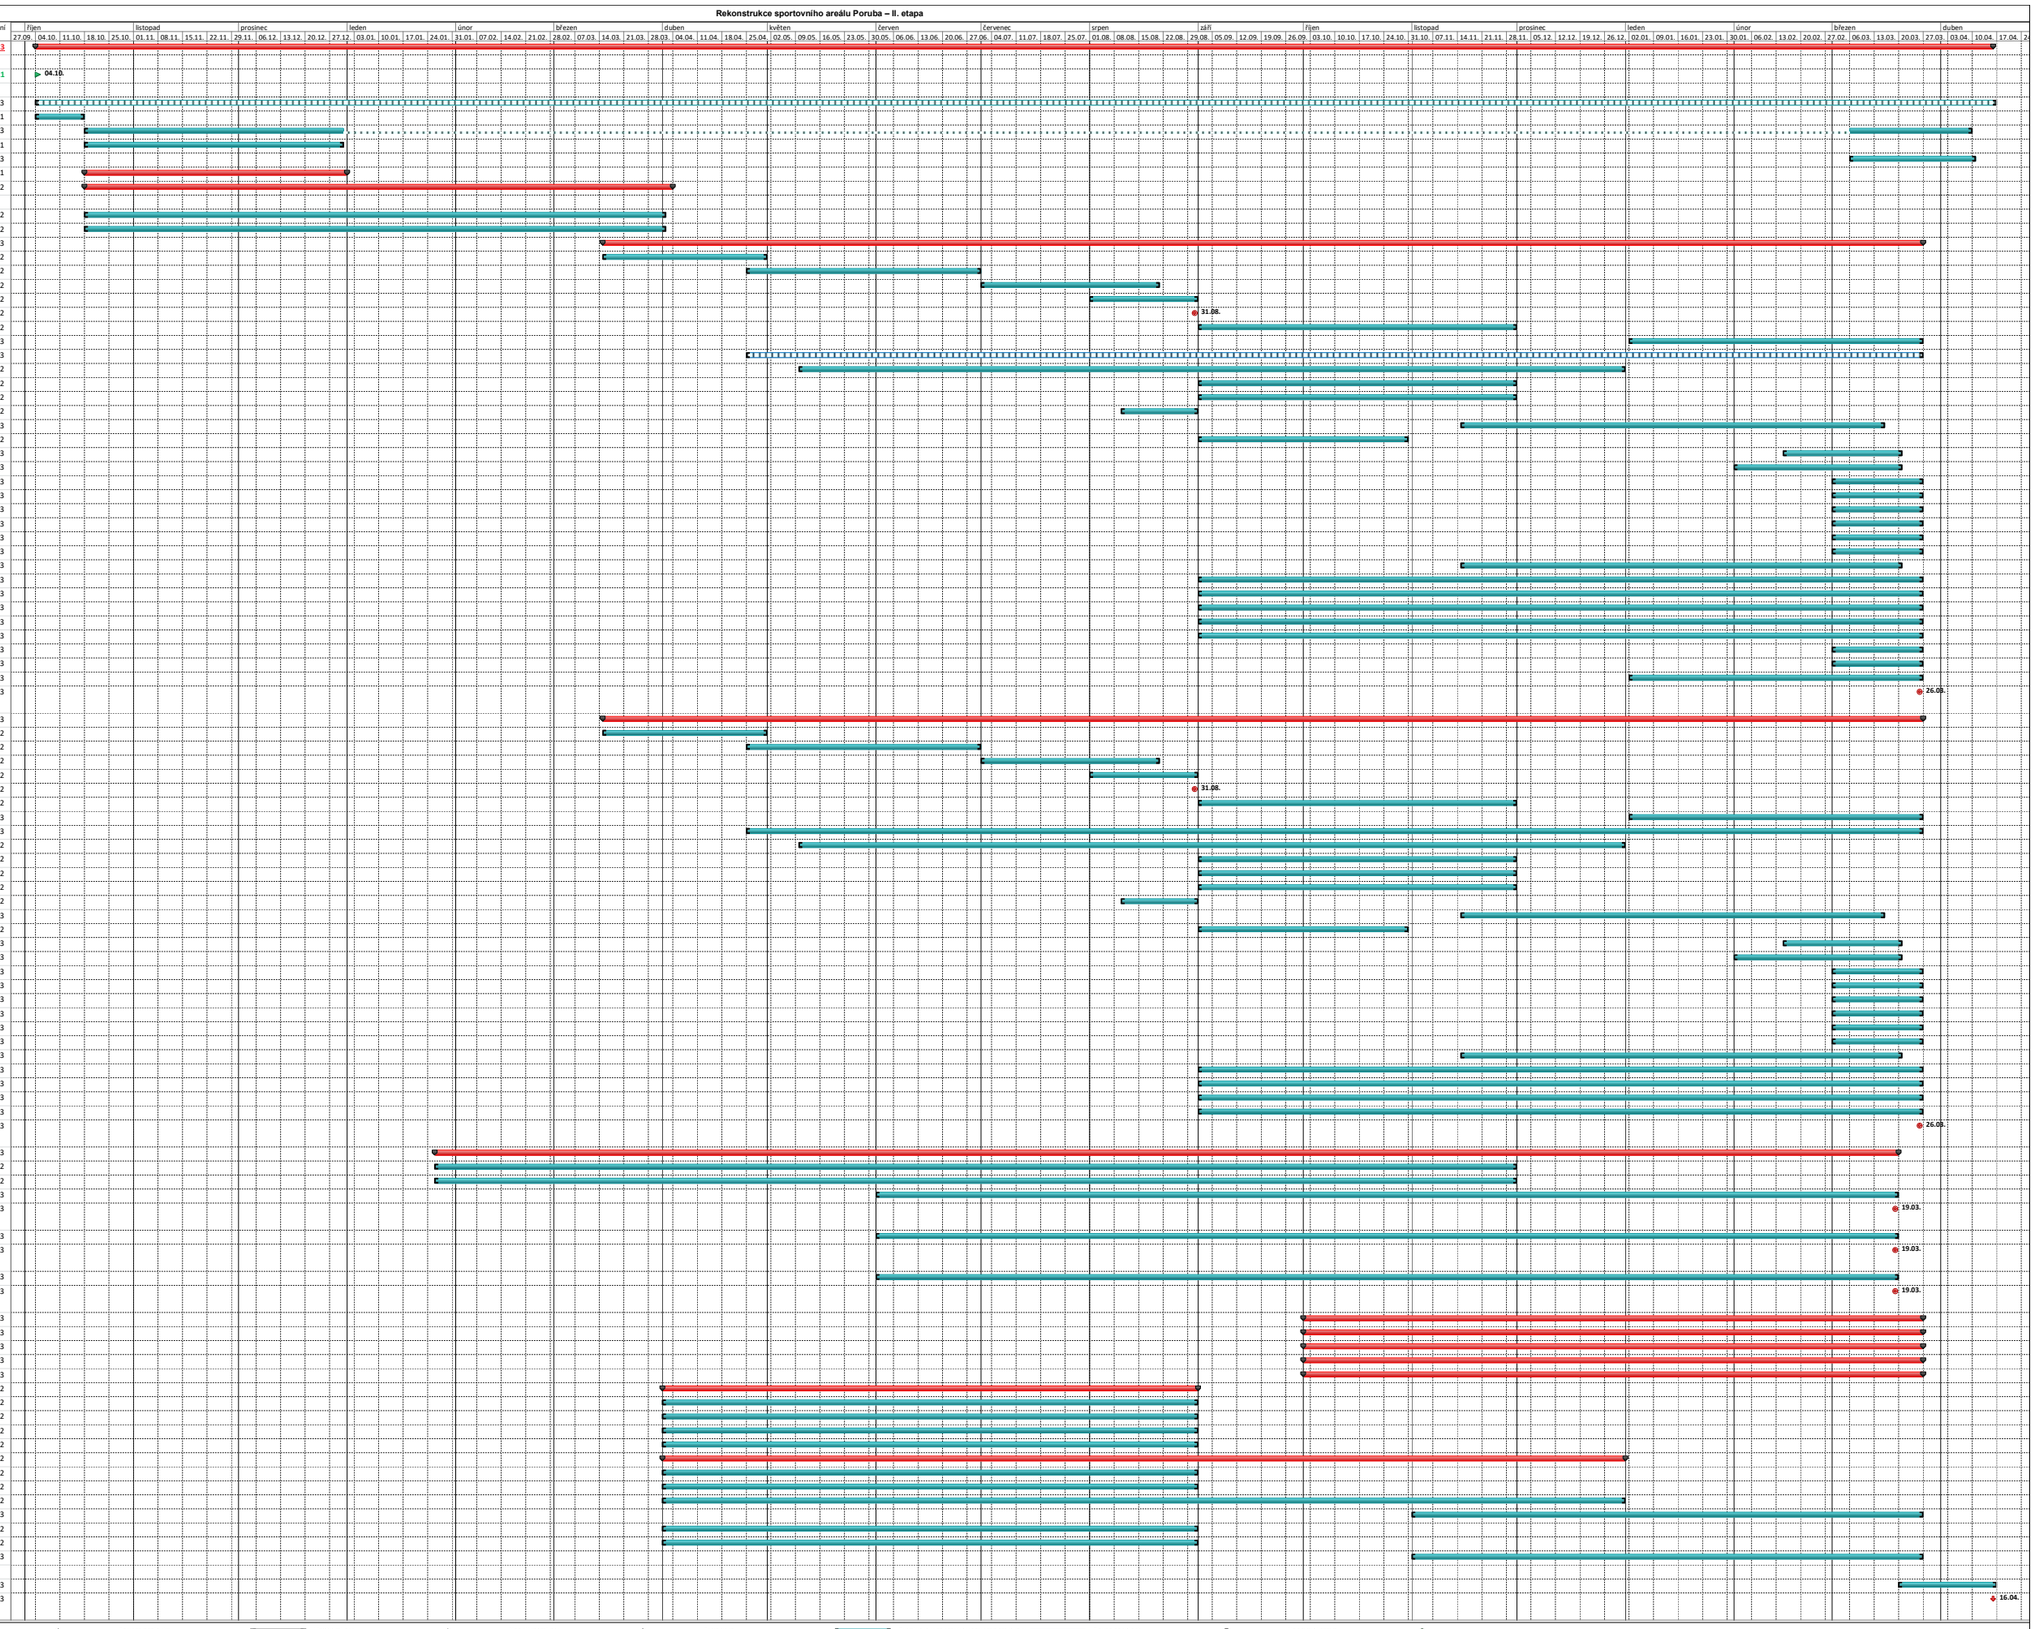

Projekt: HMG 1 SAREZA měsíční
Datum: 13.09. 21

Úkol · Rozdělení · Milník · Souhrnný · Souhrn projektu · Vnější úkoly · Vnější milník · Neaktivní úkol · Neaktivní milník · Neaktivní souhrn · Ruční úkol · Pouze s dobou trvání · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Ruční souhrn · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Konečný termín · Průběh

Jiří Stacke
Digitálně podepsal Jiří Stacke
Datum: 2021.12.20 13:23:48 +01'00'
