Harmonogram postupu prací staby: "Rekonstrukce současných prostor budovy G - MBÚ AV ČR"

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení
1	**HMG dokončení MBU**	**155 dny?**	**20.08. 21**
2	**Monolit**	**40 dny?**	**20.08. 21**
3	Dobetonování zákl. pasu výtahový šachet 1/	2 dny	20.08. 21
4	Dozdění stěny výtahů ze ztraceného bednění 1/2	2 dny	23.08. 21
5	Bourání skály pro zákl. pas výtahů 2/2	7 dny?	25.08. 21
6	dobetonování zákl. pasů výtahový šachet 2/	3 dny	02.09. 21
7	Dozdění stěny výtahů ze ztraceného bednění 2/2	5 dny	06.09. 21
8	technologická pauza	1 den	11.09. 21
9	Provedení stěn 1.NP 1/2	3 dny	13.09. 21
10	Provedení stěn 1.NP 2/2	7 dny	16.09. 21
11	provedení stropu nad 1.NP	5 dny	16.09. 21
12	odbednění stropu 1.NP	2 dny	04.10. 21
13	Dokončení monolitických konstrukcí	0 dny	05.10. 21
14	**Práce v 2.PP**	**129 dny**	**25.08. 21**
15	Provedení potěrů - 2 polovina z důvodu zavázející technologie investora	5 dny	25.08. 21
16	techologická pauza před pokládkou stěrky	16 dny	31.08. 21
17	provedení stěrky + fabiony	14 dny	18.09. 21
18	Provádění maleb	7 dny	04.09. 21
19	provádění rozvodů technologií na povrchu	30 dny	13.09. 21
20	zapravení prostupů technologií	14 dny	18.10. 21
21	technologická pauza - před pokládkou lina + topná zkouška	75 dny	31.08. 21
22	dokončení obkladů a dlažeb	5 dny	18.10. 21
23	Provedení lina	10 dny	26.11. 21
24	montáž dveří	7 dny	08.12. 21
25	Provední rozvodu strojovny VZT	14 dny	15.11. 21
26	Provední rozvodu strojovny ZTI, chlazení	10 dny	01.12. 21
27	Provední technologie MaR	10 dny	13.12. 21
28	Kompletace a zprovoznění	15 dny	05.01. 22
29			
30	**Práce v 1.PP**	**133 dny**	**11.09. 21**
31	Přednostní betonáž potěru v místnostech D.0.08 a D.0.17 - D.0.11 nelze stojky pro strop	2 dny	11.09. 21
32	techologická pauza před pokládkou stěrky	25 dny	14.09. 21
33	provedení stěrky + fabiony	20 dny	13.10. 21
34	m.č. D0.08, D.0.17 Provedení vyzdívek, instalace, omítek, podlahové stěrky, maleb a kompletací	60 dny	25.09. 21
35	D.0.08 a D.0.17 Možnost stěhování a zprovoznění technologií	3 dny	06.12. 21
36			
37	odstojkování ŽB stropní konstrukce	2 dny	16.10. 21
38	Dokočení vyzdívek	5 dny	19.10. 21
39	Provedení chybějících rozvodů ve stěnách	5 dny	25.10. 21
40	Provedení omítek zbytek 1.PP včetně místnosti D.0.11	18 dny	30.10. 21
41	Provedení podlahového topení zbytek 1.PP včetně místnosti D.0.11	6 dny	20.11. 21
42	Provedení potěrů zbytek 1.PP včetně místnosti D.0.11	2 dny	30.11. 21
43	techologická pauza před pokládkou lina- při použití rychleschnoucího betonu KNOPP	16 dny	04.01. 22
44	Pokládka lina s epoxidovou uzávěrou	10 dny	22.01. 22
45	Provedení obkladů	14 dny	25.11. 21
46	Provedení maleb	5 dny	25.11. 21
47	Provedení kompletací profesí	14 dny	01.12. 21
48	Provedení krycích rohů	2 dny	11.02. 22
49	osazení dveřních křídel a zárubní	7 dny	03.02. 22
50	koplexní zkoušky - zkušební provoz	15 dny	04.01. 22
51			
52	**Práce v 1.NP**	**83 dny**	**10.11. 21**
53	Dokočení vyzdívek	5 dny	10.11. 21
54	Provedení chybějících rozvodů ve stěnách	5 dny	16.11. 21
55	Provedení omítek včetně m.č. 1.09 úpravna vody	21 dny	22.11. 21
56	Provedení podlahového topení	3 dny	16.12. 21
57	Provedení potěrů - možná provedeme potěry dříve než omítky	4 dny	20.12. 21
58	techologická pauza před provedením stěrky	16 dny	24.12. 21
59	Pokládka lina s epoxidovou uzávěrou	14 dny	12.01. 22
60	Provedení obkladů	14 dny	12.01. 22
61	Provedení maleb	5 dny	12.01. 22
62	Provedení kompletací profesí - zapojení VZT jednotky	14 dny	18.01. 22
63	Provedení krycích rohů	2 dny	26.01. 22
64	osazení dveřních křídel a zárubní	7 dny	18.01. 22
65	koplexní zkoušky - zkušební provoz + MaR na VZT	10 dny	03.02. 22
66			
67	**Výtah a plošina a navazjící m.č.D.00.10**	**93 dny**	**22.09. 21**
68	Příprava výtahové šachty přizdívka, omítky , malby	42 dny	22.09. 21
69	montáž výtahu	45 dny	10.11. 21
70	kompletace výtahu a zprovoznění	5 dny	01.01. 22
71	Plošina - výkop dojezdu	7 dny	10.11. 21
72	Plošina - betonáž dojezdu	10 dny	18.11. 21
73	Plošina - dozdění, zásyp, betonáž mazaniny kolem dojezdu	7 dny	30.11. 21
74	omítky malby	10 dny	08.12. 21
75	příprava podlahy v místnosti skladu D.00.10	5 dny	08.12. 21
76	Betonáž potěru	2 dny	14.12. 21
77	techologická pauza před pokládkou stěrky	16 dny	16.12. 21
78	Provedení stěrky + fabiony	4 dny	04.01. 22
79	**Práce exteriér**	**90 dny?**	**04.11. 21**
80	Provedení střechy nad stropem 1.NP - přístí	14 dny	04.11. 21
81	osazení exteriérových dveří	2 dny	04.11. 21
82	montáž sklobetonových stěn - luxver	3 dny	15.11. 21
83	Provedení fasády pro dokončení monolitu	14 dny	27.11. 21
84	Demontáž lešení	3 dny	14.12. 21
85	**Provedení komunikací a venkovních ploch za předpokladu vhodných klimatických podmínek a provozu obaloven - jinak na jaře**	21 dny	17.12. 21
86	Dokončení fasády KZS po nastěhování technologií	7 dny	11.01. 22
87			
88	Podání žádosti o kolaudaci	1 den?	15.02. 22
89	předání díla	1 den	16.02. 22

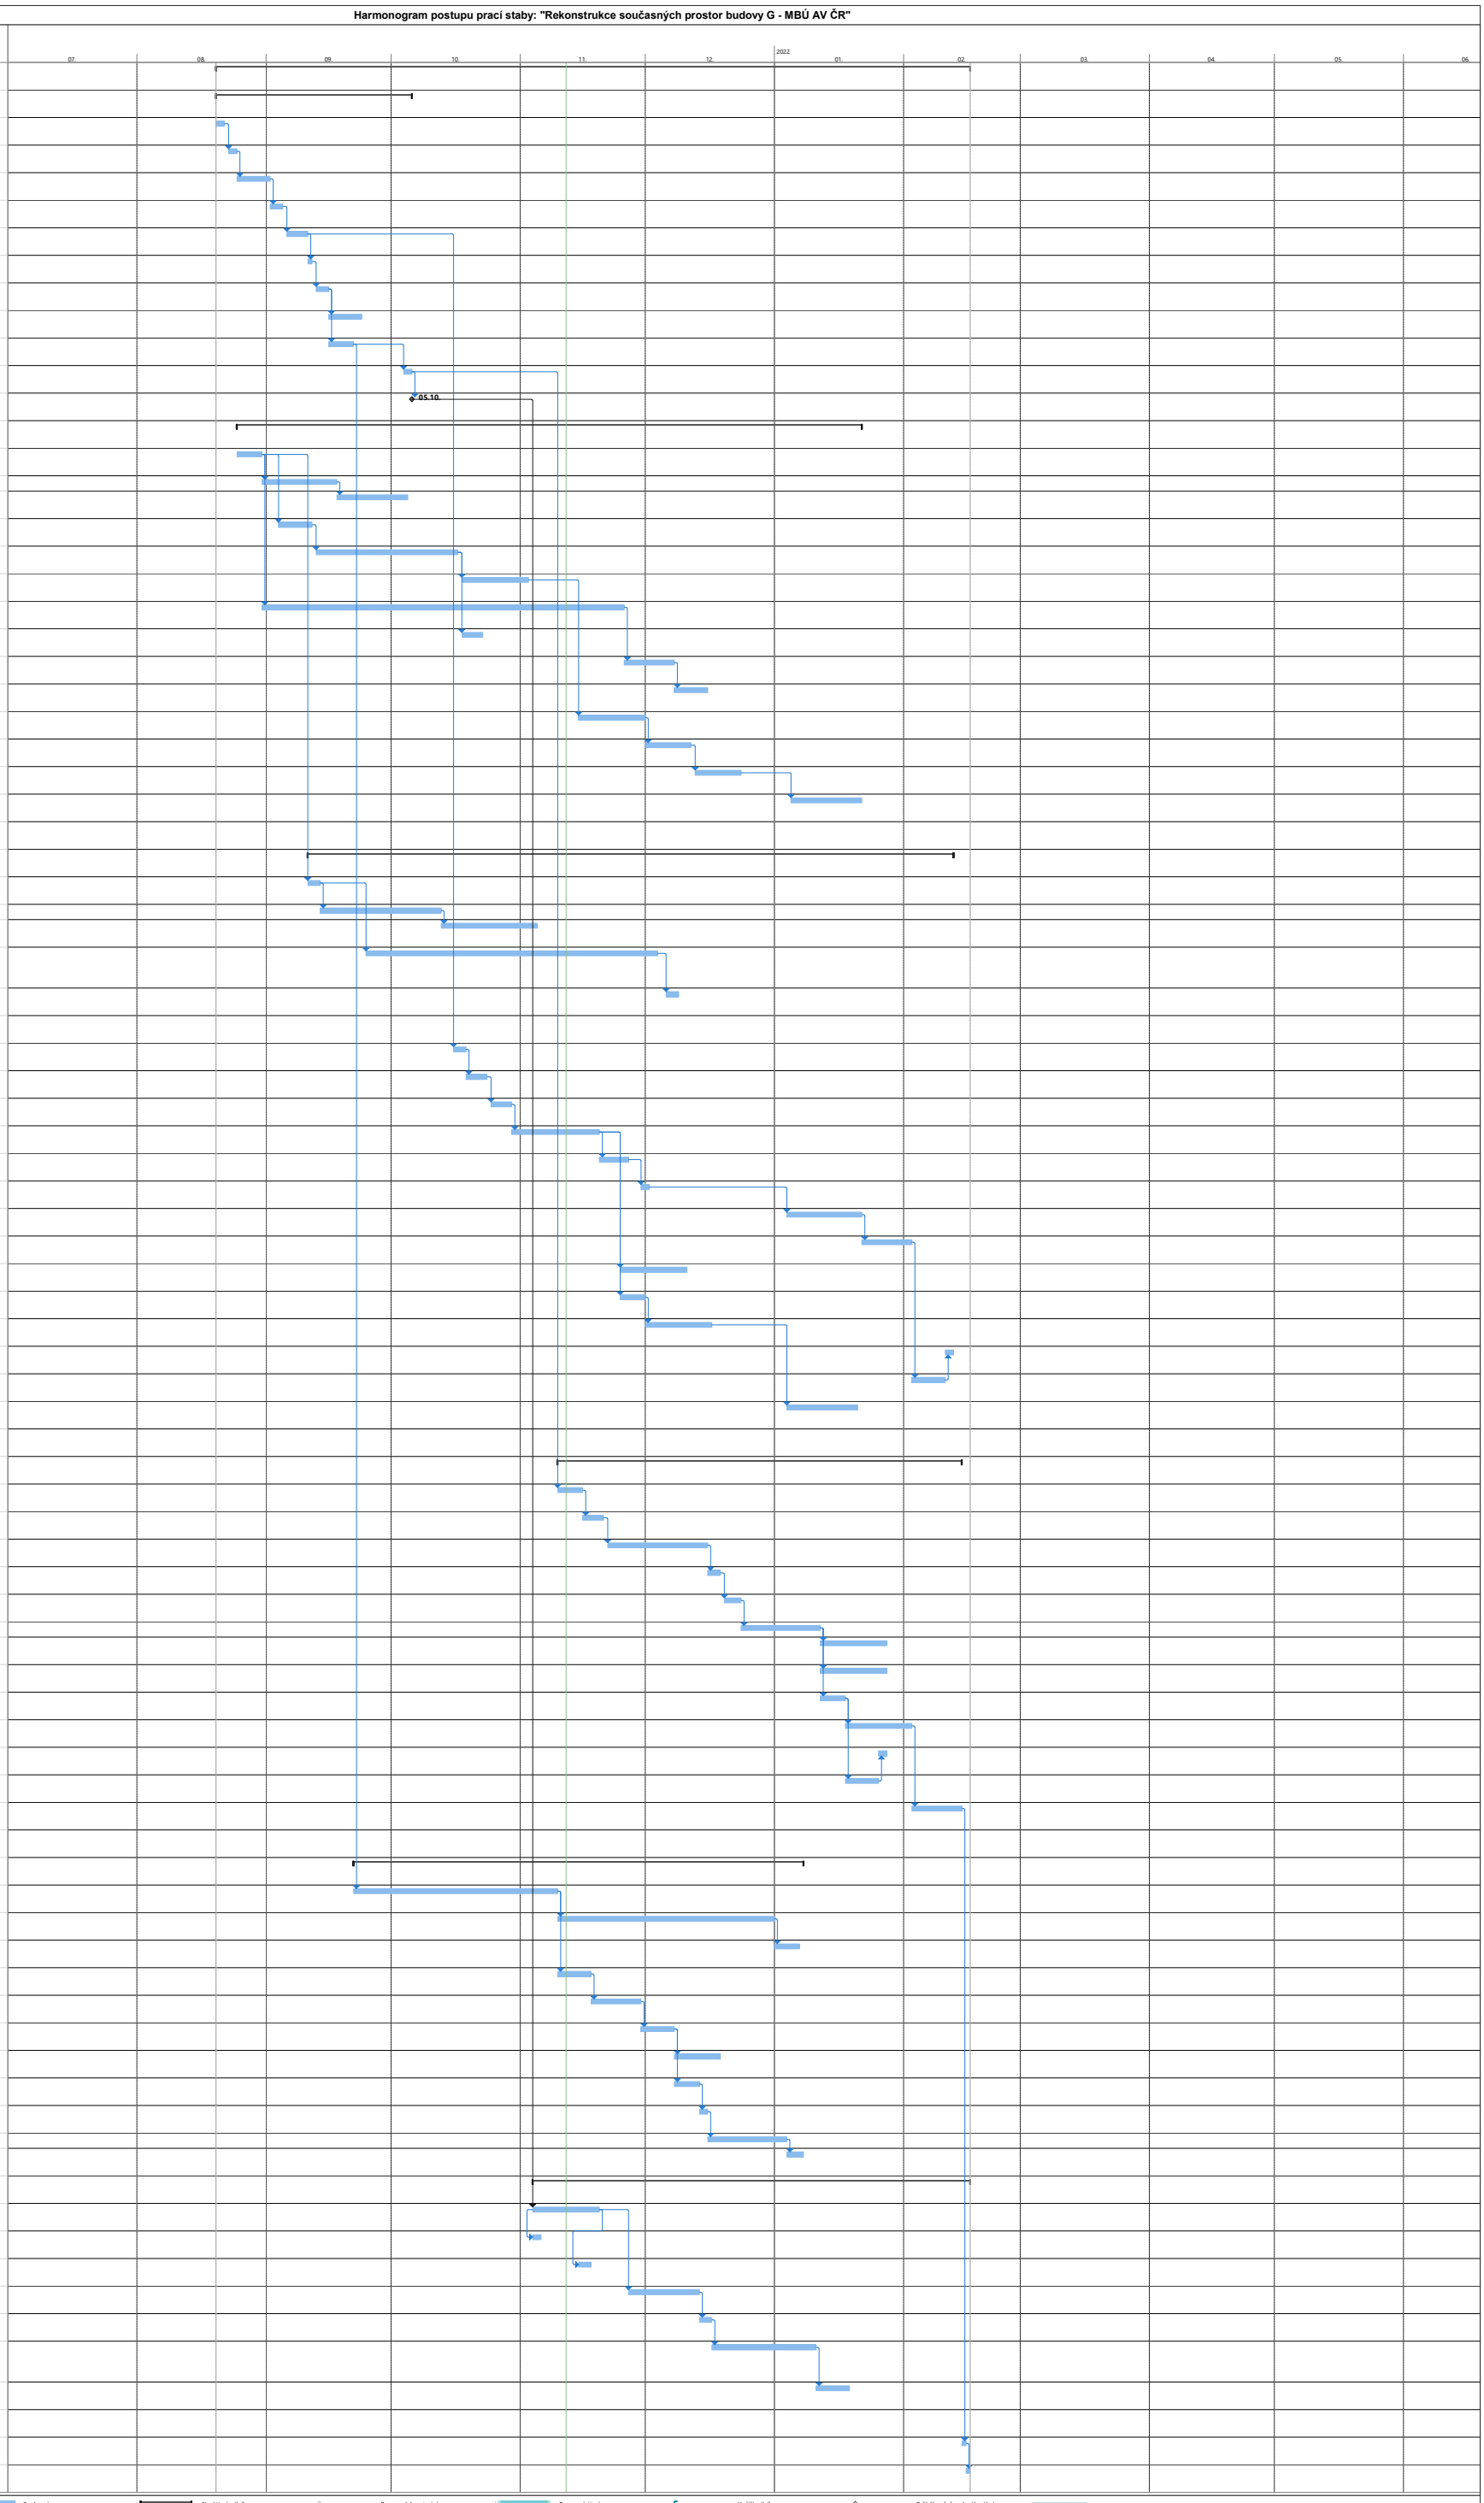

Projekt: Podrobné dokončení d
Datum: 12.11. 21

Úkol · Rozdělení · Milník · Souhrnný · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Neaktivní milník · Neaktivní souhr · Ruční úkol · Pouze s dobou trvání · Ručními úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Ruční souhrn · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Vnější úkoly · Vnější milník · Konečný termín · Průběh · Průběh ručně zadaného úkolu
