HARMONOGRAM STAVBY - ČASOVÝ

ID	Kód	Název úkolu	Doba trvání
1			
2			
3		**"ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží" - DOBA PROVÁDĚNÍ 94 týdnů**	**658 dny**
4		**Předání a převzetí staveniště**	**0 dny**
5		**Dokončení a předání díla**	**0 dny**
6			
7	**1**	**Stavební objekty**	**631 dny**
8	**0100**	**Příprava území**	**476 dny**
9	**1301-A**	**Rozdělovací objekt pro DN 1, 3, 5, 7**	**30 dny**
10	**1301-B**	**Rozdělovací objekt pro DN 2, 4, 6, 8**	**30 dny**
11	**1302-1-**	**Štětová stěna, Štětovnice VL604 pro DN7 - zřízení**	**45 dny**
12	**1302-1-**	**Štětová stěna, Štětovnice VL604 pro DN8 - zřízení**	**45 dny**
13	**1302-2-**	**Dosazovací nádrž 7**	**330 dny**
14	**1302-2-**	**Dosazovací nádrž 8**	**290 dny**
15	**1302-3-**	**Zemnící soustava DN7**	**120 dny**
16	**1302-3-**	**Zemnící soustava DN8**	**120 dny**
17	**2303**	**Domácí kanalizace**	**22 dny**
18	**2309**	**Přítokové potrubí na dosazovací nádrže**	**35 dny**
19	**2310**	**Odtokové potrubí z dosazovací nádrží**	**32 dny**
20	**2312**	**Potrubí vratného kalu, DN 900**	**42 dny**
21	**2314**	**Potrubí plovoucího kalu**	**50 dny**
22	**2319**	**Čerpací stanice plovoucího kalu**	**15 dny**
23	**2500**	**Vozovky a zpevněné plochy**	**42 dny**
24	**2600**	**Terénní a sadové úpravy**	**62 dny**
25	**2700**	**Venkovní osvětlení**	**12 dny**
26	**2800**	**Kabelové trasy**	**70 dny**
27	**2**	**Provozní soubory**	**210 dny**
28	**PS 130**	**Rozdělovací objekt**	**40 dny**
29		**12A**	**10 dny**
30		**12B**	**10 dny**
31	**PS 130**	**Dosazovací nádrže**	**180 dny**
32	**PS 231**	**ČS plovoucího kalu**	**15 dny**
33	**PS 2516, 2830**	**Provozní rozvod silnoproudu, Venkovní kabelové rozvody**	**135 dny**
34	**PS 2610**	**Měření a regulace, ASŘ**	**70 dny**
35	**00**	**Vedlejší a ostatní náklady**	**658 dny**

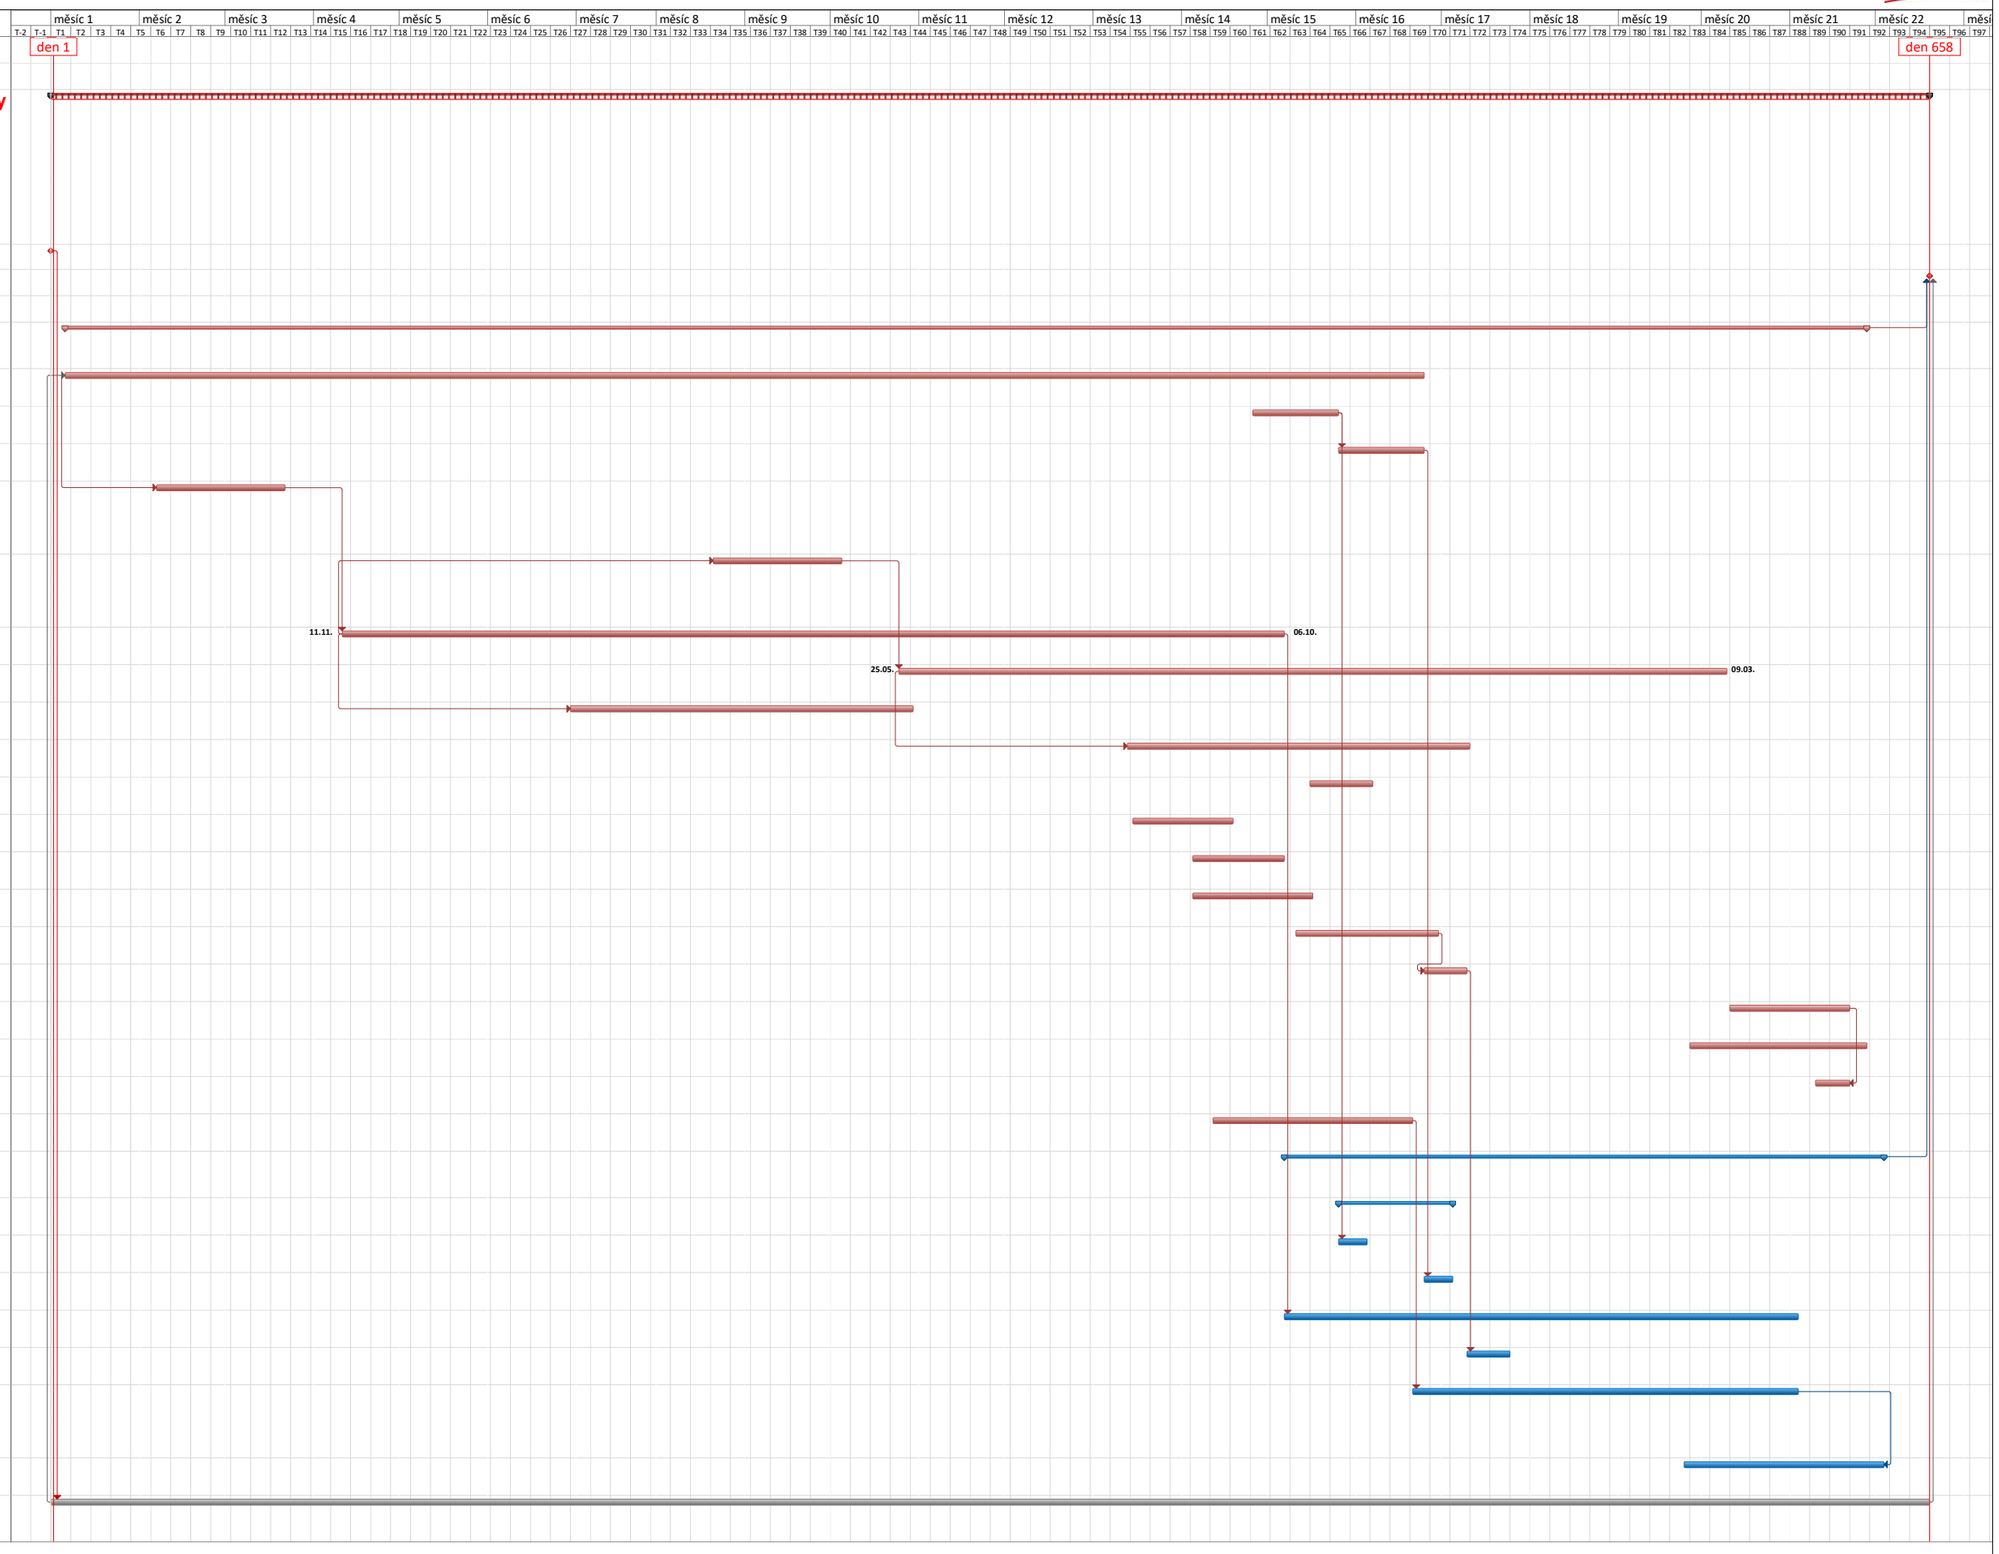

V Brně 19.11.2021
