Datum předložení změny:		**ZL č.**	**38**
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		
Smlouva o Dílo ze dne:	13.10.2020		

Projekt zakázkové číslo:	513/18
Stavba:	VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část
Objekt:	

Název změny:	38 Podhledy PP09 - část ASŘ - Nábytek

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Při zpracovávání výrobní dokumentace během výstavby, bylo rozhodnuto o nutných úpravách zákrytových desek, hlavně s ohledem na provozní vlivy do budoucna: Při revizi podhledů došlo ze strany projektanta k doplnění zákrytových desek včetně konstukce nad vestavěné skříně projektovým pokynem PP09. Tímto projektovým pokynem je řešena periodická demontovatelnost zákrytových desek pro případné zásahy revizních techniku a údržby školy vzhledem k rozvodům technologií za uváděnými zákrytovými deskami. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Nové řešení:

Prostor nad vestavěnými skříněmi je doplněn o zákrytové desky a konstrukci na kterou jsou zavěšeny demontovatelné zákrytové desky nad vestavěnými skříněmi. Tato úprava umožňuje bezpečné a jednoduché demontování zákrytů pro případný servis či údržbu.

Původní řešení v PD:

V rámci PD a VV byli řešeny zákrytové desky pro technologie jako pevná část vestavěných skříní, které by byli kotveny pomocí vrutů do konstukce vestavných skříní a jejich demontovatelnost by nebyla bezpečná a pro opakované demontáže zákrytových desek nevhodná.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Provedení těchto prací má vliv na provádění truhlářských prací a koodrinaci s realizací akustických podhledů.

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	98 187,95	98 187,95
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany	celkem		98 187,95	**98 187,95**

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	**0,00%**
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	**0,07%**
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	**0,07%**

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet

Příloha č.2 Projektový pokyn (PP09)

Příloha č.3 PD Vestavné zákryty

Datum předložení změny:		ZL č.	38
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Nemá vliv na termín.

Dne:		za dodavatele:		Podpis:	

Vyjádření TDS:

TDS respektuje požadavek GP na doplnění zákrytových a pomocných nosných konstrukcí pro umožnění přístupu obsluhy k technologickým zařízením

Dne:		za TDS:		Podpis:	

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Projektový pokyn č.09 jsme zvětšili plochu zákrytů dle skutečného stavu namontovaných instalací a zároveň jsme vyřešili demontovatelnost zákrytů, aniž by se opakovaně šroubovaly do podkonstrukce, což by mohlo vést k poškození zákrytových desek.

Dne:		za projektanta:		Podpis:	

Vyjádření objednatele:

Souhlasím

Dne:		za objednatele:		Podpis:	

ZÁVĚR:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

ZL38 Podhledy PP09 - část ASŘ - Nábytek (Zákrytové desky)					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Celkem MJ	Ceny v Kč	
				za MJ	Celkem
765.1	Výpis truhlářských prvků				
765.1	Dodávka - Doplnění zákrytové desky v kancelářích - LTD tl. 18 mm	m2	28,800	1 237,00	35 625,60
	dodávka, formátování, opracování hran, olepení hran				0,00
	Dodávka - Kotvící lišty - MDF	m2	27,2	1973,09	53 668,05
	dodávka, formátování, kotvení				
HZS2121	Montáž kotvící lišty - truhlář odborný	hod	10,0	468,12	4 681,20
HZS2122	Montáž kotvící lišty - truhlář	hod	10,0	421,31	4 213,10
CELKEM	**ZL38 Podhledy PP09 - část ASŘ - Nábytek (Zákrytové desky)**				**98 187,95 Kč**

PROJEKTOVÝ POKYN č. 09 — 08.03. 2021

STAVBA:	**STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT**
STAVEBNÍK:	VŠCHT, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
ZHOTOVITEL:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
PROJEKTANT:	SPS projekt spol. s r. o., Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10
STUPEŇ PROJEKTU:	Dokumentace pro provedení stavby
PŘEDMĚT:	**revize podhledů v kancelářích, doplněné SDK podhledy v chodbách**
DŮVOD POKYNU:	**koordinace**
DOTČENÉ PROFESE:	**stavební část**
POPIS ZMĚNY:	V rámci revize podhledů v základních kancelářích (netýká se zasedacích místností a učeben) je upraven rozsah akustických podhledů, které jsou jen lokálně doplněny SDK podhledy. Doplněn je SDK podhled v části chodby B3350 v 3NP a požární SDK podhled v chodbě B4450B v 4NP. V kancelářích jsou doplněny zákrytové desky nad vestavěnými skříněmi. Revize VZT vydána samostatně. Revize svítidel bude vydána společně s revizí podhledů v zasedacích místnostech a v učebnách.

Nový výkres	Původní výkres:	
označení / název výkresu	doplňuje	nahrazuje
D.1.1 - koo-01 - koordinace podhledů 1NP	**D.1.1.3 NS - 2**	nová příloha
D.1.1 - koo-02 - koordinace podhledů 2NP	**D.1.1.3 NS - 3**	nová příloha
D.1.1 - koo-03 - koordinace podhledů 3NP	**D.1.1.3 NS - 4**	nová příloha
D.1.1 - koo-04 - koordinace podhledů 4NP	**D.1.1.3 NS - 5**	nová příloha
D.1.1- výkres - zákrytové desky		nová příloha
D.1.1- výkaz výměr - podhledy		

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.): xxxxx .....

zhotovitel (Zlínstav a.s.): ....

TDS (Gleeds ČR, s.r.o.): ....

stavebník (VŠCHT): ....

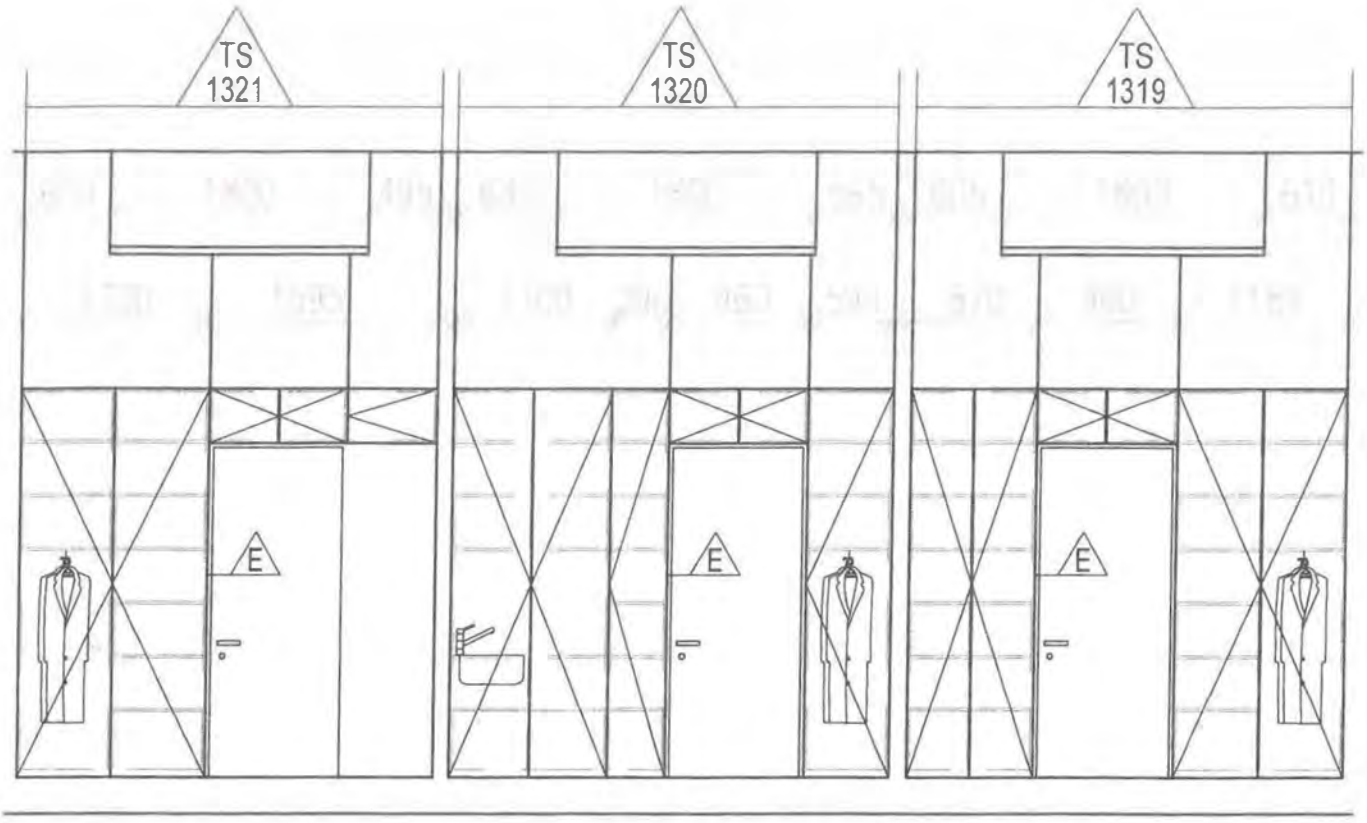

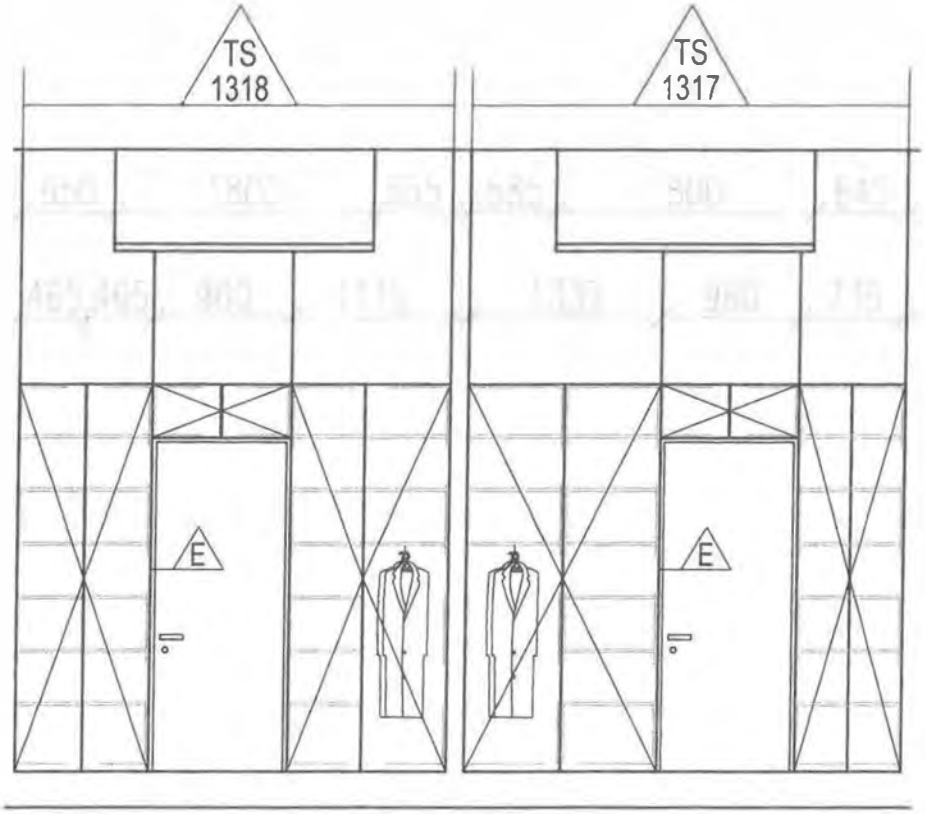

DOPLNĚNÉ ZÁKRYTOVÉ DESKY V 1NP: 4,28 m²

VŠCHT
VESTAVNÉ ZÁKRYTY
1.NP / 1:50

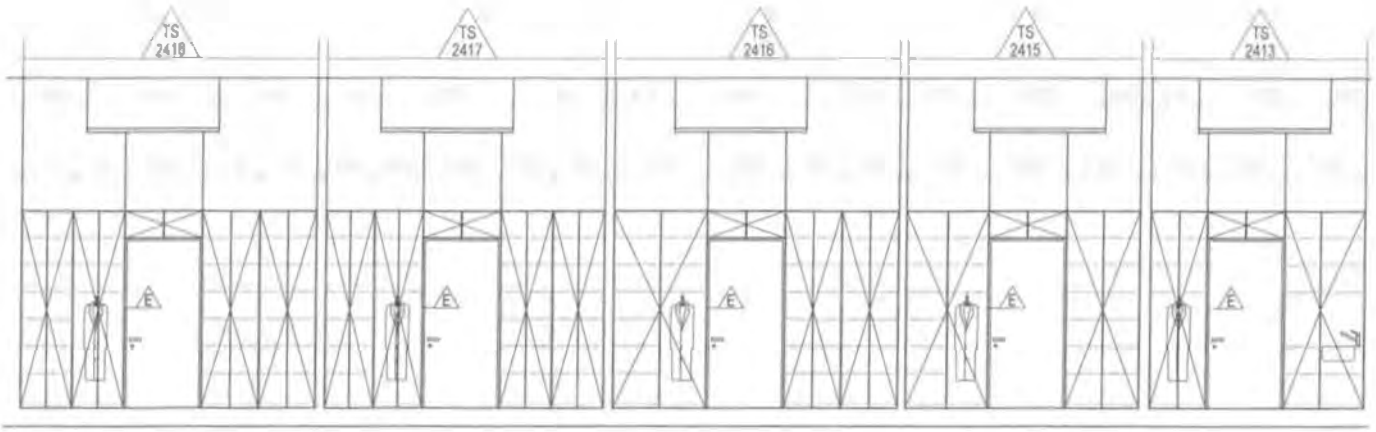

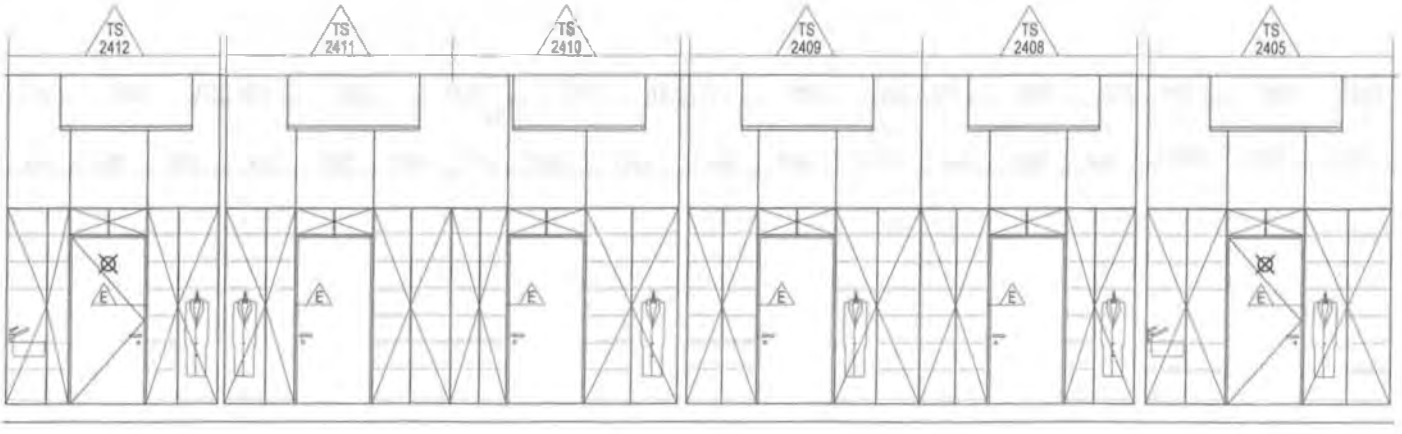

DOPLNĚNÉ ZÁKRYTOVÉ DESKY VE ŠÍŘCE 28,89 m²

VŠCHT
VESTAVNÉ ZÁKRYTY, 1/3
2.NP / 1:50

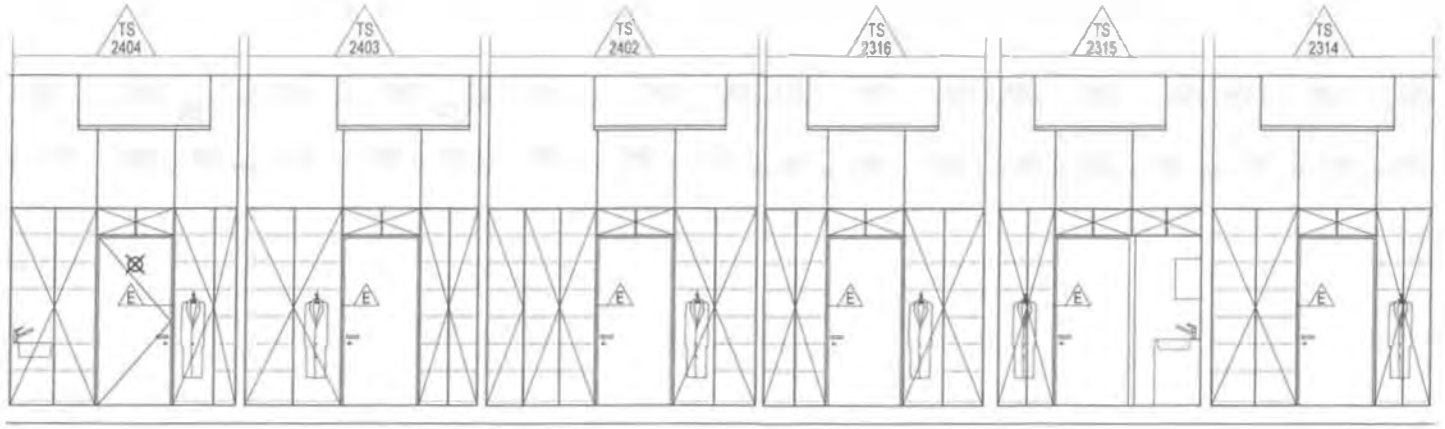

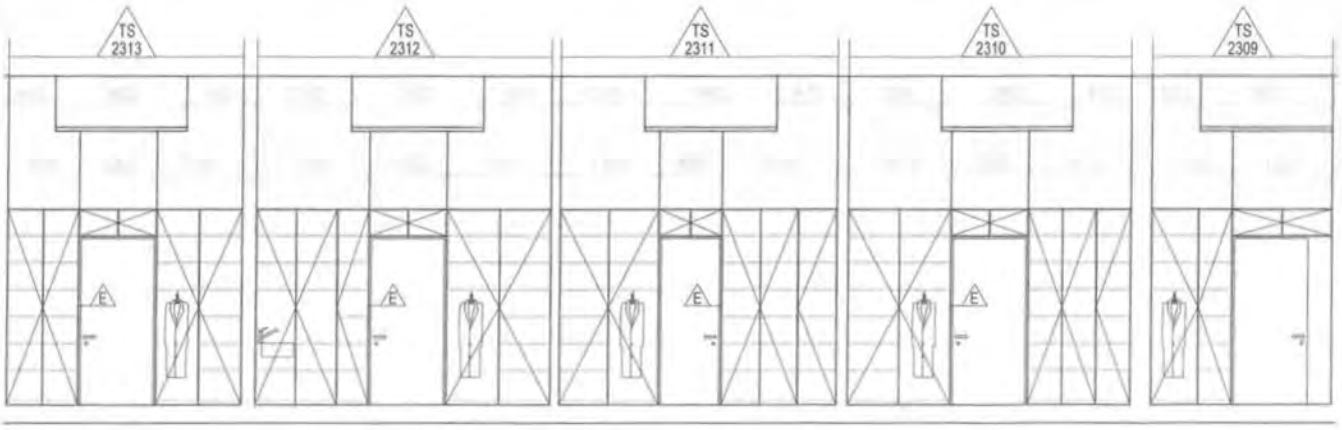

VŠCHT
VESTAVNÉ ZÁKRYTY, 2/3
2.NP / 1:50

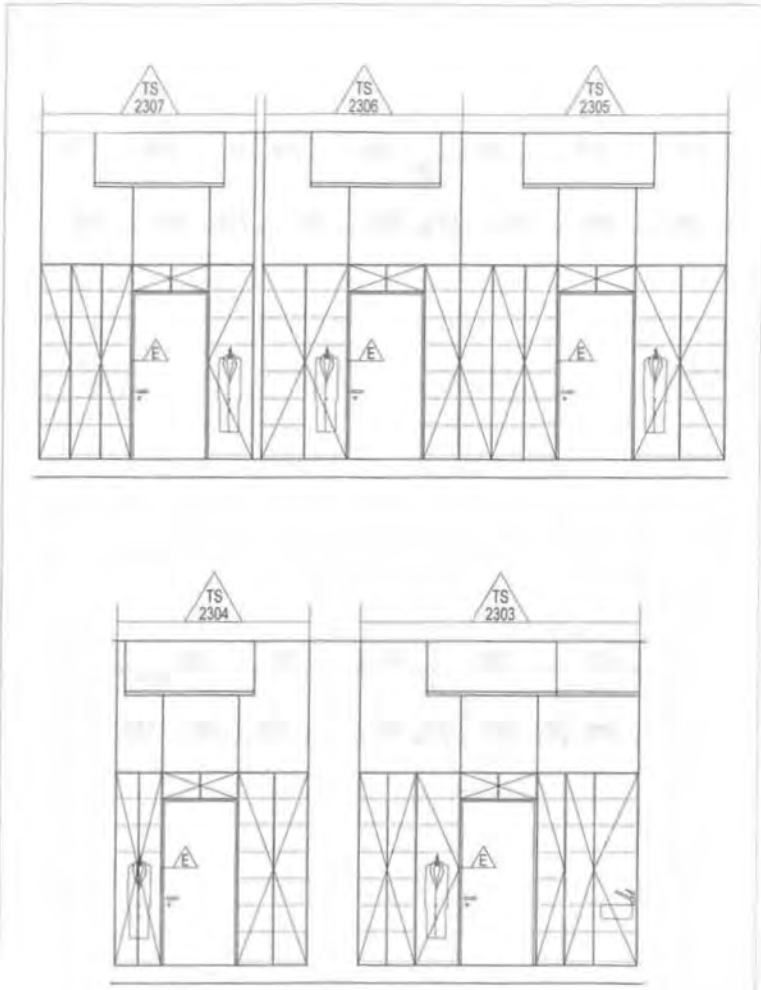

VŠCHT
VESTAVNÉ ZÁKRYTY, 3/3
2.NP / 1:50

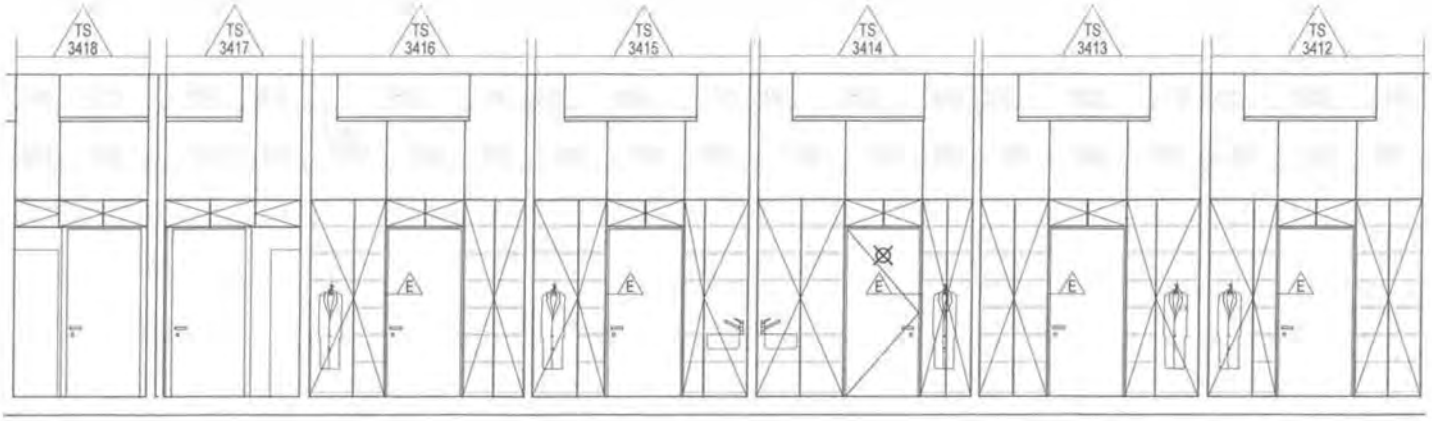

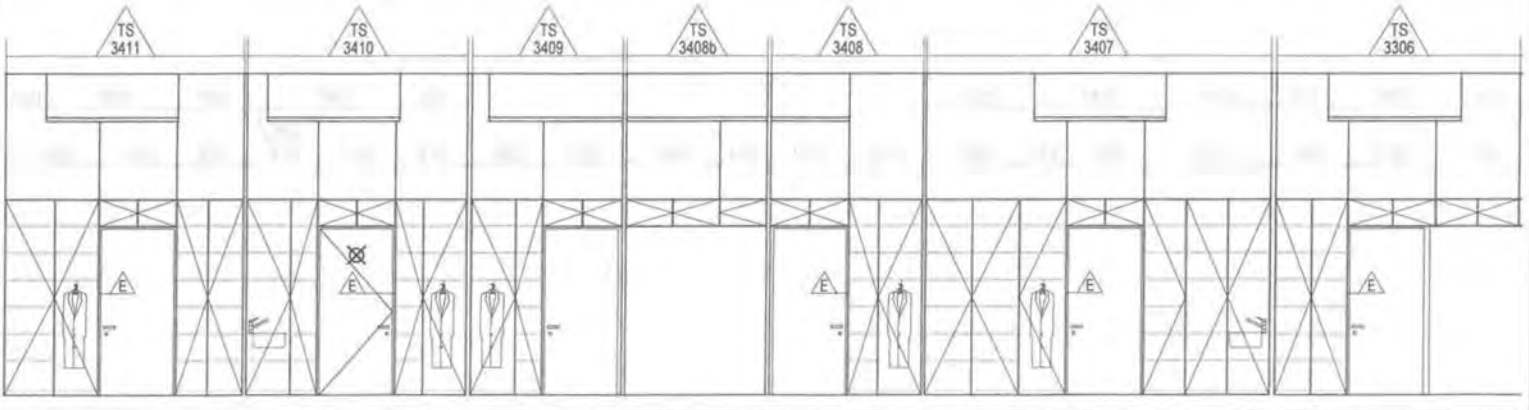

DOPLNĚNÉ ZÁKRYTOVÉ DESKY VE 3NP: 30,51 m²

VŠCHT
VESTAVNÉ ZÁKRYTY, 1/3
3.NP / 1:50

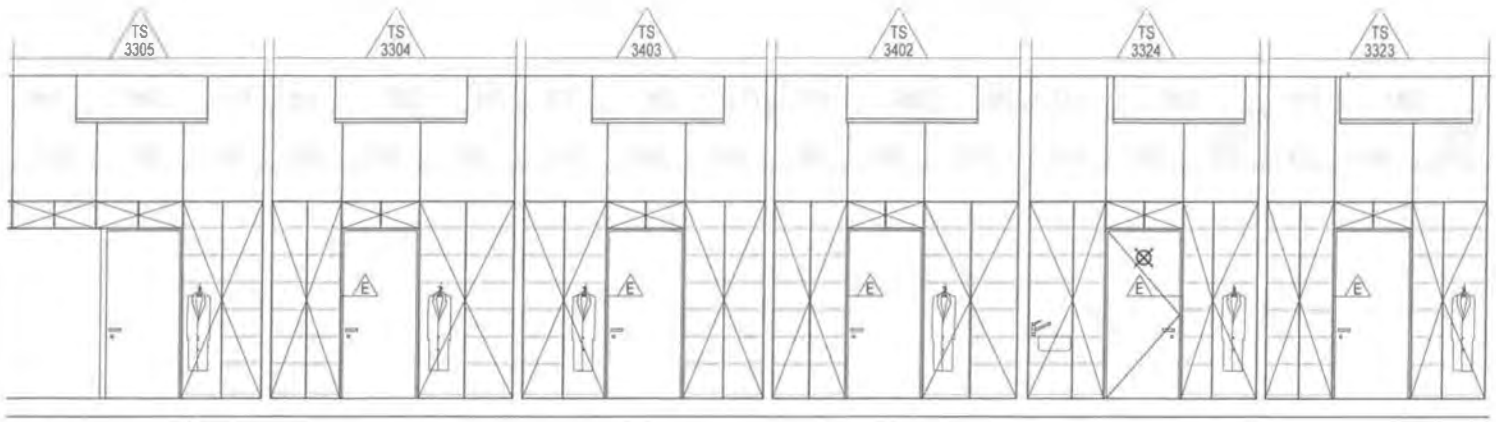

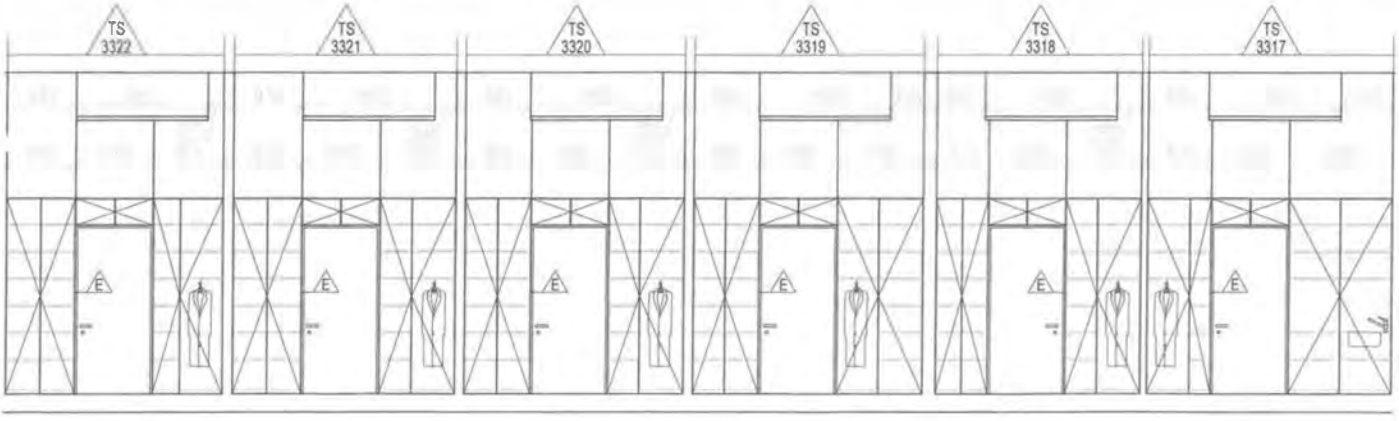

VŠCHT
VESTAVNÉ ZÁKRYTY, 2/3
3.NP / 1:50

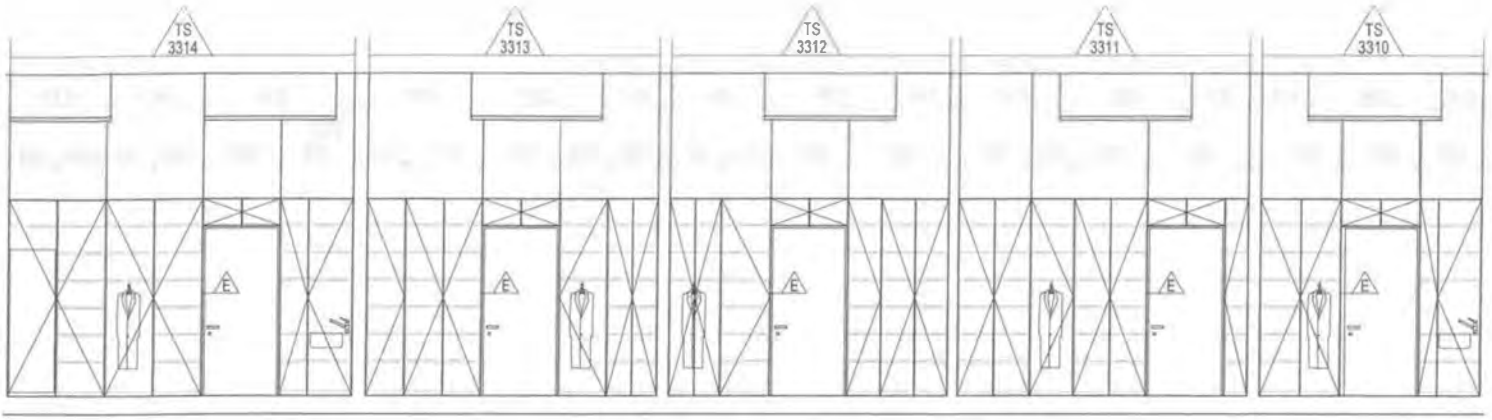

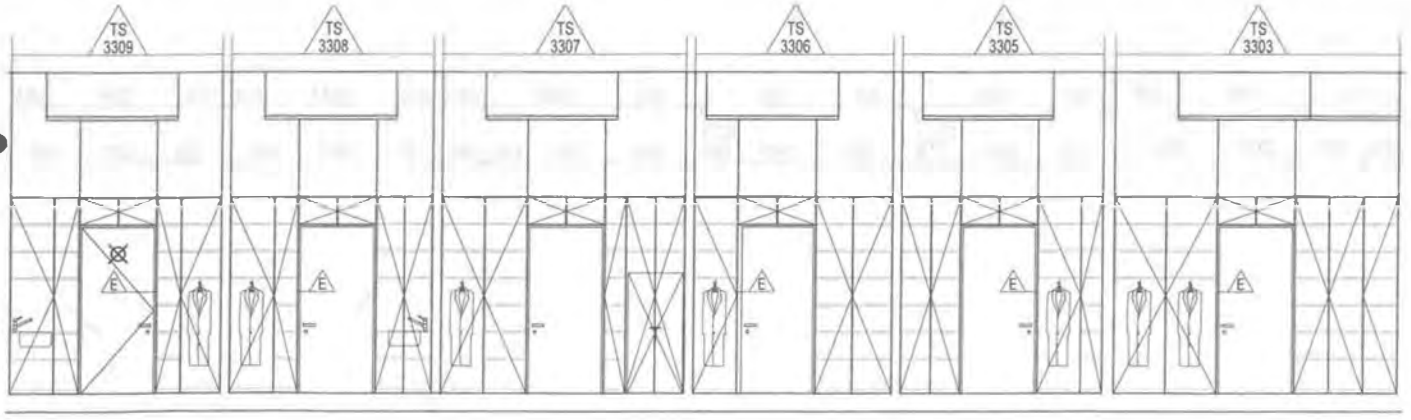

VŠCHT
VESTAVNÉ ZÁKRYTY, 3/3
3.NP / 1:50

POHLED

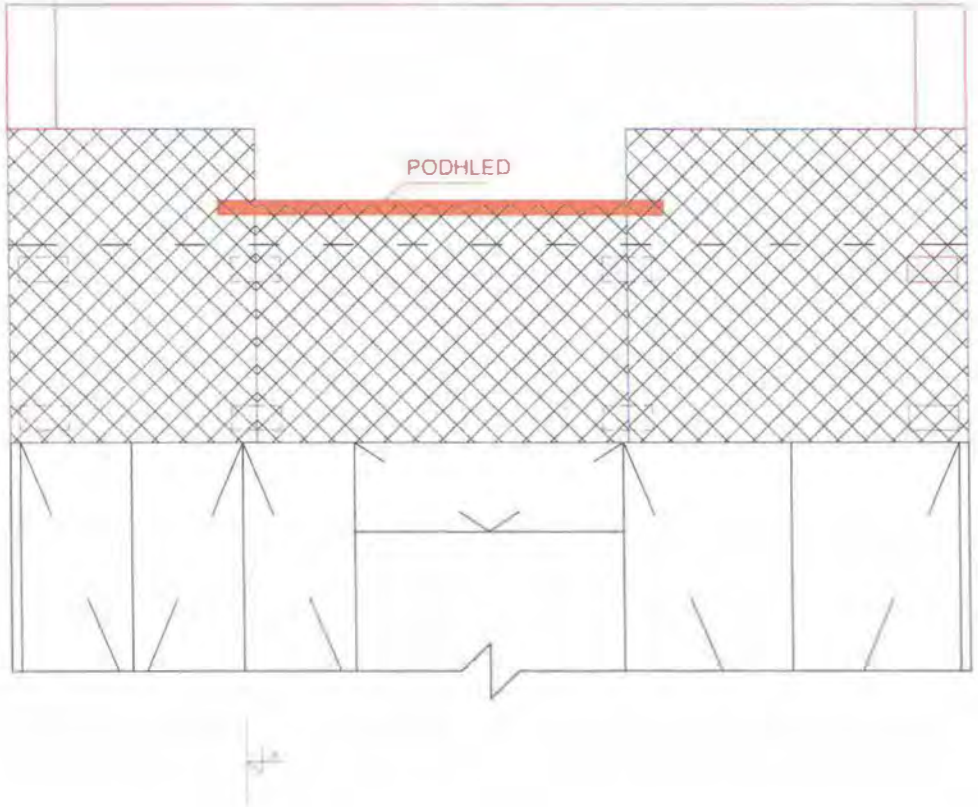

ŘEZ A-A

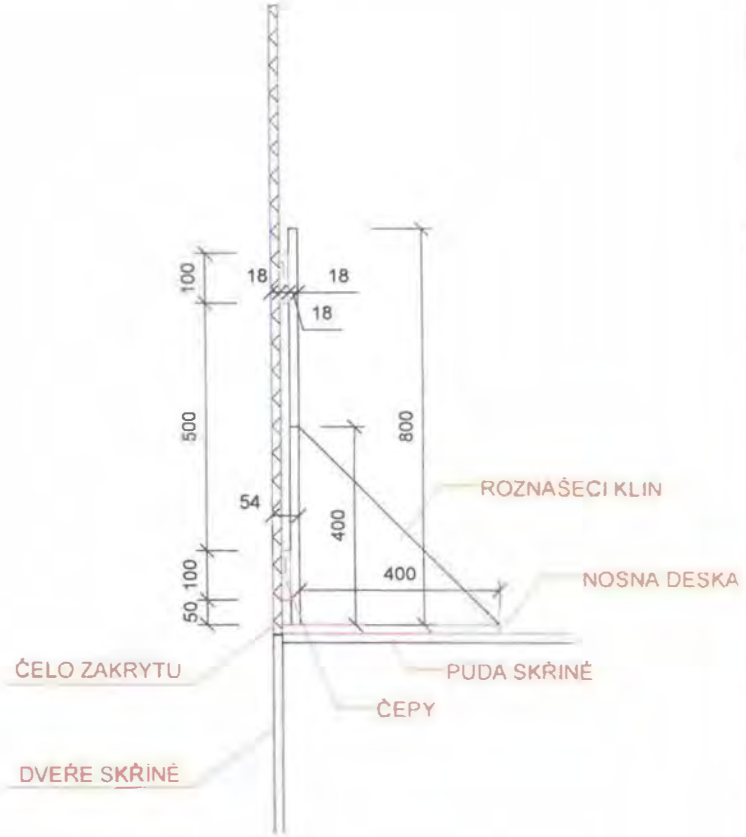

AKCE: VŠCHT PRAHA	DATUM	08/2021	
	KRESLIL	xxxxx	
OBJEKT: VESTAVNÉ ZAKRYTY	SCHVÁLIL	xxxxx	
	ODSOUHLASIL		
STUPEŇ NÁVRH KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ	VÝKRES A3	MĚŘÍTKO -	Č. VÝKRESU 1
