Společnost UHN G+Z

"Uherskoradišťská nemocnice - Rekonstukce objektu 14"

Harmonogram stavby

v členění SO a měsíce k 01/2022

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Uherskoradišťská nemocnice a.s. Rekonstrukce objektu 14**	**658 dny**	**13.08. 20**	**02.06. 22**
2	**Rekonstukce objektu 14 - milníky dle SOD**	**658 dny**	**13.08. 20**	**02.06. 22**
3	**Podpis SOD**	**0 dny**	**13.08. 20**	**13.08. 20**
4	**Nabytí účinnosti SoD**	**0 dny**	**14.08. 20**	**14.08. 20**
5	**Předání a převzetí staveniště (zahájení prací)**	**0 dny**	**31.08. 20**	**31.08. 20**
6	**Realizace díla včetně komplexního vyzkoušení a dodání dokladové části; na základě DODATKU Č. 2 navýšen počet z 600 na 635 dnů**	**635 dny**	**31.08. 20**	**28.05. 22**
7	**Předání PASPORTIZACE stávajícího stavu (čl. 4 odst. 4.2.4 SOD)**	**0 dny**	**30.09. 20**	**30.09. 20**
8	**Předání návrhu KZP (čl. 4 odst. 4.2.3 SOD)**	**0 dny**	**13.10. 20**	**13.10. 20**
9	**Předání HMG vzorků (čl. 4 odst. 4.2.1 SOD)**	**0 dny**	**23.10. 20**	**23.10. 20**
10	**Předání PODDODAVATELSKÉHO systému (čl. 4 odst. 4.2.2 SOD)**	**0 dny**	**12.12. 20**	**12.12. 20**
11	**Dokončení stavebních prací pro zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU (čl. 4 odst. 4.2.5 SOD); na základě DODATKU Č. 2 navýšen počet z 600 na 635 dnů**	**0 dny**	**28.05. 22**	**28.05. 22**
12	**Zajištění vydání a předání kladných vyjádření orgánů nutných pro zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU (čl. 4 odst. 4.2.6 SOD); na základě DODATKU Č. 2 navýšen počet z 600 na 635 dnů**	**0 dny**	**28.05. 22**	**28.05. 22**
13	**ZKUŠEBNÍ PROVOZ**	**5 dny**	**28.05. 22**	**02.06. 22**
14	**Předání protokolu o měření a zkoušek v době ZKUŠEBNÍHO PROVOZU (čl. 4 odst. 4.2.7 SOD)**	**0 dny**	**02.06. 22**	**02.06. 22**
15	**Rekonstukce objektu 14 - HMG stavby**	**640 dny**	**31.08. 20**	**02.06. 22**
16	**Předání a převzetí staveniště (zahájení prací)**	**0 dny**	**31.08. 20**	**31.08. 20**
17	**SO 01 Rekonstrukce objektu 14**	**632 dny**	**31.08. 20**	**25.05. 22**
18	11 - Přípravné a přidružené práce	30 dny	31.08. 20	30.09. 20
19	96 - Bourání konstrukcí	192 dny	05.10. 20	15.04. 21
20	1.NP - 6.NP - bourací a demoliční práce	120 dny	05.10. 20	02.02. 21
21	Jádrové vrtání	90 dny	15.01. 21	15.04. 21
22	D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	192 dny	05.10. 20	15.04. 21
23	22 - Piloty	40 dny	01.04. 21	11.05. 21
24	1 - Zemní práce	50 dny	15.01. 21	06.03. 21
25	2 - Základy a zvláštní zakládání	45 dny	04.02. 21	21.03. 21
26	711 - Izolace proti vodě	50 dny	15.02. 21	06.04. 21
27	4 - Vodorovné konstrukce	414 dny	15.02. 21	05.04. 22
28	ŽB konstrukce - Přístavba	180 dny	15.02. 21	14.08. 21
29	Podhledy	125 dny	01.12. 21	05.04. 22
30	3 - Svislé a kompletní konstrukce	290 dny	01.02. 21	18.11. 21
31	Zdivo + zazdívky	250 dny	26.02. 21	03.11. 21
32	Dodatečné zesilování konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a tkanin	120 dny	01.02. 21	01.06. 21
33	Příčk SDK	290 dny	01.02. 21	18.11. 21
34	64 - Výplně otvorů	199 dny	15.01. 21	02.08. 21
35	61 - Upravy povrchů vnitřní	316 dny	20.01. 21	02.12. 21
36	Sanační omítky	150 dny	20.01. 21	19.06. 21
37	Omítky	290 dny	15.02. 21	02.12. 21
38	62 - Úpravy povrchů vnější včetně fasády	297 dny	01.08. 21	25.05. 22
39	63 - Betonové potěry a mazaniny	90 dny	01.07. 21	29.09. 21
40	781 - Obklady keramické	150 dny	04.07. 21	01.12. 21
41	776 - Podlahy povlakové	120 dny	01.11. 21	01.03. 22
42	777 - Podlahy ze syntetických hmot	205 dny	24.09. 21	17.04. 22
43	712 - Živičné krytiny	60 dny	27.08. 21	26.10. 21
44	713 - Izolace tepelné	375 dny	08.04. 21	18.04. 22
45	762 - Konstrukce tesařské	60 dny	01.09. 21	31.10. 21
46	764 - Konstrukce klempířské	120 dny	01.09. 21	30.12. 21
47	766 - Konstrukce truhlářské	120 dny	25.01. 22	25.05. 22
48	767 - Konstrukce zámečnické	300 dny	03.06. 21	30.03. 22
49	769 - Otvorové prvky z plastu	90 dny	14.06. 21	12.09. 21
50	783 - Nátěry	190 dny	16.11. 21	25.05. 22
51	784 - Malby	190 dny	16.11. 21	25.05. 22
52	M43 - Montáže ocelových konstrukcí	196 dny	01.09. 21	16.03. 22
53	Venkovní schodiště	120 dny	01.09. 21	30.12. 21
54	Ostatní	135 dny	01.11. 21	16.03. 22
55	M44 - Montáže stabilních hasících zařízení	20 dny	05.05. 22	25.05. 22
56	M33 - Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	150 dny	03.11. 21	02.04. 22
57	94 - Lešení a stavební výtahy	420 dny	05.02. 21	01.04. 22
58	M99 - Ostatní práce "M"	30 dny	14.03. 22	13.04. 22
59	95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	30 dny	25.04. 22	25.05. 22
60	99 - Staveništní přesun hmot	170 dny	04.01. 21	23.06. 21
61	5 - Komunikace	120 dny	22.11. 21	22.03. 22

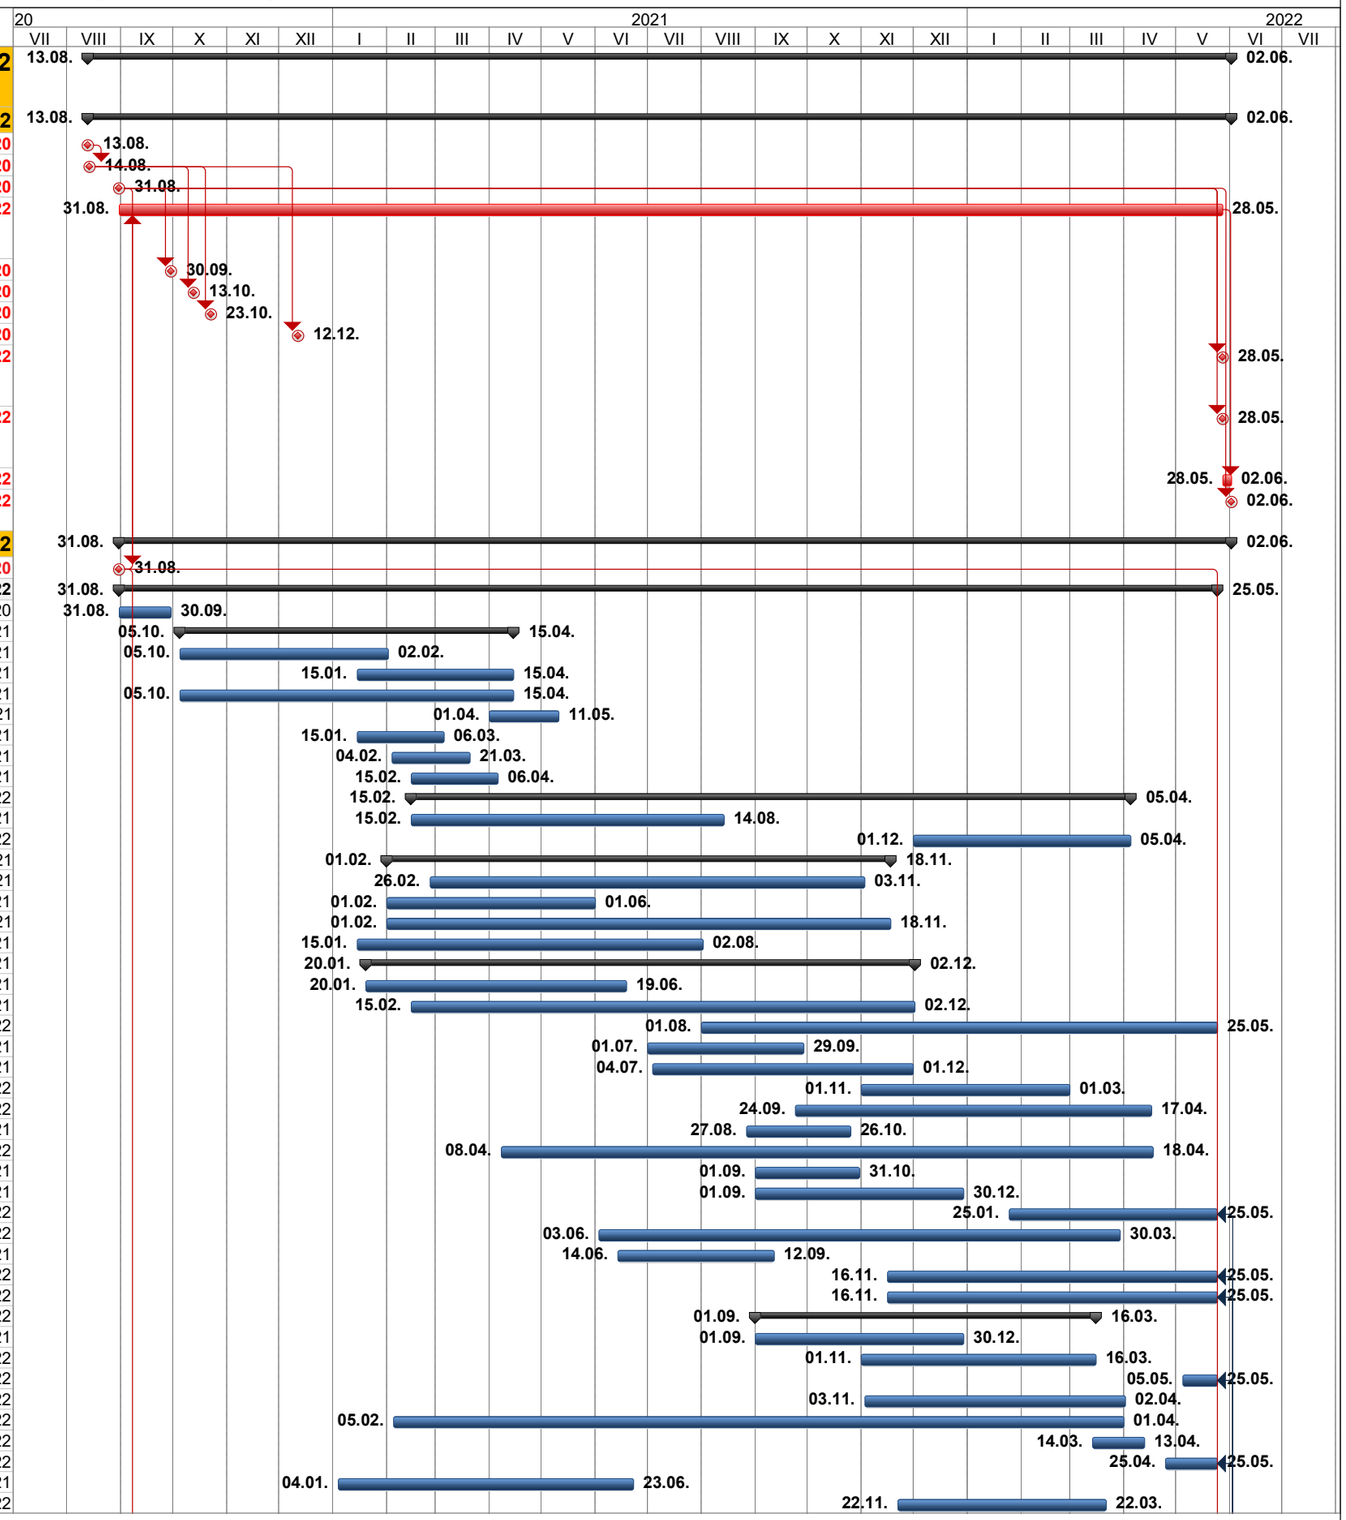

Datum aktualizace:
Stránka: 1 /2
Název stavby: Rekonstrukce objektu 14

Úkol, souhrnný úkol — Uzlový bod, milník — Souhrnný úkol

Společnost UHN G+Z

"Uherskoradišťská nemocnice - Rekonstukce objektu 14"

Harmonogram stavby v členění SO a měsíce k 01/2022

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
62	93 - Dokončovací práce inženýrskách staveb	120 dny	25.02. 21	25.06. 21
63	8 - Trubní vedení	30 dny	26.08. 21	25.09. 21
64	**SO 01 01.3. Zdravotně technické instalace**	**506 dny**	**04.01. 21**	**25.05. 22**
65	ZTI - hrubé rozvody	350 dny	04.01. 21	20.12. 21
66	ZTI - kompletace, zprovoznění, inviduální zkoušky	105 dny	09.02. 22	25.05. 22
67	**SO 01 01.7. Vzduchotechnika**	**436 dny**	**15.03. 21**	**25.05. 22**
68	VZT - hrubé rozvody	280 dny	15.03. 21	20.12. 21
69	VZT - kompletace, zprovoznění, inviduální zkoušky, zaregulování	105 dny	09.02. 22	25.05. 22
70	**SO 01 01.4. Vytápění, chlazení**	**436 dny**	**15.03. 21**	**25.05. 22**
71	UT, CHLAD - hrubé rozvody	280 dny	15.03. 21	20.12. 21
72	UT, CHLAD - kompletace, zprovoznění, inviduální zkoušky	105 dny	09.02. 22	25.05. 22
73	**SO 01 01.5. Elektroinstalace - silnoproudé, hromosvod**	**436 dny**	**15.03. 21**	**25.05. 22**
74	EL SIL - hrubé rozvody	280 dny	15.03. 21	20.12. 21
75	EL SIL - kompletace, zprovoznění, inviduální zkoušky	105 dny	09.02. 22	25.05. 22
76	**SO 01 01.6.1 Elektroinstalace - slaboproudé rozvody v objektu**	**436 dny**	**15.03. 21**	**25.05. 22**
77	EL SLP - hrubé rozvody	280 dny	15.03. 21	20.12. 21
78	EL SLP - kompletace, zprovoznění, inviduální zkoušky	105 dny	09.02. 22	25.05. 22
79	**SO 01 01.11. Měření a regulace**	**436 dny**	**15.03. 21**	**25.05. 22**
80	MaR - hrubé rozvody	280 dny	15.03. 21	20.12. 21
81	MaR - kompletace, zprovoznění, inviduální zkoušky	105 dny	09.02. 22	25.05. 22
82	**SO 01 01.8. Medicinální plyny**	**408 dny**	**12.04. 21**	**25.05. 22**
83	01.8. Medicinální plyny rozvody medicinálních plynů	408 dny	12.04. 21	25.05. 22
84	Medicinální plyny - hrubé rozvody	184 dny	12.04. 21	13.10. 21
85	Medicinální plyny - kompletace- zprovoznění, inviduální zkoušky	105 dny	09.02. 22	25.05. 22
86	01.8. Medicinální plyny-redukční stanice kyslíku a záložní zdroj kyslíku	60 dny	01.11. 21	31.12. 21
87	01.8. Medicinální plyny - vakuová stanice	60 dny	01.11. 21	31.12. 21
88	**SO 01 01.10. Potrubní pošta**	**380 dny**	**10.05. 21**	**25.05. 22**
89	01.10.1 Potrubní pošta budovy 14	340 dny	19.06. 21	25.05. 22
90	01.10.2 Potrubní pošta budovy PGO	90 dny	10.05. 21	08.08. 21
91	**SO 02 Komunikace a zpevněné plochy**	**150 dny**	**29.12. 21**	**28.05. 22**
92	Komunikace a zpevněné plochy	150 dny	29.12. 21	28.05. 22
93	Asfalty (dle obalovny)	15 dny	13.05. 22	28.05. 22
94	**SO 03 Sadové úpravy**	**549 dny**	**30.11. 20**	**02.06. 22**
95	00 Kácení a přípravné práce	120 dny	30.11. 20	30.03. 21
96	01 Výsadba stromů	45 dny	04.04. 22	19.05. 22
97	02 Kombinované záhony	45 dny	04.04. 22	19.05. 22
98	03 Založení trávníku	45 dny	04.04. 22	19.05. 22
99	04 Následná péče o sadovou úpravu za 5 let	0 dny	02.06. 22	02.06. 22
100	**SO 04 Venkovní kanalizace**	106 dny	16.08. 21	30.11. 21
101	**VON Vedlejší a ostatní náklady**	**639 dny**	**31.08. 20**	**01.06. 22**
102	Vybudování zařízení stevniště vč. provozu	639 dny	**31.08. 20**	01.06. 22
103	Dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření	60 dny	02.04. 22	01.06. 22
104	Zpracování dodavatelských dokumentací	360 dny	11.01. 21	06.01. 22
105	Provádění předepsaných zkoušek a revizí	30 dny	24.03. 22	**23.04. 22**
106	Měření hluku	**20 dny**	**12.05. 22**	**01.06. 22**
107	**KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ (72 hod)**	**3 dny**	**25.05. 22**	**28.05. 22**
108	**Soupis VaN**	**0 dny**	**28.05. 22**	**28.05. 22**
109	**Zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU**	**0 dny**	**28.05. 22**	**28.05. 22**
110	**ZKUŠEBNÍ PROVOZ**	**5 dny**	**28.05. 22**	**02.06. 22**
111	**Odstraňování VaN**	**40 dny**	**18.04. 22**	**28.05. 22**
112	**DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA**	**0 dny**	**02.06. 22**	**02.06. 22**

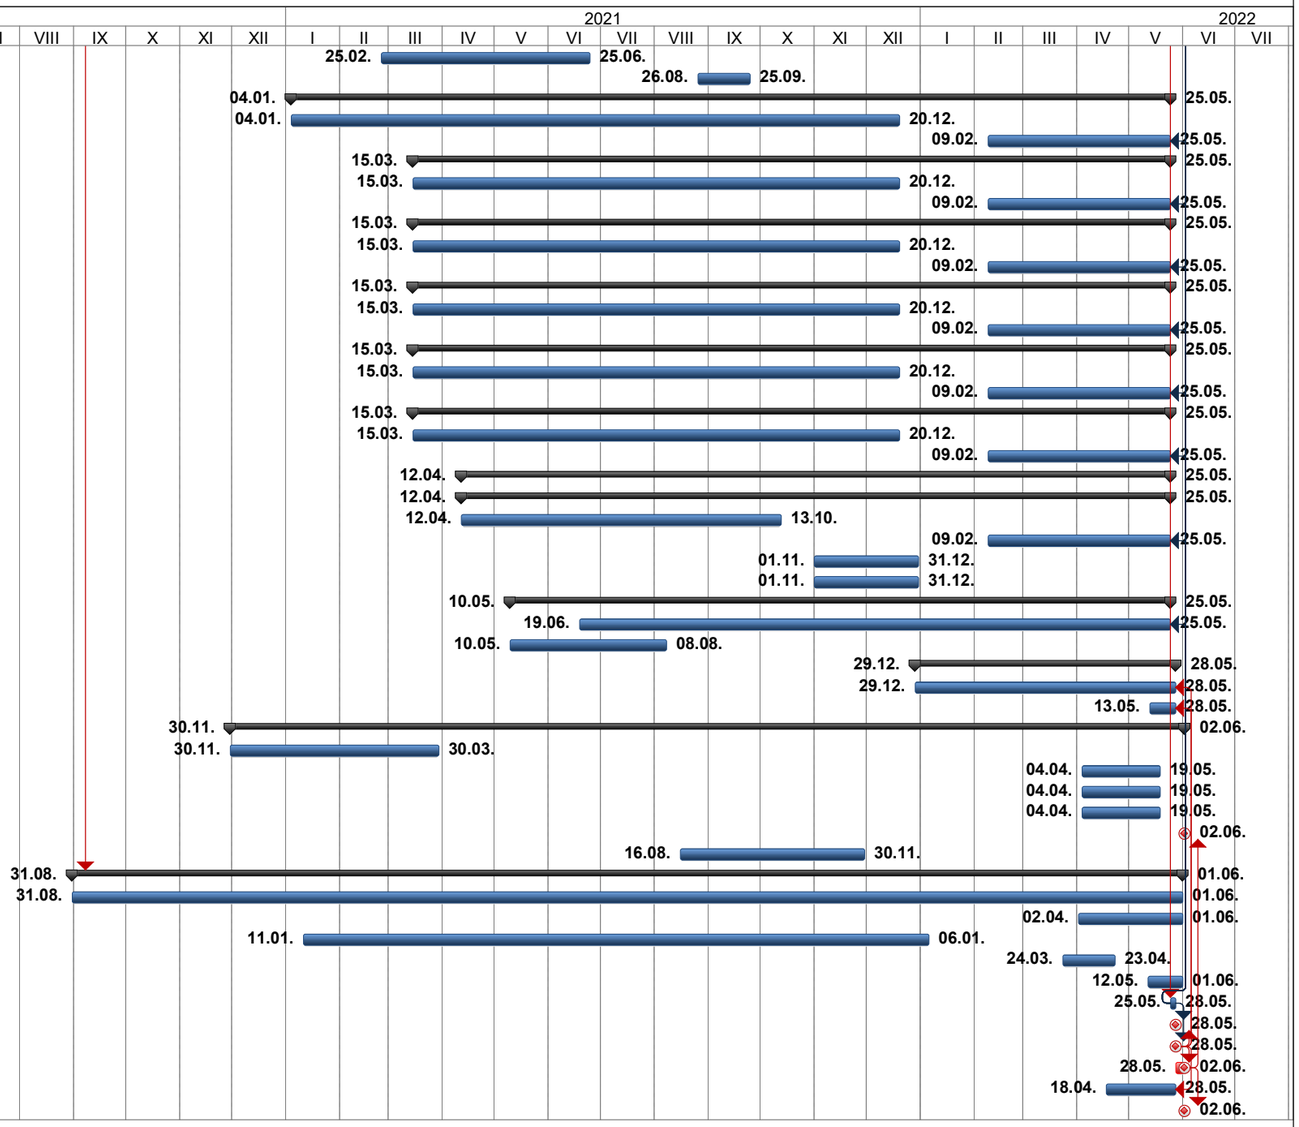

Datum aktualizace:
Stránka: 2 /2
Název stavby: Rekonstrukce objektu 14

Úkol, souhrnný úkol Uzlový bod, milník Souhrnný úkol
