ID	Režim úkolu	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0		**0**	**Pojezdová dráha TWY R a Odbavovací stání OP Jih_2.Etapa 2. Fáze**	**118 dny**	**11.08. 21**	**07.12. 21**
1		1	Předání staveniště, oplocení - TWY RR + 2. Etapa 2. Fáze	1 den	11.08. 21	11.08. 21
2		**2**	**SO 31 Oplocení**	**35 dny**	**13.08. 21**	**16.09. 21**
3		2.1	Provizorní oplocení SRA Zóny	4 dny	13.08. 21	16.08. 21
4		2.2	Demolice stávajícího oplocení	2 dny	17.08. 21	18.08. 21
5		2.3	Frézování + demolice podkladních vrstev	2 dny	16.08. 21	17.08. 21
6		2.4	Výkop + základový pás + osazení sloupků	14 dny	18.08. 21	31.08. 21
7		2.5	Podkladní vrstvy - ŠD + SC	3 dny	04.09. 21	06.09. 21
8		2.6	ACO 16 (ABH) tl 60 mm	1 den	09.09. 21	09.09. 21
9		2.7	Montáž dílů oplocení	7 dny	10.09. 21	16.09. 21
10		**3**	**Demolice provizorní přetah letadel SO 33 a TWY RR**	**20 dny**	**12.08. 21**	**31.08. 21**
11		3.1	Frézování TWY RR + SO 33	2 dny	12.08. 21	13.08. 21
12		3.2	Demolice TWY RR	8 dny	14.08. 21	21.08. 21
13		3.3	Kanalizační přípojka od vpusti ŠŽ DN 200 - dl. 36m	3 dny	22.08. 21	24.08. 21
14		3.4	Kabelovod 3 DN 110 v terénu - dl. 61,8 mb - SO 22.2	4 dny	25.08. 21	28.08. 21
15		3.5	Podkladní beton pod ŠŽ + pokládka ŠŽ u TWY L - žlab č. 14 dl. 33,3 m	5 dny	26.08. 21	30.08. 21
16		3.6	Terénní úpravy TWY RR + SO 33	12 dny	20.08. 21	31.08. 21
17		**4**	**SO 11.2 - Přípravné práce a demolice - Skrývka ornice a demolice zpevněných ploch - 2. Etapa 2. Fáze**	**20 dny**	**12.08. 21**	**31.08. 21**
18		4.1	Frézování Park Area 2,3	5 dny	12.08. 21	16.08. 21
19		4.2	Demolice podkladního betonu pod AB - Park Area 2,3	16 dny	13.08. 21	28.08. 21
20		4.3	Demolice podkladních vrstev - Park Area 2,3	16 dny	16.08. 21	31.08. 21
21		**5**	**SO12.2 Přípravné práce a demolice - Dem. Stavebních objektů po odstraňovaném SZZ - 2. Etapa 2. Fáze**	**14 dny**	**17.08. 21**	**30.08. 21**
22		5.1	Demolice, odvoz, uložení	14 dny	17.08. 21	30.08. 21
23		**6**	**SO13.2: Přípravné práce a demolice - dem. Stav. Objektů po rušeném silno a slaboproudém vedení - 2. Etapa 2. Fáze**	**14 dny**	**17.08. 21**	**30.08. 21**
24		6.1	Demolice stávajících kabelovodů	14 dny	17.08. 21	30.08. 21
25		**7**	**SO14.2: Přípravné práce a demolice - demolice rušené dešťové kanalizace - 2. etapa, viz část D8**	**4 dny**	**05.09. 21**	**08.09. 21**
26		7.1	Demolice šachet	2 dny	07.09. 21	08.09. 21
27		7.2	Vyplnění suspenzí	2 dny	05.09. 21	06.09. 21
28		**8**	**SO21.2: TWY R - 2. Etapa 2. Fáze**	**83 dny**	**15.09. 21**	**06.12. 21**
29		8.1	Úprava zemní pláně	7 dny	15.09. 21	21.09. 21
30		8.2	Stabilizace zemní pláně	4 dny	15.09. 21	18.09. 21
31		8.3	Drenáže	4 dny	17.09. 21	20.09. 21
32		8.4	Žlab GATIC - 17b dl. 49,8 m - Výkop, podkladní beton, žlab	15 dny	21.09. 21	05.10. 21
33		8.5	Žlab GATIC - 11b dl. 104,3 m - Výkop, podkladní beton, žlab	30 dny	28.09. 21	27.10. 21
34		8.6	Žlab GATIC - 12b dl. 70,3 m - Výkop, podkladní beton, žlab	20 dny	21.09. 21	10.10. 21
35		8.7	Žlab GATIC - 13b dl. 41,1 m - Výkop, podkladní beton, žlab	15 dny	11.10. 21	25.10. 21
36		8.8	ŠD tl. 200 mm	7 dny	21.09. 21	27.09. 21
37		8.9	Podkladní beton pod ŠŽ + pokládka ŠŽ - žlab č. 15 dl. 46,7 m	5 dny	28.09. 21	02.10. 21
38		8.10	Podkladní beton pod ŠŽ + pokládka ŠŽ - žlab č. 16 dl. 8,5 m	5 dny	03.10. 21	07.10. 21
39		8.11	SC C 8/10 tl. 150 mm	6 dny	28.09. 21	03.10. 21
40		8.12	Asfaltový nátěr s podrcením fr. 4/8	2 dny	04.10. 21	05.10. 21
41		8.13	Pokládka MCB - pod CBK tl. 150 mm	7 dny	06.10. 21	12.10. 21
42		8.14	Pokládka MCB - GATIC	1 den	28.10. 21	28.10. 21
43		8.15	Pokládka CBK tl. 360 mm	30 dny	16.10. 21	14.11. 21
44		8.16	Pokládka živičných vrstev - ACP tl. 70 mm	1 den	05.11. 21	05.11. 21
45		8.17	Pokládka živičných vrstev - ACO tl. 40 mm	1 den	06.11. 21	06.11. 21
46		8.18	Řezání a těsnění dilatačních spár	15 dny	10.11. 21	24.11. 21
47		8.19	Terénní úpravy, dokončovací práce	22 dny	15.11. 21	06.12. 21
48		**9**	**SO22.2: Stavební připravenost pro SZZ - 2. Etapa 2. Fáze**	**57 dny**	**19.09. 21**	**14.11. 21**
49		9.1	Výkopy pro KŠ + podklady + osazení KŠ - 34 ks	15 dny	19.09. 21	03.10. 21
50		9.2	Propojení kabuflex - ve vozovce - 963 mb	10 dny	22.09. 21	01.10. 21
51		9.3	Propojení kabuflex - v terénu - 228 mb	2 dny	04.10. 21	05.10. 21
52		9.4	Drážky pro spodní přívody + osazení + betonáž - 1 042mb	7 dny	13.10. 21	19.10. 21
53		9.5	Vývrty pro zapuštěné návěstidla - cca. 122 ks	10 dny	05.11. 21	14.11. 21
54		**10**	**SO23.2: Kabelové podchody a kabelovody - 2. Etapa 2. Fáze**	**13 dny**	**29.08. 21**	**10.09. 21**
55		10.1	Kabelovod KK 27 - stávající, dl. 49 m	7 dny	29.08. 21	04.09. 21
56		10.2	Kabelovod KK 22 - KK 25, dl. 32,5 m	6 dny	05.09. 21	10.09. 21
57		**11**	**SO24.2: Dešťová kanalizace - 2. Etapa 2. Fáze**	**37 dny**	**23.08. 21**	**28.09. 21**
58		11.1	PVC - Přeložka stoky D2, šachta D9 - D2; dl. 312,19 m	13 dny	23.08. 21	04.09. 21
59		11.2	PVC - Propoj D61, dl. 47,02 m	5 dny	05.09. 21	09.09. 21
60		11.3	PVC - Přeložka stoky D2-1; 18,52 m	5 dny	10.09. 21	14.09. 21
61		11.4	Monolitická šachta D1	30 dny	30.08. 21	28.09. 21
62		**12**	**SO25.2: Silnoproudé přeložky - 2.etapa**	**30 dny**	**11.08. 21**	**09.09. 21**
63		12.1	Demontáže stávajích kabelů a konstrukcí	30 dny	11.08. 21	09.09. 21
64		**13**	**SO26.2: Slaboproudé přeložky - 2.etapa**	**30 dny**	**11.08. 21**	**09.09. 21**
65		13.1	Demontáže stávajích kabelů a konstrukcí	30 dny	11.08. 21	09.09. 21
66		**14**	**SO27.1: Osvětlení pohybových ploch, technologická část - 2.část**	**89 dny**	**24.08. 21**	**20.11. 21**
67		14.1	Montáž napájecích kabelů a konstrukcí	4 dny	26.09. 21	29.09. 21
68		14.2	Demontáž 2 ks stožárů před T3 - dle rekonstrukce T3 - předběžný termín	8 dny	24.08. 21	31.08. 21
69		14.3	Montáž stožáru J 2.4 (12) - Musí být provedeno CBK okolo stožáru	1 den	02.11. 21	02.11. 21
70		14.4	Montáž rozvaděče	4 dny	28.10. 21	31.10. 21
71		14.5	Zapojení ovládání svítidel	1 den	02.11. 21	02.11. 21
72		14.6	Zkoušky a revize	1 den	03.11. 21	03.11. 21
73		14.7	Provedení měření osvětlenosti	3 dny	15.11. 21	17.11. 21
74		14.8	vyhotovení výpočtu nového instalovaného osvětlení	1 den	20.11. 21	20.11. 21
75		**15**	**SO28.1: Osvětlení pohybových ploch, stavební část - 2. etapa**	**22 dny**	**01.09. 21**	**22.09. 21**
76		15.1	Pilota 1 ks	1 den	01.09. 21	01.09. 21
77		15.2	Výkop pro základ stožáru - 1ks - J2.4 (12)	1 den	02.09. 21	02.09. 21
78		15.3	Základ stožáru J2.4 (12)	20 dny	03.09. 21	22.09. 21
79		**16**	**SO29.1: Slaboproud, CCTV - 2.etapa**	**57 dny**	**25.09. 21**	**20.11. 21**
80		16.1	Zatažení HDPE trubky do kabelovodu	2 dny	25.09. 21	26.09. 21
81		16.2	Zafukování optického kabelu	2 dny	30.09. 21	01.10. 21
82		16.3	Montáž rozvaděčů	1 den	05.11. 21	05.11. 21

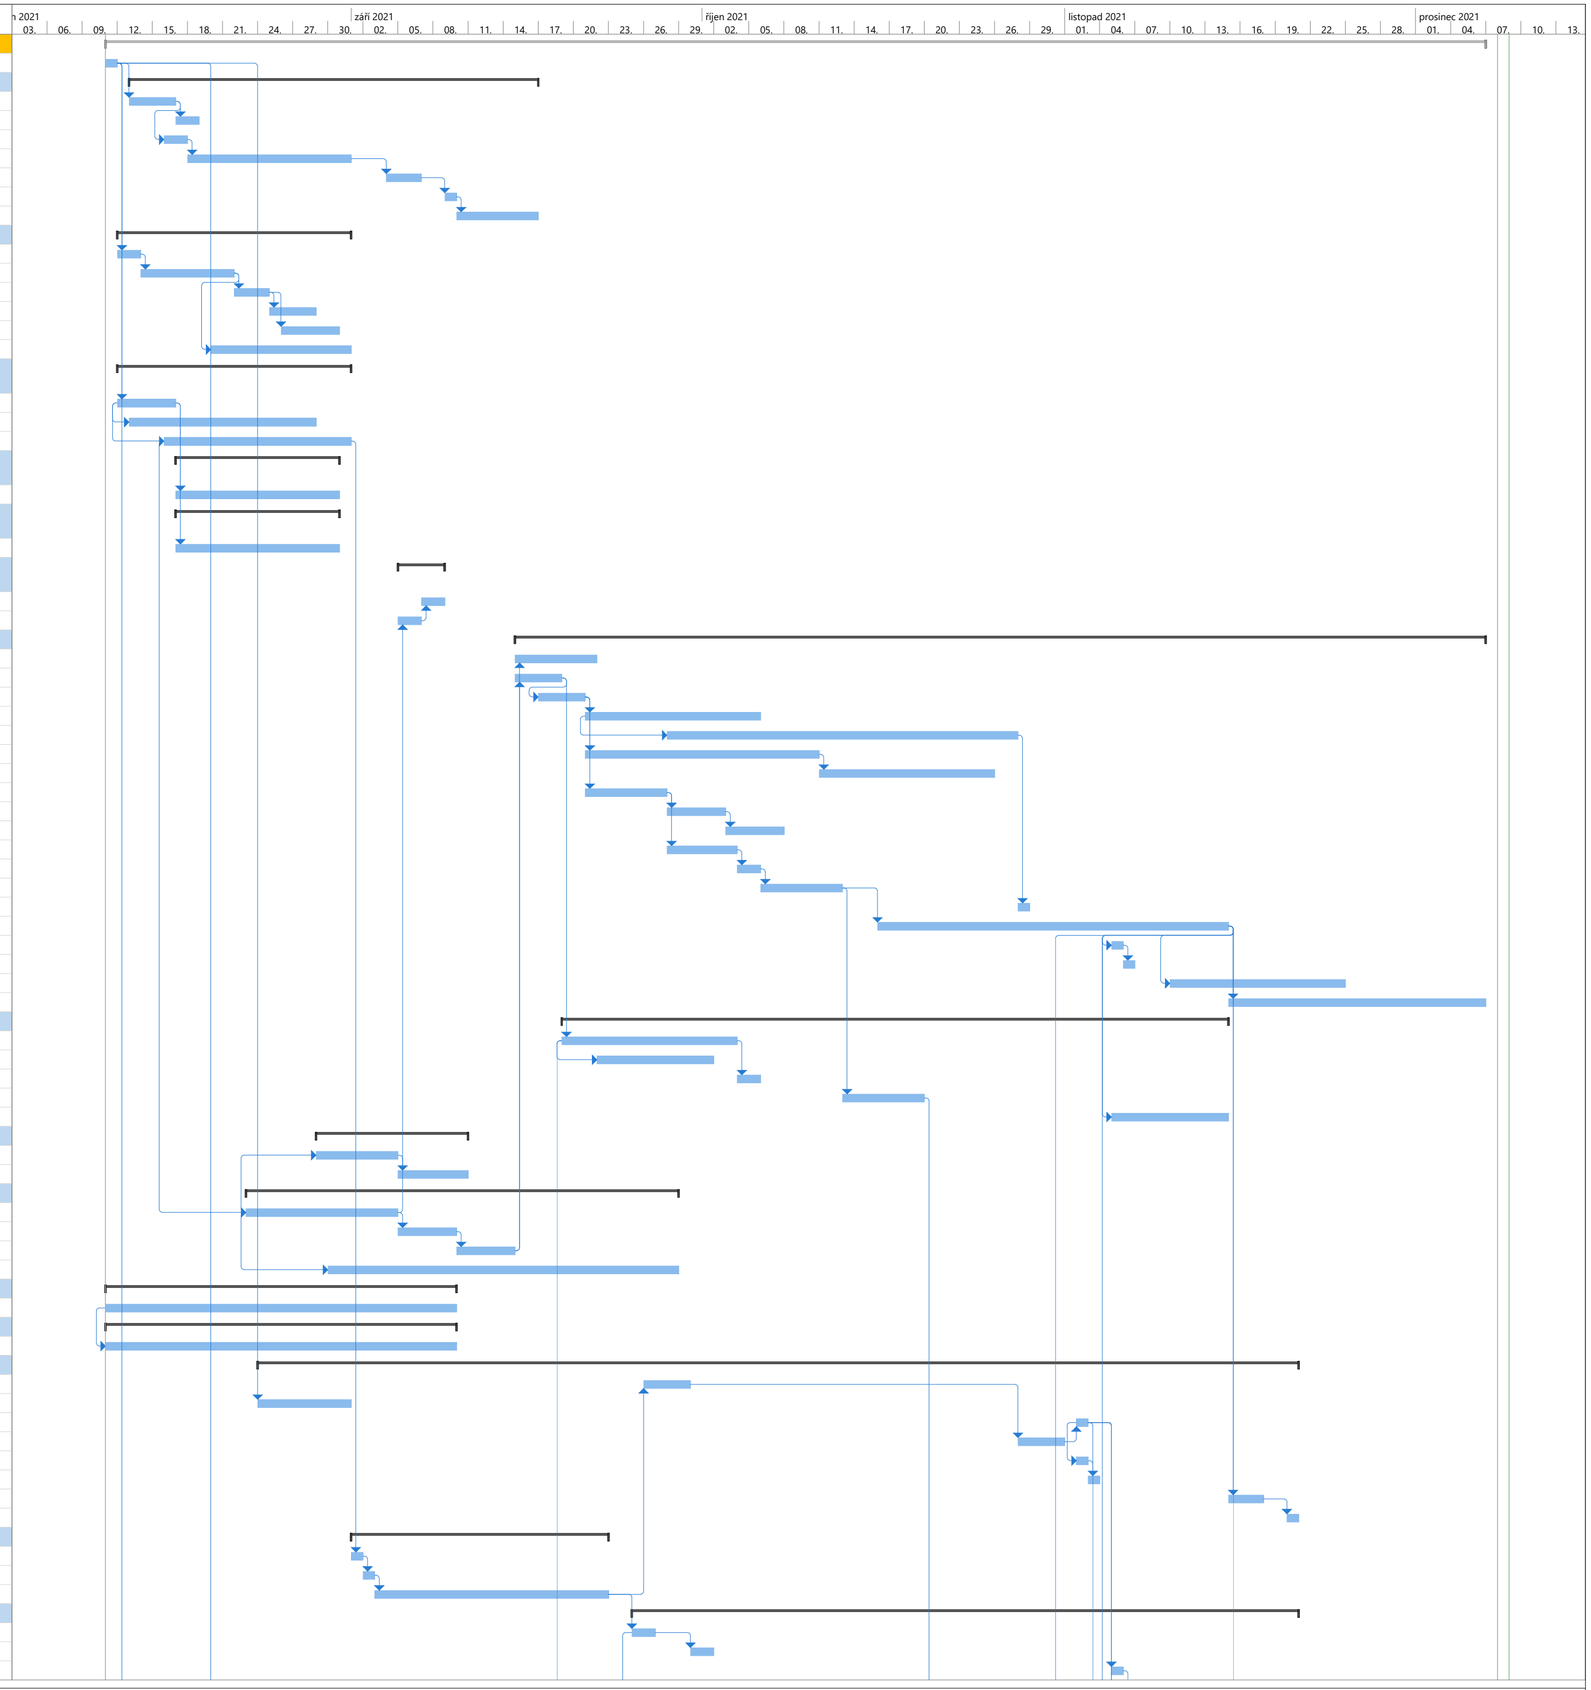
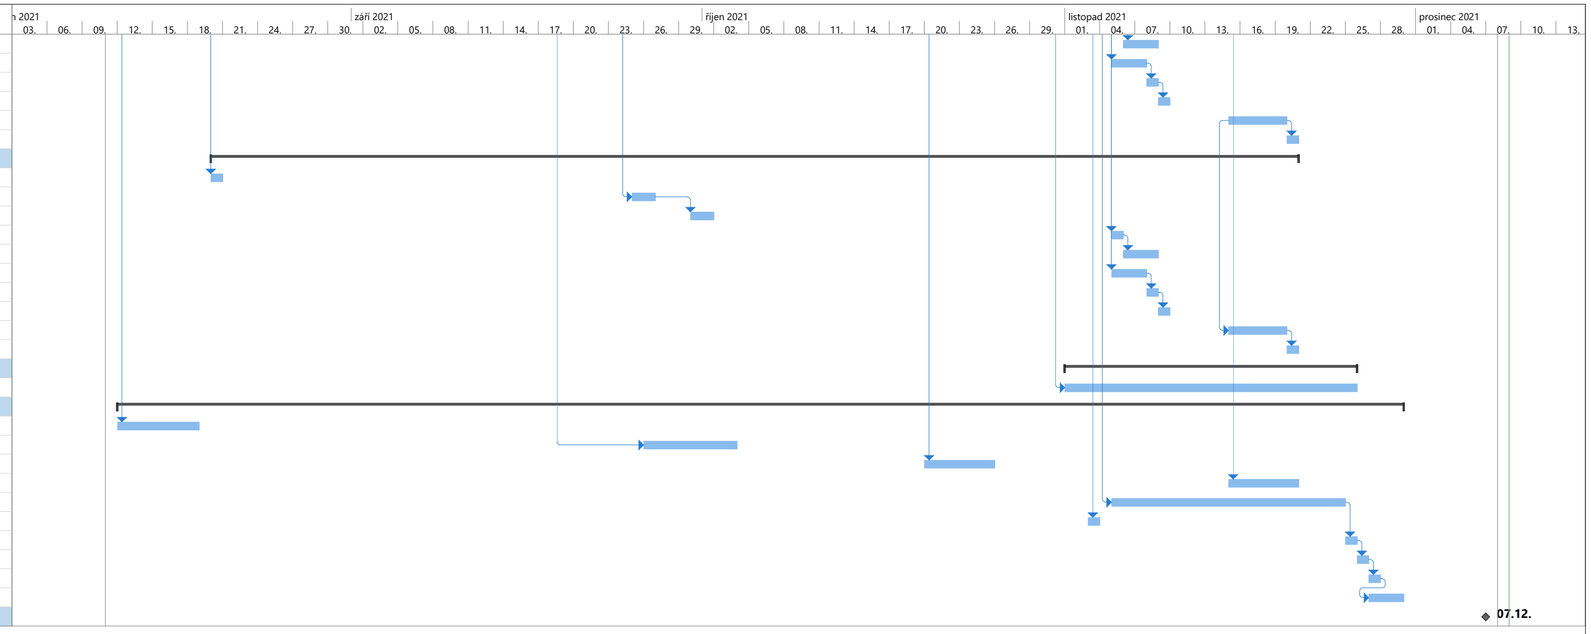
ID	Režim úkolu	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
83		16.4	Ukončení OK, odevzdání měřících protokolů	3 dny	06.11. 21	08.11. 21
84		16.5	Montáž kabelů a konstrukcí	3 dny	05.11. 21	07.11. 21
85		16.6	Komplexní měření sdělovacích kabelů, odevzdání protokolů	1 den	08.11. 21	08.11. 21
86		16.7	Montáž WLAN	1 den	09.11. 21	09.11. 21
87		16.8	Zkoušky, revize	5 dny	15.11. 21	19.11. 21
88		16.9	Dokumentace skutečného provedení	1 den	20.11. 21	20.11. 21
89		**17**	**SO30.1: Slaboproud, WLAN - 2.etapa**	**93 dny**	**20.08. 21**	**20.11. 21**
90		17.1	Finální instalace wifi na stožárech 13,14,15	1 den	20.08. 21	20.08. 21
91		17.2	Zatažení HDPE trubky do kabelovodu	2 dny	25.09. 21	26.09. 21
92		17.3	Zafukování optického kabelu	2 dny	30.09. 21	01.10. 21
93		17.4	Montáž rozvaděčů	1 den	05.11. 21	05.11. 21
94		17.5	Ukončení OK, odevzdání měřících protokolů	3 dny	06.11. 21	08.11. 21
95		17.6	Montáž kabelů a konstrukcí	3 dny	05.11. 21	07.11. 21
96		17.7	Komplexní měření sdělovacích kabelů, odevzdání protokolů	1 den	08.11. 21	08.11. 21
97		17.8	Montáž WLAN	1 den	09.11. 21	09.11. 21
98		17.9	Zkoušky, revize	5 dny	15.11. 21	19.11. 21
99		17.10	Dokumentace skutečného provedení	1 den	20.11. 21	20.11. 21
100		**18**	**SO32 : Odražeč výtokových plynů**	**25 dny**	**01.11. 21**	**25.11. 21**
101		18.1	Montáž odražeče výtokových plynů na CBK	25 dny	01.11. 21	25.11. 21
102		**19**	**PS 11, 12, 13**	**110 dny**	**12.08. 21**	**29.11. 21**
103		19.1	Demontáže návěstidel, znaků, kabelových rozvodů	7 dny	12.08. 21	18.08. 21
104		19.2	vedení SZZ - v zeleni vč.kalibrace	8 dny	26.09. 21	03.10. 21
105		19.3	vedení SZZ - v ploše	6 dny	20.10. 21	25.10. 21
106		19.4	Instalace zapuštěných návěstidel (svítidla SZZ)	6 dny	15.11. 21	20.11. 21
107		19.5	Instalace nadzemních návěstidel	20 dny	05.11. 21	24.11. 21
108		19.6	Instalace tabulí LVP	1 den	03.11. 21	03.11. 21
109		19.7	Úpravy AMS.3	1 den	25.11. 21	25.11. 21
110		19.8	Revize	1 den	26.11. 21	26.11. 21
111		19.9	10-hodinová provozní zkouška	1 den	27.11. 21	27.11. 21
112		19.10	Komplexní zkoušky	3 dny	27.11. 21	29.11. 21
113		20	**Předání a převzetí stavby**	0 dny	07.12. 21	07.12. 21
