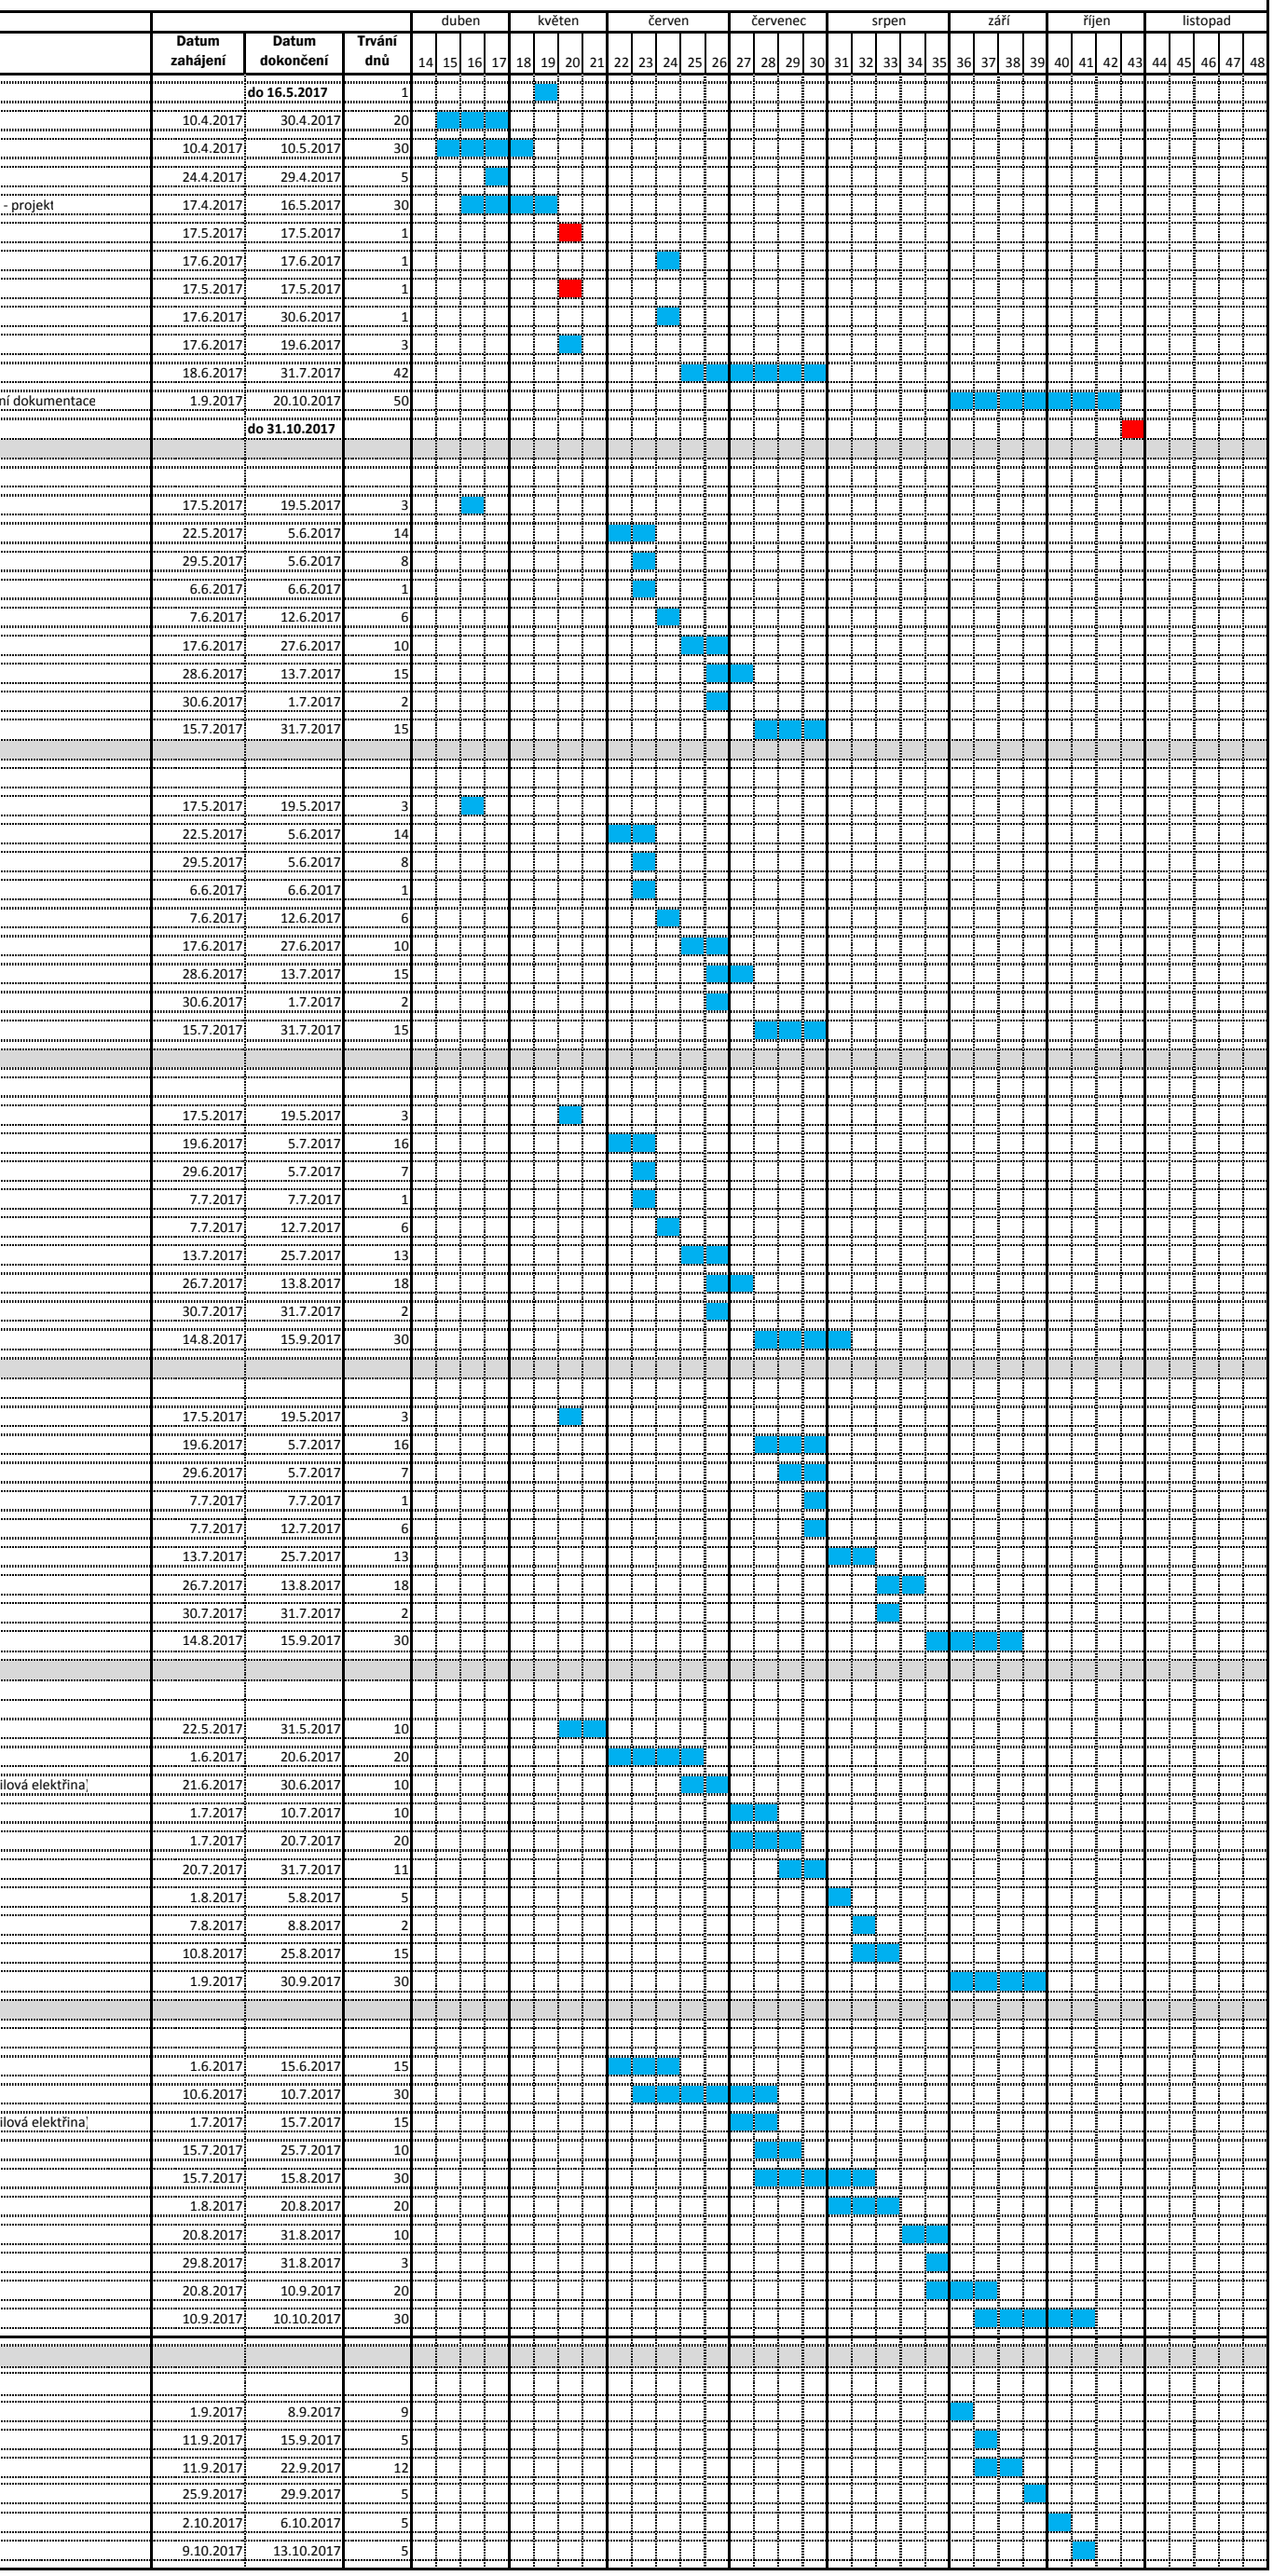Stavba:	Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II.etapa			
Rev. 2	Harmonogram výstavby			
DATUM: 21.4.2017	**II.etapa výstavby**			
Část	**Popis**	**Datum zahájení**	**Datum dokončení**	**Trvání dnů**
Celkový rámec	**Podpis smlouvy o dílo - výzva k zahájení činností**		**do 16.5.2017**	1
	Zajištění dodavatelského systému stavby	10.4.2017	30.4.2017	20
	Obnovení vyjádření správců sítí	10.4.2017	10.5.2017	30
	Příprava pro objednání materiálu - venkovní potrubí	24.4.2017	29.4.2017	5
	Příprava pro výrobu kompaktních předávacích stanic - projekt	17.4.2017	16.5.2017	30
	Objednání materiálu - venkovní potrubí	17.5.2017	17.5.2017	1
	Dodání materiálu na stavbu - venkovní potrubí	17.6.2017	17.6.2017	1
	Objednání materiálu pro výrobu KPS	17.5.2017	17.5.2017	1
	Dodání materiálu pro výrobu KPS	17.6.2017	30.6.2017	1
	Vytýčení inženýrských sítí	17.6.2017	19.6.2017	3
	Výroba KPS (postupně dle požadavků stavby)	18.6.2017	31.7.2017	42
	Dokumentace skutečného provedení stavby, průvodní dokumentace	1.9.2017	20.10.2017	50
	Předání díla objednateli		**do 31.10.2017**	
0. Fáze - venkovní rozvody, zásobované objekty 815, 832	**II.ETAPA - 0.Fáze - venkovní rozvody**			
	Odstranění dřevin	17.5.2017	19.5.2017	3
	Výkopové práce	22.5.2017	5.6.2017	14
	Montáž provizorního potrubí TUV	29.5.2017	5.6.2017	8
	Odstávka pro přepojení provizorního rozvodu TUV	6.6.2017	6.6.2017	1
	Demontáže stávajího potrubí	7.6.2017	12.6.2017	6
	Montáž nového potrubí + spojkování	17.6.2017	27.6.2017	10
	Zemní práce - obsyb potrubí + zásyp nového potrubí	28.6.2017	13.7.2017	15
	Pokládka HDPE hraniček pro komunikační kabely	30.6.2017	1.7.2017	2
	Povrchové úpravy	15.7.2017	31.7.2017	15
1. Fáze - venkovní rozvody, zásobované objekty 762, 760, 813, 812	**II.ETAPA - 1.Fáze - venkovní rozvody**			
	Odstranění dřevin	17.5.2017	19.5.2017	3
	Výkopové práce	22.5.2017	5.6.2017	14
	Montáž provizorního potrubí TUV	29.5.2017	5.6.2017	8
	Odstávka pro přepojení provizorního rozvodu TUV	6.6.2017	6.6.2017	1
	Demontáže stávajího potrubí	7.6.2017	12.6.2017	6
	Montáž nového potrubí + spojkování	17.6.2017	27.6.2017	10
	Zemní práce - obsyb potrubí + zásyp nového potrubí	28.6.2017	13.7.2017	15
	Pokládka HDPE hraniček pro komunikační kabely	30.6.2017	1.7.2017	2
	Povrchové úpravy	15.7.2017	31.7.2017	15
2. Fáze - venkovní rozvody, zásobované objekty nejsou	**II.ETAPA - 2.Fáze - venkovní rozvody**			
	Odstranění dřevin	17.5.2017	19.5.2017	3
	Výkopové práce	19.6.2017	5.7.2017	16
	Montáž provizorního potrubí TUV	29.6.2017	5.7.2017	7
	Odstávka pro přepojení provizorního rozvodu TUV	7.7.2017	7.7.2017	1
	Demontáže stávajího potrubí	7.7.2017	12.7.2017	6
	Montáž nového potrubí + spojkování	13.7.2017	25.7.2017	13
	Zemní práce - obsyb potrubí + zásyp nového potrubí	26.7.2017	13.8.2017	18
	Pokládka HDPE hraniček pro komunikační kabely	30.7.2017	31.7.2017	2
	Povrchové úpravy	14.8.2017	15.9.2017	30
3. Fáze - venkovní rozvody, zásobované objekty 556, 555, 561, 551, 565, 549, 569, 547, 573, 545	**II.ETAPA - 3.Fáze - venkovní rozvody**			
	Odstranění dřevin	17.5.2017	19.5.2017	3
	Výkopové práce	19.6.2017	5.7.2017	16
	Montáž provizorního potrubí TUV	29.6.2017	5.7.2017	7
	Odstávka pro přepojení provizorního rozvodu TUV	7.7.2017	7.7.2017	1
	Demontáže stávajího potrubí	7.7.2017	12.7.2017	6
	Montáž nového potrubí + spojkování	13.7.2017	25.7.2017	13
	Zemní práce - obsyb potrubí + zásyp nového potrubí	26.7.2017	13.8.2017	18
	Pokládka HDPE hraniček pro komunikační kabely	30.7.2017	31.7.2017	2
	Povrchové úpravy	14.8.2017	15.9.2017	30
KPS pro objekty - 832, 815, 762, 760, 813,812	**II.ETAPA - 0. a 1. Fáze - domovní předávací stanice**			
	Demontáž stávající technologie	22.5.2017	31.5.2017	10
	Stavební úpravy místností	1.6.2017	20.6.2017	20
	Příprava pro elektro a Mar (rozvaděče, elektroměr, silová elektřina)	21.6.2017	30.6.2017	10
	Dodávka KPS na stavbu	1.7.2017	10.7.2017	10
	Instalace KPS	1.7.2017	20.7.2017	20
	MaR, dokončení silové elektřiny	20.7.2017	31.7.2017	11
	Zprovoznění nové technologie	1.8.2017	5.8.2017	5
	Přepojení TUV	7.8.2017	8.8.2017	2
	Izolace technologie	10.8.2017	25.8.2017	15
	Dokončovací práce	1.9.2017	30.9.2017	30
KPS pro objekty - 556, 555, 561, 551, 565, 549,569, 547, 573, 545	**II.ETAPA - 2. a 3. Fáze - domovní předávací stanice**			
	Demontáž stávající technologie	1.6.2017	15.6.2017	15
	Stavební úpravy místností	10.6.2017	10.7.2017	30
	Příprava pro elektro a Mar (rozvaděče, elektroměr, silová elektřina)	1.7.2017	15.7.2017	15
	Dodávka KPS na stavbu	15.7.2017	25.7.2017	10
	Instalace KPS	15.7.2017	15.8.2017	30
	MaR, dokončení silové elektřiny	1.8.2017	20.8.2017	20
	Zprovoznění nové technologie	20.8.2017	31.8.2017	10
	Přepojení TUV	29.8.2017	31.8.2017	3
	Izolace technologie	20.8.2017	10.9.2017	20
	Dokončovací práce	10.9.2017	10.10.2017	30
Stzavební úpravy VS3	**Stavební úpravy VS3**			
	Demontáže elektro	1.9.2017	8.9.2017	9
	Demontáže izolací	11.9.2017	15.9.2017	5
	Demontáže technologie a ocelových konstrukcí	11.9.2017	22.9.2017	12
	Bourání stavebních prvků	25.9.2017	29.9.2017	5
	Demontáž podlahových konstrukcí	2.10.2017	6.10.2017	5
	Úpravy povrchů	9.10.2017	13.10.2017	5
