[redacted]

# Harmonogram: Elektrifikace BUS linky 119

1. Rok

Týdny

| Úsek | doba trvání |
|---|---|
| **přípravné práce - kácení zeleně** | |
| Příprava území | 9 týdnů |
| **výkop. základy, stožáry, trolej** | |
| *související "TT divoká Šárka-Dědina" předpoklad* | |
| TV Veleslavín - Divoká Šárka (podrobněji v samostatné příloze) | 21 týdnů |
| TV Divoká Šárka - s TT Dědina | 5 týdnů |
| TV Divoká Šárka - K Letišti | 20 týdnů |
| TV letiště | 4 týdny |
| TV Garáže Řepy | 9 týdnů |
| **objekty pozemních staveb** | |
| MR Garáže Řepy - stavební část | 26 týdnů |
| **úpravy vozovek a komunikací** | |
| Garáže Řepy - vozovky a pochozí plochy | 4 týdny |
| Terminál Nádraží Veleslavín - dz | 1 týden |
| **vodohospodářské objekty** | |
| Garáže Řepy - odvodnění | 6 týdnů |
| MR Garáže Řepy - kanalizační přípojka | 1 týden |
| MR Garáže Řepy - vodovodní přípojka | 1 týden |
| **kabelová vedení** | |
| Kabelové vedení Veleslavín - Divoká Šárka | 8 týdnů |
| Kabelové vedení Divoká Šárka - K Letišti | 8 týdnů |
| Kabelové vedení - letiště | 1 týden |
| Kabelové vedení - Garáže Řepy | 4 týdny |
| **přípojky PRE, letiště** | |
| Přípojka VN 22 kV MR Garáže Řepy | 4 týdny |
| Přípojka VN 22 kV MR Letiště | 3 týdny |
| Přípojka VN 22 kV MR Veleslavín | 2 týdny |
| Přípojka VN 22 kV MR Dědina | 2 týdny |
| **slaboproudé rozvody** | |
| Přípojka NN MR Garáže Řepy | 3 týdny |
| Přípojka NN MR Letiště | 2 týdny |
| Přípojka NN MR Veleslavín | 2 týdny |
| Přípojka NN MR Dědina | 2 týdny |
| Úprava VO v areálu Garáže Řepy | 2 týdny |
| Telefonní přípojka pro MR Garáže Řepy | 4 týdny |
| Telefonní přípojka pro MR Letiště | 3 týdny |
| Telefonní přípojka pro MR Veleslavín | 2 týdny |
| Telefonní přípojka pro MR Dědina | 2 týdny |
| Úprava kamer - ul. Evropská | 1 týden |
| **technologické práce** | |
| **MR Garáže Řepy (+ část PRE)** | |
| objednání a výroba technologie | 14 týdnů |
| instalace technologie | 6 týdnů |
| **KMR Letiště** | |
| objednání a výroba technologie | 14 týdnů |
| instalace kontejneru a technologie | 4 týdny |
| **KMR Veleslavín (+ část PRE)** | |
| objednání a výroba technologie | 14 týdnů |
| instalace kontejneru a technologie | 4 týdny |
| **MR Dědina (+ část PRE)** | |
| objednání a výroba technologie | 14 týdnů |
| instalace technologie | 3 týdny |
| **uvedení do provozu** | |
| Zkušební provoz | |

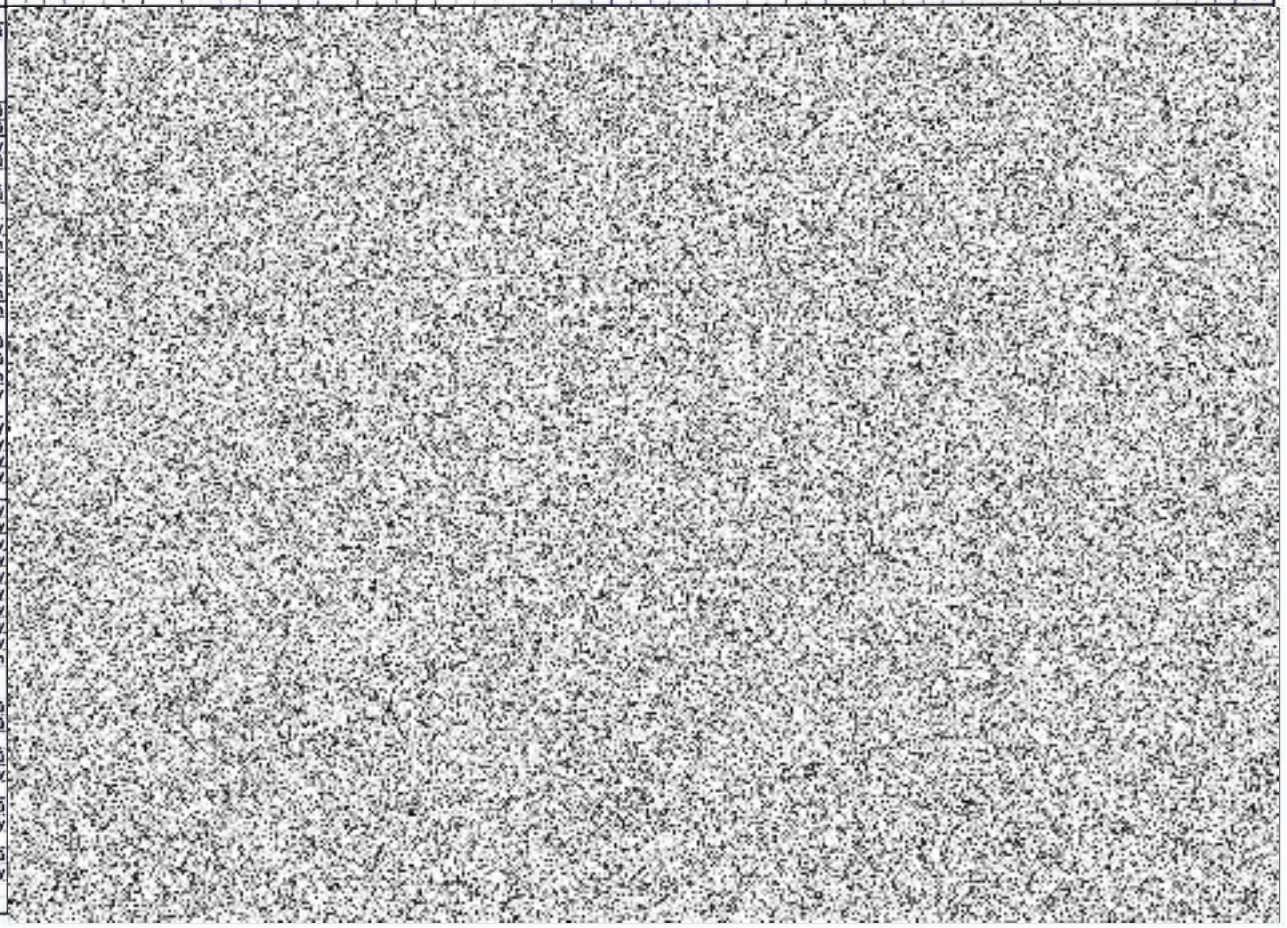

týden s počtem výluk tramvajové trati
