HARMONOGRAM PRACÍ

ID	PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**TT Divoká Šárka - Sídliště na Dědině - Výběr zhotovitele**	**480 dny**	**03.03. 22**	**25.06. 23**
2		Předpokládané zahájení stavby	0 dny	03.03. 22	03.03. 22
3		Etapa 0	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
4		Etapa 1	53 dny	23.05. 22	14.07. 22
5		Etapa 2	157 dny	15.07. 22	18.12. 22
6		Zimní přestávka	64 dny	19.12. 22	20.02. 23
7		Etapa 3	125 dny	21.02. 23	25.06. 23
8		**Předpokládané ukončení stavby**	0 dny	**25.06. 23**	**25.06. 23**
9	**D.2**	**Technologická část**	**451 dny**	**01.04. 22**	**25.06. 23**
10	PS 901	Informační systém	451 dny	01.04. 22	25.06. 23
11	PS 902	Dispečerská řídící technika	451 dny	01.04. 22	25.06. 23
12	PS 903	Měnírna Dědinská - technologická část	304 dny	26.08. 22	25.06. 23
13	**D.1**	**Stavební část**	**480 dny**	**03.03. 22**	**25.06. 23**
14	**D.0 000**	**Objekty připravy staveniště**	**458 dny**	**03.03. 22**	**03.06. 23**
15	SO 001	Provizorní úpravy ploch pro ZS a DIO	458 dny	03.03. 22	03.06. 23
16	SO 002	Demolice vrátnice a oplocení VÚ 3255	150 dny	05.03. 22	01.08. 22
17	SO 003	Ochrana inženýrských sítí při výstavbě	458 dny	03.03. 22	03.06. 23
18	SO 004	Odstranění zázemí DP-BUS, ul. Vlastina	100 dny	05.03. 22	12.06. 22
19	**D.1 100**	**Tramvajová trať a vozovky**	**480 dny**	**03.03. 22**	**25.06. 23**
20	SO 101	Hrubé terenní úpravy	230 dny	05.03. 22	20.10. 22
21	SO 102	Rekonstrukce tramvajové trati Evropská	468 dny	15.03. 22	25.06. 23
22	SO 103	Tramvajová trať	468 dny	15.03. 22	25.06. 23
23	SO 104	Tramvajová smyčka Dědinská	468 dny	15.03. 22	25.06. 23
24	SO 105	Tramvajové zastávky	468 dny	15.03. 22	25.06. 23
25	SO 106	Komunikace Evropská - sever	232 dny	01.05. 22	18.12. 22
26	SO 107	Komunikace Evropská - jih	125 dny	21.02. 23	25.06. 23
27	SO 108	Zavlažování tramvajové trati	365 dny	01.06. 22	31.05. 23
28	SO 109	Komunikace Vlastina, úsek Ke Džbánu - U Silnice	60 dny	10.03. 22	08.05. 22
29	SO 110	Komunikace Vlastina sever	470 dny	10.03. 22	22.06. 23
30	SO 111	Komunikace Vlastina jih	323 dny	15.07. 22	02.06. 23
31	SO 112	Komunikace Drnovská	232 dny	01.05. 22	18.12. 22
32	SO 113	Přeložka polní cesty v km 6,800	60 dny	01.04. 22	30.05. 22
33	SO 114	Definitivní dopravní značení	335 dny	26.07. 22	25.06. 23
34	SO 115	Provizorní dopravní značení	480 dny	03.03. 22	25.06. 23
35	SO 116	Opravy vozovek používaných stavbou	480 dny	03.03. 22	25.06. 23
36	SO 117	Zelené plochy	335 dny	26.07. 22	25.06. 23
37	**D.2 200**	**Inženýrské objekty**	**154 dny**	**20.03. 22**	**20.08. 22**
38	SO 201	Opěrná zeď v ul. Vlastina v km 5,9	90 dny	23.05. 22	20.08. 22

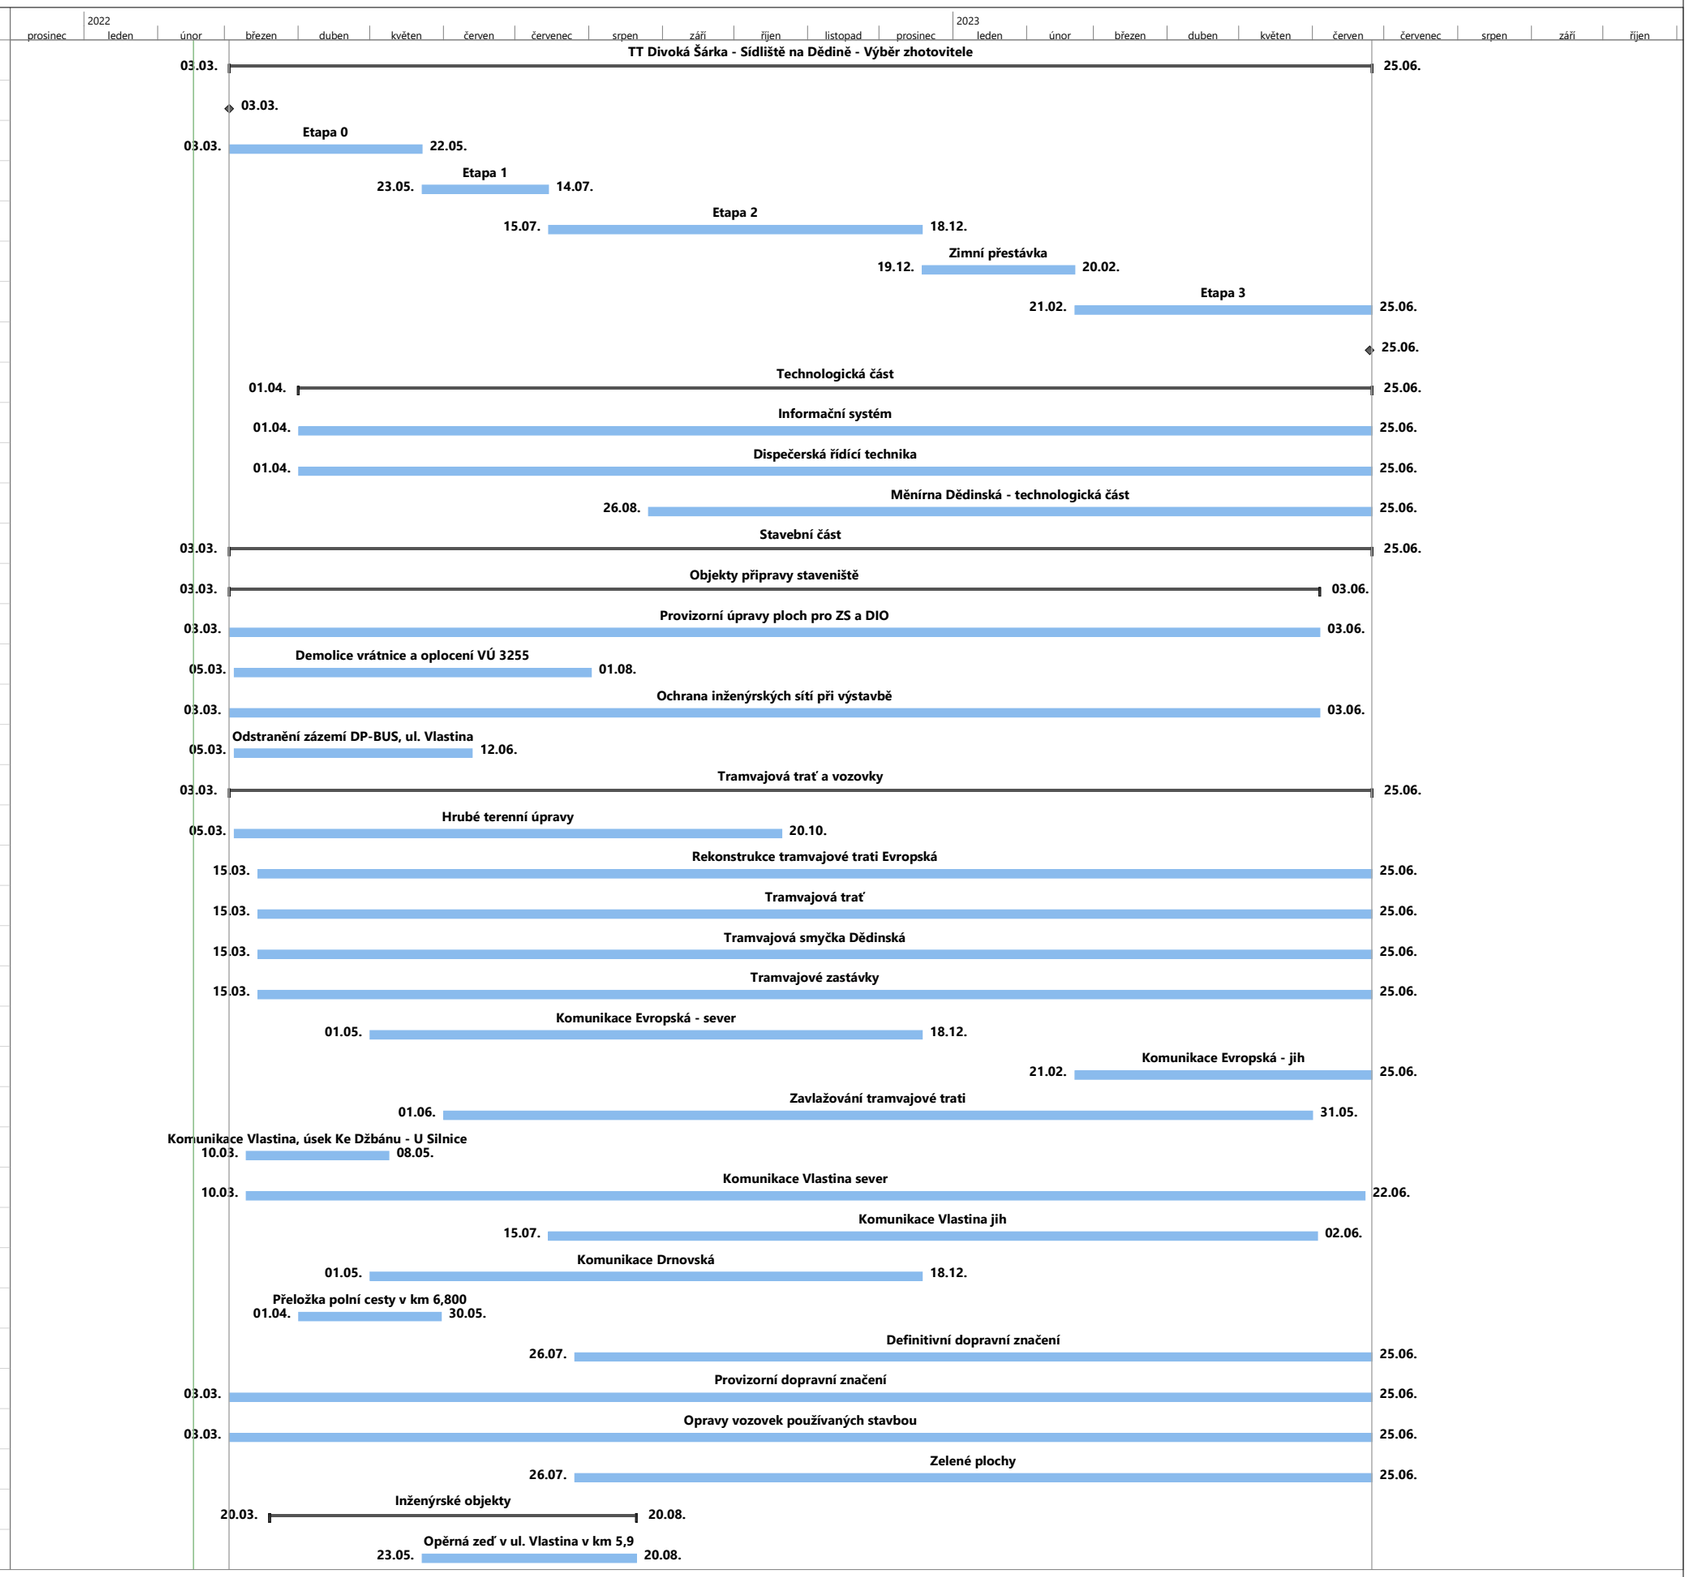

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
39	SO 202	Prodloužení propustku v km 6,8	60 dny	20.03. 22	18.05. 22
40	**D.3 300**	**Vodohospodářské objekty**	**414 dny**	**03.03. 22**	**20.04. 23**
41	SO 301	Ochrana vodovodu DN 100L, v km 5,35	122 dny	15.03. 22	14.07. 22
42	SO 302	Přeložka vodovodu DN 225, v km 5,3-5,4	122 dny	15.03. 22	14.07. 22
43	SO 303	Přípojky pro zavlažování TT	122 dny	15.03. 22	14.07. 22
44	SO 304	Ochrana vodovodu DN 100LT a výměna šoupat, v km 5,48	122 dny	15.03. 22	14.07. 22
45	SO 305	Přeložka vodovodů DN 100LT a ochrana vodovodu v km 5,56 až 5,63	122 dny	15.03. 22	14.07. 22
46	SO 306	Přeložka vodovodu DN 100L, km 5,78	122 dny	15.03. 22	14.07. 22
47	SO 307	Ochrana vodovodní přípojky DN 100, v km 5,91	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
48	SO 308	Ochrana vodovodu DN 400oc , v km 6,72	170 dny	23.05. 22	08.11. 22
49	SO 309	Přeložka vod. Přivaděče DN 1200LT v km 7,1 až 7,23 (akce PVS)	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
50	SO 310	Přeložka vodovodu DN 150LT v km 5,13 až 5,5	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
51	SO 311	Zrušení předkládaných vodovodů	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
52	SO 312	Přeložka děšťové kanalizace DN250 v km 5,3 (DN 300)	387 dny	21.03. 22	11.04. 23
53	SO 313	Přeložka splaškové kanalizace DN 250-300 v km 5,48 až 5,61	170 dny	23.05. 22	08.11. 22
54	SO 314	Přeložka dešťové stoky DN 800 v km 5,71 až 5,87 (DN 600)	328 dny	28.05. 22	20.04. 23
55	SO 315	Úprava propojení dešťové stoky DN 300 v km 5,46	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
56	SO 316	Přeložka splaškové kanalizace DN 300 v km 5,64 až 5,71	170 dny	23.05. 22	08.11. 22
57	SO 317	Přeložka dešťové stoky DN 600-700 v km 5,864 až 5,966 (DN300)	170 dny	23.05. 22	08.11. 22
58	SO 318	Přeložka dešťové stoky DN 600-700 v km 5,865 až 6,123 (DN400)	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
59	SO 319	Přeložka dešťové stoky DN 600-700 v km 6,116 až 6,228 (DN300)	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
60	SO 320	Úprava vstupů do stávající spojné komory v km 6,74	170 dny	23.05. 22	08.11. 22
61	SO 321	Dešťová kanalizace pro odvodnění TT DN 300 v km 6,74 až 7,23	53 dny	23.05. 22	14.07. 22
62	SO 322	Dešťová kanalizace areálová DP DN 300 ve smyčce	53 dny	23.05. 22	14.07. 22
63	SO 323	Přípojky odvodnění komunikací	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
64	SO 324	Připojky odvodnění tramvajové trati	387 dny	21.03. 22	11.04. 23
65	SO 325	Připojky vod. a kan. měnírny a soc. zař. na smyčce	125 dny	12.03. 22	14.07. 22
66	SO 326	Připojky zařízení stavenišť ZS1, ZS2 a ZS3 vody a kanalizace	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
67	SO 327	Kanalizace areálu VU 3255	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
68	**D.4 400**	**Elektro a sdělovací objekty**	**480 dny**	**03.03. 22**	**25.06. 23**
69	SO 401	Trolejové vedení	392 dny	30.05. 22	25.06. 23
70	SO 402	Dráhové kabely	366 dny	01.05. 22	01.05. 23
71	SO 403	Elektrické ovládání a vytápění výměn	346 dny	15.07. 22	25.06. 23
72	SO 404	Mazací zařízení	346 dny	15.07. 22	25.06. 23
73	SO 405	Elektrické zařízení zastávek	346 dny	15.07. 22	25.06. 23
74	SO 406	Napájení přístřešků TRAM	346 dny	15.07. 22	25.06. 23
75	SO 407	Napájení přistřešků BUS	346 dny	15.07. 22	25.06. 23
76	SO 408	Přeložky silových kabelů VUSS	60 dny	10.03. 22	08.05. 22

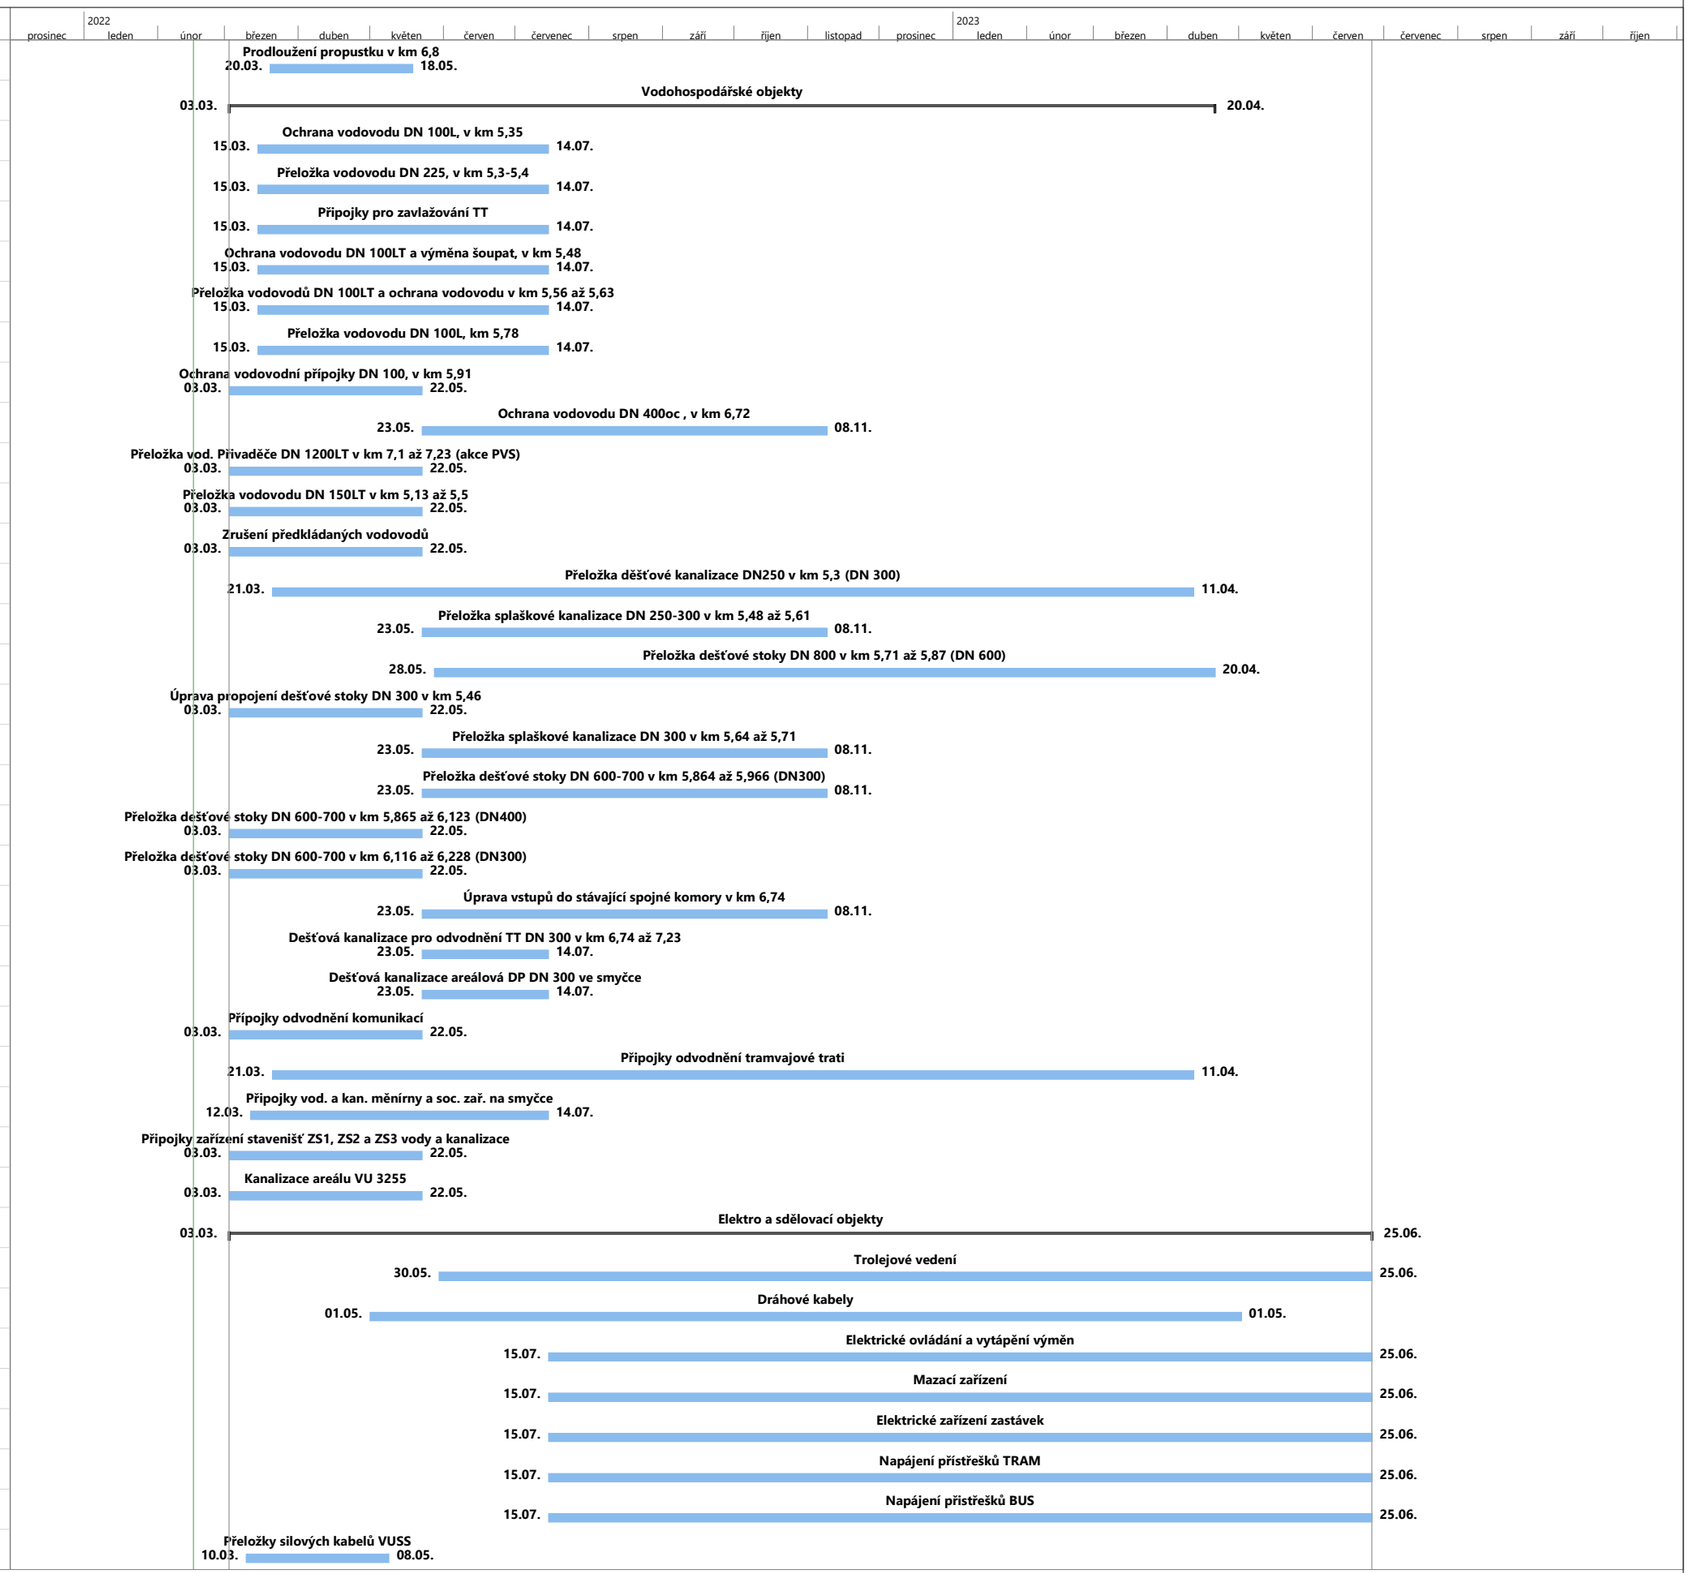

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
77	SO 409	Přeložka osvětlení na parcele 1837/193	60 dny	10.03. 22	08.05. 22
78	SO 410	Protikorozní ochrana plynovodů	418 dny	10.03. 22	01.05. 23
79	SO 411	Přeložky VO v ulici Evropská	291 dny	03.03. 22	18.12. 22
80	SO 412	Přeložky VO v ulici Vlastina - úsek Evropská - U Silnice	134 dny	03.03. 22	14.07. 22
81	SO 413	Přeložky VO v ulici Vlastina - úsek U Silnice - Drnovská	134 dny	03.03. 22	14.07. 22
82	SO 414	Přeložky VO v ulici Drnovská	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
83	SO 415	Přisvětlení přechodů	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
84	SO 416	Osvětlení smyčky Dědinská	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
85	SO 420	SSZ 6.843 Drnovská - Vlastina	382 dny	15.04. 22	01.05. 23
86	SO 424	SSZ 6.169 Evropská - Vlastina	382 dny	15.04. 22	01.05. 23
87	SO 425	SSZ 6.123 Evropská - Libocká	382 dny	15.04. 22	01.05. 23
88	SO 426	SSZ 6.162 Evropská - Smyčka Divoká Šárka	382 dny	15.04. 22	01.05. 23
89	SO 427	Koordinační kabel SSZ	283 dny	03.03. 22	10.12. 22
90	SO 428	Úprava kamerového systému	53 dny	23.05. 22	14.07. 22
91	SO 430	Přeložky kabelů 22 kV Evropská - Vlastina	134 dny	03.03. 22	14.07. 22
92	SO 431	Přeložky kabelů 22 kV Vlastina - U Silnice	253 dny	03.03. 22	10.11. 22
93	SO 432	Přeložky kabelů 22 kV smyčka Dědinská	134 dny	03.03. 22	14.07. 22
94	SO 433	Přeložky optokabelů Evropská - Vlastina	134 dny	03.03. 22	14.07. 22
95	SO 436	Připojka 22 kV pro ZS 1 na nové smyčce	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
96	SO 437	Přeložky NN kabelů Evropská - Vlastina	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
97	SO 438	Přeložky NN kabelů Vlastina - U Silnice	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
98	SO 439	Přeložky kabelů NN Vlastina - Drnovská	253 dny	03.03. 22	10.11. 22
99	SO 440	Připojka NN pro zapínací místo VO Hodčina	253 dny	03.03. 22	10.11. 22
100	SO 441	Přípojka NN pro zapínací místo VO Drnovská	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
101	SO 442	Přípojka NN pro novou MR	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
102	SO 443	Přípojka NN pro sociální zařízení na nové smyčce	253 dny	03.03. 22	10.11. 22
103	SO 444	Přípojka NN pro ZS3 (Evropská - Vlastina)	253 dny	03.03. 22	10.11. 22
104	SO 445	Přípojka NN Stanice katodické ochrany	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
105	SO 447	Provizorní přeložky nn kabelů	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
106	SO 451	Sdělovací přípojka měnírny - objekt nebude součástí nabídky	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
107	SO 452	Přeložka kabelů UPC	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
108	SO 453	Ovládání vstupu do areálu VÚ 3255	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
109	SO 454	Přeložka kabelů T-Mobile	134 dny	03.03. 22	14.07. 22
110	SO 455	Přeložka kabelů MV	134 dny	03.03. 22	14.07. 22
111	SO 456	Přeložka kabelů Řízení letového provozu	253 dny	03.03. 22	10.11. 22
112	SO 457	Přeložka kabelů MO	253 dny	03.03. 22	10.11. 22
113	**D.5 500**	**Objekty trubních vedení**	**291 dny**	**03.03. 22**	**18.12. 22**
114	SO 501	Přeložka STL plynovodu dn225-315	134 dny	03.03. 22	14.07. 22

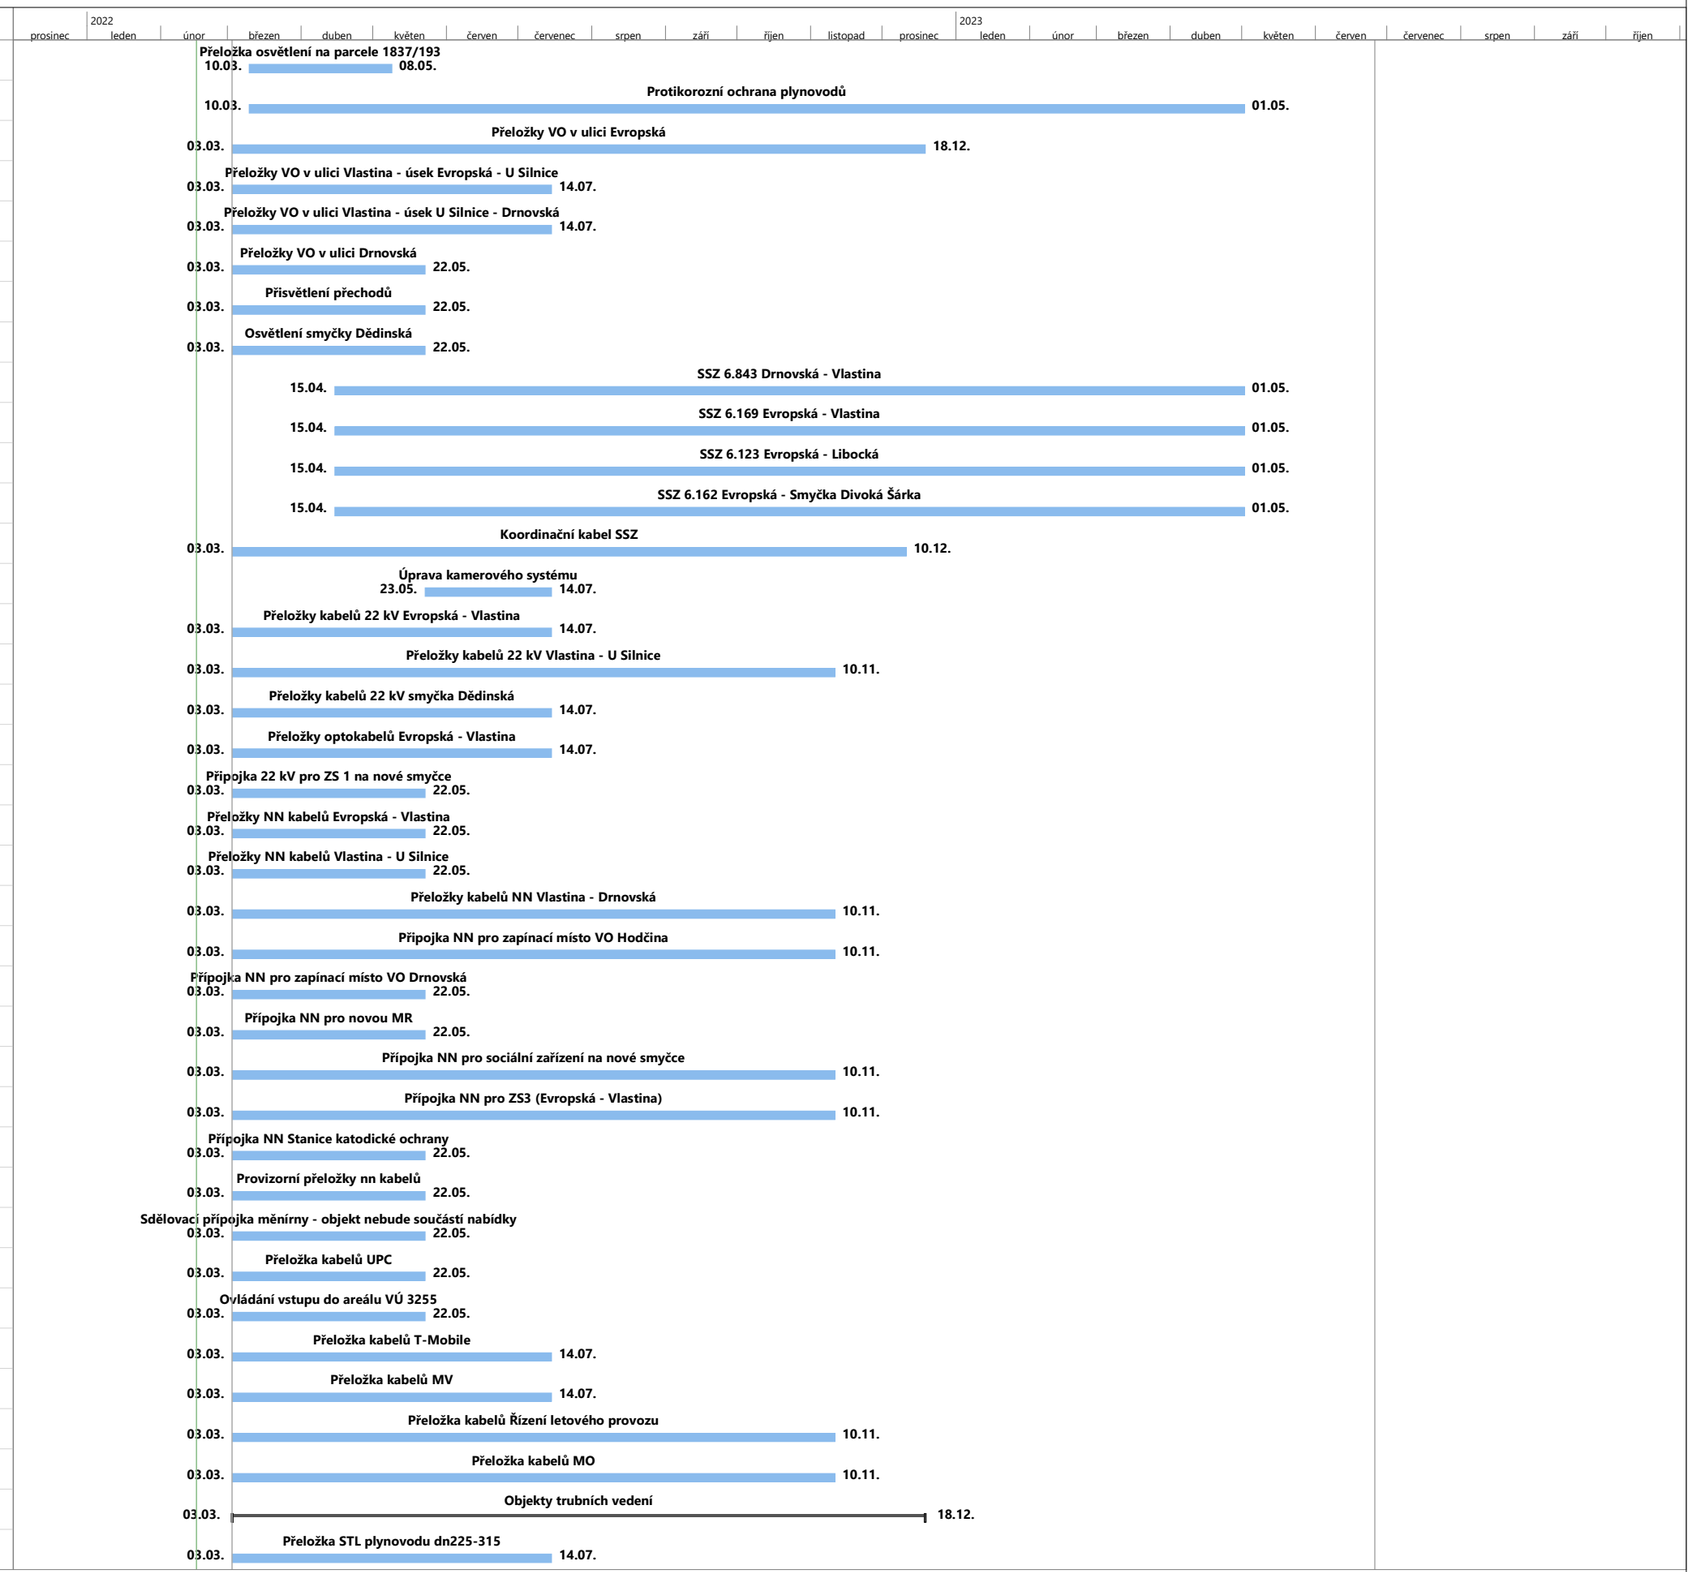

HARMONOGRAM PRACÍ
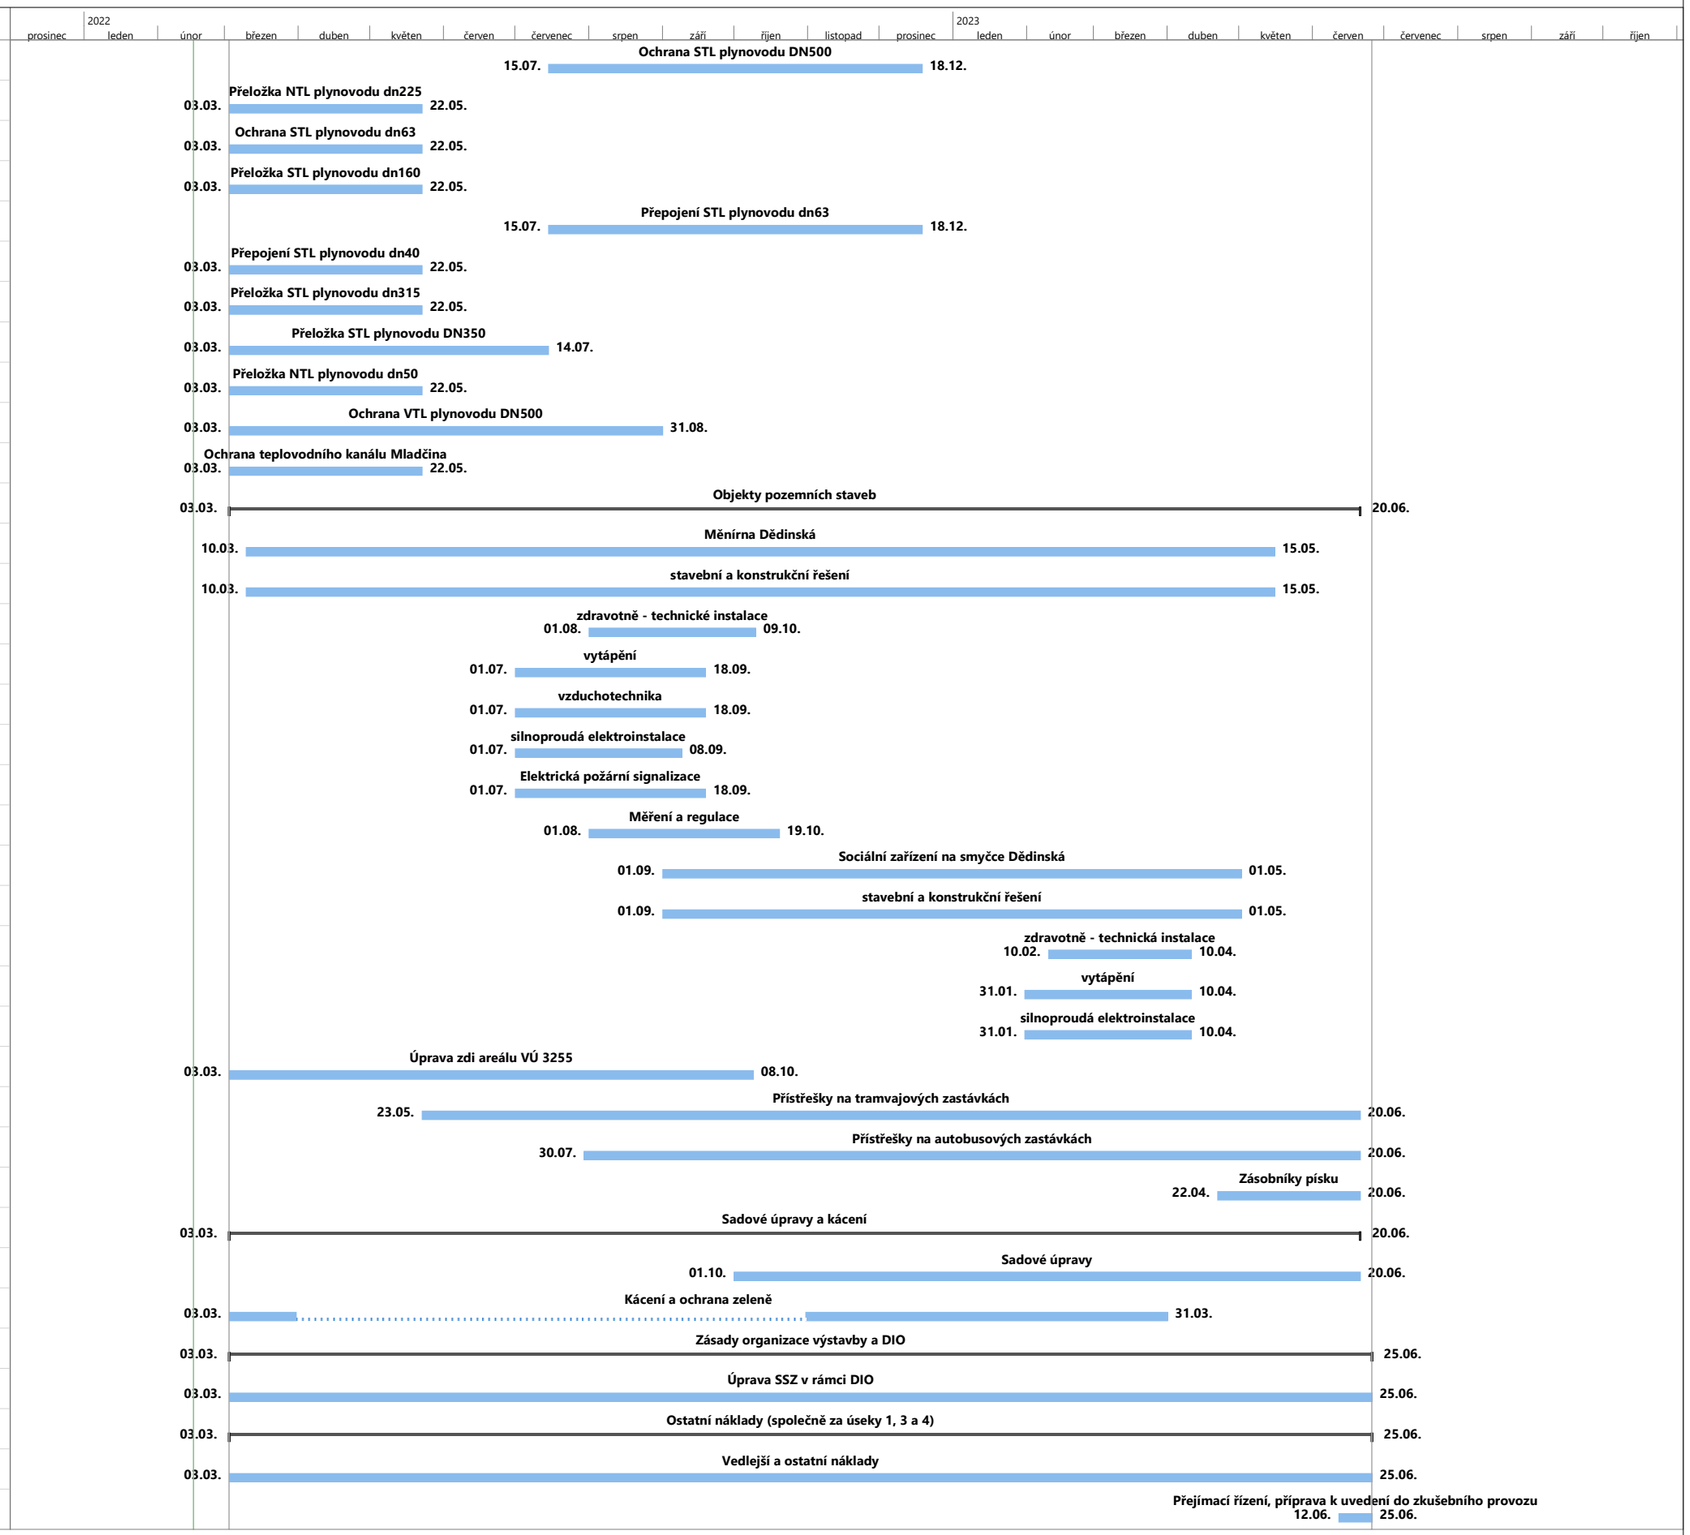
ID	PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
115	SO 502	Ochrana STL plynovodu DN500	157 dny	15.07. 22	18.12. 22
116	SO 504	Přeložka NTL plynovodu dn225	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
117	SO 505	Ochrana STL plynovodu dn63	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
118	SO 506	Přeložka STL plynovodu dn160	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
119	SO 507	Přepojení STL plynovodu dn63	157 dny	15.07. 22	18.12. 22
120	SO 508	Přepojení STL plynovodu dn40	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
121	SO 509	Přeložka STL plynovodu dn315	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
122	SO 510	Přeložka STL plynovodu DN350	134 dny	03.03. 22	14.07. 22
123	SO 512	Přeložka NTL plynovodu dn50	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
124	SO 513	Ochrana VTL plynovodu DN500	182 dny	03.03. 22	31.08. 22
125	SO 532	Ochrana teplovodního kanálu Mladčina	81 dny	03.03. 22	22.05. 22
126	**D.7 700**	**Objekty pozemních staveb**	**475 dny**	**03.03. 22**	**20.06. 23**
127	SO 701	Měnírna Dědinská	432 dny	10.03. 22	15.05. 23
128	*SO 701.1*	*stavební a konstrukční řešení*	432 dny	10.03. 22	15.05. 23
129	*SO 701.4*	*zdravotně - technické instalace*	70 dny	01.08. 22	09.10. 22
130	*SO 701.5*	*vytápění*	80 dny	01.07. 22	18.09. 22
131	*SO 701.6*	*vzduchotechnika*	80 dny	01.07. 22	18.09. 22
132	*SO 701.7*	*silnoproudá elektroinstalace*	70 dny	01.07. 22	08.09. 22
133	*SO 701.8*	*Elektrická požární signalizace*	80 dny	01.07. 22	18.09. 22
134	*SO 701.9*	*Měření a regulace*	80 dny	01.08. 22	19.10. 22
135	SO 702	Sociální zařízení na smyčce Dědinská	243 dny	01.09. 22	01.05. 23
136	*SO 702.1*	*stavební a konstrukční řešení*	243 dny	01.09. 22	01.05. 23
137	*SO 702.4*	*zdravotně - technická instalace*	60 dny	10.02. 23	10.04. 23
138	*SO 702.5*	*vytápění*	70 dny	31.01. 23	10.04. 23
139	*SO 702.6*	*silnoproudá elektroinstalace*	70 dny	31.01. 23	10.04. 23
140	SO 703	Úprava zdi areálu VÚ 3255	220 dny	03.03. 22	08.10. 22
141	SO 704	Přístřešky na tramvajových zastávkách	394 dny	23.05. 22	20.06. 23
142	SO 705	Přístřešky na autobusových zastávkách	326 dny	30.07. 22	20.06. 23
143	SO 706	Zásobníky písku	60 dny	22.04. 23	20.06. 23
144	**D.8 800**	**Sadové úpravy a kácení**	**475 dny**	**03.03. 22**	**20.06. 23**
145	SO 801	Sadové úpravy	263 dny	01.10. 22	20.06. 23
146	SO 802	Kácení a ochrana zeleně	180 dny	03.03. 22	31.03. 23
147	**E**	**Zásady organizace výstavby a DIO**	**480 dny**	**03.03. 22**	**25.06. 23**
148	E.3	Úprava SSZ v rámci DIO	480 dny	03.03. 22	25.06. 23
149	**F**	**Ostatní náklady (společně za úseky 1, 3 a 4)**	**480 dny**	**03.03. 22**	**25.06. 23**
150	VON	Vedlejší a ostatní náklady	480 dny	03.03. 22	25.06. 23
151		Přejímací řízení, příprava k uvedení do zkušebního provozu	14 dny	12.06. 23	25.06. 23
