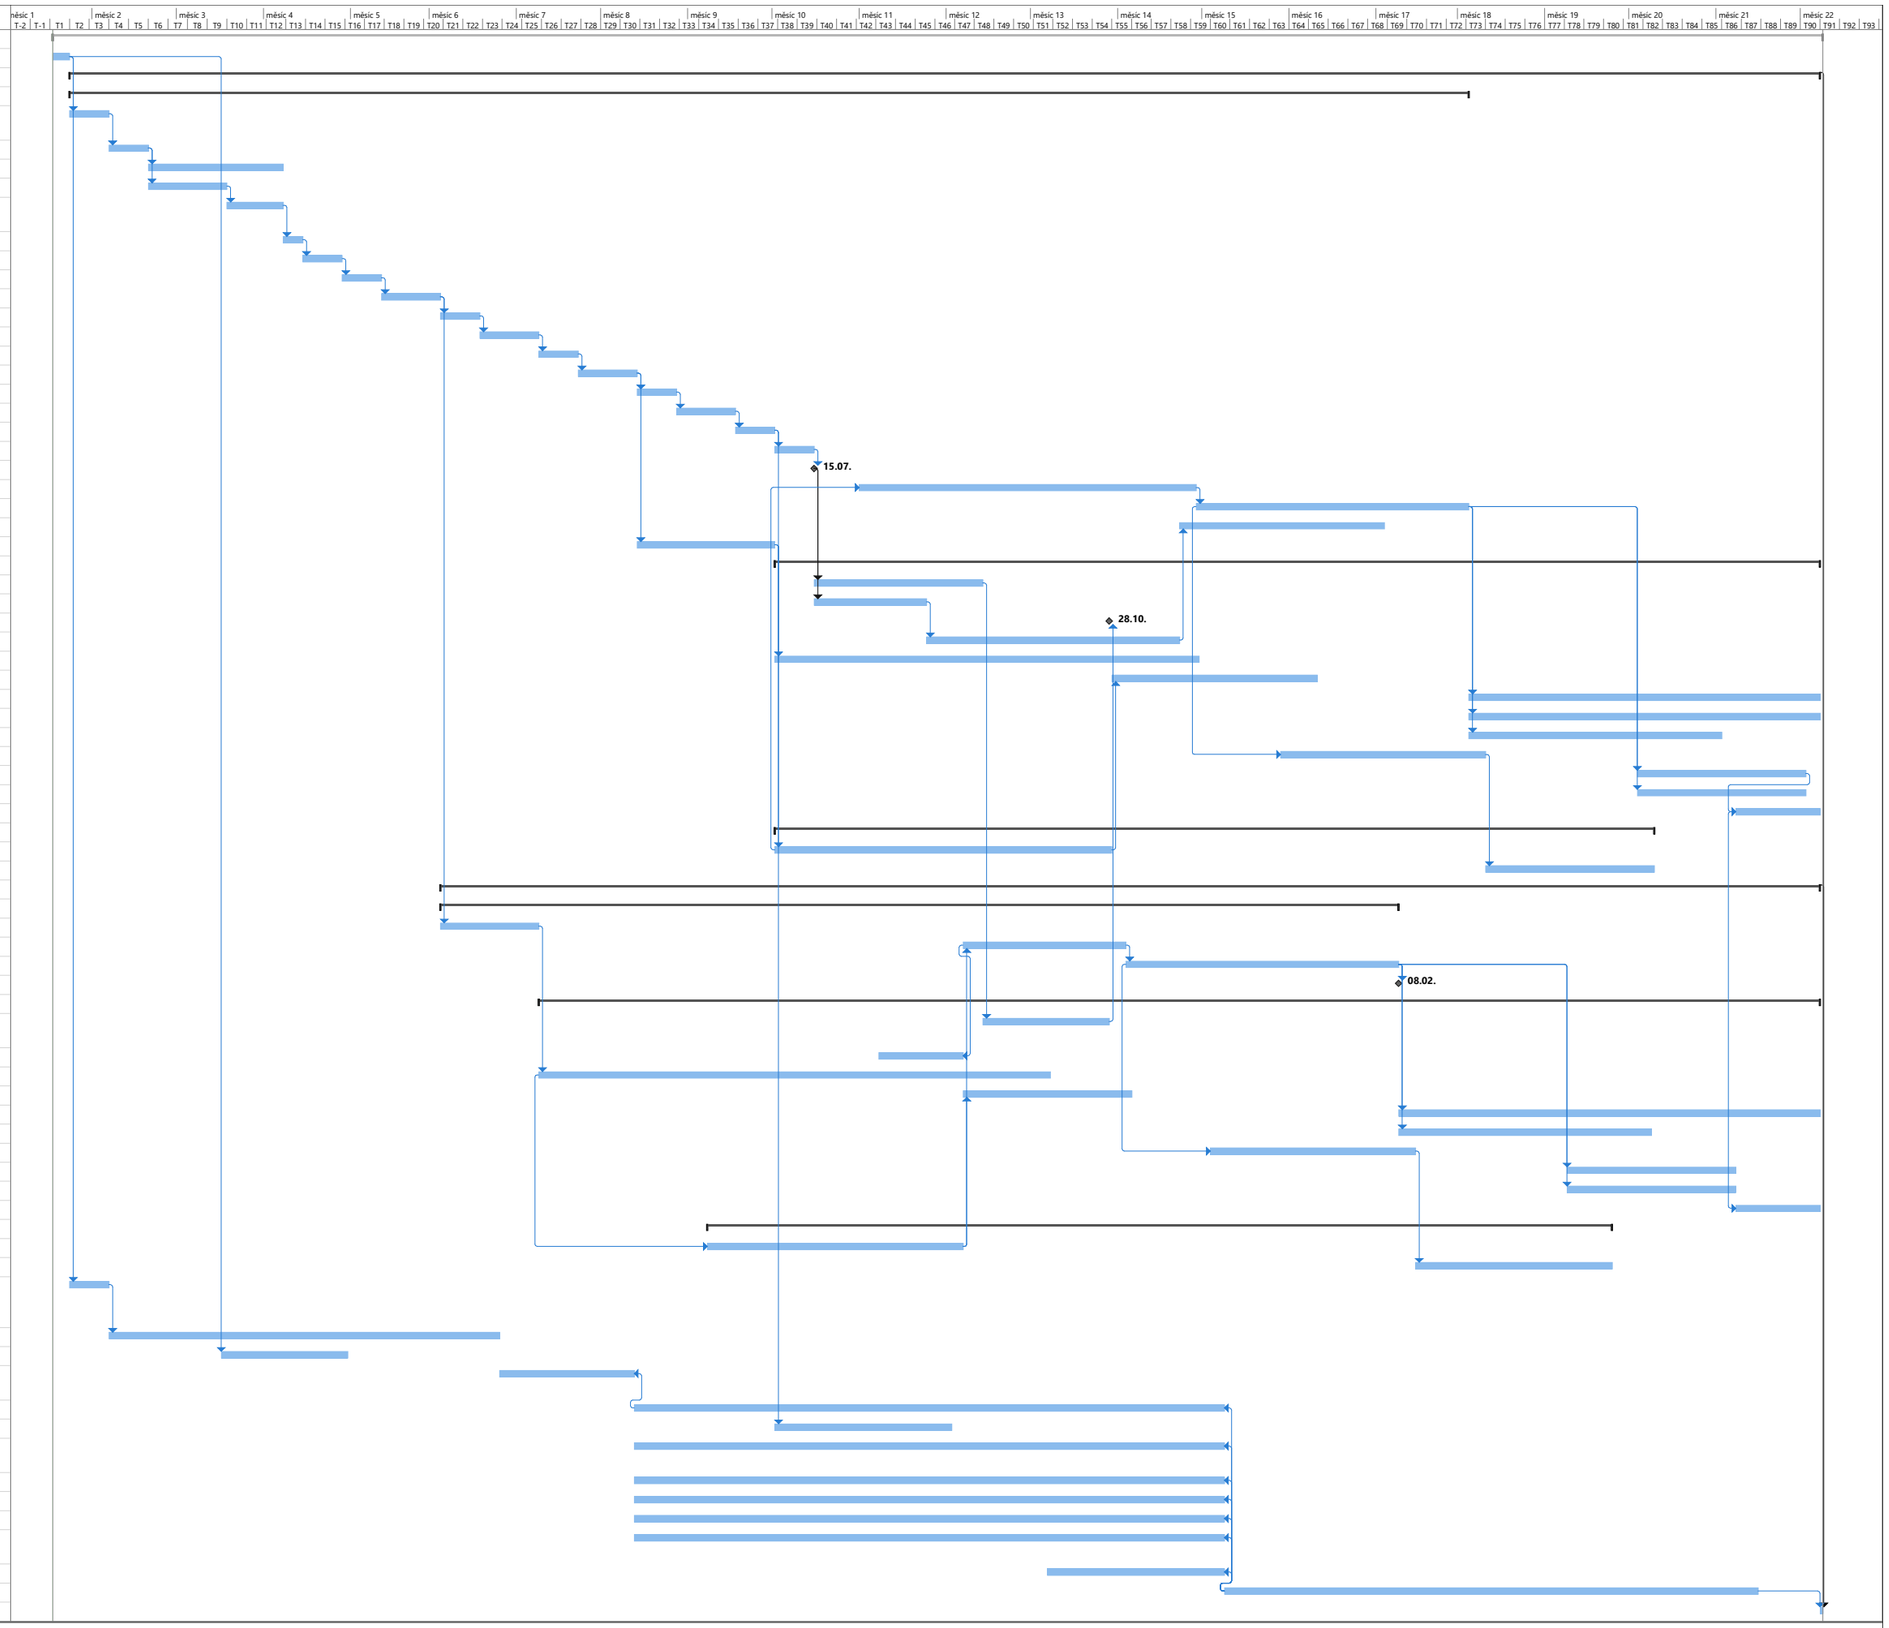ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
0		**DSP Kralovice - harmonogram zaháje**	**630 dny**	**18.10. 22**	**08.07. 24**	
1		Zařízení staveniště - zřízení	6 dny	18.10. 22	23.10. 22	
2		**Blok D**	**623 dny**	**24.10. 22**	**07.07. 24**	
3		**HSV**	**498 dny**	**24.10. 22**	**04.03. 24**	
4		Zemní práce - příprava pilotovací roviny	14 dny	24.10. 22	06.11. 22	1
5		Pilotové založení	14 dny	07.11. 22	20.11. 22	4
6		Základové pasy	48 dny	21.11. 22	07.01. 23	5
7		Ležatá kanalizace	28 dny	21.11. 22	18.12. 22	5
8		Zemní práce - zásyp kanalizace + kční vrstvy pod deskou	20 dny	19.12. 22	07.01. 23	7
9		Podkladní beton	7 dny	08.01. 23	14.01. 23	8
10		Izolace	14 dny	15.01. 23	28.01. 23	9
11		Základová deska	14 dny	29.01. 23	11.02. 23	10
12		Zdivo 1.PP	21 dny	12.02. 23	04.03. 23	11
13		Strop nad 1.PP	14 dny	05.03. 23	18.03. 23	12
14		Zdivo 1.NP	21 dny	19.03. 23	08.04. 23	13
15		Strop nad 1.NP	14 dny	09.04. 23	22.04. 23	14
16		Zdivo 2.NP	21 dny	23.04. 23	13.05. 23	15
17		Strop nad 2.NP	14 dny	14.05. 23	27.05. 23	16
18		Zdivo 3.NP	21 dny	28.05. 23	17.06. 23	17
19		Strop nad 3.NP	14 dny	18.06. 23	01.07. 23	18
20		Atika	14 dny	02.07. 23	15.07. 23	19
21		**Hrubá stavba**	**0 dny**	**15.07. 23**	**15.07. 23**	**20**
22		Omítky	120 dny	01.08. 23	28.11. 23	41SS+30 dny
23		Betonové podlahy	97 dny	29.11. 23	04.03. 24	22
24		Zateplení fasády	73 dny	23.11. 23	03.02. 24	30
25		Příčky - 1.PP keramické	49 dny	14.05. 23	01.07. 23	16
26		**PSV**	**372 dny**	**02.07. 23**	**07.07. 24**	
27		Střešní plášť	60 dny	16.07. 23	13.09. 23	21
28		Výplně vnější	40 dny	16.07. 23	24.08. 23	21
29		**Vodotěsnost budovy**	**0 dny**	**28.10. 23**	**28.10. 23**	**50**
30		Provětraná fasáda	90 dny	25.08. 23	22.11. 23	28
31		SDK příčky - 1.NP, 2.NP, 3.NP	151 dny	02.07. 23	29.11. 23	25
32		SDK podhledy	73 dny	30.10. 23	10.01. 24	41
33		Výtah	125 dny	05.03. 24	07.07. 24	23
34		Zámečnické kce	125 dny	05.03. 24	07.07. 24	23
35		Obklady, dlažby	90 dny	05.03. 24	02.06. 24	23
36		Malby, nátěry	73 dny	29.12. 23	10.03. 24	23SS+30 dny
37		Podlahy povlakové	60 dny	04.05. 24	02.07. 24	23FS+60 dny
38		Podlahy lité	60 dny	04.05. 24	02.07. 24	23FS+60 dny
39		Vnitřní dveře	30 dny	08.06. 24	07.07. 24	37FS-25 dny
40		**Technika prostředí staveb**	**313 dny**	**02.07. 23**	**09.05. 24**	
41		Rozvody	120 dny	02.07. 23	29.10. 23	25
42		Kompletace	60 dny	11.03. 24	09.05. 24	36
43		**Blok B - etapa I.**	**491 dny**	**05.03. 23**	**07.07. 24**	
44		**HSV**	**341 dny**	**05.03. 23**	**08.02. 24**	
45		Bourací práce	35 dny	05.03. 23	08.04. 23	12
46		Omítky	58 dny	07.09. 23	03.11. 23	61
47		Betonové podlahy	97 dny	04.11. 23	08.02. 24	46
48		**Betonové podlahy**	**0 dny**	**08.02. 24**	**08.02. 24**	**47**
49		**PSV**	**456 dny**	**09.04. 23**	**07.07. 24**	
50		Střešní plášť - napojení na přístavbu	45 dny	14.09. 23	28.10. 23	27
51		Výplně vnější	30 dny	08.08. 23	07.09. 23	46SF
52		SDK příčky	182 dny	09.04. 23	07.10. 23	45
53		SDK podhledy	60 dny	07.09. 23	05.11. 23	61
54		Zámečnické kce	150 dny	09.02. 24	07.07. 24	47
55		Obklady, dlažby	90 dny	09.02. 24	08.05. 24	47
56		Malby, nátěry	73 dny	04.12. 23	14.02. 24	47SS+30 dny
57		Podlahy povlakové	60 dny	09.04. 24	07.06. 24	47FS+60 dny
58		Podlahy lité	60 dny	09.04. 24	07.06. 24	47FS+60 dny
59		Vnitřní dveře	30 dny	08.06. 24	07.07. 24	39SS
60		**Technika prostředí staveb**	**322 dny**	**08.06. 23**	**24.04. 24**	
61		Rozvody	91 dny	08.06. 23	06.09. 23	52SS+60 dny
62		Kompletace	70 dny	15.02. 24	24.04. 24	56
63		Propojení stávající kanalizace mimo retenční jezírko (56 m, 3 x šachta)	14 dny	24.10. 22	06.11. 22	1
64		Retenční jezírko	139 dny	07.11. 22	25.03. 23	63
65		Vrty pro TČ - část 8 vrtů	45 dny	17.12. 22	30.01. 23	1FS+54 dny
66		Vrty pro TČ - část 12 vrtů (dle počasí)	48 dny	26.03. 23	13.05. 23	67SF
67		Primární okruh pro TČ	210 dny	13.05. 23	09.12. 23	75SF
68		Opěrné stěny - I.Etapa	63 dny	02.07. 23	02.09. 23	19
69		Vnější dešťová a splašková kanalizace	210 dny	13.05. 23	09.12. 23	75SF
70		Vnější vodovodní rozvody	210 dny	13.05. 23	09.12. 23	75SF
71		Vnější plynovodní rozvody	210 dny	13.05. 23	09.12. 23	75SF
72		Přípojka NN	210 dny	13.05. 23	09.12. 23	75SF
73		Přípojka sítě elektronických komunikací	210 dny	13.05. 23	09.12. 23	75SF
74		Veřejné osvětlení - etapa I.	63 dny	07.10. 23	09.12. 23	75SF
75		Komunikace	190 dny	09.12. 23	15.06. 24	
76		**Předání stavby**	**1 den**	**08.07. 24**	**08.07. 24**	**43;2;75**
