Oprava technologického vybavení NN v kolektoru Bx

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Oprava technologického vybavení NN v kolektoru Bx**	**50 dny**	**9.1. 23**	**17.3. 23**
2	Předání a převzetí pracoviště	1 den	9.1. 23	9.1. 23
3	Objednání a dodávka materiálu	30 dny	9.1. 23	17.2. 23
4	Vyhotovení konstrukční dokumentace pro RO14	5 dny	9.1. 23	13.1. 23
5	Výroba nového rozváděče RO14	5 dny	16.1. 23	20.1. 23
6				
7	**Montáže**	**45 dny**	**9.1. 23**	**10.3. 23**
8	Přípravné práce v kolektoru a R12	5 dny	9.1. 23	13.1. 23
9	Pospojení ocelových konstrukcí	10 dny	16.1. 23	27.1. 23
10	Pokládka nových kabelů dle projektu	10 dny	30.1. 23	10.2. 23
11	Montáž osvětlení kolektoru, včetně kabeláže	10 dny	8.2. 23	21.2. 23
12	Montáž zásuvek 230 a 400 VAC, včetně kabeláže	5 dny	20.2. 23	24.2. 23
13	Montáž houkaček, včetně kabeláže	5 dny	27.2. 23	3.3. 23
14	Pripojení servopohonu a vzduchotechniky	2 dny	6.3. 23	7.3. 23
15	Usazení rozváděče RO14	1 den	20.2. 23	20.2. 23
16	Postupné připojování technologie do RO14	15 dny	20.2. 23	10.3. 23
17	Montáž protipožárních ucpávek	2 dny	9.3. 23	10.3. 23
18				
19	**Zkoušky a uvedení do provozu**	**5 dny**	**13.3. 23**	**17.3. 23**
20	Individuální zkoušky rozváděčů a s návazností na technologii kolektoru	2 dny	13.3. 23	14.3. 23
21	Příprava dokladové části	2 dny	14.3. 23	15.3. 23
22	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	2 dny	14.3. 23	15.3. 23
23	Vyklizení a úklid kolektoru a R12	1 den	16.3. 23	16.3. 23
24	Předání díla objednateli	1 den	17.3. 23	17.3. 23

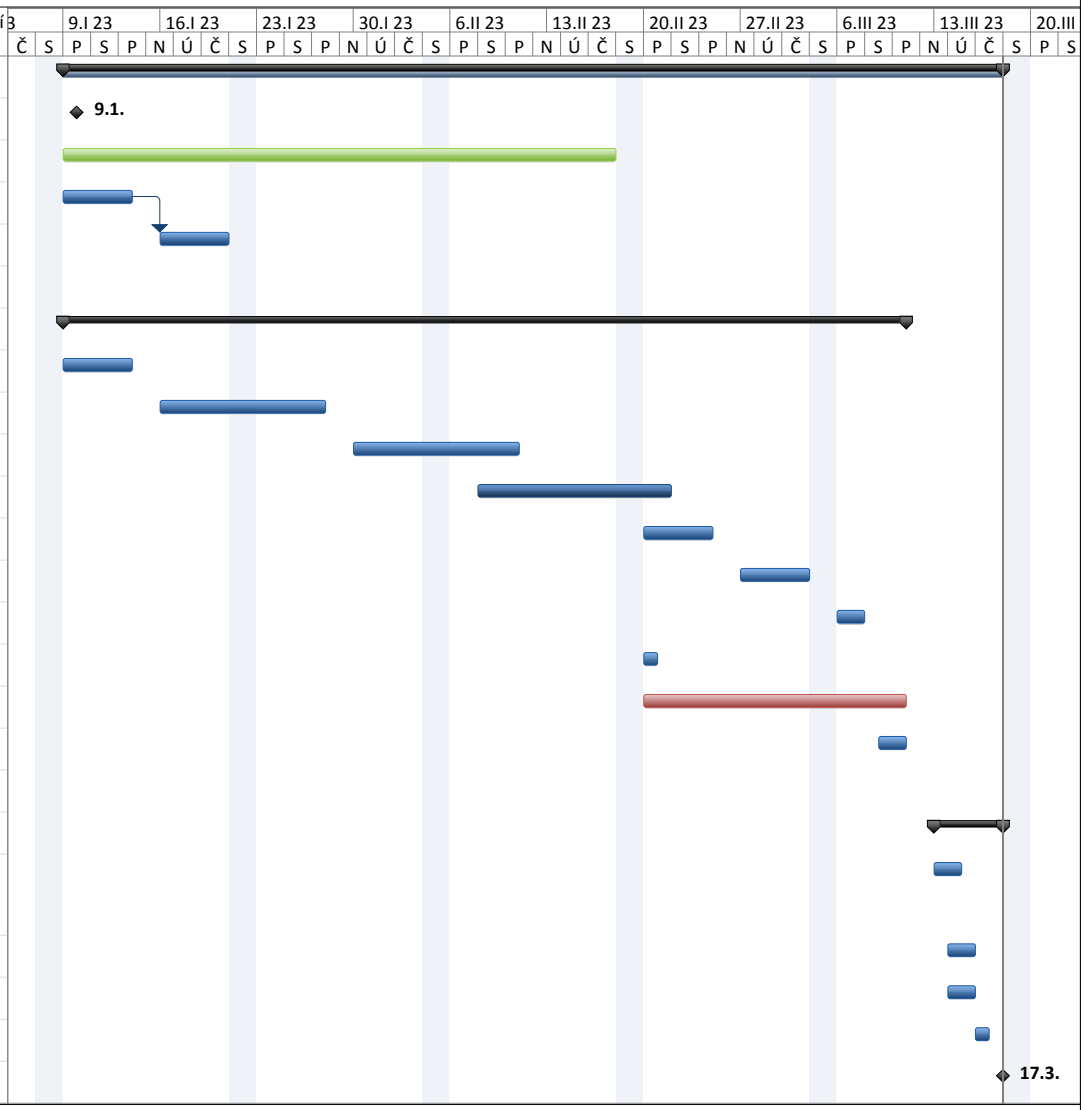

Projekt: NN kol. BX
Datum: 28.11. 22

Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	

UDÁVÁNÁ DOBA JE UVEDENA V PRACOVNÍCH DNECH
