ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Rozšíření provozu domu sv.Františka a novostavba azylového**	**502 dny**	**01.02. 22**	**30.06. 23**
2	Písemná výzva objednatele k převzetí staveniště	0 dny	01.02. 22	01.02. 22
3	Přípravné práce	7 dny	01.02. 22	07.02. 22
4	Demolice	21 dny	07.02. 22	27.02. 22
5	Zemní práce	49 dny	28.02. 22	17.04. 22
6	Piloty	21 dny	07.03. 22	27.03. 22
7	Podkladní betony 1.PP	2 dny	14.03. 22	15.03. 22
8	Vodorovná Izolace spodní stavby 1.PP	3 dny	21.03. 22	23.03. 22
9	Svislá izolace spodní stavby 1.PP	7 dny	14.04. 22	20.04. 22
10	Ležaté rozvody ZTI	21 dny	11.04. 22	01.05. 22
11	Podkladní betony 1.NP	21 dny	18.04. 22	08.05. 22
12	Izolace spodní stavby 1.NP pod zdivo	21 dny	25.04. 22	15.05. 22
13	**ŽBK**	**188 dny**	**21.03. 22**	**24.09. 22**
14	1.PP	21 dny	24.03. 22	13.04. 22
15	Základy 1.NP	35 dny	21.03. 22	24.04. 22
16	1.NP	35 dny	09.05. 22	12.06. 22
17	2.NP	28 dny	13.06. 22	10.07. 22
18	3.NP	35 dny	21.07. 22	24.08. 22
19	4.NP	28 dny	28.08. 22	24.09. 22
20	**Zděné konstrukce nosné**	**160 dny**	**02.05. 22**	**08.10. 22**
21	1.NP	28 dny	02.05. 22	29.05. 22
22	2.NP	28 dny	06.06. 22	03.07. 22
23	3.NP	28 dny	11.07. 22	07.08. 22
24	4.NP	28 dny	18.08. 22	14.09. 22
25	5NP	21 dny	18.09. 22	08.10. 22
26	Tesařské konstrukce	42 dny	02.10. 22	12.11. 22
27	Střechy	91 dny	16.10. 22	11.05. 23
28	**Příčky**	**140 dny**	**28.07. 22**	**14.12. 22**
29	1.NP	56 dny	28.07. 22	21.09. 22
30	2.NP	56 dny	25.08. 22	19.10. 22
31	3.NP	56 dny	22.09. 22	16.11. 22
32	4.NP	56 dny	20.10. 22	14.12. 22
33	Omítky	120 dny	10.11. 22	22.03. 23
34	Podlahy	90 dny	11.01. 23	10.04. 23
35	Obklady,dlažby	120 dny	01.02. 23	31.05. 23
36	SDK konstrukce, podhledy	120 dny	08.12. 22	19.04. 23
37	Vnější výplně otvorů	49 dny	16.10. 22	03.12. 22
38	Fasáda	230 dny	16.10. 22	15.06. 23
39	Povlakové krytiny	90 dny	15.03. 23	12.06. 23
40	Truhlářské konstrukce	28 dny	03.05. 23	30.05. 23
41	Malby	170 dny	08.12. 22	08.06. 23
42	Hrubé rozvody ZTI	90 dny	22.09. 22	20.12. 22
43	Silnoprod	200 dny	20.10. 22	20.05. 23
44	Slaboproud	200 dny	20.10. 22	20.05. 23
45	VZT	200 dny	20.10. 22	20.05. 23
46	UT	90 dny	08.12. 22	20.03. 23
47	Kompletace	65 dny	27.04. 23	30.06. 23
48	Dopravní řešení	28 dny	03.06. 23	30.06. 23
49	**Protokolární předání díla**	0 dny	30.06. 23	30.06. 23

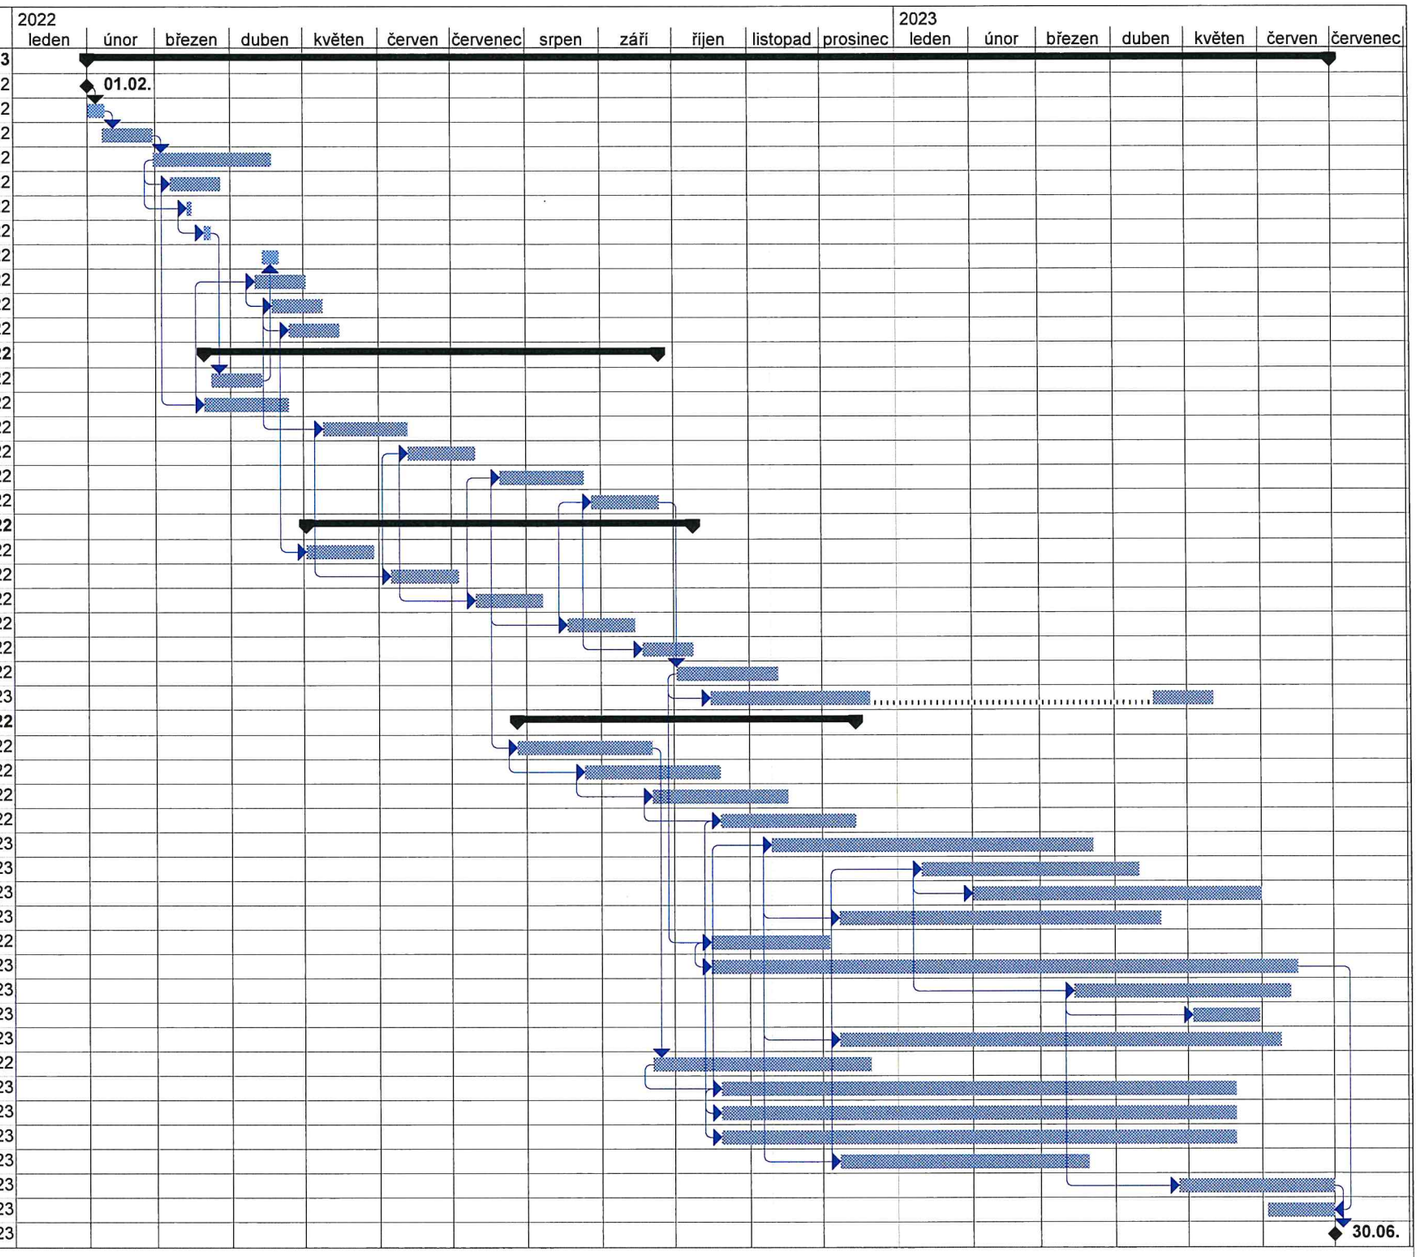

Datum: 10.11. 22

Úkol		Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly	
Rozdělení		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Milník		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Průběh	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Konečný termín	
Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení			
