Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo

Časový harmonogram prací
„Rekonstrukce OP JIH - 5. Etapa"

ID	Objekt / činnost / milník	Trvání (kal. dny)	Zahájení	Ukončení
1	**Postup provádění díla**	**72 dny**	**21.6. 17**	**31.8. 17**
2	***zahájení výstavby***	0 dny	21.6. 17	21.6. 17
3	zajištění vjezdu na staveniště dle požadavků investora	1 den	21.6. 17	21.6. 17
4	**SO 01.4 Zpevněné plochy**	**72 dny**	**21.6. 17**	**31.8. 17**
5	proviz. oplocení staveniště dle zásad ZOV	1 den	21.6. 17	21.6. 17
6	sejmutí ornice v tl. 100mm	1 den	22.6. 17	22.6. 17
7	zaříznutí obvodu bouraných vozovek	1 den	23.6. 17	23.6. 17
8	frézování asf. vrstev v tl. 50mm dle PD	1 den	23.6. 17	23.6. 17
9	vybourání stáv. CB desek tl. 270mm	8 dny	24.6. 17	1.7. 17
10	vybourání stáv. nestmelených vrstev vozovek tl. 190mm	7 dny	26.6. 17	2.7. 17
11	provedení podpůrného bet. prahu na J hraně a napoj. na TWY N dl. 167m	9 dny	28.6. 17	6.7. 17
12	provedení trativodů z trub flex. DN 100 dl. 365m	8 dny	30.6. 17	7.7. 17
13	provedení štěrb. žlabu typ IV dl. 150m	10 dny	4.7. 17	13.7. 17
14	úprava a zhutnění pláně na únosnost Edef,2 min. 60 MPa	3 dny	12.7. 17	14.7. 17
15	provedení podkl. nestmelené vrstvy ŠDa v tl. 200mm (CB) a tl. 220mm (AB)	5 dny	14.7. 17	18.7. 17
16	provedení podkl. stmelené vrstvy SC 0/32 C8/10 v tl. 250mm (CB) a tl. 150mm (AB)	6 dny	18.7. 17	23.7. 17
17	provedení CB krytu v tl. 280mm	10 dny	24.7. 17	2.8. 17
18	zrání CB krytu	28 dny	3.8. 17	30.8. 17
19	pokládka hutněných asf. vrstev ACP 70mm, ACL 60mm a ACO 40mm vč. spojovacích postřiků	9 dny	26.7. 17	3.8. 17
20	těsnění pracovních a styčných spár asf. zálivkou	10 dny	21.8. 17	30.8. 17
21	ohumusování a založení trávníku	3 dny	29.8. 17	31.8. 17
22	**SO 02.4 Kabelovody (Stavební úpravy pro SZZ)**	**46 dny**	**23.6. 17**	**7.8. 17**

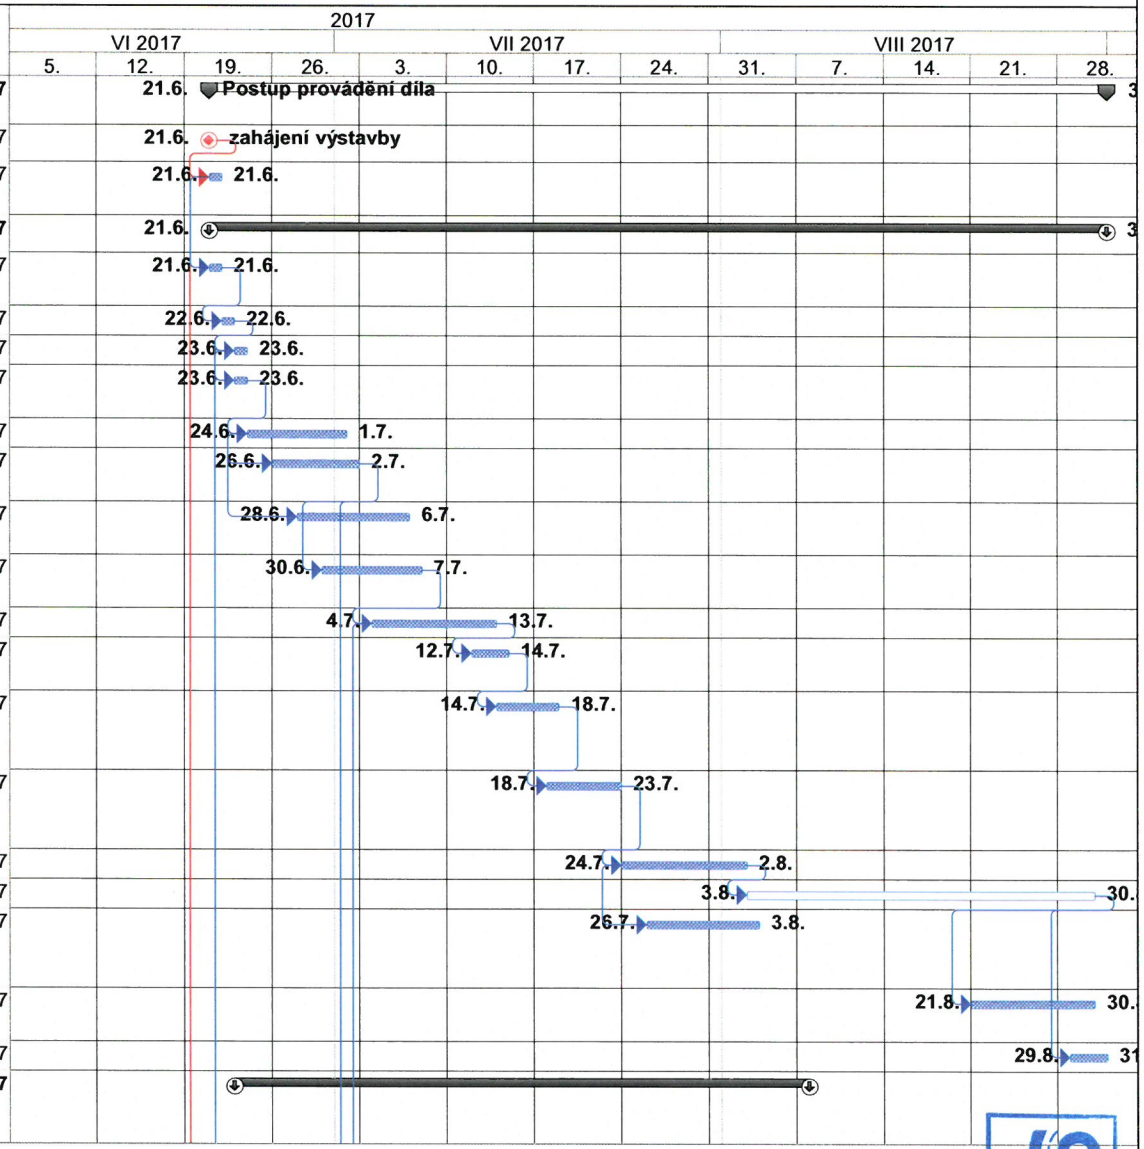

Datum : 26.4.2017, Praha

DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, a.s.
NA BĚLIDLE 198/21,

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo

Časový harmonogram prací

„Rekonstrukce OP JIH - 5. Etapa"

ID	Objekt / činnost / milník	Trvání (kal. dny)	Zahájení	Ukončení
23	výkopy jam a hloubení rýh pro instalaci kabel. šachet KŠ1 a kabelovodu	10 dny	23.6. 17	2.7. 17
24	vybourání stáv. kabel. šachet - 4 ks	6 dny	3.7. 17	8.7. 17
25	instalace KŠ 1 vč. montáže krycích desek a obsypů - 3ks	18 dny	9.7. 17	26.7. 17
26	osazení elektroinstal. trubky HDPE DN 110 dl. 105m	12 dny	27.7. 17	7.8. 17
27	**SO 03.4 Odvodnění**	**15 dny**	**3.7. 17**	**17.7. 17**
28	osazení kanal. šachty - 1ks	9 dny	3.7. 17	11.7. 17
29	kanal. přípojky DN200 od vpustí štěrb. žlabu - 5ks a DN300 od šachty ke stáv. kanalizaci - 1ks	10 dny	8.7. 17	17.7. 17
30	**SO 04.4 Oprava SZZ**	**69 dny**	**21.6. 17**	**28.8. 17**
31	demontáže prvků SZZ před zahájením stav. prací	1 den	21.6. 17	21.6. 17
32	dodávky a montáže prvků zařízení SZZ vč. provedení kabeláže	21 dny	8.8. 17	28.8. 17
33	**SO 05.4 Provozní opatření**	**71 dny**	**21.6. 17**	**31.8. 17**
34	zavedení provozních opatření dle PD	1 den	21.6. 17	21.6. 17
35	odstranění provozních opatření dle PD	1 den	30.8. 17	31.8. 17
36	dokončovací práce na celé ploše - VDZ (provádí složka letiště), odstranění ZS atp.	2 dny	29.8. 17	31.8. 17
37	***ukončení výstavby***	0 dny	31.8. 17	31.8. 17

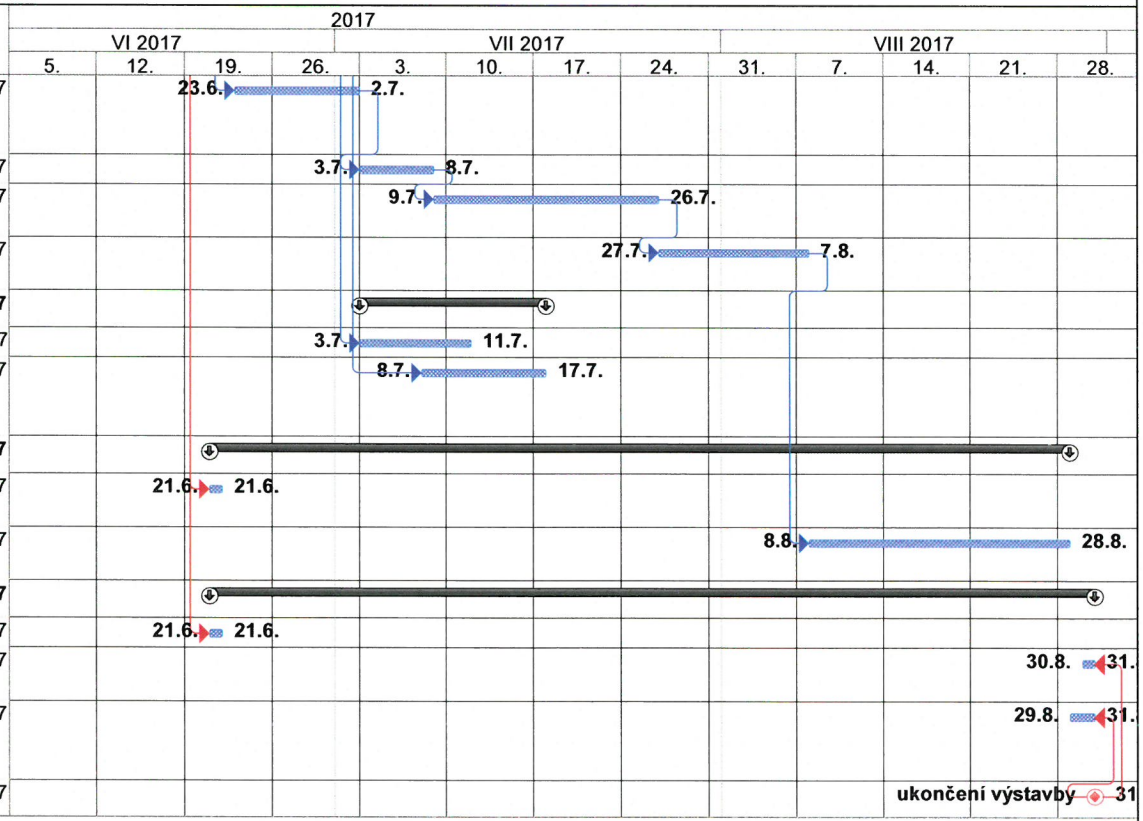

DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, a.s.
NA BĚLIDLE 198/21,
CZ - 150 00 PRAHA 5
