Příloha č.9: Harmonogram prací

ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad**	**988 dny**	**01.09. 21**	**15.05. 24**
2		Zahájení stavby	1 den	01.09. 21	01.09. 21
3		**Autorský dozor**	**988 dny**	**01.09. 21**	**15.05. 24**
4		**Technický dozor investora**	**988 dny**	**01.09. 21**	**15.05. 24**
5		**Zábor - zařízení staveniště - úroveň terénu**	**988 dny**	**01.09. 21**	**15.05. 24**
6		**Výstavba výtahu**	**988 dny**	**01.09. 21**	**15.05. 24**
7		**Stavební objekty**	**907 dny**	**01.09. 21**	**24.02. 24**
8		Příprava území	5 dny	01.09. 21	05.09. 21
9		Archeologický průzkum	14 dny	06.09. 21	19.09. 21
10	SO 11	Přípojka VN staveniště	14 dny	06.09. 21	19.09. 21
11	SO 14	Protihluková opatření	14 dny	13.09. 21	22.02. 24
12		Objekty zařízení staveniště, zpevněná plocha (+ přípojka vody a kanalizace)	14 dny	13.09. 21	22.02. 24
13		Dopravně inženýrská opatření	4 dny	06.09. 21	24.02. 24
14	**SO 02**	**Šachta - těžní a montážní - ražba + primární ostění**	**839 dny**	**20.09. 21**	**06.01. 24**
15		**SO 02/01 Stavební jáma**	**182 dny**	**20.09. 21**	**20.03. 22**
16		Příprava plochy pro stavební jámu	3 dny	20.09. 21	22.09. 21
17		Vrtání zápor	12 dny	23.09. 21	04.10. 21
18		Odtěžování a zajištění stavební jámy	10 dny	05.10. 21	14.10. 21
19		Kotvení stavební jámy 1. úrovně	10 dny	15.10. 21	24.10. 21
20		Pokračování odtěžování a zajištění stavební jámy	12 dny	25.10. 21	05.11. 21
21		Kotvení stavební jámy 2. úrovně	10 dny	06.11. 21	15.11. 21
22		Pokračování odtěžování a zajištění stavební jámy	15 dny	16.11. 21	30.11. 21
23		Kotvení stavební jámy 3. úrovně	10 dny	01.12. 21	10.12. 21
24		Těžba šachty Š1 a výstavba primárního ostění Š1 do úrovně +231,730 mnm	100 dny	11.12. 21	20.03. 22
25		**SO 02/02 Ražba přestupní chodby**	**138 dny**	**21.03. 22**	**05.08. 22**
26		Ražba přestupní chodby metodou NRTM	138 dny	21.03. 22	05.08. 22
27		**SO 02/02 Ražba schodišťové šachty Š2.1**	**249 dny**	**06.08. 22**	**11.04. 23**
28		Příprava prostoru pro ražbu Š2.1	5 dny	06.08. 22	10.08. 22
29		Těžba šachty Š2.1 a výstavba primárního ostění Š2.1 do úrovně cca+223,4 mnm	85 dny	11.08. 22	03.11. 22
30		Horninová injektáž úpatní	7 dny	04.11. 22	10.11. 22
31		Těžba šachty Š2.1 a výstavba primárního ostění Š2.1 do úrovně cca+212,165 mnm	70 dny	11.11. 22	19.01. 23
32		Horninová injektáž horizontální	8 dny	20.01. 23	27.01. 23
33		Těžba šachty výtahů Š2.2	45 dny	28.01. 23	13.03. 23
34		Ražba přestupní chodby v úrovni nástupiště	14 dny	14.03. 23	27.03. 23
35		Instalace dočasných trubních rozpěr	5 dny	28.03. 23	01.04. 23
36		**Vybourání ŽB čelní stěny SST**	**10 dny**	**02.04. 23**	**11.04. 23**
37		Hydroizolace	120 dny	12.04. 23	09.08. 23
38		Sekundární ostění	130 dny	22.04. 23	29.08. 23
39		Výstavba schodišť	70 dny	30.08. 23	07.11. 23

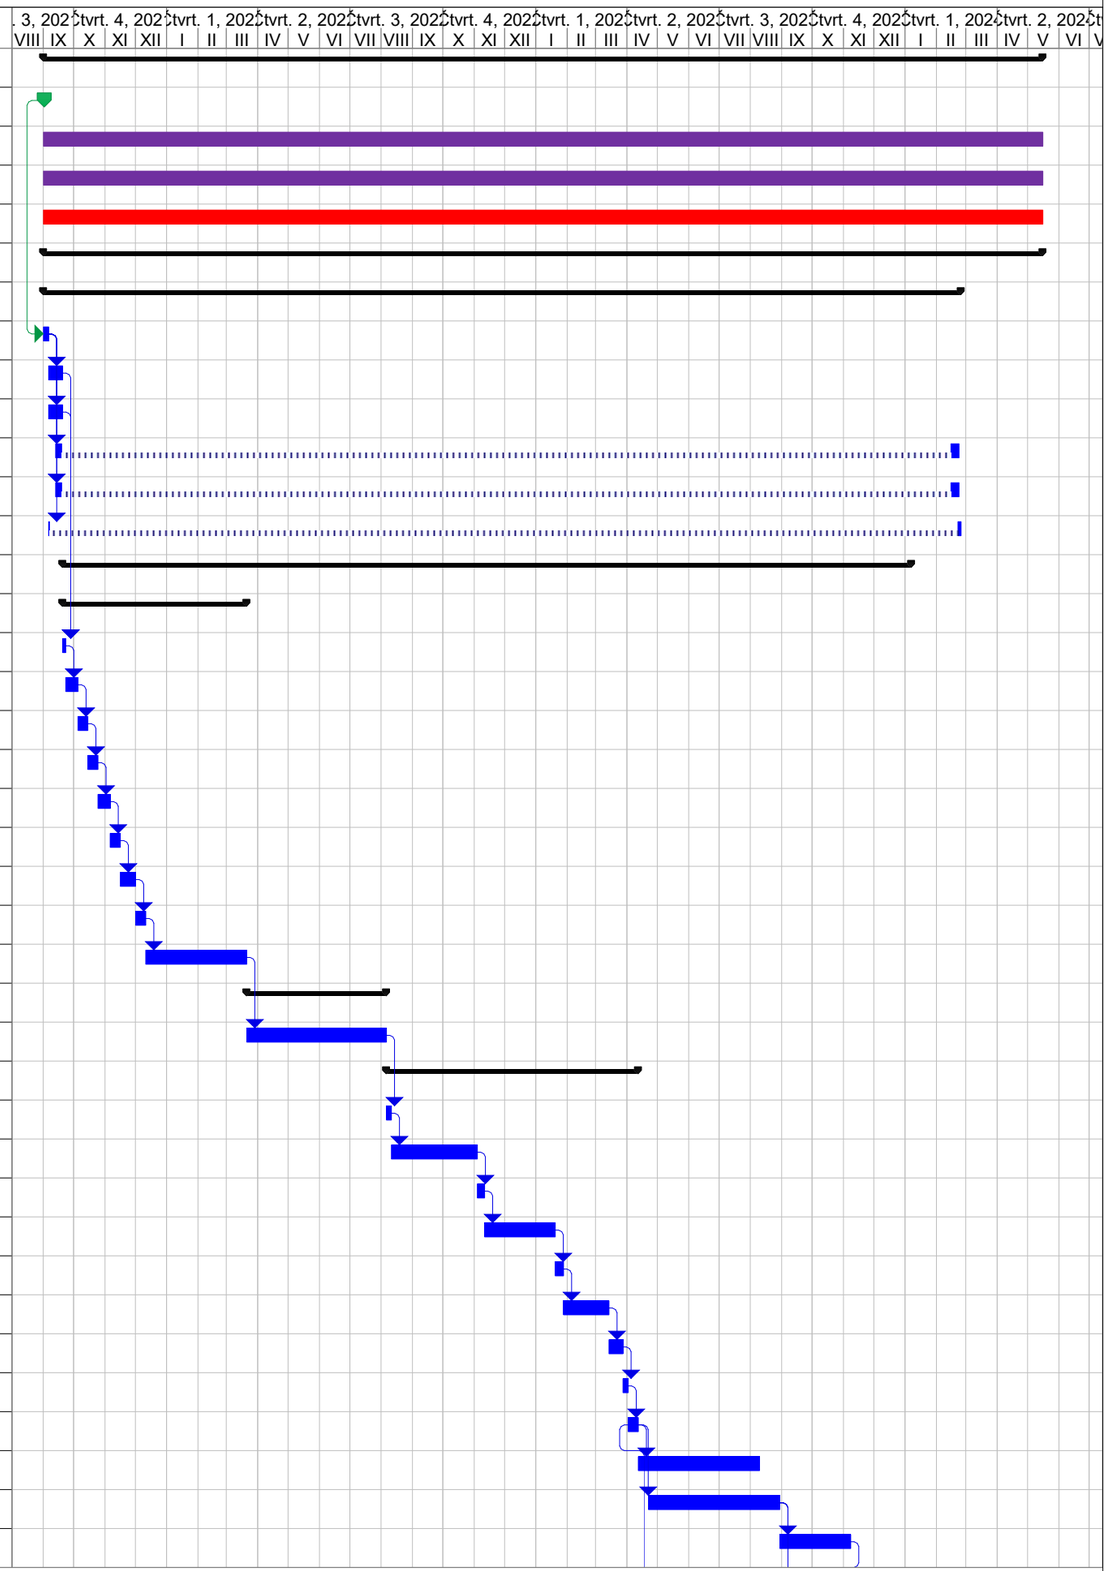

Příloha č.9: Harmonogram prací

ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
40	PS 94-1	Instalace výtahů z ÚN do přestupní chodby	35 dny	09.10. 23	12.11. 23
41	PS 94-1	Instalace výtahů z přestupní chodby na ÚT	55 dny	13.11. 23	06.01. 24
42		Zásypy, zrušení šachty	14 dny	30.08. 23	12.09. 23
43	**SO 01/06**	**Bezbariérové zpřístupnění**	**150 dny**	**30.08. 23**	**26.01. 24**
44		HSV+PSV	150 dny	30.08. 23	26.01. 24
45		Výstavba kiosku pro výtah na ÚT	40 dny	11.12. 23	19.01. 24
46	**SO 10**	**Vnější kanalizace - ražená přípojka**	**89 dny**	**13.09. 23**	**10.12. 23**
47		Ražba kanalizační přípojky	70 dny	13.09. 23	21.11. 23
48		Uložení a zabetonování potrubí	15 dny	22.11. 23	06.12. 23
49		Napojení kanalizační přípojky	4 dny	07.12. 23	10.12. 23
50		Komunikace - definitivní úpravy	15 dny	20.01. 24	03.02. 24
51	SO 12	Sadové úpravy	10 dny	04.02. 24	13.02. 24
52		**Provozní soubory**	**247 dny**	**11.09. 23**	**14.05. 24**
53	PS 82	OSM vč. předstihových prací	50 dny	11.09. 23	30.10. 23
54	PS 91-1	Silové rozvody	45 dny	28.11. 23	11.01. 24
55	PS 91-80	MDT vč. předstihových prací	60 dny	11.09. 23	09.11. 23
56	PS 92	Zabezpečovací zařízení	20 dny	21.02. 24	11.03. 24
57	PS 93-1	Slaboproudá zařízení	50 dny	12.01. 24	01.03. 24
58	PS 93-2	EPS	20 dny	21.02. 24	11.03. 24
59	PS 94-1	Strojní zařízení	92 dny	28.11. 23	27.02. 24
60	PS 94-2	Čerpací stanice	20 dny	14.02. 24	04.03. 24
61	PS 95	VZT	80 dny	18.12. 23	06.03. 24
62	PS 96-2	ASDŘ-E	10 dny	28.02. 24	08.03. 24
63	PS 96-3	ASDŘ-T	10 dny	19.03. 24	28.03. 24
64	PS 97-1	Tlakové těsnění	8 dny	29.03. 24	05.04. 24
65	PS 97-2	Požární těsnění	11 dny	06.04. 24	16.04. 24
66		Zkušební provoz, revize, přejímky	28 dny	17.04. 24	14.05. 24
67		**Dokončení stavby, kolaudace**	**1 den**	**15.05. 24**	**15.05. 24**
68					
69		**Modernizace eskalátorů ve stanici Jiřího z Poděbrad - SO, PS**	**406 dny**	**20.09. 22**	**30.10. 23**
70		**Přípravné práce (podchod, vestibul - práce v noci a v lokálních záborech)**	**116 dny**	**20.09. 22**	**14.01. 23**
71		Zařízení staveniště	5 dny	20.09. 22	25.09. 22
72		Přípravné práce	15 dny	25.09. 22	10.10. 22
73	SO 01	Stavební část - předstihové práce v podchodech a vestibulu	96 dny	10.10. 22	14.01. 23
74	SO 01	příprava na uzavření podchodu	10 dny	04.01. 23	14.01. 23
75		**Omezení provozu stanice**	**290 dny**	**14.01. 23**	**30.10. 23**
76		**Stanice uzavřena - omezený průchod mezi vstupy**	**290 dny**	**14.01. 23**	**30.10. 23**
77		**Úroveň nástupiště, Eskalátorový tunel, Úroveň vestibulu**	**9 dny**	**14.01. 23**	**22.01. 23**
78		Zábor - zařízení staveniště	3 dny	14.01. 23	16.01. 23

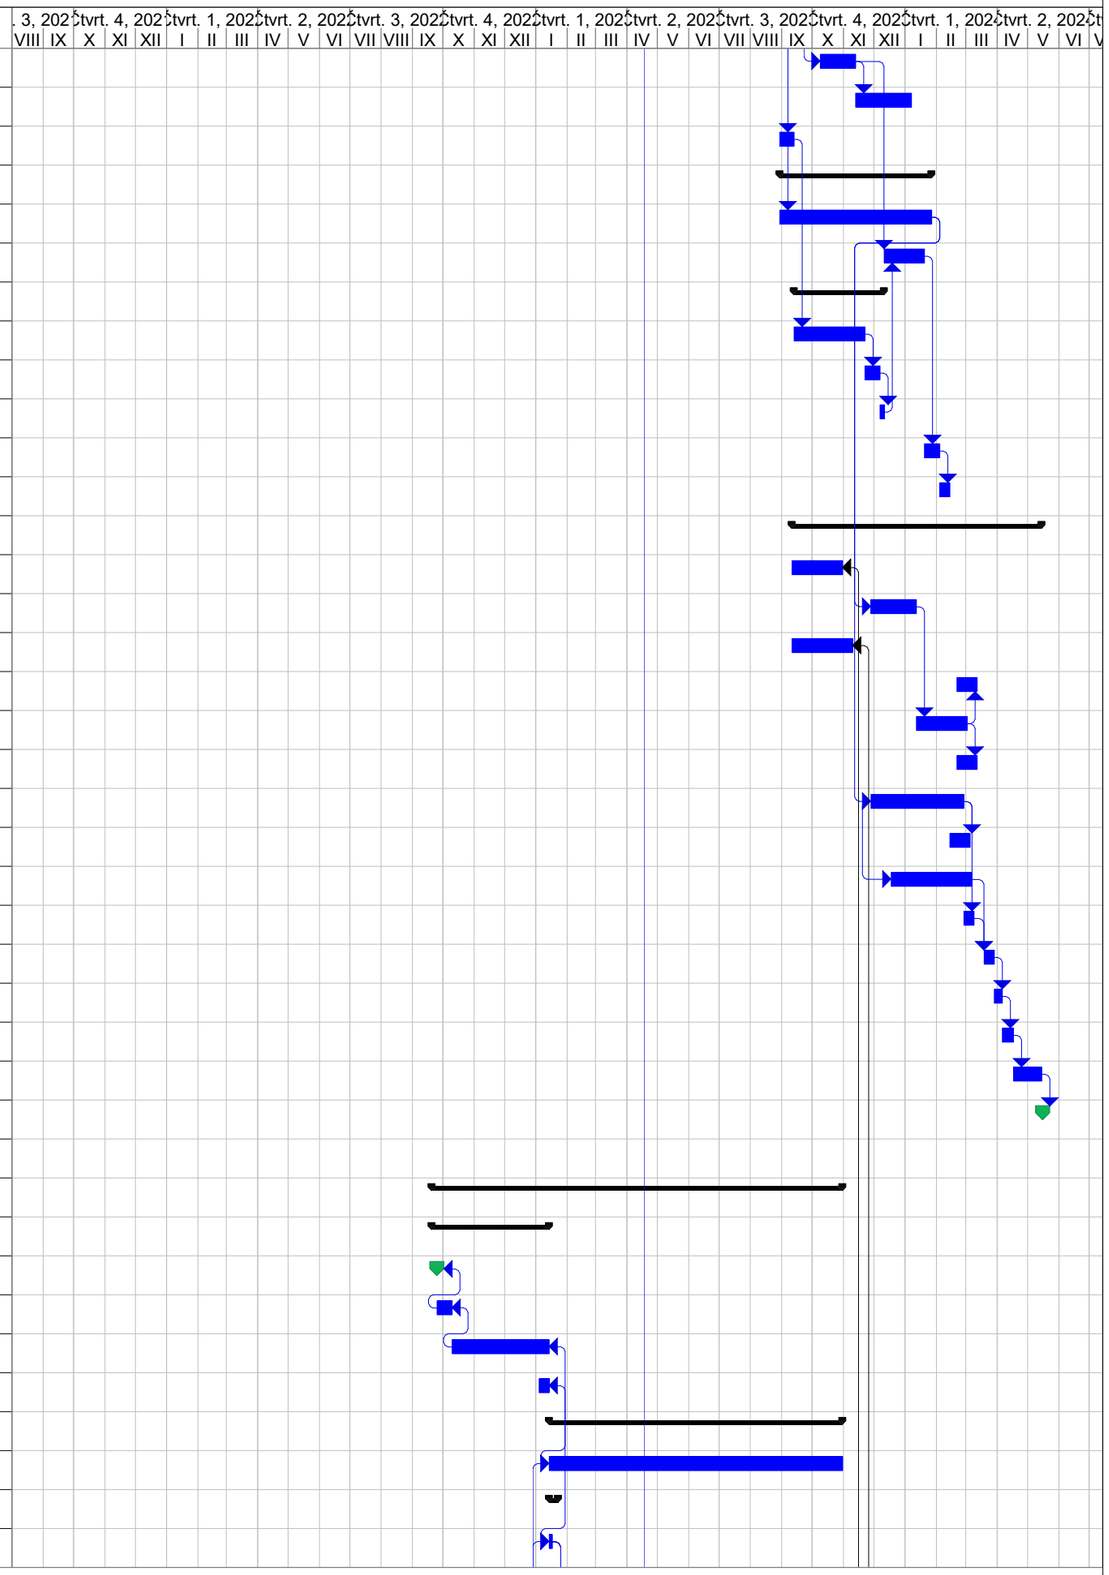

Příloha č.9: Harmonogram prací

ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
79	SO 09	Stavební část - ochrana stávajících povrchů	8 dny	15.01. 23	22.01. 23
80	**SO 05**	**Informační systém**	**4 dny**	**17.01. 23**	**20.01. 23**
81	SO 05	Montáž provizorního informačního systému	2 dny	17.01. 23	18.01. 23
82	SO 05	Demontáž stávajícího informačního systému	2 dny	19.01. 23	20.01. 23
83	SO 06	Reklamní systém - demontáž	2 dny	15.01. 23	16.01. 23
84	**SO 01**	**Stavební část**	**10 dny**	**17.01. 23**	**26.01. 23**
85	SO 01	Demontáž obkladů - eskt. Tunel - dokončení	10 dny	17.01. 23	26.01. 23
86	SO 01	Demontáž podhledových lamel - ÚV - dokončení	10 dny	17.01. 23	26.01. 23
87	PS 94-1	Strojní zařízení - kompletní demontáž esk. Ev. Č. 119, 120, 121	35 dny	22.01. 23	25.02. 23
88		Dmtž přístřešků Slavíkova/ Vinohradská	14 dny	08.03. 23	21.03. 23
89		Dmtž, Mtž krátké eskalátory UT - UV - 2 ks	60 dny	22.03. 23	20.05. 23
90	SO 03	Elektroinstalace, osvětlení - demontáž	10 dny	27.01. 23	05.02. 23
91	PS 93-1	Slaboproudá zařízení - demontáž	10 dny	02.02. 23	11.02. 23
92		Zařízení staveniště - osvětlení - montáž	24 dny	27.01. 23	21.06. 23
93	**SO 01**	**Stavební část**	**115 dny**	**26.02. 23**	**20.06. 23**
94	SO 01	Vybourání úložných boků v esk. tunelu	21 dny	26.02. 23	18.03. 23
95	SO 01	Vybourání původních esk. základů	14 dny	26.02. 23	11.03. 23
96	SO 01	Demontáž zontů	10 dny	19.03. 23	28.03. 23
97	SO 01	Sanace tybinek	35 dny	29.03. 23	02.05. 23
98	SO 01	Stávající konstrukce - sanace	14 dny	19.03. 23	01.04. 23
99	SO 01	Nosné konstrukce	35 dny	29.03. 23	02.05. 23
100	SO 01	Stavební připravenost pro mtž nových eskalátorů	21 dny	28.04. 23	18.05. 23
101	SO 01	Zpětná montáž zontů	28 dny	03.05. 23	30.05. 23
102	SO 01	Lokální výměna dlažby	21 dny	31.05. 23	20.06. 23
103	PS 91-1	Silové rozvody	20 dny	26.02. 23	08.08. 23
104	PS 95	VZT	22 dny	26.02. 23	01.08. 23
105		ZTI	20 dny	26.02. 23	10.06. 23
106	**PS 94-1**	**Strojní zařízení - eskalátory ev. č. 119, 120, 121**	**90 dny**	**31.05. 23**	**28.08. 23**
107	PS 94-1	Transport + hrubá montáž eskalátorů	42 dny	31.05. 23	11.07. 23
108	PS 94-1	Definitivní uložení eskalátorů	48 dny	12.07. 23	28.08. 23
109	SO 03	Elektroinstalace, osvětlení - montáž	30 dny	09.08. 23	07.09. 23
110	PS 93-1	Slaboproudá zařízení - montáž	15 dny	24.08. 23	07.09. 23
111		Zařízení staveniště - osvětlení - demontáž	5 dny	07.09. 23	11.09. 23
112	**SO 01**	**Stavební část**	**14 dny**	**29.08. 23**	**11.09. 23**
113	SO 01	Montáž obkladů - esk. tunel	14 dny	29.08. 23	11.09. 23
114	SO 01	Montáž podhledových lamel - ÚV	14 dny	29.08. 23	11.09. 23
115	SO 07	ASDŘ-O	14 dny	08.09. 23	21.09. 23
116	PS 96-3	ASDŘ-T	14 dny	08.09. 23	21.09. 23
117	PS 93-2	EPS	14 dny	22.09. 23	05.10. 23

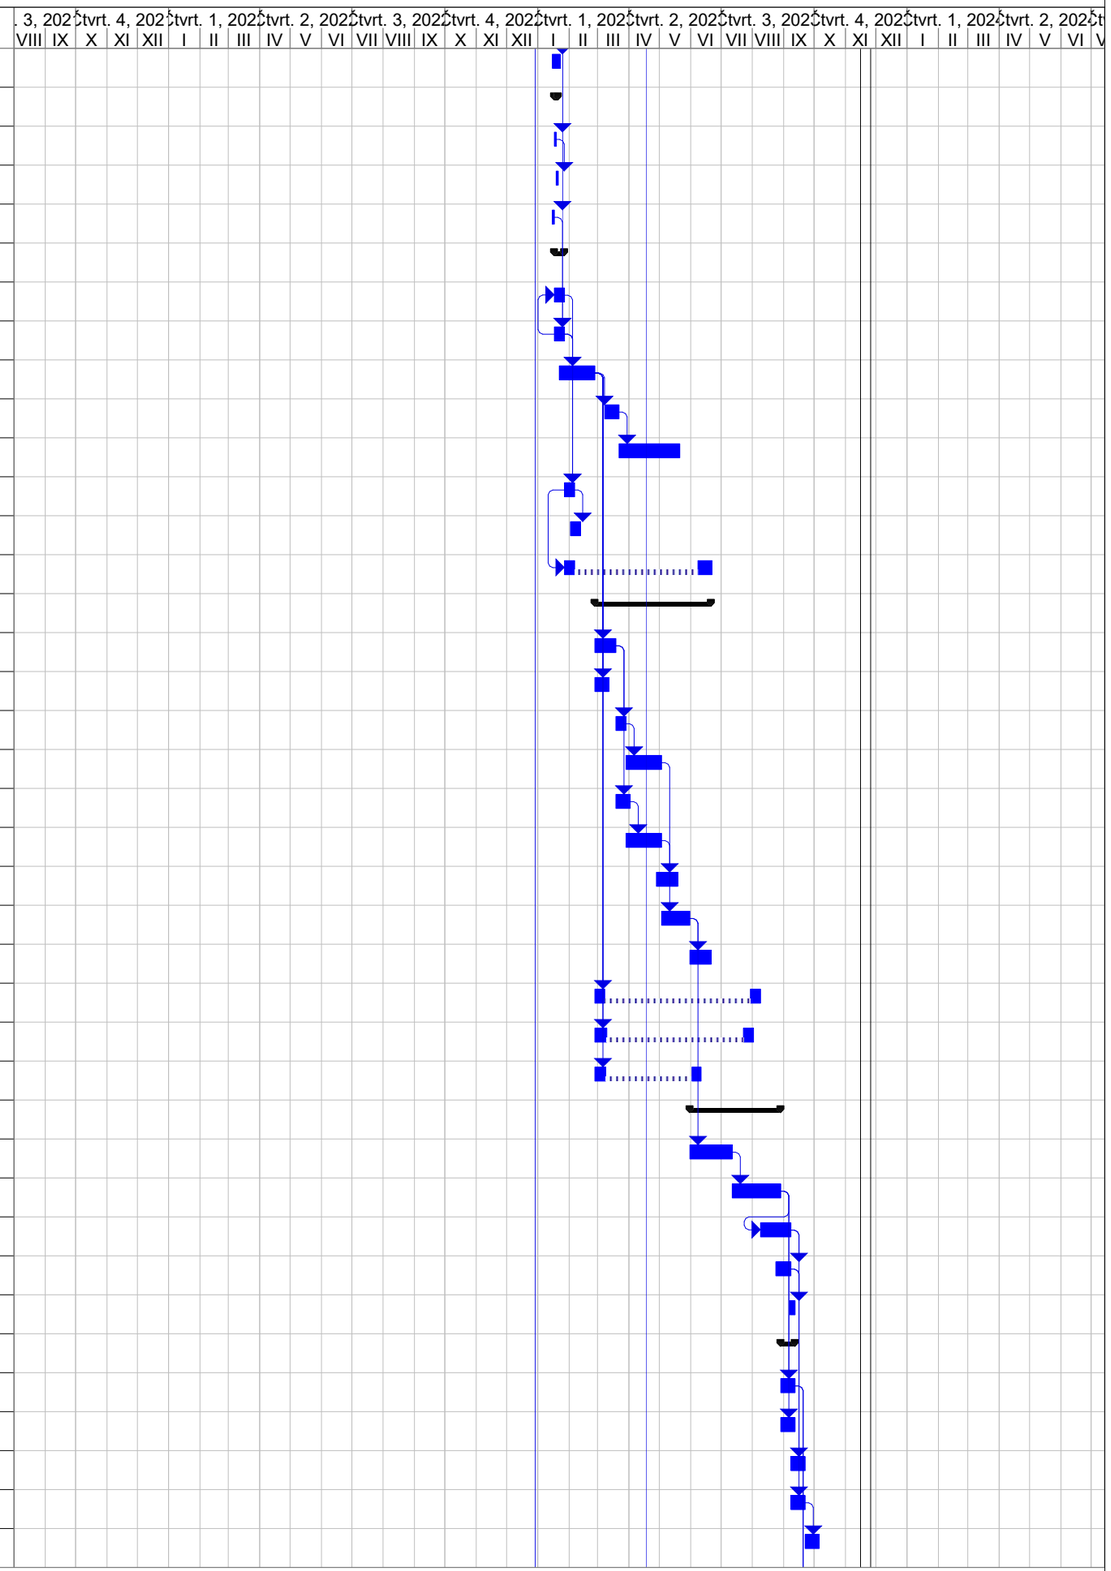

Příloha č.9: Harmonogram prací

ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
118	PS 97-1	Tlakové těsnění	14 dny	26.09. 23	09.10. 23
119	**SO 05**	**Informační systém**	**4 dny**	**12.09. 23**	**15.09. 23**
120	SO 05	Montáž definitivního informačního systému	2 dny	12.09. 23	13.09. 23
121	SO 05	Demontáž provizorního informačního systému	2 dny	14.09. 23	15.09. 23
122	SO 06	Reklamní systém - montáž	3 dny	16.09. 23	18.09. 23
123	SO 01	Stavební část - dokončovací práce	14 dny	12.09. 23	25.09. 23
124		**Schvalování, přejímky**	**29 dny**	**02.10. 23**	**30.10. 23**
125		Předání výchozích revizí	1 den	02.10. 23	02.10. 23
126		Komplexní vyzkoušení	10 dny	03.10. 23	12.10. 23
127		Vydání průkazu způsobilosti	19 dny	08.10. 23	26.10. 23
128		Schvalovací řízení	3 dny	27.10. 23	29.10. 23
129		**Přejímací řízení**	**1 den**	**30.10. 23**	**30.10. 23**
130		Zábor - zařízení staveniště - likvidace	2 dny	27.09. 23	28.09. 23
131		Úklid po stavbě	3 dny	29.09. 23	01.10. 23
132		**Ukončení stavby**	**1 den**	**31.10. 23**	**31.10. 23**
133					
134		**Modernizace stanice metra - Jiřího z Poděbrad**	**377 dny**	**19.10. 22**	**30.10. 23**
135		Zahájení prací ve stanici	1 den	23.10. 22	24.10. 22
136		**Přípravné práce (stanice v provozu - práce v noci a v lokálních záborech)**	**165 dny**	**19.10. 22**	**02.04. 23**
137		Zařízení staveniště	5 dny	19.10. 22	24.10. 22
138	SO 01	Stavební část - předstihové práce, dmt kamenných obkladů	82 dny	24.10. 22	14.01. 23
139		Příprava na proražení čelní stěny	10 dny	23.03. 23	02.04. 23
140		**Omezení provozu stanice**	**290 dny**	**14.01. 23**	**30.10. 23**
141		**Stanice uzavřena - vlak pouze projíždí**	**290 dny**	**14.01. 23**	**30.10. 23**
142		**Práce v uzavřené stanici metra - úroveň nástupiště**	**290 dny**	**14.01. 23**	**30.10. 23**
143		**Uzavření stanice pro cestující (vlak pouze projíždí)**	**290 dny**	**14.01. 23**	**30.10. 23**
144		Zábor - zařízení staveniště	1 den	14.01. 23	14.01. 23
145	SO 02	Informační systém - demontáž	5 dny	15.01. 23	19.01. 23
146	SO 03	Osvětlení stanice - demontáž stávajícího osvětlení	10 dny	15.01. 23	24.01. 23
147	PS 93	Slaboproud - demontáž stávajícího slaboproudého vedení	10 dny	20.01. 23	29.01. 23
148	SO 01	Stavební část - demontáž obkladů - dokončení	14 dny	25.01. 23	07.02. 23
149	SO 01	Stavební část - demontáž zontů	30 dny	29.01. 23	27.02. 23
150	SO 03	Přetěsnění spár, injektáže	60 dny	08.02. 23	08.04. 23
151	SO 01	Stavební část - odstranění vstupu do OSM (kolej č.1 a č.2)	120 dny	28.02. 23	27.06. 23
152	SO 01	Stavební část - oprava bezpečnostního pásu (kolej č.1 a č.2)	28 dny	02.06. 23	29.06. 23
153	**SO 01**	**Stavební část - montáž nových zontů**	**54 dny**	**09.04. 23**	**01.06. 23**
154	SO 01	Stavební část - nosný rošt	28 dny	09.04. 23	06.05. 23
155	SO 01	Stavební část - desky	40 dny	23.04. 23	01.06. 23
156	SO 01	Stavební část - oprava pilířů	60 dny	08.02. 23	08.04. 23

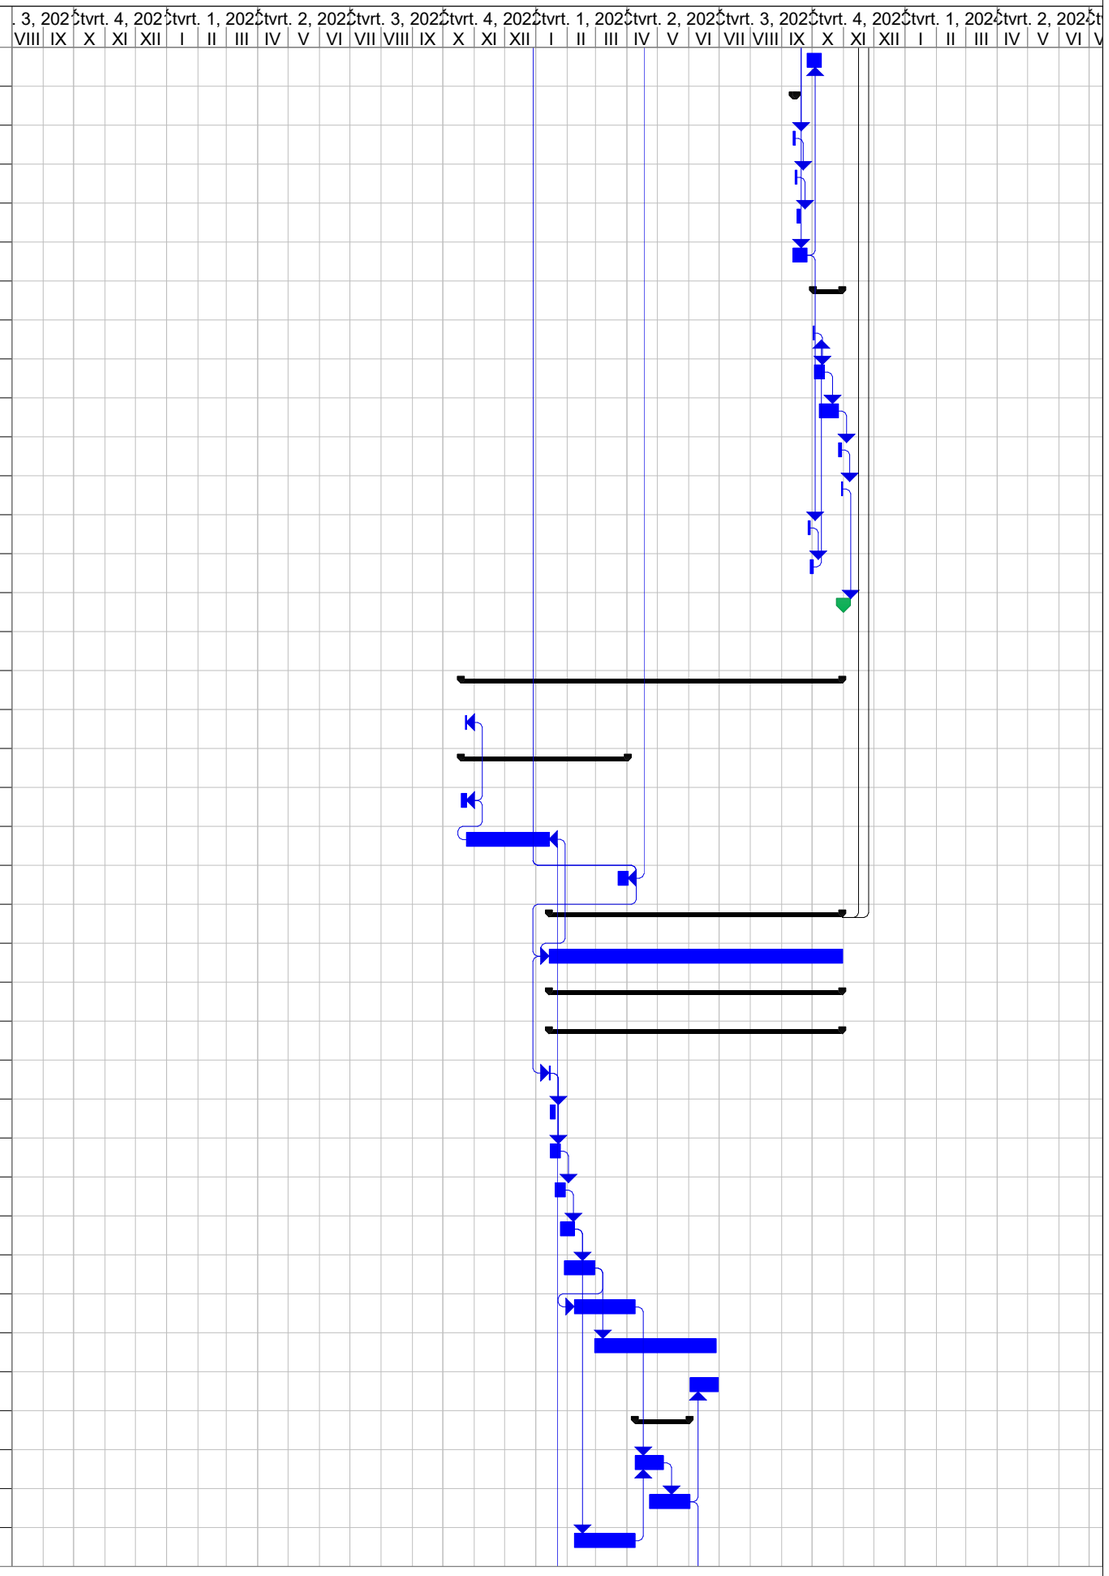

Příloha č.9: Harmonogram prací
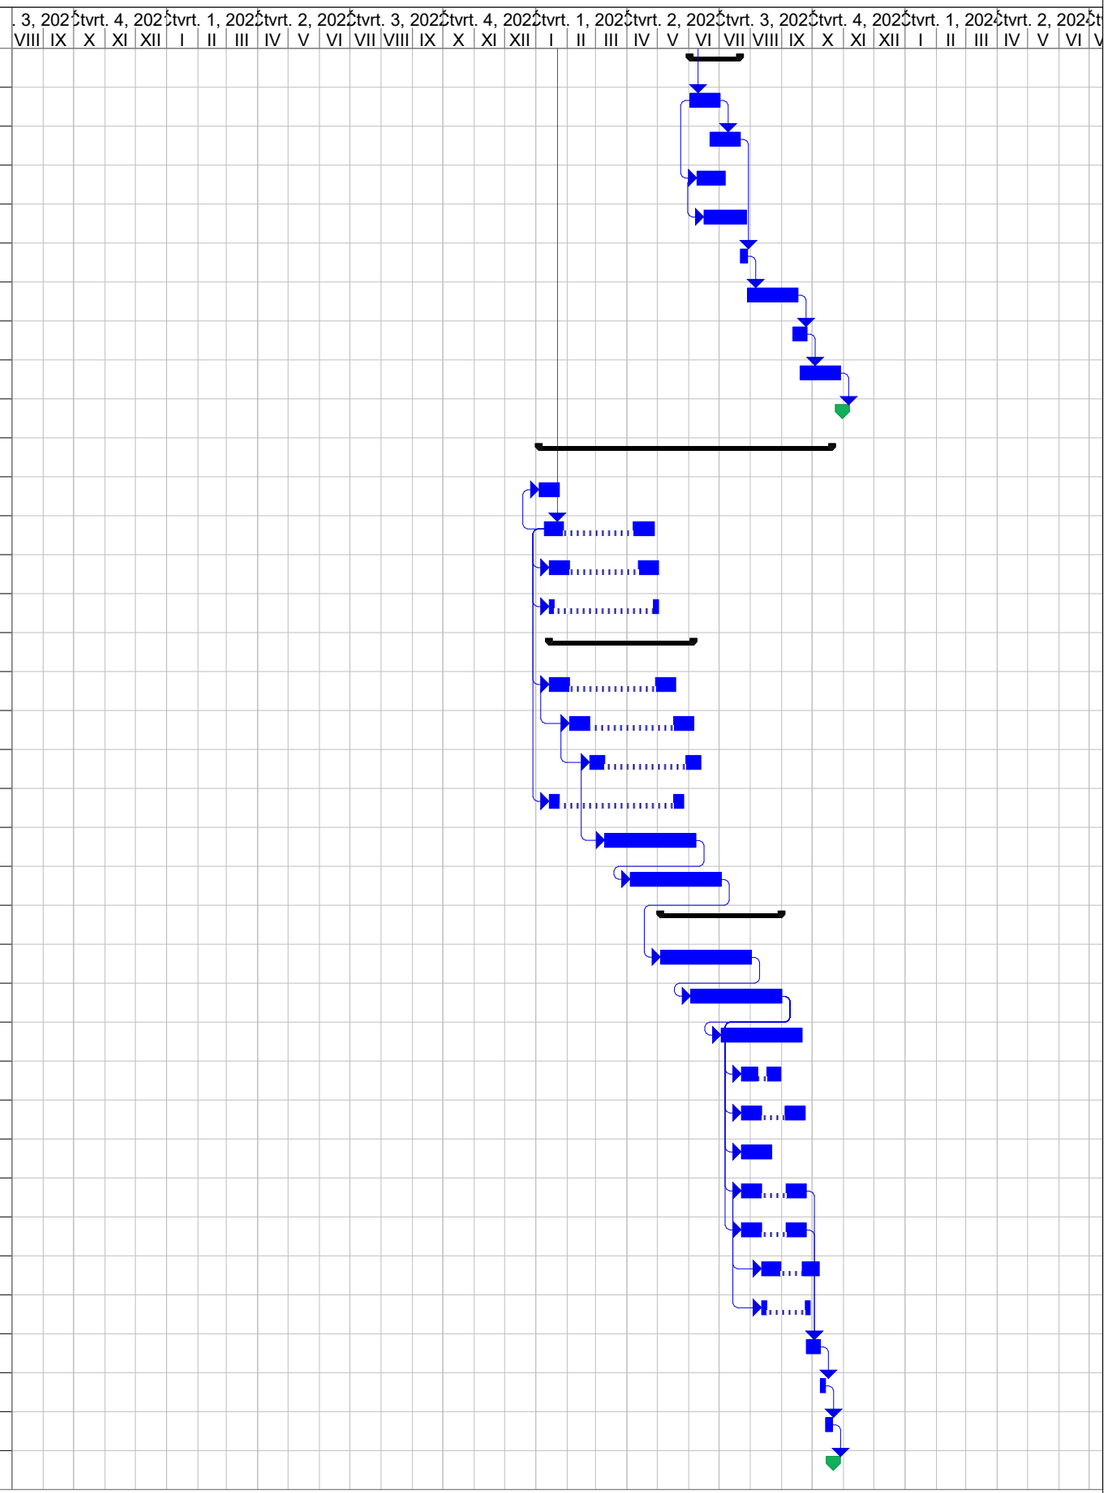
ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
157	**SO 01**	**Stavební část - montáž obkladů**	**50 dny**	**02.06. 23**	**21.07. 23**
158	SO 01	Stavební část - nosný rošt	30 dny	02.06. 23	01.07. 23
159		Stavební část - obklady	30 dny	22.06. 23	21.07. 23
160	SO 05	Osvětlení stanice - montáž definitivního osvětlení	28 dny	09.06. 23	06.07. 23
161	PS 93	Slaboproud - definitivní slaboproudé vedení	42 dny	16.06. 23	27.07. 23
162	SO 02	Informační systém - montáž definitivního informačního systému	7 dny	22.07. 23	28.07. 23
163	SO 01	Stavební část - montáž obkladů - podhledy	50 dny	29.07. 23	16.09. 23
164	SO 01	Stavební část - montáž svodidel	14 dny	12.09. 23	25.09. 23
165	SO 01	Stavební část - dokončovací práce HSV + PSV	40 dny	19.09. 23	28.10. 23
166		Likvidace ZS, úklid po stavbě	2 dny	29.10. 23	30.10. 23
167		**Práce ve stanici metra - neveřejná část**	**290 dny**	**04.01. 23**	**20.10. 23**
168	SO 01/05	Ochrana stávajícího technologického zařízení	20 dny	04.01. 23	23.01. 23
169	SO 05	Osvětlení - demontáž stávajícího osvětlení	40 dny	09.01. 23	27.04. 23
170	PS 93	Slaboproud - demontáž stávajícího slaboproudého vedení	40 dny	14.01. 23	01.05. 23
171	PS 93-1	Sdělovací zařízení - EPS - demontáž	10 dny	14.01. 23	01.05. 23
172	**PS 95**	**Vzduchotechnická zařízení**	**143 dny**	**14.01. 23**	**05.06. 23**
173	PS 95	Demontáž VZT rozvodů	40 dny	14.01. 23	18.05. 23
174	PS 95	Provizorní VZT rozvody	40 dny	03.02. 23	05.06. 23
175	PS 91-1	Silové rozvody ve stanici vč. tunelů	30 dny	23.02. 23	12.06. 23
176	PS 91-1	Energetická zařízení	20 dny	14.01. 23	26.05. 23
177	SO 01/03	Stavební část - demontáž zontů	90 dny	10.03. 23	07.06. 23
178	SO 01/03	Přetěsnění spár, injektáže	90 dny	04.04. 23	02.07. 23
179	**SO 01/03**	**Stavební část - montáž nových zontů**	**120 dny**	**04.05. 23**	**31.08. 23**
180		Stavební část - nosný rošt	90 dny	04.05. 23	01.08. 23
181		Stavební část - desky	90 dny	03.06. 23	31.08. 23
182	SO 01/03	Stavební část - práce HSV + PSV	80 dny	03.07. 23	20.09. 23
183		Silové rozvody strojního zařízení ČS	30 dny	23.07. 23	30.08. 23
184	PS 95	Vzduchotechnická zařízení - definitivní	40 dny	23.07. 23	23.09. 23
185	SO 04	Zdravotně technické instalace	30 dny	23.07. 23	21.08. 23
186	SO 05	Osvětlení - montáž definitivního osvětlení	40 dny	23.07. 23	24.09. 23
187	PS 93	Slaboproud - definitivní slaboproudé vedení	40 dny	23.07. 23	24.09. 23
188		ASDŘ-O	36 dny	12.08. 23	07.10. 23
189	PS 93-2	Sdělovací zařízení - EPS - montáž	10 dny	12.08. 23	28.09. 23
190	SO 01/03	Stavební část - dokončovací práce HSV + PSV	14 dny	25.09. 23	08.10. 23
191		Vyčištění stanice po stavbě	5 dny	09.10. 23	13.10. 23
192		Zábor - zařízení staveniště - likvidace	7 dny	14.10. 23	20.10. 23
193		Ukončení stavby	1 den	21.10. 23	21.10. 23
