ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

FN Brno – Rekonstrukce havarijních rozvodů

Lhůta plnění: 205 kalendářních dnů
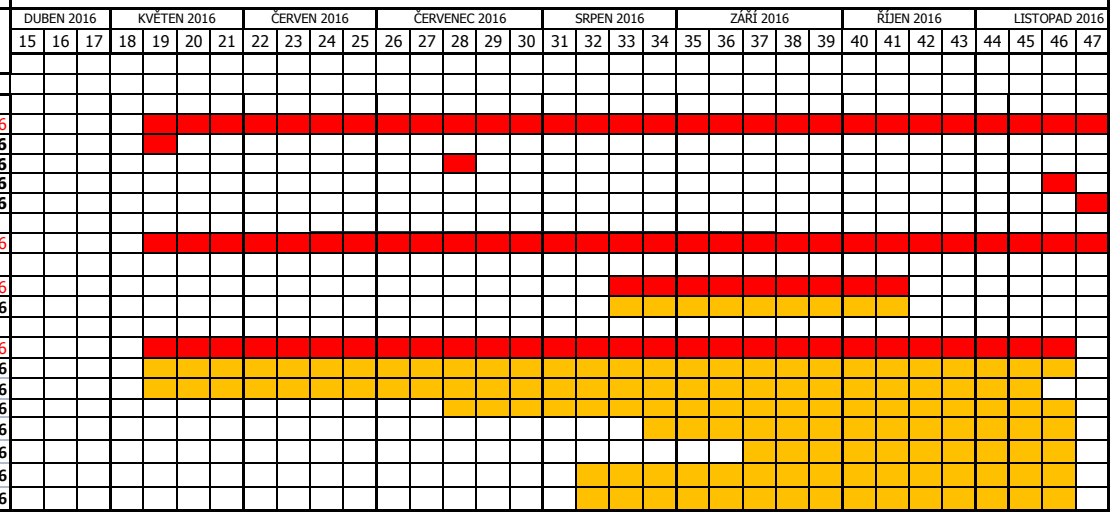
		TRVÁNÍ	ZAHÁJENÍ	DOKONČENÍ
	MILNÍKY VÝSTAVBY	205 dny	10.5.2016	30.11.2016
	Zahájení stavby		**10.5.2016**	**10.5.2016**
	Dokončení bourání a demontáží		**16.7.2016**	**16.7.2016**
	Dokončení stavebních prací		**27.11.2016**	**27.11.2016**
	Předání a převzetí díla		**30.11.2016**	**30.11.2016**
	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	205 dny	10.5.2016	30.11.2016
	PROVOZNÍ SOUBORY	65 dny	15.8.2016	18.10.2016
PS 02	**Vzduchotechnika**	**65 dny**	**15.8.2016**	**18.10.2016**
	STAVEBNÍ OBJEKTY	198 dny	12.5.2016	25.11.2016
SO 01	**Rekonstrukce rozvodů a stoupaček NTP v rozsahu 1.PP - 3.NP**	**198 dny**	**12.5.2016**	**25.11.2016**
	Stavební část	**192 dny**	**12.5.2016**	**19.11.2016**
	Zdravotně technické instalace	**138 dny**	**11.7.2016**	**25.11.2016**
	Silnoproudé elektroinstalace	**87 dny**	**29.8.2016**	**23.11.2016**
	Slaboproudé elektroinstalace	**73 dny**	**12.9.2016**	**23.11.2016**
SO 02	**Rekonstrukce rozvodů a stoupaček VTP v rozsahu 1.PP - 4.NP**	**108 dny**	**8.8.2016**	**23.11.2016**
	Zdravotně technické instalace	**108 dny**	**8.8.2016**	**23.11.2016**
