Vzor časového harmonogramu stavby ETAPA I

Název akce: Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Místo stavby: Věznice Ostrov

			měsíc	
			týden	
	Předání staveniště zhotoviteli			
	Zřízení zařízení staveniště			
	Zahájení prací			
	Provizorní dopravní značení			
	Pasportizace, vytýčení sítí			
	1.Etapa			
	Kanalizační stoky a přípojky		*délka stoky*	*přípojky*
	Stoka A	ŠA1 - ŠA18	274,60	10
	Stoka B	ŠA2 - ŠB4	81,54	2
	Stoka B1	ŠB2 - ŠB1-2	14,70	2
	Stoka C	ŠA5 - ŠC 21	394,15	10
	Stoka C1	ŠC2 - ŠC1-2	33,10	1
	Stoka C2	ŠC10 - ŠC2-3	60,00	2
	Stoka C3	ŠC12 - ŠC3-4	69,00	4
	Stoka C4	ŠC14 - ŠC4-1	13,00	1
	Stoka C5	ŠC15 - ŠC5-3	34,00	3
	Protlaky			**délka**
	Protlak OC DN 500	ŠA17 - ŠA18		23,40
	Protlak OC DN 500	ŠC17 - ŠC18		24,70
	Čerpací stanice odpadních vod			
	Stavební část ČSOV			
	Tecnologická část ČSOV			
	Elektrotechnologie, měření a regulace ČSOV			
	Elektropřípojka pro ČSOV			
	Kanalizační přípojka pro provozní objekt ČSOV			
	Vodovodní přípojka pro ČSOV			
	Vodovodní přípojka pro provozní objekt ČSOV			
	Přeložka výtlaku			
	Zkušební provoz ČSOV			
	Geodetické zaměření			
	Zkoušky těsnosti			
	Terénní úpravy na nezpevněných površích			
	Opravy povrchů zpeněných ploch a komunikací			
	Proplach stávající splaškové kanalizace			
	Odstanění zářízení staveniště			
	Předání díla a staveniště objednateli			

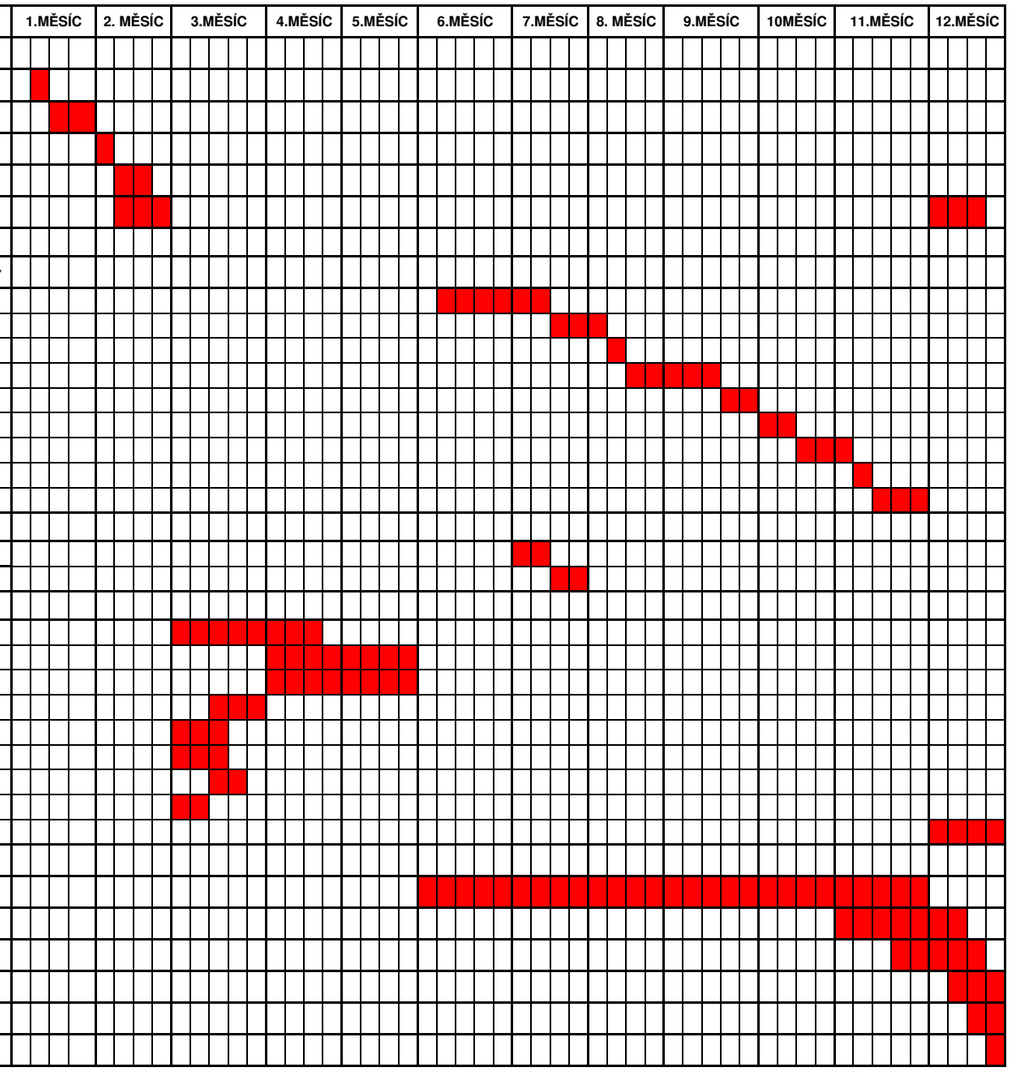

Vzor časového harmonogramu stavby ETAPA II

Název akce: Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Místo stavby: Věznice Ostrov

			měsíc		1 MĚSÍC	2 MĚSÍC	3 MĚSÍC	4 MĚSÍC	5 MĚSÍC	6 MĚSÍC	7 MĚSÍC	8 MĚSÍC	9 MĚSÍC	10 MĚSÍC	11 MĚSÍC	12 MĚSÍC
			týden													
	Předání staveniště zhotoviteli															
	Zřízení zařízení staveniště															
	Zahájení prací															
	Provizorní dopravní značení															
	Pasportizace, vytýčení sítí															
	Kanalizační stoky a přípojky		*délka stoky*	*přípojky*												
	Stoka A	ŠA18 - ŠA37	261,42	10												
	Stoka D	ŠA18 - ŠD6	126,41	3												
	Stoka E	ŠA21 - ŠE10	200,73	4												
	Stoka E1	ŠE4 - šachta u ub. K	15,20													
	Stoka E2	ŠE5 - ŠE2-4	44,00	2												
	Stoka E3	ŠE7 - ŠE3 - 6	110,00	4												
	Stoka F	ŠA22 - ŠF4	73,33	3												
	Stoka G	ŠA24 - ŠG3	54,40	3												
	Stoka H	ŠA27 - ŠH2	39,21	1												
	Stoka I	ŠA30 - ŠI5	136,81	5												
	Stoka J	ŠA32 - ŠJ5	84.50	2												
	Stoka K	ŠA32 - ŠK17	229,14	10												
	Stoka K1	ŠK8 - ŠK1-2	27,60	2												
	Stoka L	ŠA35 - ŠL4	47,45	2												
	Protlaky			**délka**												
	Protlak OC DN 500	ŠA23 - ŠA24		7,90												
	Protlak OC DN 500	ŠE3 - ŠE4		20,50												
	Geodetické zaměření															
	Zkoušky těsnosti															
	Terénní úpravy na nezpevněných površích															
	Opravy povrchů zpeněných ploch a komunikací															
	Proplach stávající splaškové kanalizace															
	Odstanění zářízení staveniště															
	Předání díla a staveniště objednateli															
