ID	Režim úkolu	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení
0		**0**	**Knihovna Petřiny**	**528 dny**	**22.03. 22**
1		**1**	**SO 0201 Knihovna**	**517 dny**	**22.03. 22**
2		1.1	Předání staveniště	1 den	22.03. 22
3		1.2	Kácení stromů	7 dny	23.03. 22
4		1.3	Demolice starého objektu	41 dny	25.03. 22
5		1.4	Přeložka vodovodu	56 dny	05.05. 22
6		1.5	Výkop a pažení jámy	73 dny	15.06. 22
7		1.6	Monolitické konstrukce	181 dny	20.08. 22
8		1.7	Izolace spodní stavby	45 dny	25.10. 22
9		1.8	Zásypy spodní stavby a instalace potrubí	84 dny	19.11. 22
10		1.9	Osazení oken	90 dny	29.11. 22
11		1.10	Vnitřní omítky	90 dny	09.12. 22
12		1.11	Montáž střešního pláště	50 dny	10.01. 23
13		1.12	Rozvody TZB	37 dny	08.01. 23
14		1.13	Rastrování SDK	69 dny	19.12. 22
15		**1.14**	**1.PP**	**188 dny**	**14.02. 23**
16		1.14.1	Hrubé rozvody VZT	12 dny	14.02. 23
17		1.14.2	Hrubé rozvody SIL/SLA_proud	12 dny	14.02. 23
18		1.14.3	Hrubé rozvody TZB (voda, topení, kanalizace)	12 dny	14.02. 23
19		1.14.4	SDK konstrukce záklop	22 dny	26.02. 23
20		1.14.5	Hrubé podlahy	10 dny	20.03. 23
21		1.14.6	Úpravy povrchů SDK	21 dny	30.03. 23
22		1.14.7	Malba v kotelně	10 dny	20.04. 23
23		1.14.8	Čistá podlaha v kotelně	15 dny	30.04. 23
24		1.14.9	Montáž technologie v kotelně	68 dny	15.05. 23
25		1.14.10	Kompletace technologie v kotelně	30 dny	22.07. 23
26		1.14.11	Montáž akustických obkladů v sále	21 dny	20.04. 23
27		1.14.12	Montáž podhledů v sále	21 dny	11.05. 23
28		1.14.13	Čistá podlaha v sále	14 dny	01.06. 23
29		1.14.14	Montáž tribuny v sále	31 dny	15.06. 23
30		1.14.15	Kompletace technologie v sále	21 dny	16.07. 23
31		1.14.16	Dlažby a obklady	20 dny	20.04. 23
32		1.14.17	Malby	10 dny	10.05. 23
33		1.14.18	Čisté podlahy	20 dny	20.05. 23
34		1.14.19	Výplně otvorů	6 dny	09.06. 23
35		1.14.20	Kompletace technologií	21 dny	15.06. 23
36		1.14.21	Montáž výtahu	70 dny	24.04. 23
37		1.14.22	Montáž invalidní plošiny	40 dny	09.06. 23
38		**1.15**	**1.NP**	**171 dny**	**26.02. 23**
39		1.15.1	Hrubé rozvody VZT	5 dny	26.02. 23
40		1.15.2	Hrubé rozvody SIL/SLA_proud	5 dny	26.02. 23
41		1.15.3	Hrubé rozvody TZB (voda, topení, kanalizace	5 dny	26.02. 23
42		1.15.4	SDK konstrukce záklop	21 dny	03.04. 23
43		1.15.5	Točité ocelové schodiště Z.04	31 dny	20.03. 23
44		1.15.6	D+M podlahové vytápění	5 dny	02.05. 23
45		1.15.7	Hrubé podlahy	10 dny	07.05. 23
46		1.15.8	Úpravy povrchů SDK	21 dny	17.05. 23
47		1.15.9	Dlažby a obklady	14 dny	16.06. 23
48		1.15.10	Malby	7 dny	30.06. 23
49		1.15.11	Čisté podlahy	21 dny	07.07. 23
50		1.15.12	Výplně otvorů	6 dny	25.07. 23
51		1.15.13	Kompletace technologií	22 dny	25.07. 23
52		**1.16**	**2.NP**	**182 dny**	**14.02. 23**
53		1.16.1	SDK konstrukce jedostranný záklop	3 dny	14.02. 23
54		1.16.2	Hrubé rozvody VZT	5 dny	03.03. 23
55		1.16.3	Hrubé rozvody SIL/SLA_proud	5 dny	03.03. 23
56		1.16.4	Hrubé rozvody TZB (voda, topení, kanalizace	5 dny	03.03. 23
57		1.16.5	SDK konstrukce záklop	5 dny	03.04. 23
58		1.16.6	Zábradlí dvorany Z.01	14 dny	14.02. 23
59		1.16.7	D+M podlahové vytápění	5 dny	18.04. 23
60		1.16.8	Hrubé podlahy	9 dny	23.04. 23
61		1.16.9	Úpravy povrchů SDK	21 dny	02.05. 23
62		1.16.10	Dlažby a obklady	14 dny	01.06. 23
63		1.16.11	Malby	7 dny	15.06. 23
64		1.16.12	Čisté podlahy	21 dny	22.06. 23
65		1.16.13	Výplně otvorů	6 dny	13.07. 23
66		1.16.14	Kompletace technologií	27 dny	19.07. 23
67		**1.17**	**3.NP**	**176 dny**	**17.02. 23**
68		1.17.1	SDK konstrukce jedostranný záklop	8 dny	17.02. 23
69		1.17.2	Hrubé rozvody VZT	5 dny	08.03. 23
70		1.17.3	Hrubé rozvody SIL/SLA_proud	5 dny	08.03. 23
71		1.17.4	Hrubé rozvody TZB (voda, topení, kanalizace)	5 dny	08.03. 23

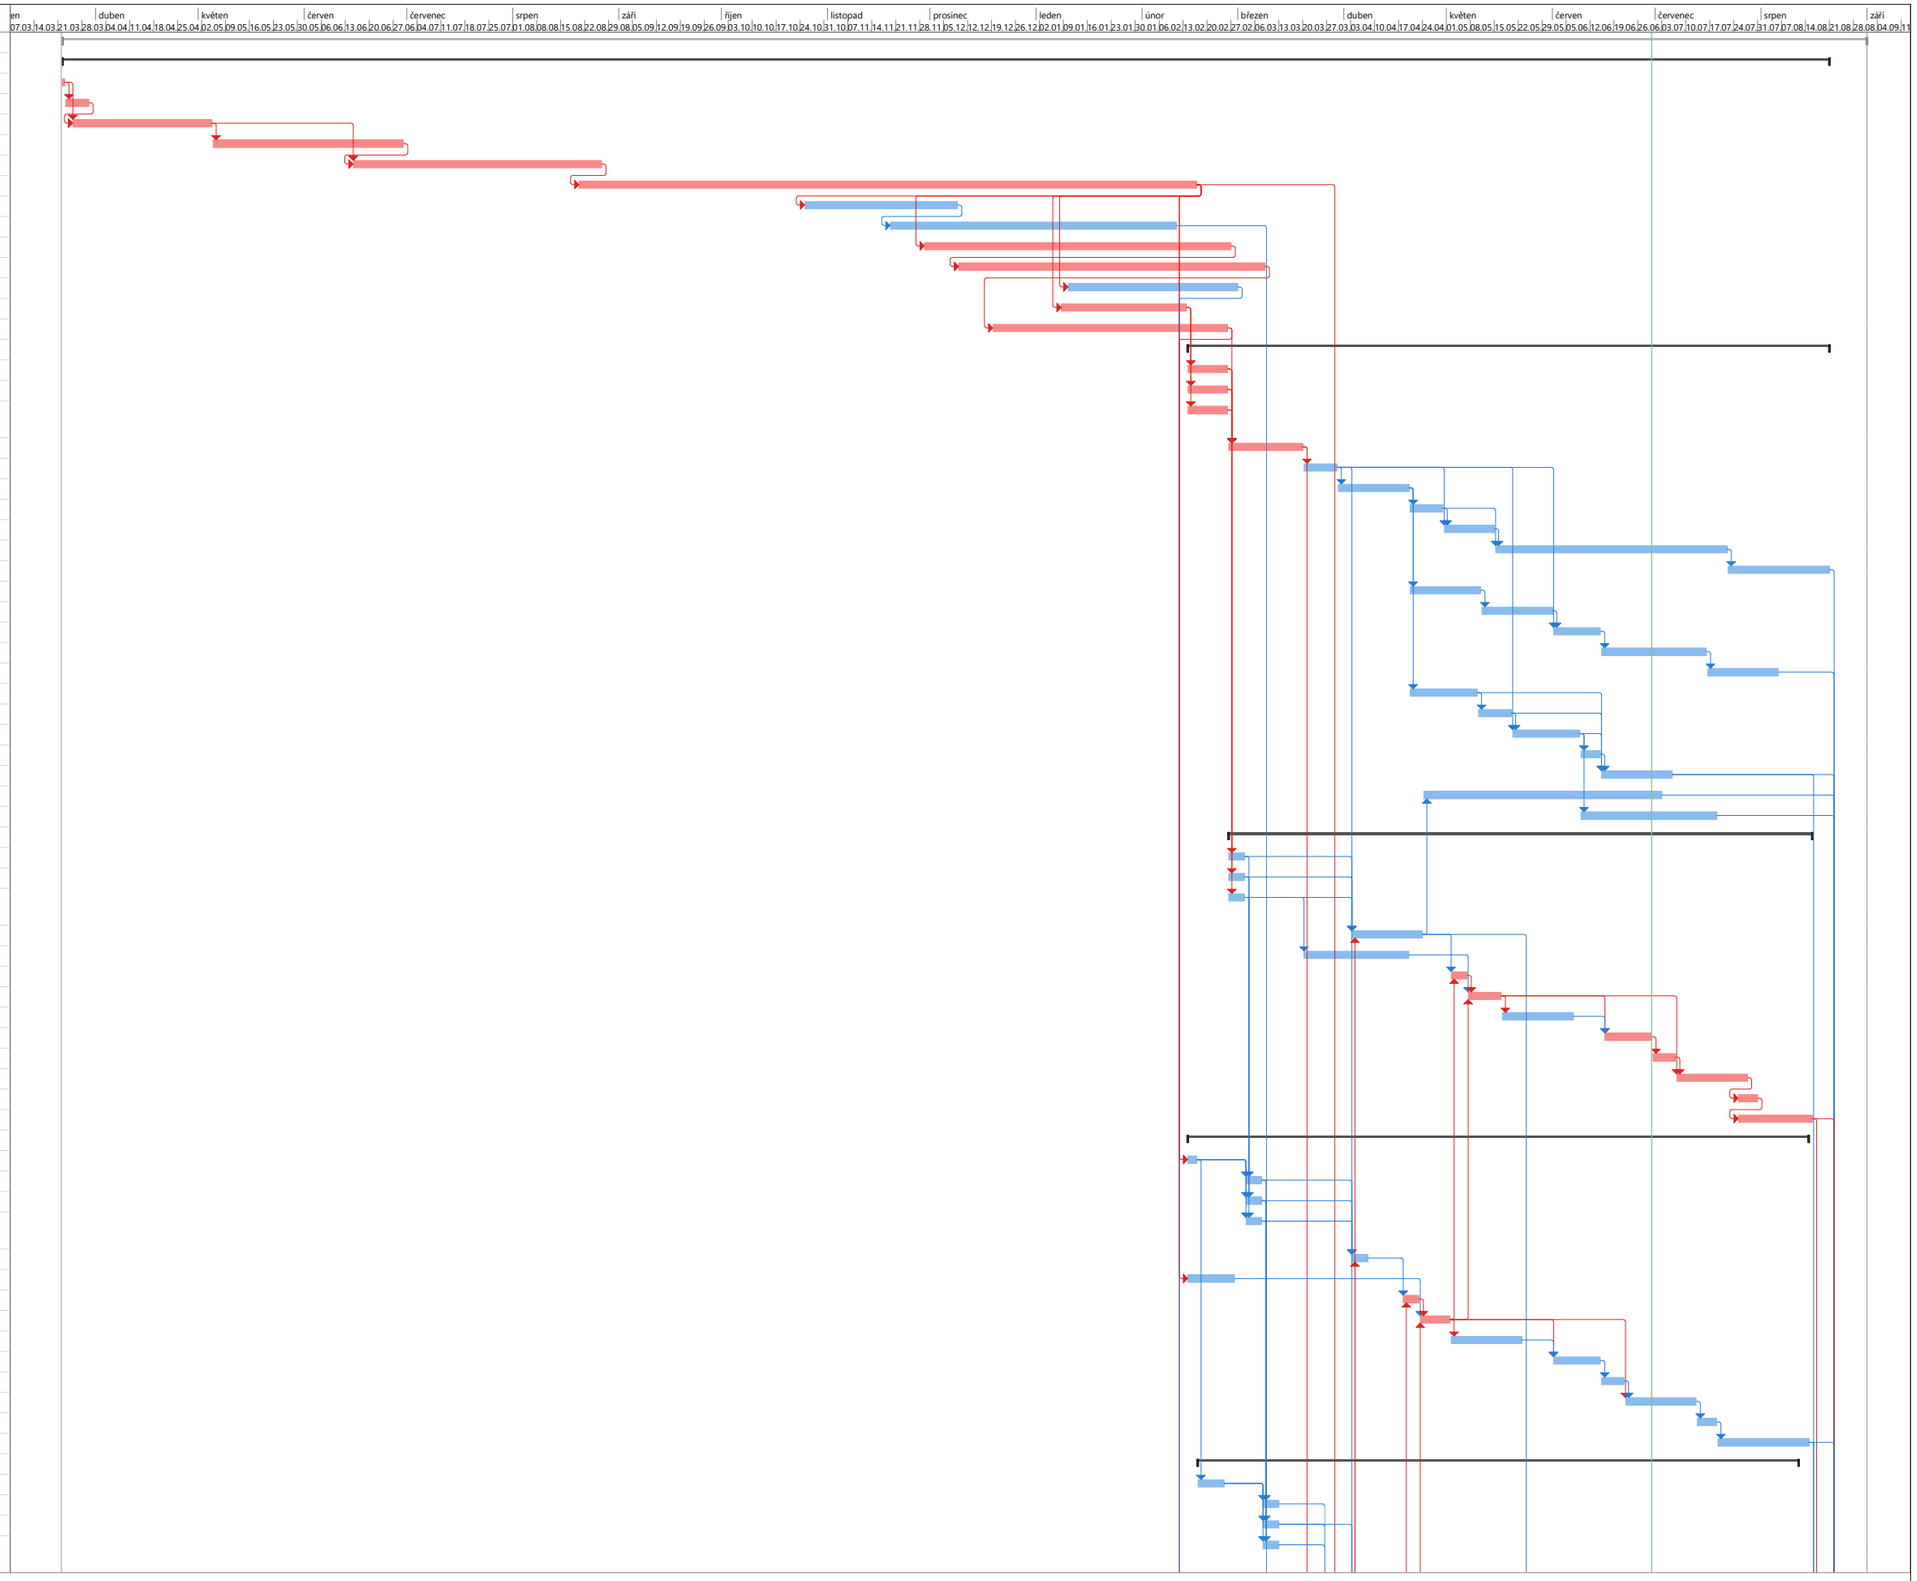

Projekt: Knihovna Petřiny
Datum: 30.06. 23

Úkol | Souhrnný | Neaktivní milník | Pouze s dobou trvání | Pouze zahájení | Vnější milník | Kritické rozdělení
Rozdělení | Souhrn projektu | Neaktivní souhrn | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze s datem dokončení | Konečný termín | Průběh
Milník | Neaktivní úkol | Ruční úkol | Ruční souhrn | Vnější úkoly | Kritický | Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Režim úkolu	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení
72		1.17.5	SDK konstrukce záklop	5 dny	03.04. 23
73		1.17.6	Hrubé podlahy	8 dny	10.04. 23
74		1.17.7	Úpravy povrchů SDK	21 dny	18.04. 23
75		1.17.8	Dlažby a obklady	14 dny	24.05. 23
76		1.17.9	Malby	7 dny	07.06. 23
77		1.17.1(	Čisté podlahy	21 dny	14.06. 23
78		1.17.1:	Výplně otvorů	7 dny	05.07. 23
79		1.17.1:	Kompletace technologií	31 dny	12.07. 23
80		**1.18**	**4.NP**	**138 dny**	**20.03. 23**
81		1.18.1	SDK konstrukce jedostranný záklop	7 dny	20.03. 23
82		1.18.2	Hrubé rozvody VZT	5 dny	26.03. 23
83		1.18.3	Hrubé rozvody SIL/SLA_proud	5 dny	26.03. 23
84		1.18.4	Hrubé rozvody TZB (voda, topení, kanalizace	5 dny	26.03. 23
85		1.18.5	SDK konstrukce záklop	6 dny	28.03. 23
86		1.18.6	Hrubé podlahy	7 dny	03.04. 23
87		1.18.7	Úpravy povrchů SDK	21 dny	10.04. 23
88		1.18.8	Dlažby a obklady	14 dny	10.05. 23
89		1.18.9	Malby	10 dny	24.05. 23
90		1.18.1(	Čisté podlahy	21 dny	03.06. 23
91		1.18.1:	Výplně otvorů	7 dny	24.06. 23
92		1.18.1:	Kompletace technologií	35 dny	01.07. 23
93		**1.19**	**Střecha**	**181 dny**	**14.02. 23**
94		1.19.1	Hydroizolační souvrství	10 dny	14.02. 23
95		1.19.2	Tížná betonová deska	4 dny	24.02. 23
96		1.19.3	D+M technologie	65 dny	28.02. 23
97		1.19.4	Klempířské práce	21 dny	04.05. 23
98		1.19.5	Pergola na střeše	30 dny	04.05. 23
99		1.19.6	Akustický obklad	30 dny	03.06. 23
100		1.19.7	Trhuhlářské výrobky, květináče	21 dny	03.07. 23
101		1.19.8	Zelená střecha extenzivní zeleň	21 dny	24.07. 23
102		1.19.9	Kompletace technologií	70 dny	03.06. 23
103		**1.20**	**Úpravy povrchů - obvodový plášť**	**138 dny**	**14.02. 23**
104		1.20.1	Vyřešení podoby zámečnických konstru	23 dny	14.02. 23
105		1.20.2	Výroba kotev do fasády	21 dny	09.03. 23
106		1.20.3	Montáž lešení - sever a východ	4 dny	09.03. 23
107		1.20.4	Montáž zámečnických výrobků Z.16/17 1.etapa	5 dny	30.03. 23
108		1.20.5	Osazení kastlíku - žaluzie	10 dny	16.03. 23
109		1.20.6	Kontaktní zateplovací systém - sever a východ	49 dny	04.04. 23
110		1.20.7	Montáž zámečnických výrobků Z.16/17 2.etapa	14 dny	23.05. 23
111		1.20.8	Montáž žaluzií	7 dny	06.06. 23
112		1.20.9	Demontáž lešení - sever a východ	4 dny	13.06. 23
113		1.20.1(	Montáž lešení - jih a západ	7 dny	14.04. 23
114		1.20.1:	Montáž zámečnických výrobků Z.16/17 3.etapa	5 dny	21.04. 23
115		1.20.1:	Osazení kastlíku - žaluzie	10 dny	26.04. 23
116		1.20.1:	Kontaktní zateplovací systém - jih a záp	25 dny	06.05. 23
117		1.20.1	Montáž zámečnických výrobků Z.16/17 4.etapa	14 dny	06.06. 23
118		1.20.1:	Montáž žaluzií	7 dny	20.06. 23
119		1.20.1(	Demontáž lešení - jih a západ	5 dny	27.06. 23
120		**2**	**SO 0202 Oplocení**	**126 dny**	**29.03. 23**
121		2.1	Kácení stromu	2 dny	29.03. 23
122		2.2	Zemní práce - 1.etapa	7 dny	31.03. 23
123		2.3	Oplocení areálu - 1.etapa	40 dny	07.04. 23
124		2.4	Zemní práce - 2.etapa	10 dny	02.07. 23
125		2.5	Oplocení areálu - 2.etapa	21 dny	12.07. 23
126		**3**	**SO 0601 Venkovní plochy**	**40 dny**	**14.06. 23**
127		3.1	Zemní práce	5 dny	14.06. 23
128		3.2	Zpevněné plochy	35 dny	19.06. 23
129		**4**	**SO 0602 Vnitřní plochy**	**50 dny**	**19.06. 23**
130		4.1	Zemní práce	10 dny	19.06. 23
131		4.2	Zpevněné plochy	19 dny	20.07. 23
132		**5**	**SO 0102 Sadové úpravy**	**24 dny**	**29.07. 23**
133		5.1	Terénní úpravy	10 dny	29.07. 23
134		5.2	Výsadba rostlin a stromů	14 dny	08.08. 23
135		**6**	**Dokončení díla**	**16 dny**	**16.08. 23**
136		6.1	Úklid	2 dny	22.08. 23
137		6.2	Kontrolní prohlídka HZS a HS	1 den	16.08. 23
138		6.3	Kolaudace - místní šetření	1 den	24.08. 23
139		6.4	Odstranění vad a nedodělků nebránících u	6 dny	25.08. 23
140		6.5	Předání díla	1 den	31.08. 23

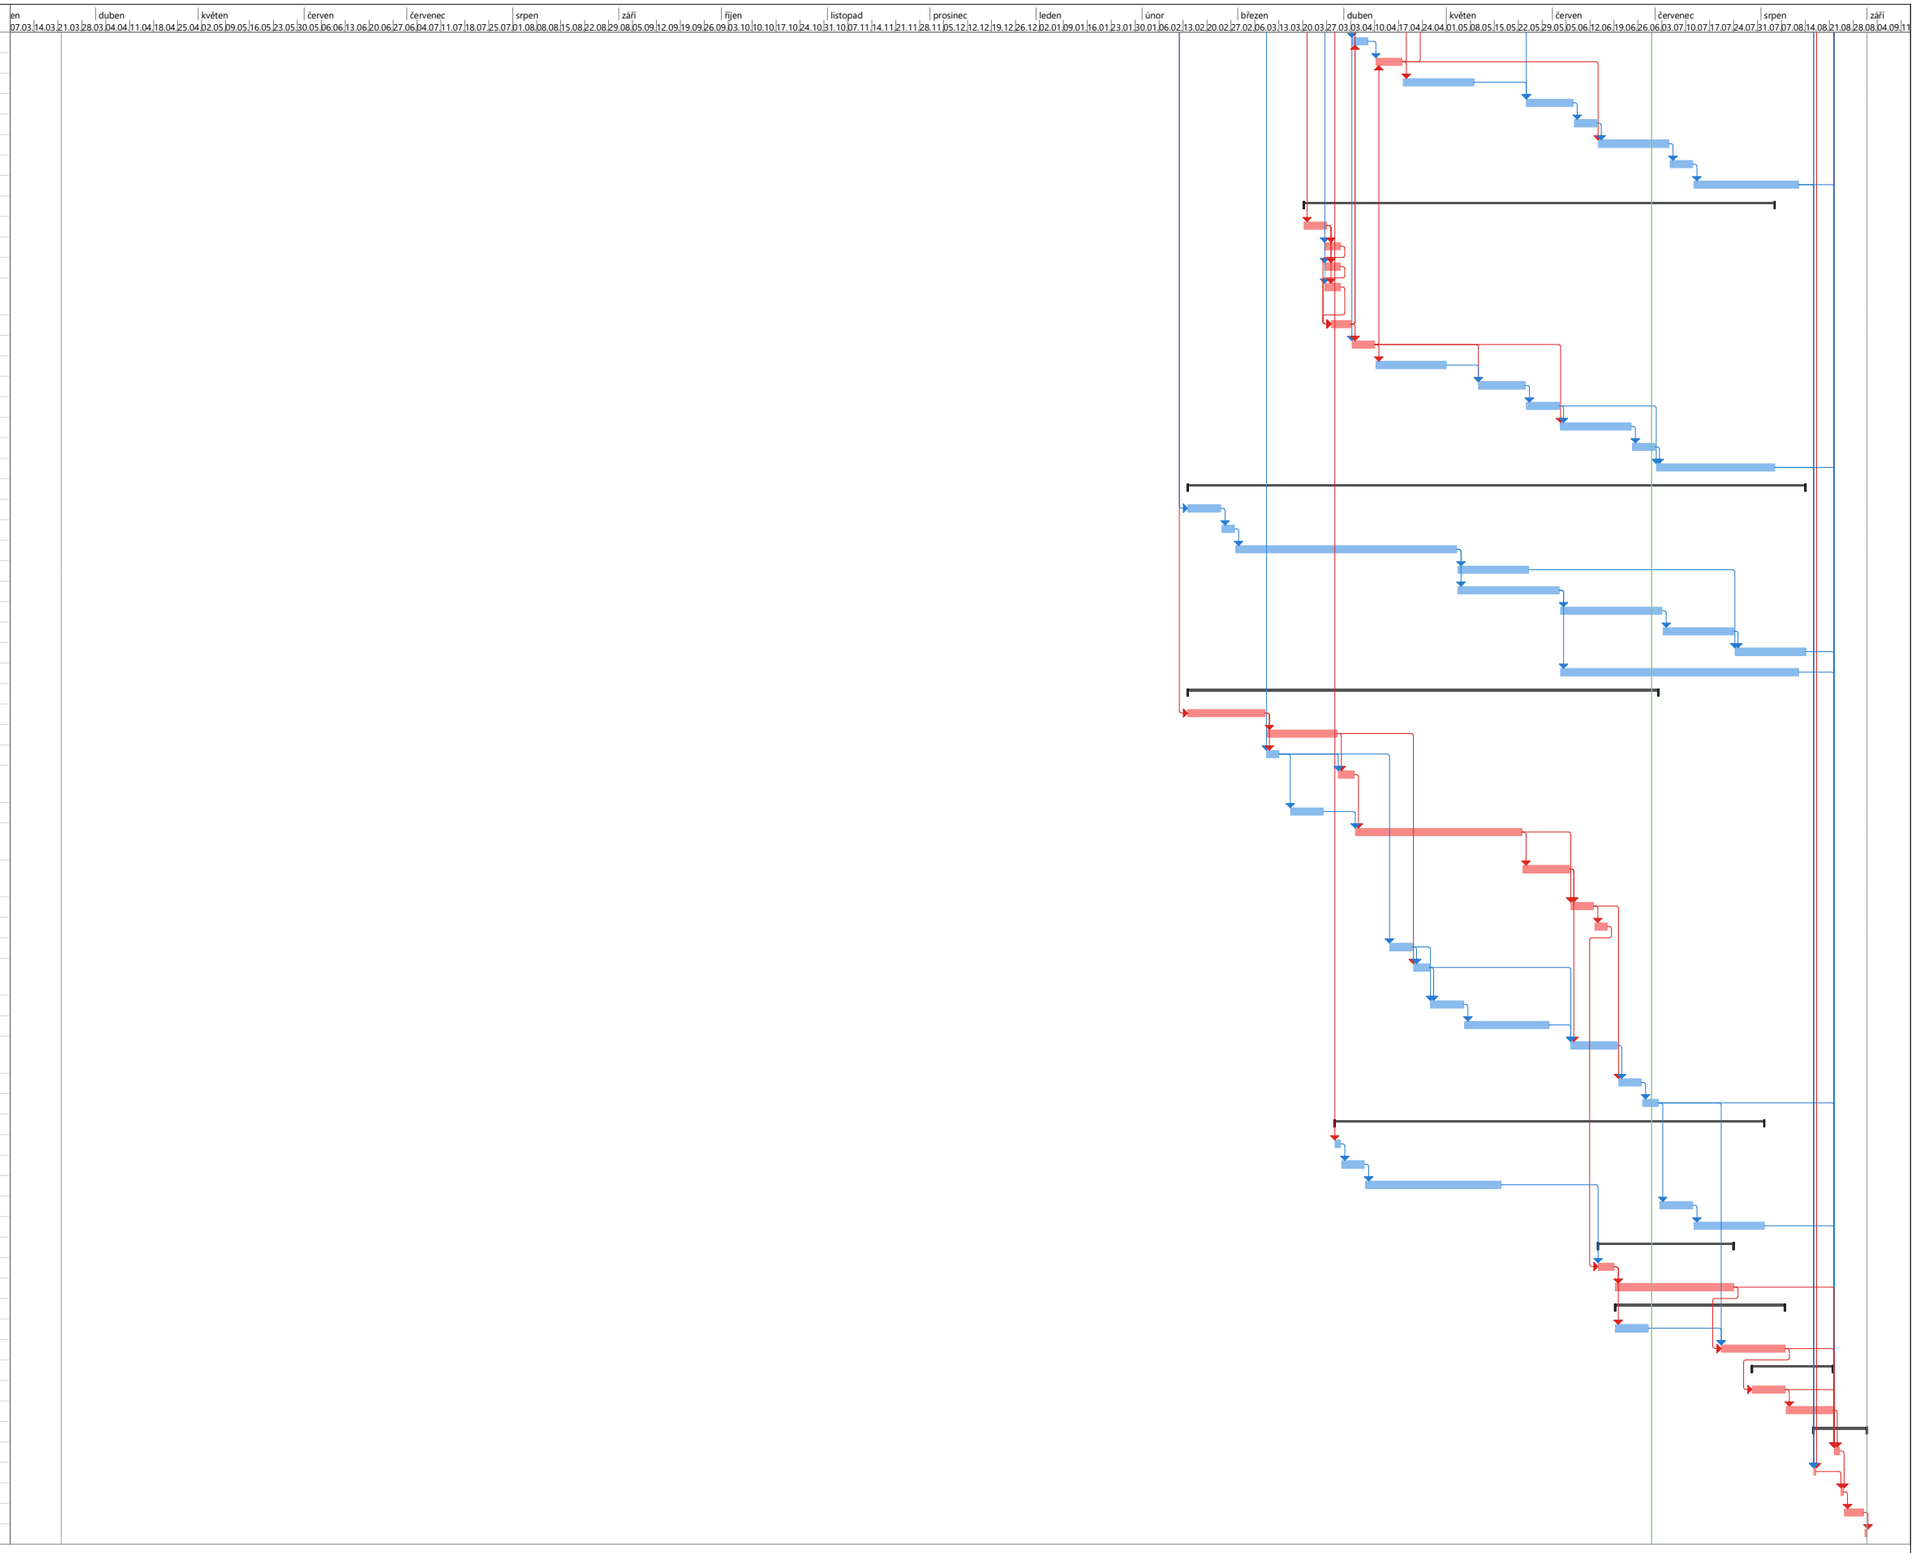

Projekt: Knihovna Petřiny
Datum: 30.06. 23

Úkol	Souhrnný	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Kritické rozdělení
Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	Průběh
Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Kritický	Průběh ručně zadaného úkolu
