Harmonogram: Oprava VZT objektů a rozvoden pro PÚ3, PÚ4 a PÚ12
MODŘANY - K1, 2023 ZÁŘÍ - PROSINEC, 2024 LEDEN - ÚNOR

| p.č | Místo (stavba) | Popis prací | ZÁŘÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ŘÍJEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V06	K1	Odbourání stávajícího výdechu včetně krčku až na stropní konstrukci
		Mt nového krčku - podzemní
		Oprava a mt nových hydroizolací
		Mt nového objek tu z betonových tvárnic, nová střešní deska
		Zásyp zeminou včetně hutnění , odstranění pažení
		Mt obrubníků, zásyp kačírkem + zatravnění
		Dmt podběnění + sanace krčku
		Osazení nových prvků VZT včetně nosné konstrukce, revize, zkouška
		Osazení nového stropního roštu
		Označení + úklid
V07	K1	Dmt stávajících VZT (klapky), pospojení
		Zajištění ochrany sítí podbedněním
		Odstranění náletrové zeleně
		Výkopové práce + mt pažení
		Dmt betonové střešní desky, odtranění žaluzií
		Odbourání stávajícího výdechu včetně krčku až na stropní konstrukci
		Mt nového krčku - podzemní
		Oprava a mt nových hydroizolací
		Mt nového objek tu z betonových tvárnic, nová střešní deska
		Zásyp zeminou včetně hutnění , odstranění pažení
		Mt obrubníků, zásyp kačírkem + zatravnění
		Dmt podběnění + sanace krčku
		Osazení nových prvků VZT včetně nosné konstrukce, revize, zkouška
		Osazení nového stropního roštu
		Označení + úklid
V08	K1	Dmt stávajících VZT (klapky), pospojení
		Zajištění ochrany sítí podbedněním
		Odstranění náletrové zeleně
		Výkopové práce
		Dmt betonové střešní desky, odtranění žaluzií
		Odbourání stávajícího výdechu včetně krčku až na stropní konstrukci
		Mt nového krčku - podzemní
		Oprava a mt nových hydroizolací
		Mt nového objek tu z betonových tvárnic, nová střešní deska
		Zásyp zeminou včetně hutnění
		Mt obrubníků, zásyp kačírkem + zatravnění
		Dmt podběnění + sanace krčku
		Osazení nových prvků VZT včetně nosné konstrukce, revize, zkouška
		Označení + úklid
V09	K2	Dmt stávajících VZT (klapky), pospojení
		Zajištění ochrany sítí podbedněním
		Odstranění náletrové zeleně
		Výkopové práce
		Dmt betonové střešní desky, odtranění žaluzií
		Odbourání stávajícího výdechu včetně krčku až na stropní konstrukci
		Mt nového krčku - podzemní
		Oprava a mt nových hydroizolací
		Mt nového objek tu z betonových tvárnic, nová střešní deska
		Zásyp zeminou včetně hutnění
		Mt obrubníků, zásyp kačírkem + zatravnění
		Dmt podběnění + sanace krčku
		Osazení nových prvků VZT včetně nosné konstrukce, revize, zkouška
		Označení + úklid
V10	K3	Dmt stávajících VZT (klapky), pospojení
		Zajištění ochrany sítí podbedněním
		Odstranění náletrové zeleně
		Výkopové práce
		Dmt betonové střešní desky, odtranění žaluzií
		Odbourání stávajícího výdechu včetně krčku až na stropní konstrukci
		Mt nového krčku - podzemní
		Oprava a mt nových hydroizolací
		Mt nového objek tu z betonových tvárnic, nová střešní deska
		Zásyp zeminou včetně hutnění
		Mt obrubníků, zásyp kačírkem + zatravnění
		Dmt podběnění + sanace krčku
		Osazení nových prvků VZT včetně nosné konstrukce, revize, zkouška
		Označení + úklid
V11	K4	Dmt stávajících VZT (klapky), pospojení
		Zajištění ochrany sítí podbedněním
		Odstranění náletrové zeleně
		Výkopové práce + mt pažení
		Dmt betonové střešní desky, odtranění žaluzií
		Odbourání stávajícího výdechu včetně krčku až na stropní konstrukci
		Mt nového krčku - podzemní
		Oprava a mt nových hydroizolací
		Mt nového objek tu z betonových tvárnic, nová střešní deska
		Zásyp zeminou včetně hutnění , odstranění pažení
		Mt obrubníků, zásyp kačírkem + zatravnění
		Dmt podběnění + sanace krčku
		Osazení nových prvků VZT včetně nosné konstrukce, revize, zkouška
		Osazení nového stropního roštu
		Označení + úklid

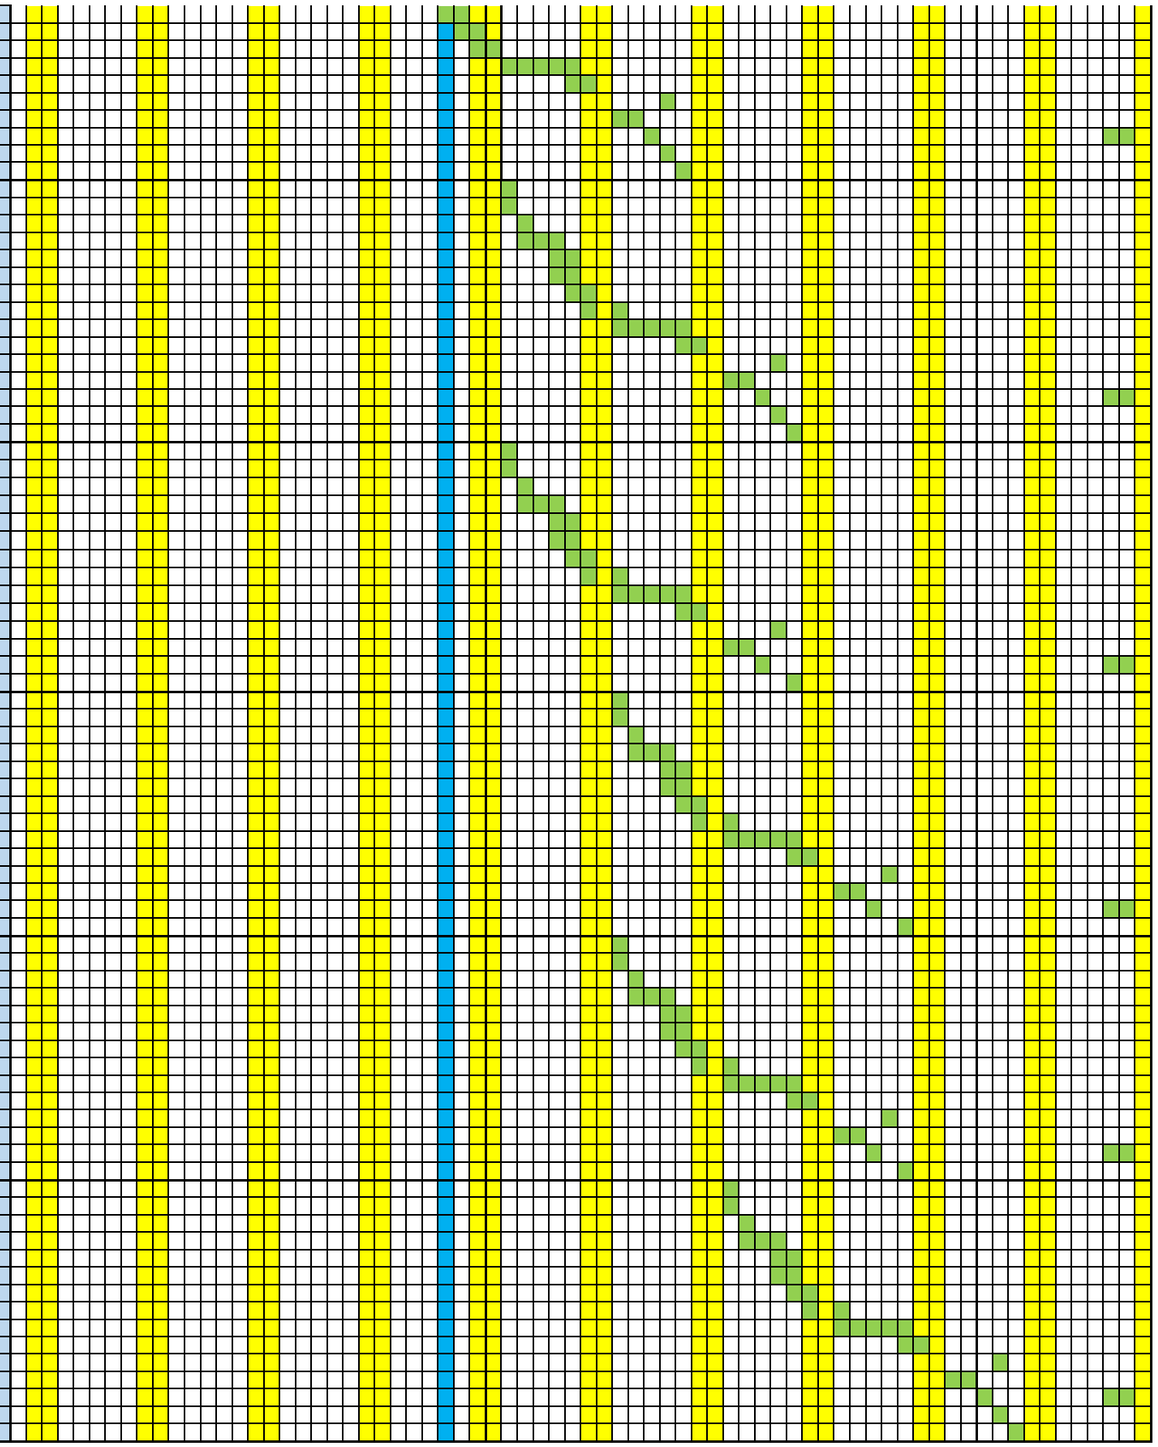

pač	Místo (stavba)	Popis prací
3RZ	K1	Zahájení (přípravné práce, demontáž VZT, pospojení) + odstranění zeleně
		Zajištění ochrany sítí - podbednění
		Oprava vnějších ostění stěn, nátěr stávající střešní konstrukce
		Dmt podhledu, vybourání dělicí stěny, osazení překladu - stropní kce
		Vyčištění a oprava kabelového kanálu + osazení nových chrániček
		Zabetonování otvoru po VZT, oprava podlah
		Nátěr ocelových profilů, sanace krčku
		Označení + úklid
4RO	K1	Zahájení (přípravné práce, demontáž VZT, pospojení) + odstranění zeleně
		Zajištění ochrany sítí - podbednění
		Dmt stávajícího zateplení, oprava ostění, dozdění otvorů
		Výkopy + oprava hydroizolací, zateplení pod úrovní terénu
		Zpětný zásyp zeminou + mt obrubníků, zásyp kačírkem
		Výměna výplní (dveře a žaluzie)
		Dmt podhledu, dmt stávající střešní konstrukce
		Mt nové střechy včetně zateplení a krytiny
		Mt KZ - zateplení objektu + fasáda
		Vyčištění a oprava kabelového kanálu + osazení nových chrániček
		Oprava podlah, nátěr ocelových konstrukcí
		Mt nových omítek, vyspravení stropu, výmalba
		Oprava provětrání objektu - obnova větracích prostupů
		Sanace krčku
		Mt nových prvků VZT včetně ocelové konstrukce
		Označení + úklid , vysetí travného semene
12RO	K1	Zahájení (přípravné práce, demontáž VZT, pospojení) + odstranění zeleně
		Zajištění ochrany sítí - podbednění
		Dmt stávajícího zateplení, oprava ostění, dozdění otvorů
		Výkopy + oprava hydroizolací, zateplení pod úrovní terénu
		Zpětný zásyp zeminou + mt obrubníků, zásyp kačírkem
		Dmt stávající střešní konstrukce
		Mt nové střechy včetně zateplení a krytiny
		Mt KZ - zateplení objektu + fasáda
		Oprava provětrání objektu - obnova větracích prostupů
		Sanace krčku
		Mt nových prvků VZT včetně ocelové konstrukce
		Označení + úklid , vysetí travného semene
P01	K1	Zahájení (přípravné práce, ochrana stávajích sítí)
		Bourací práce (zárubní, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kontrola pospojení, posun sestavy tlačítek
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémové
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových konstrukcí - dveře
		Dopnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení + úklid
P02	K1	Zahájení (přípravné práce, ochrana stávajích sítí)
		Bourací práce (zárubní, příčky) + vysazení dveří
		Začištění, sanace ostění - v místě příčky nové / bourané
		Posun dělících desek, kontrola pospojení, posun sestavy tlačítek
		Měření koncentrace respitabilních azbestových vláken
		Vytýčení nové příčky, osazení zárubní včetně dveří + vyzdění příčky
		Montáž omítek + zatěsnění prostupů systémové
		Nátěr kabelových lávek, pospojení ocelových konstrukcí - dveře
		Dopnění protipožárních desek, povrchová ochrana potrubí
		Oprava podlahy, doplnění bezpečnostního značení + úklid
B01	K1	Zahájení (přípravné práce, ochrana stávajích sítí)
		Bourací práce (zárubní, příčky)
		Začištění, sanace ostění - v místě příčky
		Kontrola + doplnění pospojení, nátěr lávek a nosných konstrukcí
		Oprava podlahy, doplnění chybějících protipožárních desek
		Povrchová ochrana potrubí, doplnění izolací, úklid
B02	K1	Zahájení (přípravné práce, ochrana stávajích sítí)
		Bourací práce (zárubní, příčky)
		Začištění, sanace ostění - v místě příčky
		Kontrola + doplnění pospojení, nátěr lávek a nosných konstrukcí
		Oprava podlahy, doplnění chybějících protipožárních desek
		Povrchová ochrana potrubí, doplnění izolací, úklid
S01	K1	Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí)
		Sanace ostění (stropní konstrukce)
		Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky
		Ukončení prací, úklid + označení
S02	K1	Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí)
		Sanace ostění (stropní konstrukce)
		Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky
		Ukončení prací, úklid + označení
S03, S04	K1	Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí)
		Sanace ostění (stropní konstrukce)
		Montáž nových zámečnických konstrukcí - lávky
		Ukončení prací, úklid + označení
S06	K1	Zahájení (přípravné práce, demontáž zámečnických konstrukcí)
		Sanace ostění (stropní konstrukce)

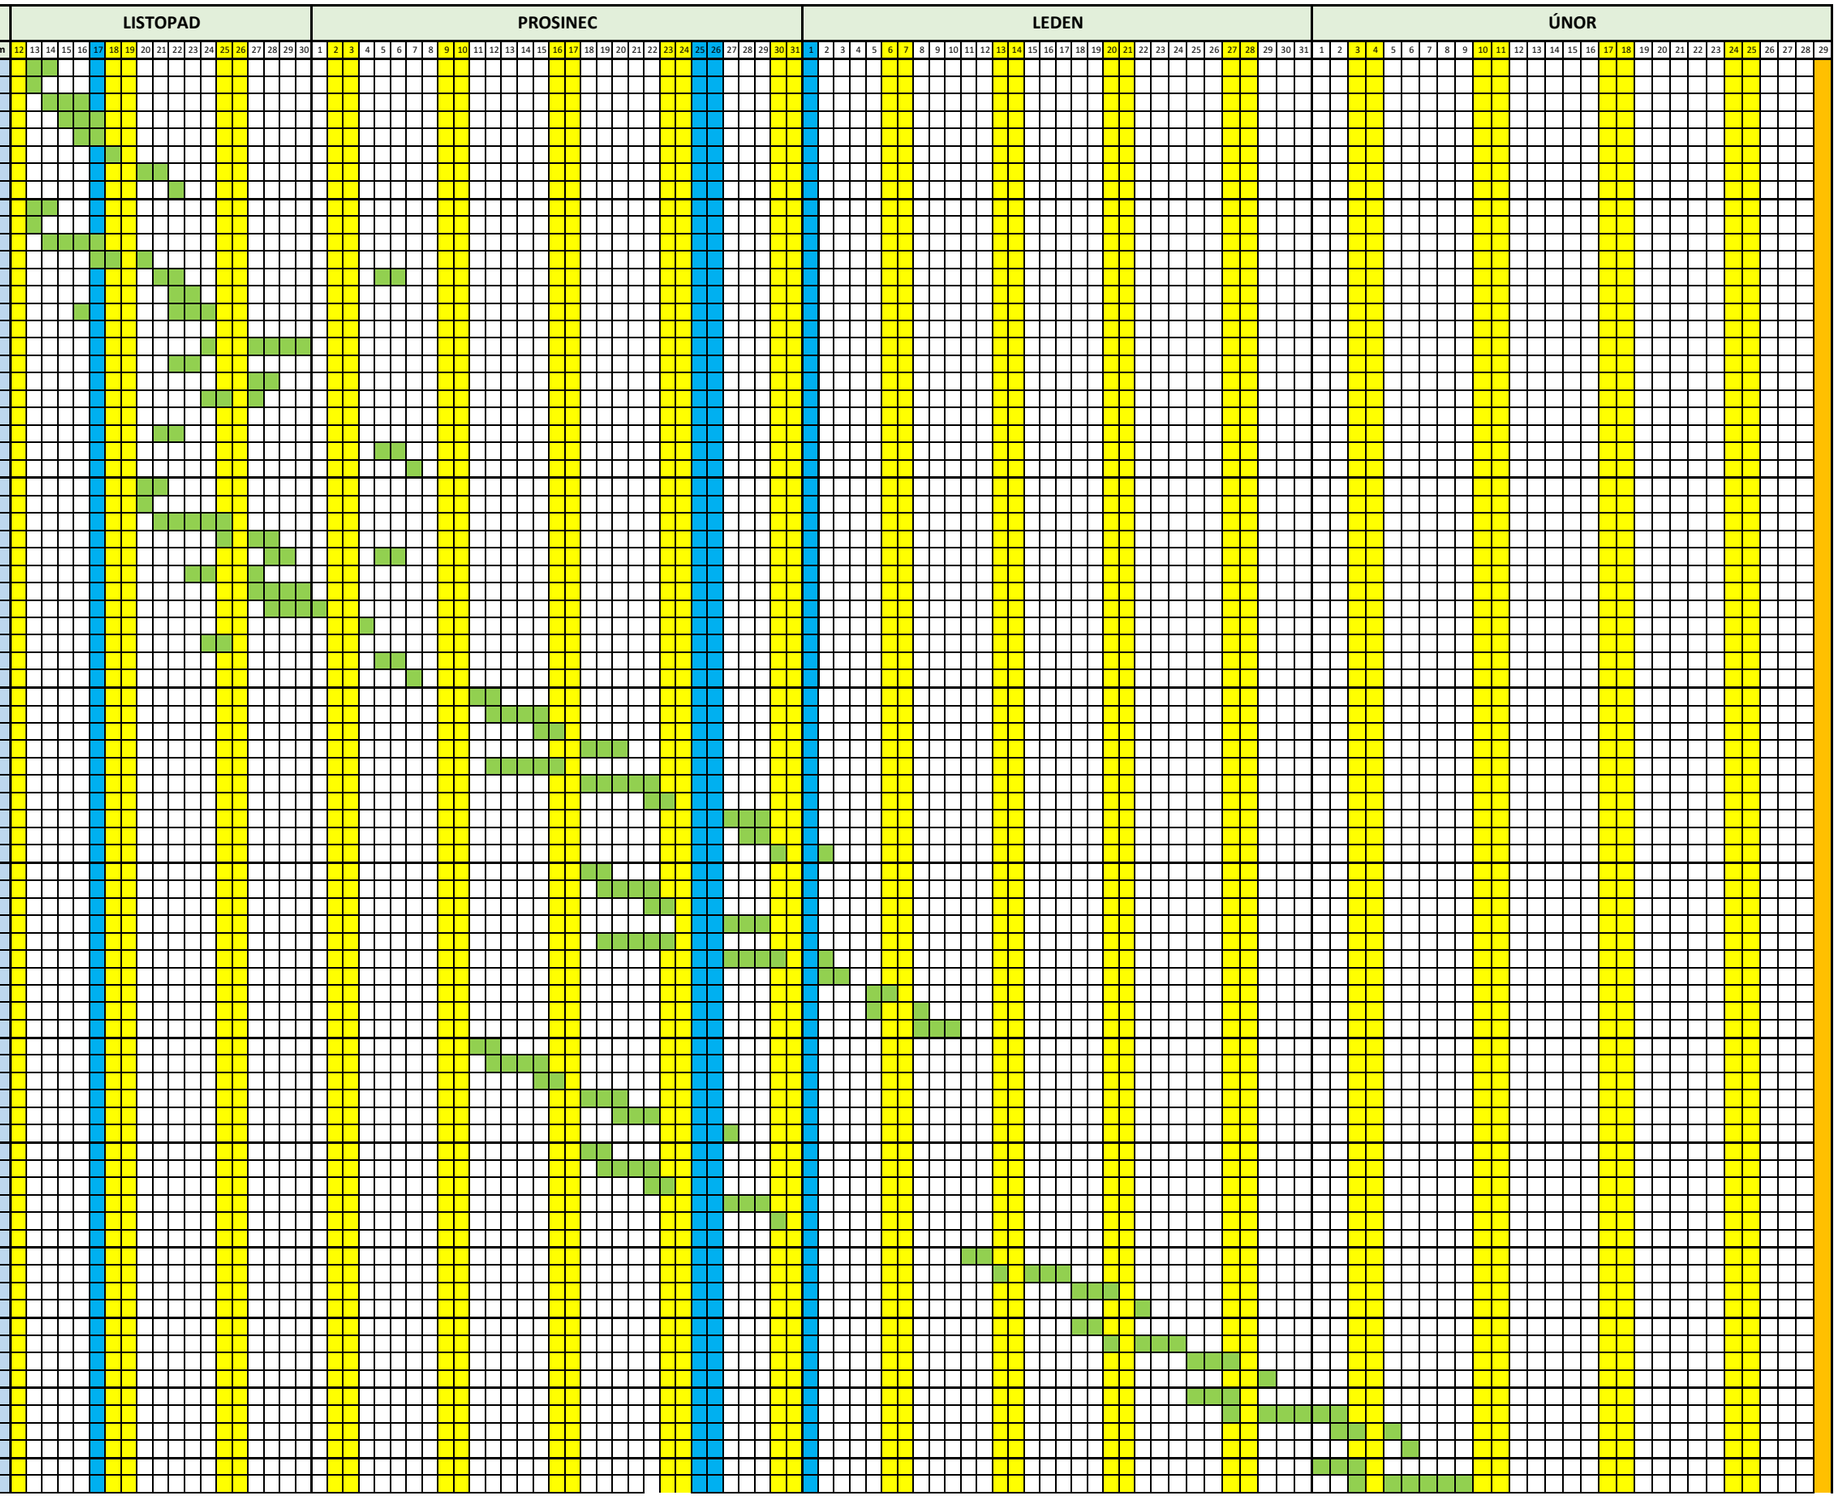



poznámka: Doba realizace 180 dní je reálná za předpokladu vyřízení všech povolení k záboru plochy nutné k realizaci od dotčených orgánů do 14 dnů od vstupního jednání

Datum : 24.08.2023

Vypracova: Michal Šlak, stavbyvedoucí
