Výměna mostnic, obnova PKO, čištění a demolice objektů
v obvodu SMT Praha OŘ Praha, vyčištění a oprava opěrné zdi
v Praze Karlíně na trati Česká Třebová - Praha Masarykovo n.

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
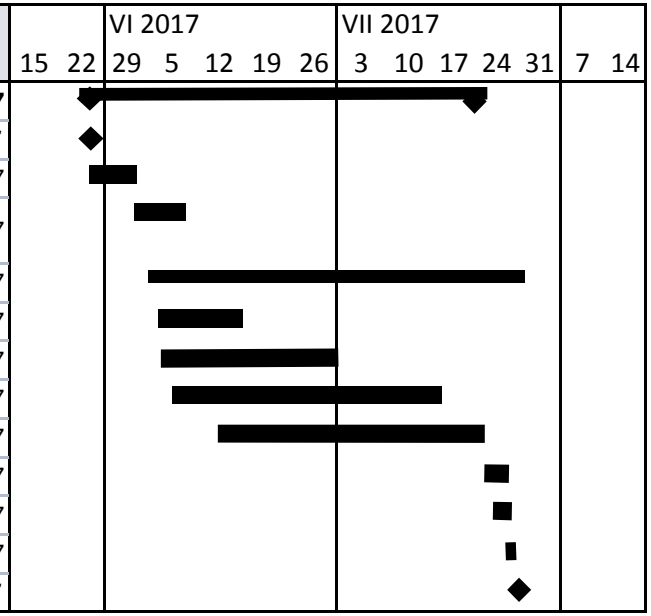
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Celková doba prací**	**64 dnů**	**29.5.2017**	**31.7.2017**
2	***Zahájení prací***	***0 dny***	***29.5.2017***	***29.5.2017***
3	zařízení staveniště, odstranění vegetace	5 dny	29.5.2017	2.6.2017
4	odstranění nánosů a zabezpečení svahu nad opěrnou zdí	6 dny	3.6.2017	8.6.2017
5	lešení	51 dny	5.6.2017	25.7.2017
6	očištění stěny pískem	14 dny	6.6.2017	19.6.2017
7	vysekání spár	25 dny	6.6.2017	30.6.2017
8	přezdění včetně spárování	40 dny	9.6.2017	18.7.2017
9	výstavba nové římsy včetně kotvení	42 dny	14.6.2017	25.7.2017
10	terénní úpravy	4 dny	26.7.2017	29.7.2017
11	dokončovací práce	3 dny	28.7.2017	30.7.2017
12	předání stavby	1 den	31.7.2017	31.7.2017
13	***Ukončení prací***	***0 dny***	***31.7.2017***	***31.7.2017***
