ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	**VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE V HORAŽĎOVICÍCH**	**599 d**	**02.01. 24**	**04.07. 25**	
2	**HLAVNÍ MILNÍKY**	**727 d**	**02.01. 24**	**30.10. 25**	
3	Písemný pokyn objednatele	0 d	02.01. 24	02.01. 24	
4	Předání a převzetí staveniště	0 d	05.01. 24	05.01. 24	3FS+4 d
5	Zahájení stavebních prací	0 d	25.01. 24	25.01. 24	12
6	Řádné dokončení a protokolární předání provedeného díla bez vad a nedodělků	0 d	30.06. 25	30.06. 25	97
7	příprava staveniště	5 d	05.01. 24	10.01. 24	4
8	DIO, zřízení vjezdů	2 d	10.01. 24	12.01. 24	7
9	staveništní přípojky	6 d	12.01. 24	17.01. 24	8
10	ZS - zřízení	3 d	17.01. 24	20.01. 24	9
11	dočasné oplocení staveniště	3 d	20.01. 24	23.01. 24	10
12	zřízení úložiště odpadu	2 d	23.01. 24	25.01. 24	11
13	SO-00 Demolice provozního objektu	25 d	12.01. 24	04.02. 24	8
14	**SO 00 Hlavní budova**	**93 d**	**24.03. 25**	**17.06. 25**	
15	3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 d	27.03. 25	28.03. 25	17
16	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 d	28.03. 25	02.04. 25	15
17	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 d	24.03. 25	26.03. 25	47
18	713 - Izolace tepelné	1 d	02.04. 25	03.04. 25	16
19	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 d	01.06. 25	05.06. 25	73FF
20	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 d	01.06. 25	05.06. 25	74FF
21	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 d	01.06. 25	05.06. 25	75FF
22	741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 d	01.06. 25	05.06. 25	80FF
23	751 - Vzduchotechnika	3 d	03.06. 25	05.06. 25	78FF
24	763 - Konstrukce suché výstavby	4 d	03.04. 25	07.04. 25	18
25	766 - Konstrukce truhlářské	2 d	07.04. 25	08.04. 25	24
26	771 - Podlahy z dlaždic	2 d	27.05. 25	29.05. 25	60SS
27	776 - Podlahy povlakové	2 d	27.05. 25	29.05. 25	61SS
28	781 - Dokončovací práce - obklady	2 d	03.06. 25	04.06. 25	63SS
29	783 - Dokončovací práce - nátěry	1 d	09.06. 25	10.06. 25	64SS
30	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 d	16.06. 25	17.06. 25	65FF
31	**020 - SO 01 Východní přístavba - stavební část**	**691 d**	**04.02. 24**	**30.10. 25**	
32	1 - Zemní práce	14 d	04.02. 24	16.02. 24	13
33	2 - Zakládání	40 d	17.02. 24	24.03. 24	32
34	3 - Svislé nosné konstrukce 1.NP	20 d	12.04. 24	30.04. 24	50
35	4 - Vodorovné konstrukce nad 1.NP	25 d	30.04. 24	23.05. 24	32;34
36	3 - Svislé nosné konstrukce 2.NP	20 d	23.05. 24	10.06. 24	35
37	4 - Vodorovné konstrukce nad 2.NP	25 d	10.06. 24	03.07. 24	36
38	3 - Svislé nosné konstrukce 3.NP	20 d	03.07. 24	22.07. 24	37
39	4 - Vodorovné konstrukce 3.NP	25 d	22.07. 24	14.08. 24	38
40	Nenosné vnitřní zdivo	60 d	25.11. 24	18.01. 25	42
41	Atiky a střešní obezdívky	12 d	14.08. 24	25.08. 24	39
42	výplně otvorů vnější	40 d	19.10. 24	24.11. 24	51
43	5 - Komunikace pozemní	180 d	18.05. 25	30.10. 25	44
44	62 - Úprava povrchů vnějších	190 d	25.11. 24	18.05. 25	42
45	63 - Podlahy a podlahové konstrukce	70 d	24.03. 25	27.05. 25	47
46	64 - Osazování výplní otvorů - zárubně	15 d	14.08. 24	27.08. 24	39
47	61 - Úprava povrchů vnitřních	70 d	19.01. 25	24.03. 25	40
48	9 - Ostatní konstrukce a práce,lešení	110 d	19.10. 24	28.01. 25	51
49	96 - Bourání konstrukcí	3 d	12.04. 24	14.04. 24	34SS
50	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 d	24.03. 24	12.04. 24	33
51	712 - Povlakové krytiny	60 d	25.08. 24	19.10. 24	41
52	713 - Izolace tepelné	110 d	25.08. 24	04.12. 24	51SS
53	762 - Konstrukce tesařské	10 d	12.09. 24	21.09. 24	55
54	763 - Konstrukce suché výstavby	10 d	18.05. 25	27.05. 25	45FF
55	7631 - Dřevostavby - přihradové vazníky	10 d	03.09. 24	12.09. 24	51SS+10 d
56	764 - Konstrukce klempířské	15 d	21.09. 24	05.10. 24	53
57	765 - Krytina skládaná	25 d	05.10. 24	28.10. 24	56
58	766 - Konstrukce truhlářské - dveře vnitřní	15 d	27.05. 25	10.06. 25	54
59	767 - Konstrukce zámečnické vč. Ocelové kce. Spojovacího krčku	90 d	22.07. 24	12.10. 24	38
60	771 - Podlahy z dlaždic	7 d	27.05. 25	02.06. 25	45
61	776 - Podlahy povlakové	7 d	27.05. 25	02.06. 25	60SS
62	777 - Podlahy lité	4 d	03.06. 25	06.06. 25	60
63	781 - Dokončovací práce - obklady	7 d	03.06. 25	09.06. 25	60
64	783 - Dokončovací práce - nátěry	2 d	09.06. 25	11.06. 25	63
65	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 d	11.06. 25	17.06. 25	64
66	786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	3 d	17.06. 25	20.06. 25	65
67	Výtahy	250 d	19.10. 24	05.06. 25	77SS
68	**021 - SO 01 Východní přístavba - ZTI**	**531 d**	**04.02. 24**	**05.06. 25**	
69	1 - Zemní práce	14 d	04.02. 24	16.02. 24	32SS
70	5 - Komunikace pozemní	10 d	27.05. 25	05.06. 25	45
71	8 - Trubní vedení	21 d	17.02. 24	07.03. 24	69
72	Úpravy po položení sítí	7 d	07.03. 24	13.03. 24	71
73	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	250 d	19.10. 24	05.06. 25	51
74	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	250 d	19.10. 24	05.06. 25	73SS
75	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	250 d	19.10. 24	05.06. 25	73SS
76	022 - SO 01 Vytápění - úprava plynové kotelny	250 d	19.10. 24	05.06. 25	73SS
77	023 - SO 01 Vytápění - přístavba	250 d	19.10. 24	05.06. 25	73SS
78	024 - SO 01 VZT a klimatizace	250 d	19.10. 24	05.06. 25	73SS
79	025 - SO 01 MaR	250 d	19.10. 24	05.06. 25	73SS
80	026 - SO 01 Elektroinstalace - silnoproud	250 d	19.10. 24	05.06. 25	73SS
81	027 - SO 01 Elektroinstalace - slaboproud	250 d	19.10. 24	05.06. 25	73SS
82	028 - SO 01 Fotovoltaická elektrárna	250 d	19.10. 24	05.06. 25	73SS
83	**Kompletace**	**57 d**	**09.05. 25**	**30.06. 25**	
84	Ukončení stavebních a montážních prací	0 d	05.06. 25	05.06. 25	80
85	Postupné funkční zkoušky a revize	30 d	09.05. 25	05.06. 25	84FF
86	**Individuální zkoušky technologie**	**26 d**	**05.06. 25**	**29.06. 25**	
87	IZ - silnoproud	12 d	05.06. 25	16.06. 25	84
88	IZ - slaboproud	12 d	05.06. 25	16.06. 25	84
89	IZ - VZT	12 d	05.06. 25	16.06. 25	87SS
90	Ukončení IZ	0 d	16.06. 25	16.06. 25	87;88;89
91	Úklid stavby	10 d	20.06. 25	29.06. 25	66
92	**Převzetí objektu**	**15 d**	**16.06. 25**	**30.06. 25**	
93	Komplexní zkoušky technologie	5 d	16.06. 25	21.06. 25	90
94	Zahájení předpřejímek	0 d	21.06. 25	21.06. 25	93
95	Odstraňování vad a nedodělků	10 d	21.06. 25	30.06. 25	94
96	Součinnost pro kolaudaci, předložení podkladů pro kolaudaci	10 d	21.06. 25	30.06. 25	94
97	Předání stavby Objednateli	0 d	30.06. 25	30.06. 25	95

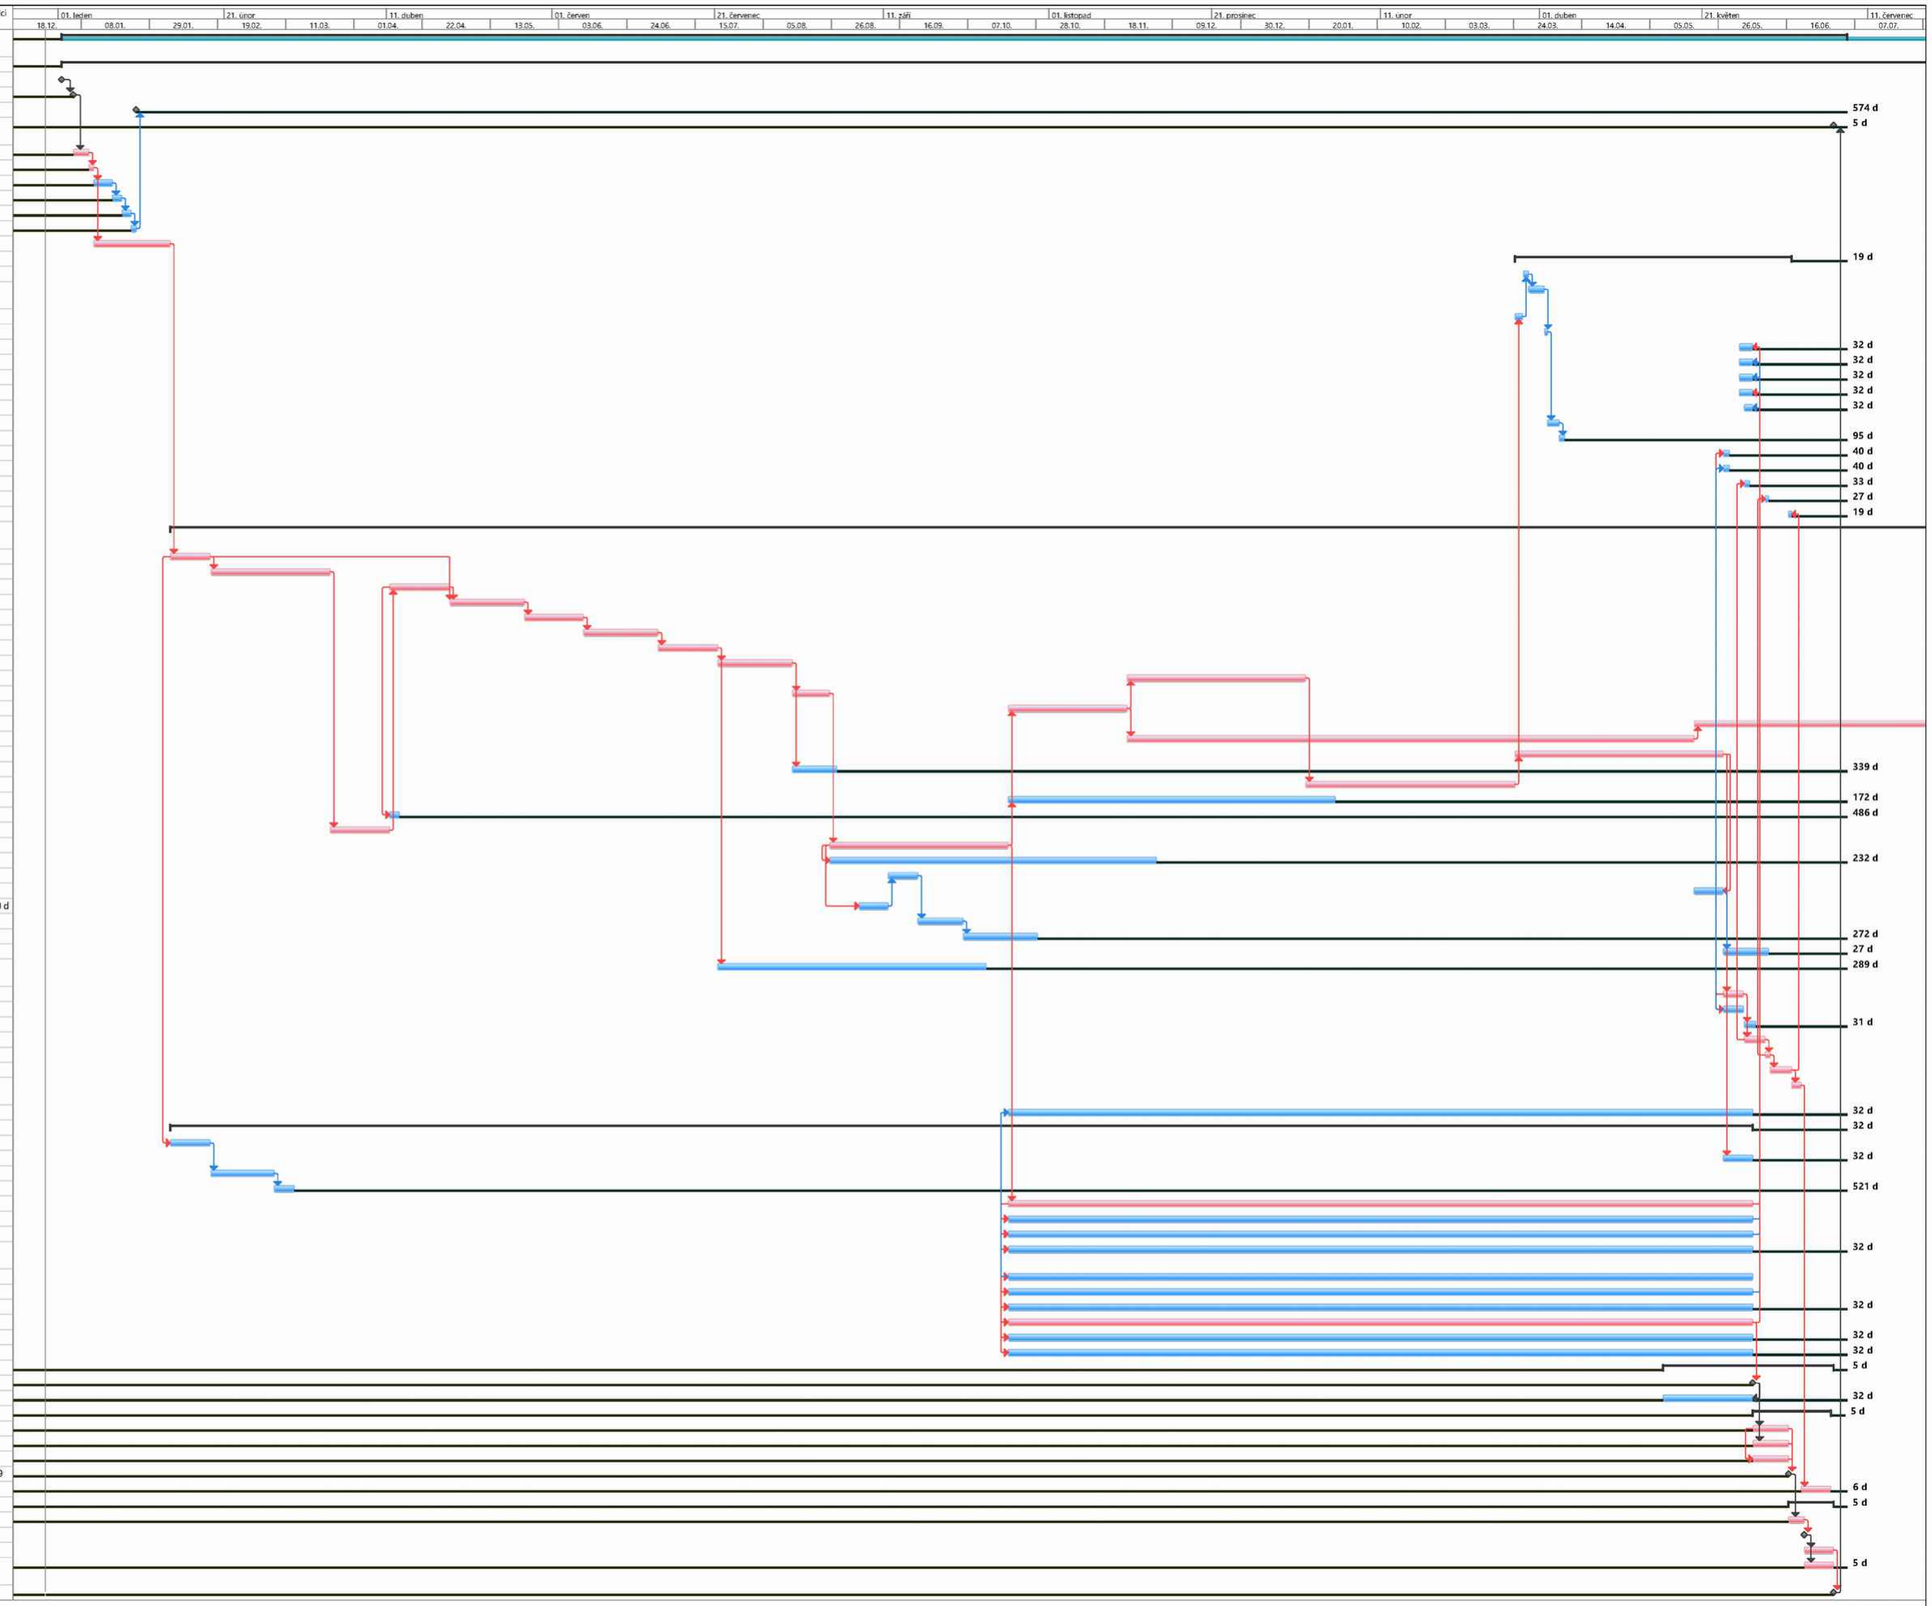

Kritický	Rozdělení	Skluz	Zahrnutý kritický	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník		
Rozdělení kritického úkolu	Milník	Souhrnný	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín		
Úkol	Časová rezerva	Souhrn projektu	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Průběh		

Ing. Kamil Vykydal
Digitální podpis: 27.11.2023 17:18:56
