Společnost "TBR + Firesta + STRABAG - Dvorecký most "

Dvorecký most - časový harmongram - Baseline - druhá aktualizace

18.10.2023

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**Dvorecký most - celkem**	**1144 dny**	**17.06. 22**	**04.08. 25**
2		Pokyn k zahájení prací	1 den	13.09. 22	13.09. 22
3		Předání staveniště	1 den	20.09. 22	20.09. 22
4		**Dokumentace RDS - vypracování + schválení**	**957 dny**	**17.06. 22**	**28.01. 25**
289		**Dvorecký most - Realizace**	**1049 dny**	**20.09. 22**	**04.08. 25**
290		**Zahájení stavby-předání staveniště**	**0 dny**	**20.09. 22**	**20.09. 22**
291	**0**	**Objekty přípravy staveniště**	**246 dny**	**21.09. 22**	**24.05. 23**
292	1	Příprava území - levý břeh Vltavy vč.zařízení staveniště	35 dny	28.09. 22	01.11. 22
293		Příprava území - levý břeh Vltavy dodatečné práce	91 dny	02.11. 22	31.01. 23
294		Změna "a" Zajištění VK Smíchov - RDS vč. schválení	21 dny	01.02. 23	21.02. 23
295		Změna "a" Zajištění VK Smíchov - Realizace	21 dny	22.02. 23	14.03. 23
296		Příprava území - levý břeh Vltavy - molo SK Zlíchov	7 dny	21.03. 23	27.03. 23
297	3	Příprava území - pravý břeh Vltavy vč. zařízení staveniště	38 dny	21.09. 22	28.10. 22
298		Kácení	5 dny	13.02. 23	17.02. 23
299		Úprava vjezdu	11 dny	18.02. 23	28.02. 23
300		Příprava území - pravý břeh Vltavy dodatečné práce	208 dny	29.10. 22	24.05. 23
301	**100**	**Objekty pozemních komunikací**	**1024 dny**	**21.09. 22**	**10.07. 25**
302		Vytýčení a přeložení inženýrských sítí pro SO řady 100	11 dny	21.09. 22	01.10. 22
303	**101**	**Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy**	**464 dny**	**29.03. 24**	**06.07. 25**
304		RDS - schválení čistopisu	0 dny	29.03. 24	29.03. 24
305		část mezi ul. Na Zlíchově a nádraží	56 dny	12.04. 25	06.06. 25
306		dělící ostrůvek a přechody pro chodce v ul. Na Zlíchově	30 dny	07.06. 25	06.07. 25
307	**102**	**Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí**	**899 dny**	**29.11. 22**	**16.05. 25**
308		RDS - schválení čistopisu vrátnice	0 dny	29.11. 22	29.11. 22
309		RDS - schválení čistopisu zbytek	0 dny	30.05. 23	30.05. 23
310		část Žluté lázně - Vrátnice	71 dny	29.03. 23	07.06. 23
311		výšková úprava - přebalení pražců	15 dny	10.05. 23	24.05. 23
312		směr z centra	50 dny	06.02. 25	27.03. 25
313		směr do centra - pravá strana	25 dny	28.03. 25	21.04. 25
314		směr do centra - levá strana	25 dny	22.04. 25	16.05. 25
315	**103**	**Žluté lázně-vozovky a zpevněné plochy**	**933 dny**	**25.11. 22**	**15.06. 25**
316		RDS - schválení čistopisu vrátnice	0 dny	25.11. 22	25.11. 22
317		část vrátnice	15 dny	12.04. 23	26.04. 23
318		RDS - schválení čistopisu zbytek	0 dny	25.11. 22	25.11. 22
319		část ostatní	30 dny	17.05. 25	15.06. 25
320	**121**	**Dopravní značení**	**783 dny**	**16.05. 23**	**06.07. 25**
321		Část Žluté lázně	31 dny	16.05. 23	15.06. 23
322		Část zbývající	336 dny	05.08. 24	06.07. 25
323	**131**	**Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy**	**732 dny**	**27.10. 22**	**27.10. 24**
324		RDS - schválení čistopisu	0 dny	01.12. 22	01.12. 22
325		Zpevněná nábřežní hrana včetně přísypu	79 dny	27.10. 22	13.01. 23
326		Odstranění nábřežní hrany	28 dny	30.09. 24	27.10. 24
327	**133**	**Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy**	**688 dny**	**01.12. 22**	**19.10. 24**
328		RDS - schválení čistopisu	0 dny	01.12. 22	01.12. 22
329		Zpevněná nábřežní hrana včetně přísypu	74 dny	04.12. 22	15.02. 23
330		Odstranění nábřežní hrany	28 dny	22.09. 24	19.10. 24
331	**181**	**Dopravně - inženýrská opatření**	**1002 dny**	**12.10. 22**	**10.07. 25**
332		Etapa 2 - vykácení a rozšíření vjezdu - vyparkování u vjezdu na ZS	16 dny	13.02. 23	28.02. 23
333		Etapa 3 - vykácení dřevin směr DC ul. Pn	16 dny	13.02. 23	28.02. 23
334		Etapa 4 - uzavírka směr DC ul. Pn	31 dny	01.03. 23	31.03. 23
335		Etapa 5 - výluka TT + uzavírka přilehých pruhů ul. Pn	27 dny	01.04. 23	27.04. 23
336		Etapa 6 - výluka TT + uzavírka směr ZC ul. Pn	12 dny	28.04. 23	09.05. 23
337		Etapa 7 - uzavírka směr ZC ul. Pn	15 dny	10.05. 23	24.05. 23
338		Etapa 8 - Opatření z důvodu ochranného klínu	367 dny	25.05. 23	25.05. 24
339		RDS - schválení čistopisu	0 dny	12.10. 22	12.10. 22
340		Souhrnné dopravně-inženýrské opatření	993 dny	22.10. 22	10.07. 25
341	**191**	**Terénní úpravy - Podolí**	**614 dny**	**31.10. 23**	**06.07. 25**
342		RDS - schválení čistopisu	0 dny	31.10. 23	31.10. 23
343		Terénní úpravy	51 dny	17.05. 25	06.07. 25
344	**192**	**Terénnní úpravy - Hlubočepy**	**614 dny**	**31.10. 23**	**06.07. 25**
345		RDS - schválení čistopisu	0 dny	31.10. 23	31.10. 23
346		Terénní úpravy	51 dny	17.05. 25	06.07. 25
347	**200**	**Mostní objekty a zdi**	**1008 dny**	**21.09. 22**	**24.06. 25**
348	**201**	**Tramvajový most přes Vltavu**	**1008 dny**	**21.09. 22**	**24.06. 25**
349		Vytýčení a přeložení inženýrských sítí pro SO řady 200	11 dny	21.09. 22	01.10. 22
350		**RDS - schválení čistopisu**	**524 dny**	**27.10. 22**	**03.04. 24**
351		Zakládání O1, P2, P3, P6, O7	0 dny	27.10. 22	27.10. 22
352		Zakládání P4 a P5	0 dny	01.12. 22	01.12. 22
353		Zakládání štětovnicové jímky P4, P5	0 dny	27.12. 22	27.12. 22
354		Spodní stavba P2, P3 a P6	0 dny	05.01. 23	05.01. 23
355		Spodní stavba P4 a P5	0 dny	22.06. 23	22.06. 23
356		**Spodní stavba O1 a O7**	**96 dny**	**16.02. 23**	**23.05. 23**
357		Část 200.2 - základy	0 dny	16.02. 23	16.02. 23
358		Část 200.3 - zbývající část	0 dny	23.05. 23	23.05. 23
359		Nosná konstrukce - část 1 - Etapa č.1 Tvar	0 dny	13.07. 23	13.07. 23
360		Nosná konstrukce - část 2 - Etapa č. 1, 2 a 3	0 dny	20.07. 23	20.07. 23
361		Nosná konstrukce - část 3 - Etapa č. 4, 5 a 6	0 dny	27.07. 23	27.07. 23
362		Příslušenství	0 dny	03.04. 24	03.04. 24
363		**OP1**	**579 dny**	**21.09. 22**	**21.04. 24**
364		Přeložky kabelů SO 401, SO 402, SO 403	133 dny	21.09. 22	31.01. 23

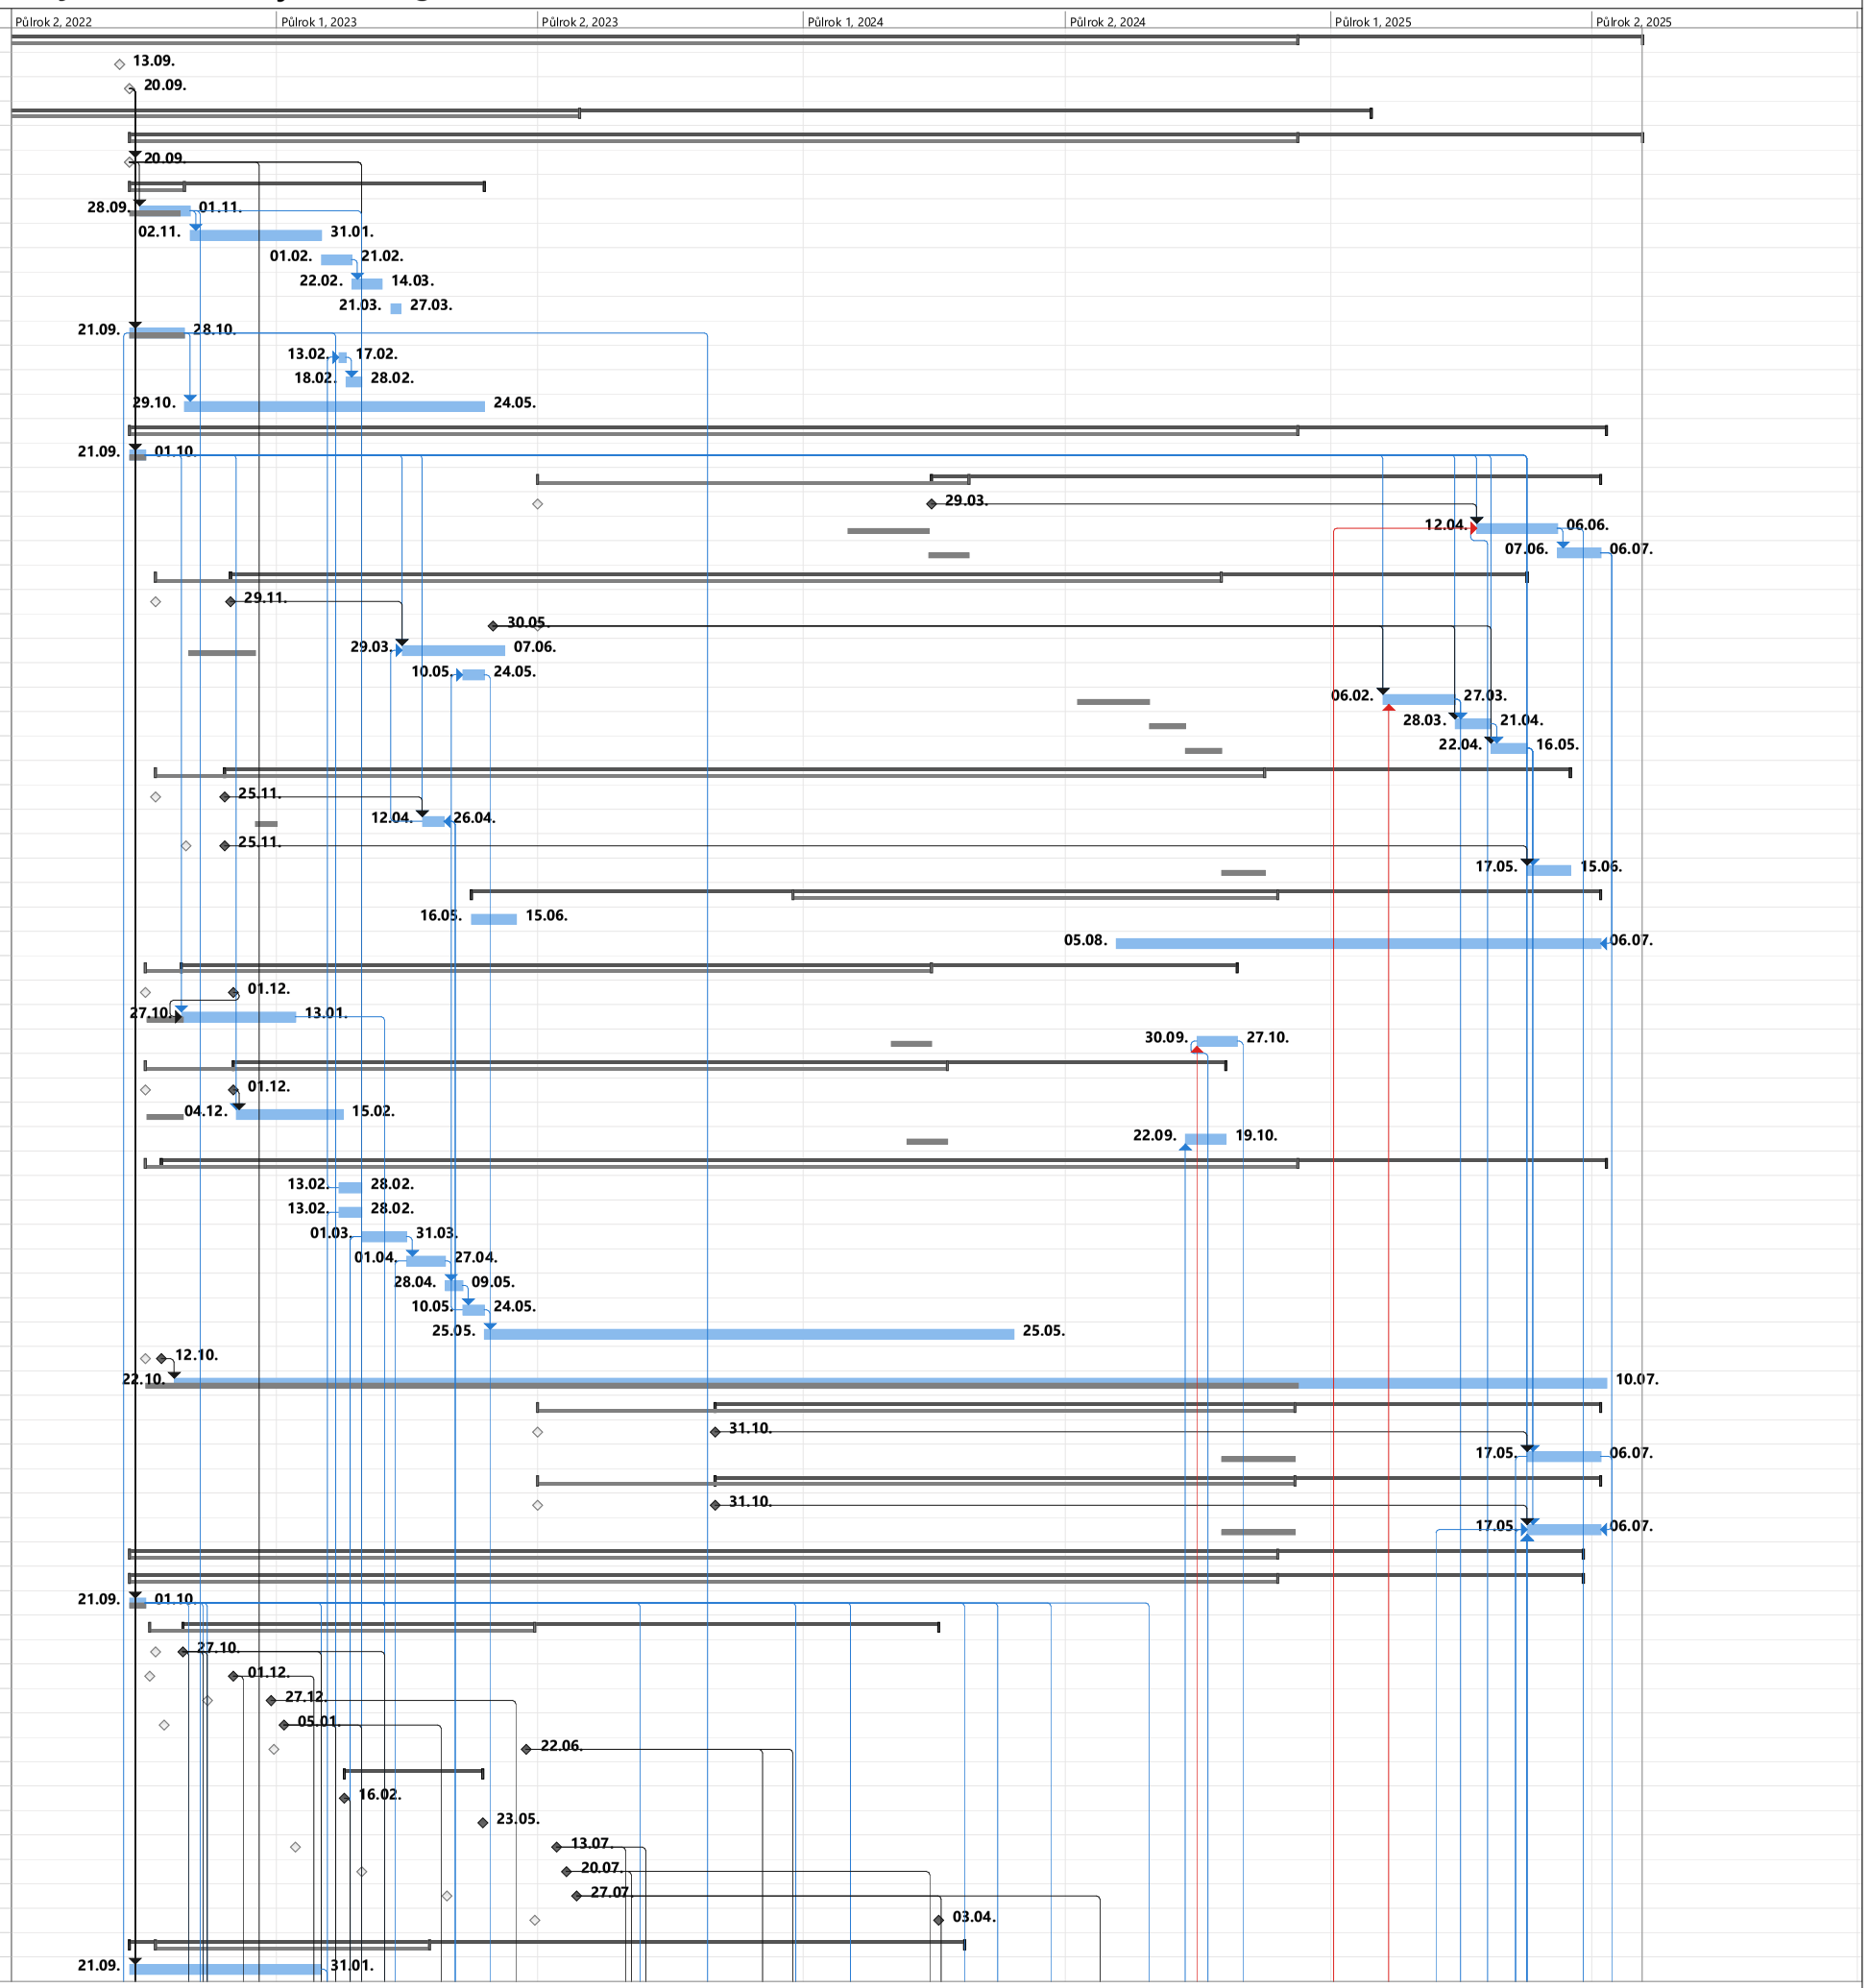

Jméno : Tomáš Veselý
Certifikát autora podpisu :
Čas podpisu : 18.10.2023
Vydal : ACaDiD 2 - Issuing Certificate
Fingerprint: 3c 1b 20 26 4e 83 1a 00 00 e0 2d 00

Dvorecký most - časový harmongram - Baseline - druhá aktualizace

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
365		Hlubinné založení včetně jímek	19 dny	01.02. 23	19.02. 23
366		Pažení opěry 100.4_změna b	20 dny	01.03. 23	20.03. 23
367		Záporová stěna za OP1 - SO 200.8 změna a	277 dny	01.04. 23	02.01. 24
368		Základ	46 dny	21.03. 23	05.05. 23
369		Dřík	97 dny	06.05. 23	10.08. 23
370		**Křídla**	**255 dny**	**11.08. 23**	**21.04. 24**
371		Levé křídlo	30 dny	11.08. 23	09.09. 23
372		Pravé křídlo - hlubinné založení	20 dny	07.12. 23	26.12. 23
373		Pravé křídlo - výkopy + základ + dřík	90 dny	23.01. 24	21.04. 24
374		**P2**	**171 dny**	**14.11. 22**	**03.05. 23**
375		Hlubinné založení bez jímek	24 dny	14.11. 22	07.12. 22
376		Přepracování a schálení návrhu záporové jímky	51 dny	08.12. 22	27.01. 23
377		Záporová jímka včetně vytěžení	14 dny	28.01. 23	10.02. 23
378		Základ	18 dny	11.02. 23	28.02. 23
379		Dřík	64 dny	01.03. 23	03.05. 23
380		**P3**	**227 dny**	**03.01. 23**	**17.08. 23**
381		Přerušení mobilizace kapacit	29 dny	03.01. 23	31.01. 23
382		Zajištění VK Smíchov - RDS vč. schválení	21 dny	01.02. 23	21.02. 23
383		Zajištění VK Smíchov - Realizace	22 dny	22.02. 23	15.03. 23
384		Hlubinné založení včetně jímky	39 dny	17.03. 23	24.04. 23
385		Základ	26 dny	25.04. 23	20.05. 23
386		Dřík	53 dny	26.06. 23	17.08. 23
387		**P4**	**493 dny**	**30.11. 22**	**05.04. 24**
388		**Hlubinné založení**	**177 dny**	**30.11. 22**	**25.05. 23**
389		Beranící pokus pro zhotovení těsněných jímek pilířů P4 a P5 v korytě řeky Vltavy	1 den	30.11. 22	30.11. 22
390		Oznámení o výsledcích beranícího pokusu (DM/2022/17)	1 den	01.12. 22	01.12. 22
391		Pokyn Zhotoviteli (MHMP 2282666/2022) - návrh realizace pokusných předvrtů pro jímky P4	1 den	08.12. 22	08.12. 22
392		Oznámení Zhotovitele (DM/2023/01) ve věci zpětné vazby na Pokyn Zhotoviteli (MHMP 2282666/2022) vztahující se k dopisům Zhotovitele č.j. DM/2022/17 a DM/2022/18	1 den	02.01. 23	02.01. 23
393		Pokyn Příkaznika č. 3 k provedení změny Díla - změna průměru pilot pod P4 (č.j. RM-LM/2023-17)	1 den	25.01. 23	25.01. 23
394		Hlubinné založení (dle RDS změna a)- do přeřušení	4 dny	27.01. 23	30.01. 23
395		Pokyn k provedení doplňkového IGP	1 den	02.02. 23	02.02. 23
396		Doplňkový IGP včetně vyhodnocení	36 dny	02.02. 23	09.03. 23
397		Zapracování výsledků IGP do RDS 100.2b změna b	34 dny	10.03. 23	12.04. 23
398		Hlubinné založení (dle RDS změna b) - pokračování dle Změny b	48 dny	08.04. 23	25.05. 23
399		**Jímka ve Vltavě**	**192 dny**	**26.05. 23**	**03.12. 23**
400		Čistopis RDS část 100.3a Změna a	1 den	31.05. 23	31.05. 23
401		Mobilizace	21 dny	26.05. 23	15.06. 23
402		Předvrty pro štětovnice	73 dny	16.06. 23	27.08. 23
403		Jímka + 9 dnů opeření	79 dny	28.08. 23	14.11. 23
404		Injektáž pat pilot	19 dny	15.11. 23	03.12. 23
405		Základ	60 dny	04.12. 23	01.02. 24
406		Dřík	64 dny	02.02. 24	05.04. 24
407		**P5**	**476 dny**	**09.12. 22**	**28.03. 24**
408		Hlubinné založení	40 dny	09.12. 22	17.01. 23
409		Předvrty pro štětovnice	51 dny	28.08. 23	17.10. 23
410		Opeření	14 dny	18.10. 23	31.10. 23
411		Jímka	54 dny	01.11. 23	24.12. 23
412		Základ	35 dny	25.12. 23	28.01. 24
413		Dřík	60 dny	29.01. 24	28.03. 24
414		**P6**	**183 dny**	**11.11. 22**	**12.05. 23**
415		Hlubinné založení včetně jímek	110 dny	11.11. 22	28.02. 23
416		Základ	32 dny	01.03. 23	01.04. 23
417		Dřík	41 dny	02.04. 23	12.05. 23
418		**OP7**	**380 dny**	**01.11. 22**	**15.11. 23**
419		Hlubinné založení včetně jímek	90 dny	01.11. 22	29.01. 23
420		Přípravné práce pro základ	18 dny	30.01. 23	16.02. 23
421		Základ	35 dny	17.02. 23	23.03. 23
422		Dřík	107 dny	13.05. 23	27.08. 23
423		Základy křídel - 2. úroveň	24 dny	24.03. 23	16.04. 23
424		Základy křídel vč. odtěžení - 3. úroveň	60 dny	25.05. 23	23.07. 23
425		Křídla - 2. úroveň	40 dny	28.08. 23	06.10. 23
426		Křídla - 3. úroveň	40 dny	07.10. 23	15.11. 23
427		**Nosná konstrukce**	**664 dny**	**31.08. 23**	**24.06. 25**
428		Pole OP1 - P2	180 dny	31.08. 23	26.02. 24
429		Pole P2 - P3	223 dny	14.09. 23	23.04. 24
430		Pole P3 - P4	170 dny	06.04. 24	22.09. 24
431		Pole P4 - P5	196 dny	25.07. 24	05.02. 25
432		Pole P5 - P6	170 dny	29.03. 24	14.09. 24
433		Pole P6 - OP7	198 dny	04.09. 23	19.03. 24
434		Vybavení a dokončovací práce	169 dny	07.01. 25	24.06. 25
435		Zatěžovací zkouška	2 dny	26.05. 25	27.05. 25
436	**202**	**Cyklolávka - Hlubočepy**	**553 dny**	**04.08. 23**	**07.02. 25**
437		RDS - schválení čistopisu - zakládání	0 dny	04.08. 23	04.08. 23
438		RDS - schválení čistopisu -spodní stavba	0 dny	01.09. 23	01.09. 23
439		RDS - schválení čistopisu - nosná konstrukce	0 dny	06.10. 23	06.10. 23
440		RDS - schválení čistopisu - příslušenství	0 dny	03.11. 23	03.11. 23

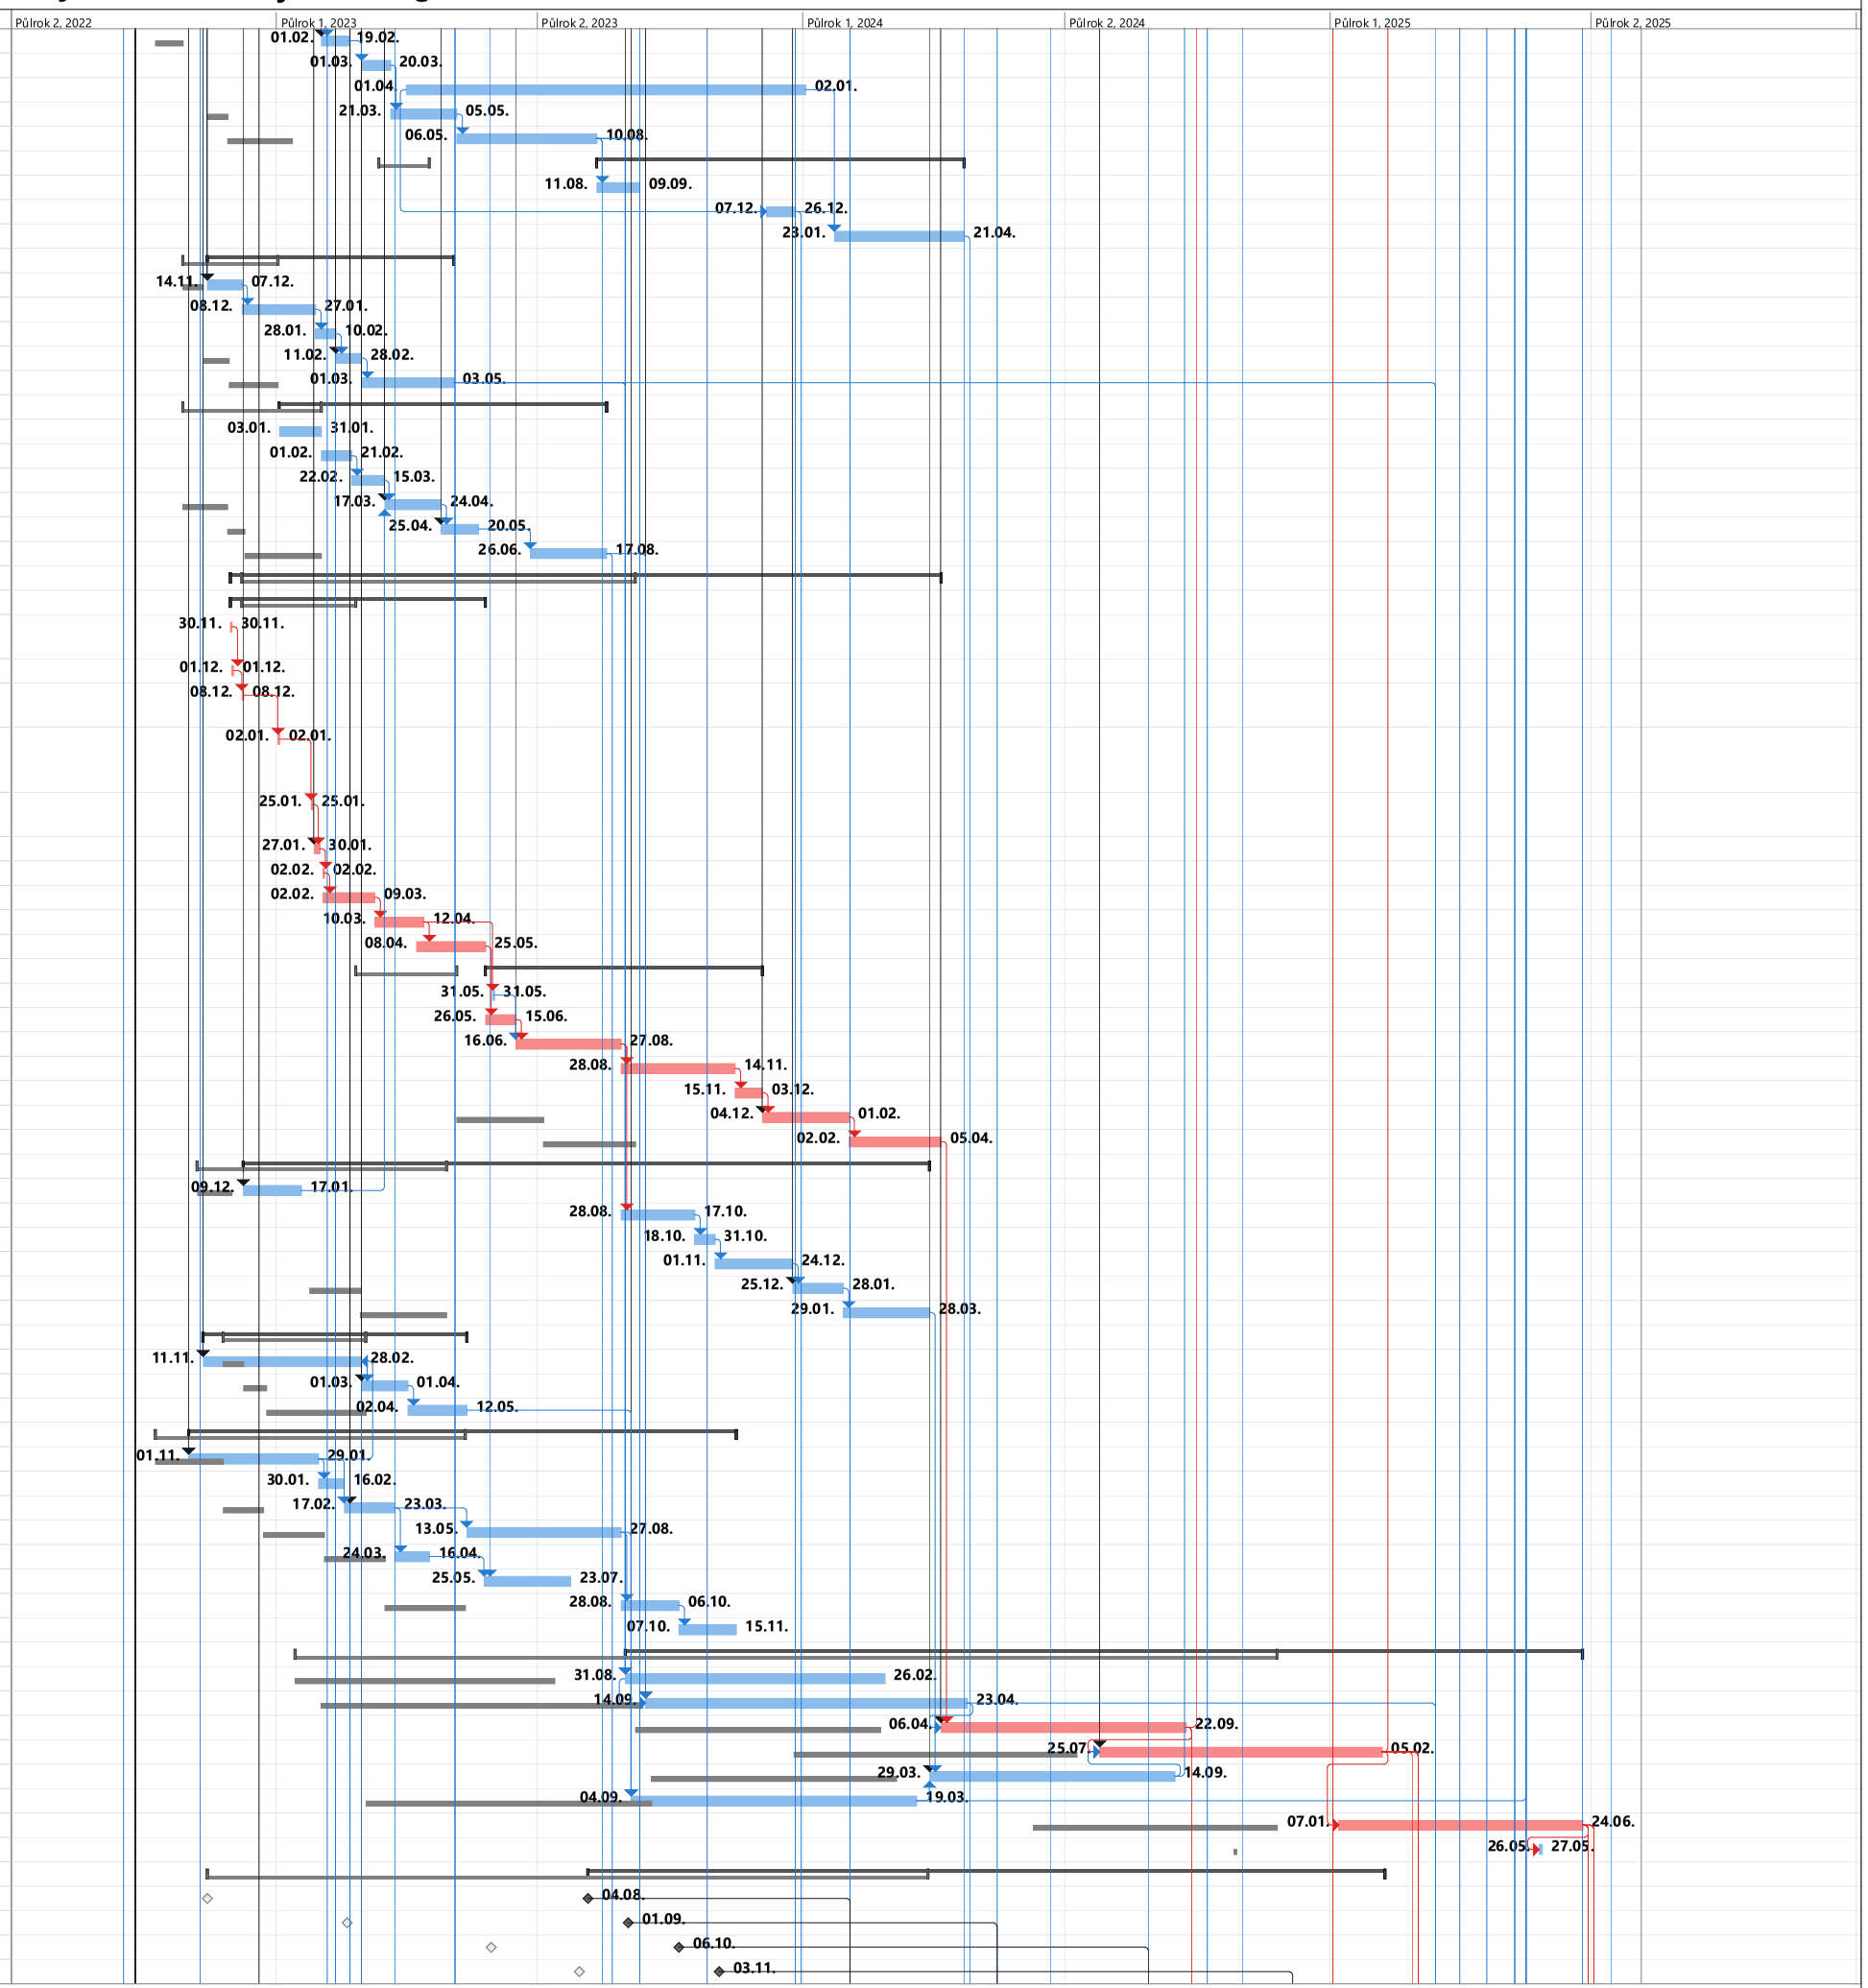

Dvorecký most - časový harmongram - Baseline - druhá aktualizace

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
441		Zakládání	102 dny	03.02. 24	14.05. 24
442		Spodní stavba	105 dny	15.05. 24	27.08. 24
443		Nosná konstrukce	100 dny	28.08. 24	05.12. 24
444		Mostní svršek a příslušenství	64 dny	06.12. 24	07.02. 25
445	**221**	**Opěrné zdi - Hlubočepy**	**484 dny**	**24.04. 23**	**19.08. 24**
446		RDS - schválení čistopisu - zakládání	0 dny	04.05. 23	04.05. 23
447		RDS - schválení čistopisu - spodní stavba	0 dny	11.08. 23	11.08. 23
448		Hlubinné založení 4ks za kabelovodem	7 dny	24.04. 23	30.04. 23
449		Hlubinné založení 4ks Lávka Zlíchov	4 dny	02.05. 23	05.05. 23
450		Zajištění stavební jámy vč. zemních prací	35 dny	10.09. 23	14.10. 23
451		Hlubinné založení	28 dny	27.12. 23	23.01. 24
452		Založení	60 dny	22.04. 24	20.06. 24
453		Opěrné zdi	60 dny	21.06. 24	19.08. 24
454	**300**	**Vodohospodářské objekty**	**934 dny**	**21.09. 22**	**12.04. 25**
455		Vytýčení a přeložení inženýrských sítí pro SO řady 300	11 dny	21.09. 22	01.10. 22
456	**301**	**Dešťová kanalizace - Hlubočepy**	**353 dny**	**02.11. 23**	**20.10. 24**
457		RDS - schválení čistopisu	0 dny	02.11. 23	02.11. 23
458		Dešťová kanalizace - Hlubočepy	28 dny	23.09. 24	20.10. 24
459	**302**	**Dešťová kanalizace - Podolí**	**584 dny**	**29.03. 23**	**02.11. 24**
460		RDS - schválení čistopisu	0 dny	29.03. 23	29.03. 23
461		Napojení UV 11 - hl. 3,5 m	5 dny	03.04. 23	07.04. 23
462		Napojení UV 10 - hl. 3,5 m	6 dny	05.04. 23	10.04. 23
463		Dešťová kanalizace - Podolí	56 dny	08.09. 24	02.11. 24
464	**304**	**Splašková přípojka - Hlubočepy, objekt IC PID**	**422 dny**	**05.10. 23**	**30.11. 24**
465		RDS - schválení čistopisu	0 dny	05.10. 23	05.10. 23
466		Splašková přípojka - Hlubočepy, objekt IC PID	28 dny	03.11. 24	30.11. 24
467	**305**	**Splašková přípojka - Podolí, areál Arény**	**426 dny**	**05.10. 23**	**04.12. 24**
468		RDS - schválení čistopisu	0 dny	05.10. 23	05.10. 23
469		Splašková přípojka - Podolí, areál Arény	28 dny	07.11. 24	04.12. 24
470	**306**	**Odvodnění vozovek a chodníků, Hlubočepy**	**526 dny**	**02.11. 23**	**12.04. 25**
471		RDS - schválení čistopisu	0 dny	02.11. 23	02.11. 23
472		Odvodnění vozovek a chodníků, Hlubočepy	28 dny	15.03. 25	12.04. 25
473	**307**	**Splašková přípojka Podolí-Žluté lázně**	**146 dny**	**01.12. 22**	**26.04. 23**
474		RDS - schválení čistopisu	0 dny	01.12. 22	01.12. 22
475		Splašková přípojka - hlavní trasa	14 dny	16.01. 23	29.01. 23
476		Splašková přípojka - připojení	14 dny	13.04. 23	26.04. 23
477	**312**	**Vodovodní přípojka - Hlubočepy, objekt IC PID**	**628 dny**	**23.07. 23**	**11.04. 25**
478		RDS - schválení čistopisu	0 dny	23.07. 23	23.07. 23
479		Vodovodní přípojka - Hlubočepy, objekt IC PID	28 dny	15.03. 25	11.04. 25
480	**313**	**Přeložka vodovodní přípojky - VK Smíchov**	**702 dny**	**25.11. 22**	**28.10. 24**
481		RDS - schválení čistopisu	0 dny	25.11. 22	25.11. 22
482		RDS - Změna A - Provizorní	0 dny	06.01. 23	06.01. 23
483		RDS - Změna B - Definitivní	0 dny	01.12. 23	01.12. 23
484		Přípravné práce - Přeložka vodovodní přípojky - VK Smíchov	28 dny	26.11. 22	23.12. 22
485		Změna A - Přeložka vodovodní přípojky - VK Smíchov	5 dny	07.01. 23	11.01. 23
486		Změna B - Definitivní přeložka přípojky VK Smíchov	25 dny	03.10. 24	28.10. 24
487	**314**	**Vodovodní řád - Podolí**	**616 dny**	**29.03. 23**	**05.12. 24**
488		RDS - schválení čistopisu	0 dny	29.03. 23	29.03. 23
489		**Pod TT**	7 dny	03.04. 23	09.04. 23
490		Výkop (do ca 2m) vč. pažení	2 dny	03.04. 23	04.04. 23
491		Uložení potrubí TLT DN 150 vč. podsypu	2 dny	05.04. 23	06.04. 23
492		Zkouška těsnosti	1 den	07.04. 23	07.04. 23
493		Zásyp	2 dny	08.04. 23	09.04. 23
494		Vodovodní řád - Podolí	28 dny	07.11. 24	05.12. 24
495	**315**	**Vodovodní přípojka - Podolí, areál Arény**	**425 dny**	**06.10. 23**	**04.12. 24**
496		RDS - schválení čistopisu	0 dny	06.10. 23	06.10. 23
497		Vodovodní přípojka - Podolí, areál Arény	28 dny	07.11. 24	04.12. 24
498	**316**	**Vodovodní přípojka - Podolí, Žluté lázně**	**146 dny**	**01.12. 22**	**26.04. 23**
499		RDS - schválení čistopisu	0 dny	01.12. 22	01.12. 22
500		Vodovodní přípojka - Podolí, Žluté lázně - hlavní trasa	14 dny	16.01. 23	29.01. 23
501		Vodovodní přípojka - Podolí, Žluté lázně - připojení	14 dny	13.04. 23	26.04. 23
502	**321**	**Vyústění kanalizace do Vltavy- Hlubočepy**	**465 dny**	**18.08. 23**	**24.11. 24**
503		RDS - schválení čistopisu - po dobu výstavby	0 dny	06.10. 23	06.10. 23
504		RDS - schválení čistopisu - definitivní	0 dny	25.04. 24	25.04. 24
505		Vyústění kanalizace do Vltavy- Hlubočepy - po dobu výstavby	28 dny	18.08. 23	14.09. 23
506		Vyústění kanalizace do Vltavy- Hlubočepy - definitivní	28 dny	28.10. 24	24.11. 24
507	**400**	**Elektro a sdělovací objekty**	**1008 dny**	**21.09. 22**	**24.06. 25**
508		Vytýčení a přeložení inženýrských sítí pro SO řady 400	11 dny	21.09. 22	01.10. 22
509	**411**	**Veřejné osvětlení - Hlubočepy**	**928 dny**	**01.12. 22**	**16.06. 25**
510		RDS - schválení čistopisu	0 dny	01.12. 22	01.12. 22
511		dočasné po dobu stavby	14 dny	11.08. 23	24.08. 23
512		hlavní část	56 dny	22.04. 25	16.06. 25
513	**412**	**Veřejné osvětlení - Podolí**	**830 dny**	**13.02. 23**	**22.05. 25**
514		RDS - schválení čistopisu	0 dny	24.03. 23	24.03. 23
515		**Směr DC ul.Plynárenská a chodník**	**28 dny**	**13.02. 23**	**12.03. 23**
516		**Ulice Podolská - část A - úplná uzavírka jednosměrky**	**5 dny**	**13.02. 23**	**17.02. 23**
517		Výkop (do ca 1m) bez pažení	1 den	13.02. 23	13.02. 23
518		Uložení chrániček	1 den	14.02. 23	14.02. 23
519		Zásyp	1 den	15.02. 23	15.02. 23
520		Provizorní povrch	2 dny	16.02. 23	17.02. 23

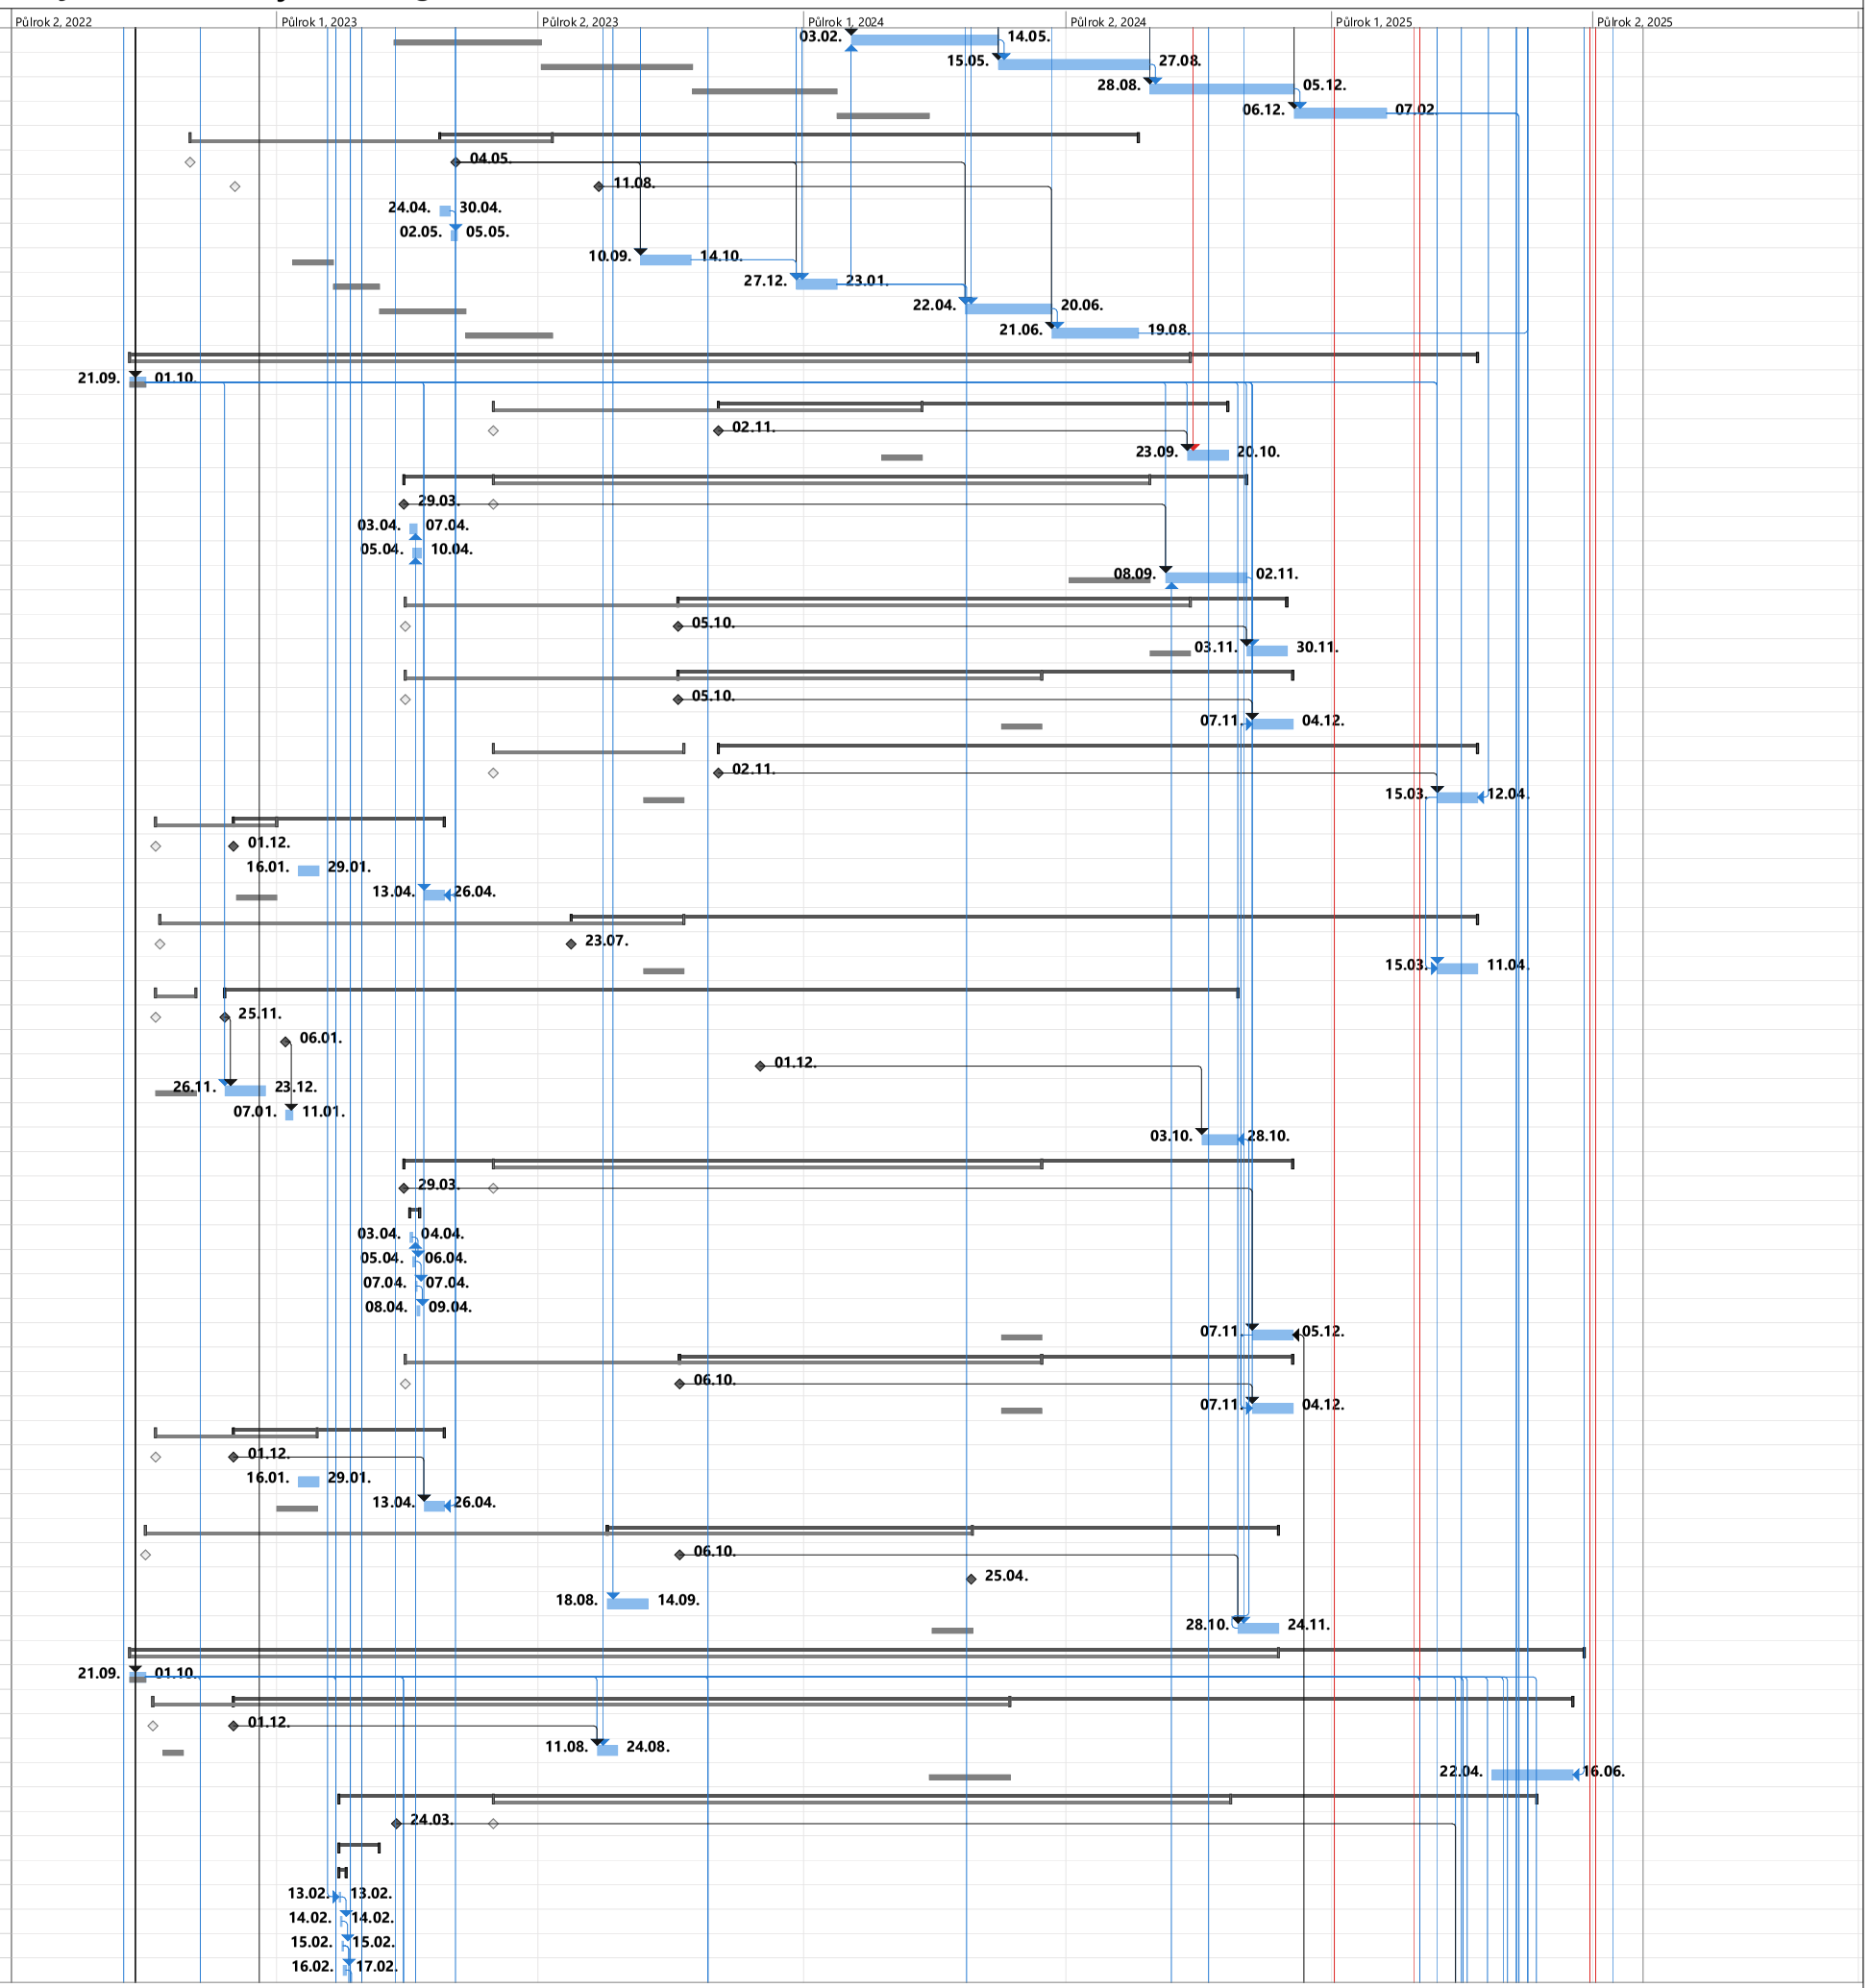

Dvorecký most - časový harmongram - Baseline - druhá aktualizace

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
521		**Ulice Podolská - část B - 1/2 pruhu u parkoviště**	**5 dny**	**18.02. 23**	**22.02. 23**
522		Výkop (do ca 1m) bez pažení	1 den	18.02. 23	18.02. 23
523		Uložení chrániček	1 den	19.02. 23	19.02. 23
524		Zásyp	1 den	20.02. 23	20.02. 23
525		Provizorní povrch	2 dny	21.02. 23	22.02. 23
526		**Ulice Podolská - část C - 2/2 pruhu u parkoviště**	**5 dny**	**23.02. 23**	**27.02. 23**
527		Výkop (do ca 1m) bez pažení	1 den	23.02. 23	23.02. 23
528		Uložení chrániček	1 den	24.02. 23	24.02. 23
529		Zásyp	1 den	25.02. 23	25.02. 23
530		Provizorní povrch	2 dny	26.02. 23	27.02. 23
531		**Ulice Podolská - část chodník**	**25 dny**	**16.02. 23**	**12.03. 23**
532		Výkop (do ca 1m) bez pažení	13 dny	16.02. 23	28.02. 23
533		Uložení kabelu	1 den	01.03. 23	01.03. 23
534		Zásyp	4 dny	02.03. 23	05.03. 23
535		Povrchy	7 dny	06.03. 23	12.03. 23
536		**Směr DC ul. PN 1/2 polovina**	**11 dny**	**01.03. 23**	**11.03. 23**
537		Výkop (do ca 1m) bez pažení	4 dny	01.03. 23	04.03. 23
538		Uložení chrániček	2 dny	05.03. 23	06.03. 23
539		Zásyp	2 dny	07.03. 23	08.03. 23
540		Provizorní povrch	3 dny	09.03. 23	11.03. 23
541		**Směr DC ul. PN 2/2 polovina**	**8 dny**	**12.03. 23**	**19.03. 23**
542		Výkop (do ca 1m) bez pažení	4 dny	12.03. 23	15.03. 23
543		Uložení chrániček	2 dny	16.03. 23	17.03. 23
544		Zásyp	2 dny	18.03. 23	19.03. 23
545		**Pod TT**	**14 dny**	**03.04. 23**	**16.04. 23**
546		Výkop (do ca 1m) bez pažení (ZC)	2 dny	03.04. 23	04.04. 23
547		Uložení chrániček a protažení kabelu (ZC)	1 den	05.04. 23	05.04. 23
548		Zásyp (ZC)	2 dny	06.04. 23	07.04. 23
549		Výkop (do ca 1m) bez pažení (DC)	2 dny	08.04. 23	09.04. 23
550		Uložení chrániček a protažení kabelu (DC)	1 den	10.04. 23	10.04. 23
551		Zásyp (DC)	2 dny	11.04. 23	12.04. 23
552		Napojení sloupu 4069 a 4066	4 dny	13.04. 23	16.04. 23
553		Koordinace vymístění u nových TT stožárů	9 dny	04.04. 23	12.04. 23
554		Veřejné osvětlení - Podolí	56 dny	28.03. 25	22.05. 25
555	**413**	**Slavnostní osvětlení mostu**	**600 dny**	**02.11. 23**	**24.06. 25**
556		RDS - schválení čistopisu	0 dny	02.11. 23	02.11. 23
557		Slavnostní osvětlení mostu	56 dny	30.04. 25	24.06. 25
558	**414**	**Veřejné osvětlení - most a plavební znaky**	**600 dny**	**02.11. 23**	**24.06. 25**
559		RDS - schválení čistopisu	0 dny	02.11. 23	02.11. 23
560		Veřejné osvětlení - most a plavební znaky	84 dny	02.04. 25	24.06. 25
561	**415**	**Žluté lázně - úprava rozvodů NN a VO**	**930 dny**	**02.12. 22**	**19.06. 25**
562		RDS - schválení čistopisu	0 dny	02.12. 22	02.12. 22
563		část nová vrátnice	28 dny	11.02. 23	10.03. 23
564		zbývající část	28 dny	23.05. 25	19.06. 25
565	**416**	**Úprava osvětlení parkoviště u botelu Racek**	**148 dny**	**28.06. 23**	**23.11. 23**
566		RDS - schválení čistopisu	0 dny	28.06. 23	28.06. 23
567		Úprava osvětlení parkoviště u botelu Racek	28 dny	27.10. 23	23.11. 23
568	**417**	**Elektroinstalace mostu**	**600 dny**	**02.11. 23**	**24.06. 25**
569		RDS - schválení čistopisu	0 dny	02.11. 23	02.11. 23
570		Elektroinstalace mostu	84 dny	02.04. 25	24.06. 25
571	**424**	**Přípojka NN pro areál Arény - Podolí - pouze založení chráničky**	**934 dny**	**09.11. 22**	**30.05. 25**
572		**Směr DC ul. PN**	**13 dny**	**01.03. 23**	**13.03. 23**
573		Výkop (do ca 1,2m) bez pažení	3 dny	01.03. 23	03.03. 23
574		Uložení chrániček a obetonování	4 dny	04.03. 23	07.03. 23
575		Zásyp	3 dny	08.03. 23	10.03. 23
576		Provizorní povrch	3 dny	11.03. 23	13.03. 23
577		**Pod TT**	**6 dny**	**03.04. 23**	**08.04. 23**
578		Výkop (do ca 1,2m) bez pažení	2 dny	03.04. 23	04.04. 23
579		Uložení chrániček a obetonování	2 dny	05.04. 23	06.04. 23
580		Zásyp	2 dny	07.04. 23	08.04. 23
581	**425**	**Přípojka NN pro SSZ na kříž. Podolské nábř. Dvor. Most**	**761 dny**	**01.03. 23**	**30.03. 25**
582		RDS - schválení čistopisu	0 dny	24.03. 23	24.03. 23
583		**Směr DC ul. PN**	**13 dny**	**01.03. 23**	**13.03. 23**
584		Výkop (do ca 1,2m) bez pažení	3 dny	01.03. 23	03.03. 23
585		Uložení chrániček a obetonování	4 dny	04.03. 23	07.03. 23
586		Zásyp	3 dny	08.03. 23	10.03. 23
587		Provizorní povrch	3 dny	11.03. 23	13.03. 23
588		**Pod TT**	**6 dny**	**03.04. 23**	**08.04. 23**
589		Výkop (do ca 1,2m) bez pažení	2 dny	03.04. 23	04.04. 23
590		Uložení chrániček a obetonování	2 dny	05.04. 23	06.04. 23
591		Zásyp	2 dny	07.04. 23	08.04. 23
592		Přípojka NN pro SSZ na kříž. Podolské nábř. Dvor. Most	28 dny	03.03. 25	30.03. 25
593	**431**	**Rozvody NN v areálu Arény (Podolí)**	**605 dny**	**28.09. 23**	**25.05. 25**
594		RDS - schválení čistopisu	0 dny	28.09. 23	28.09. 23
595		Rozvody NN v areálu Arény (Podolí)	84 dny	03.03. 25	25.05. 25
596	**432**	**Úprava rozvodů NN v areálu vodácké skupiny Šán**	**465 dny**	**21.12. 23**	**30.03. 25**
597		RDS - schválení čistopisu	0 dny	21.12. 23	21.12. 23
598		Úprava rozvodů NN v areálu vodácké skupiny Šán	28 dny	03.03. 25	30.03. 25
599	**461**	**Žluté lázně - úpravy rozvodů slaboproudu, CCTV**	**152 dny**	**25.11. 22**	**26.04. 23**
600		RDS - schválení čistopisu	0 dny	25.11. 22	25.11. 22

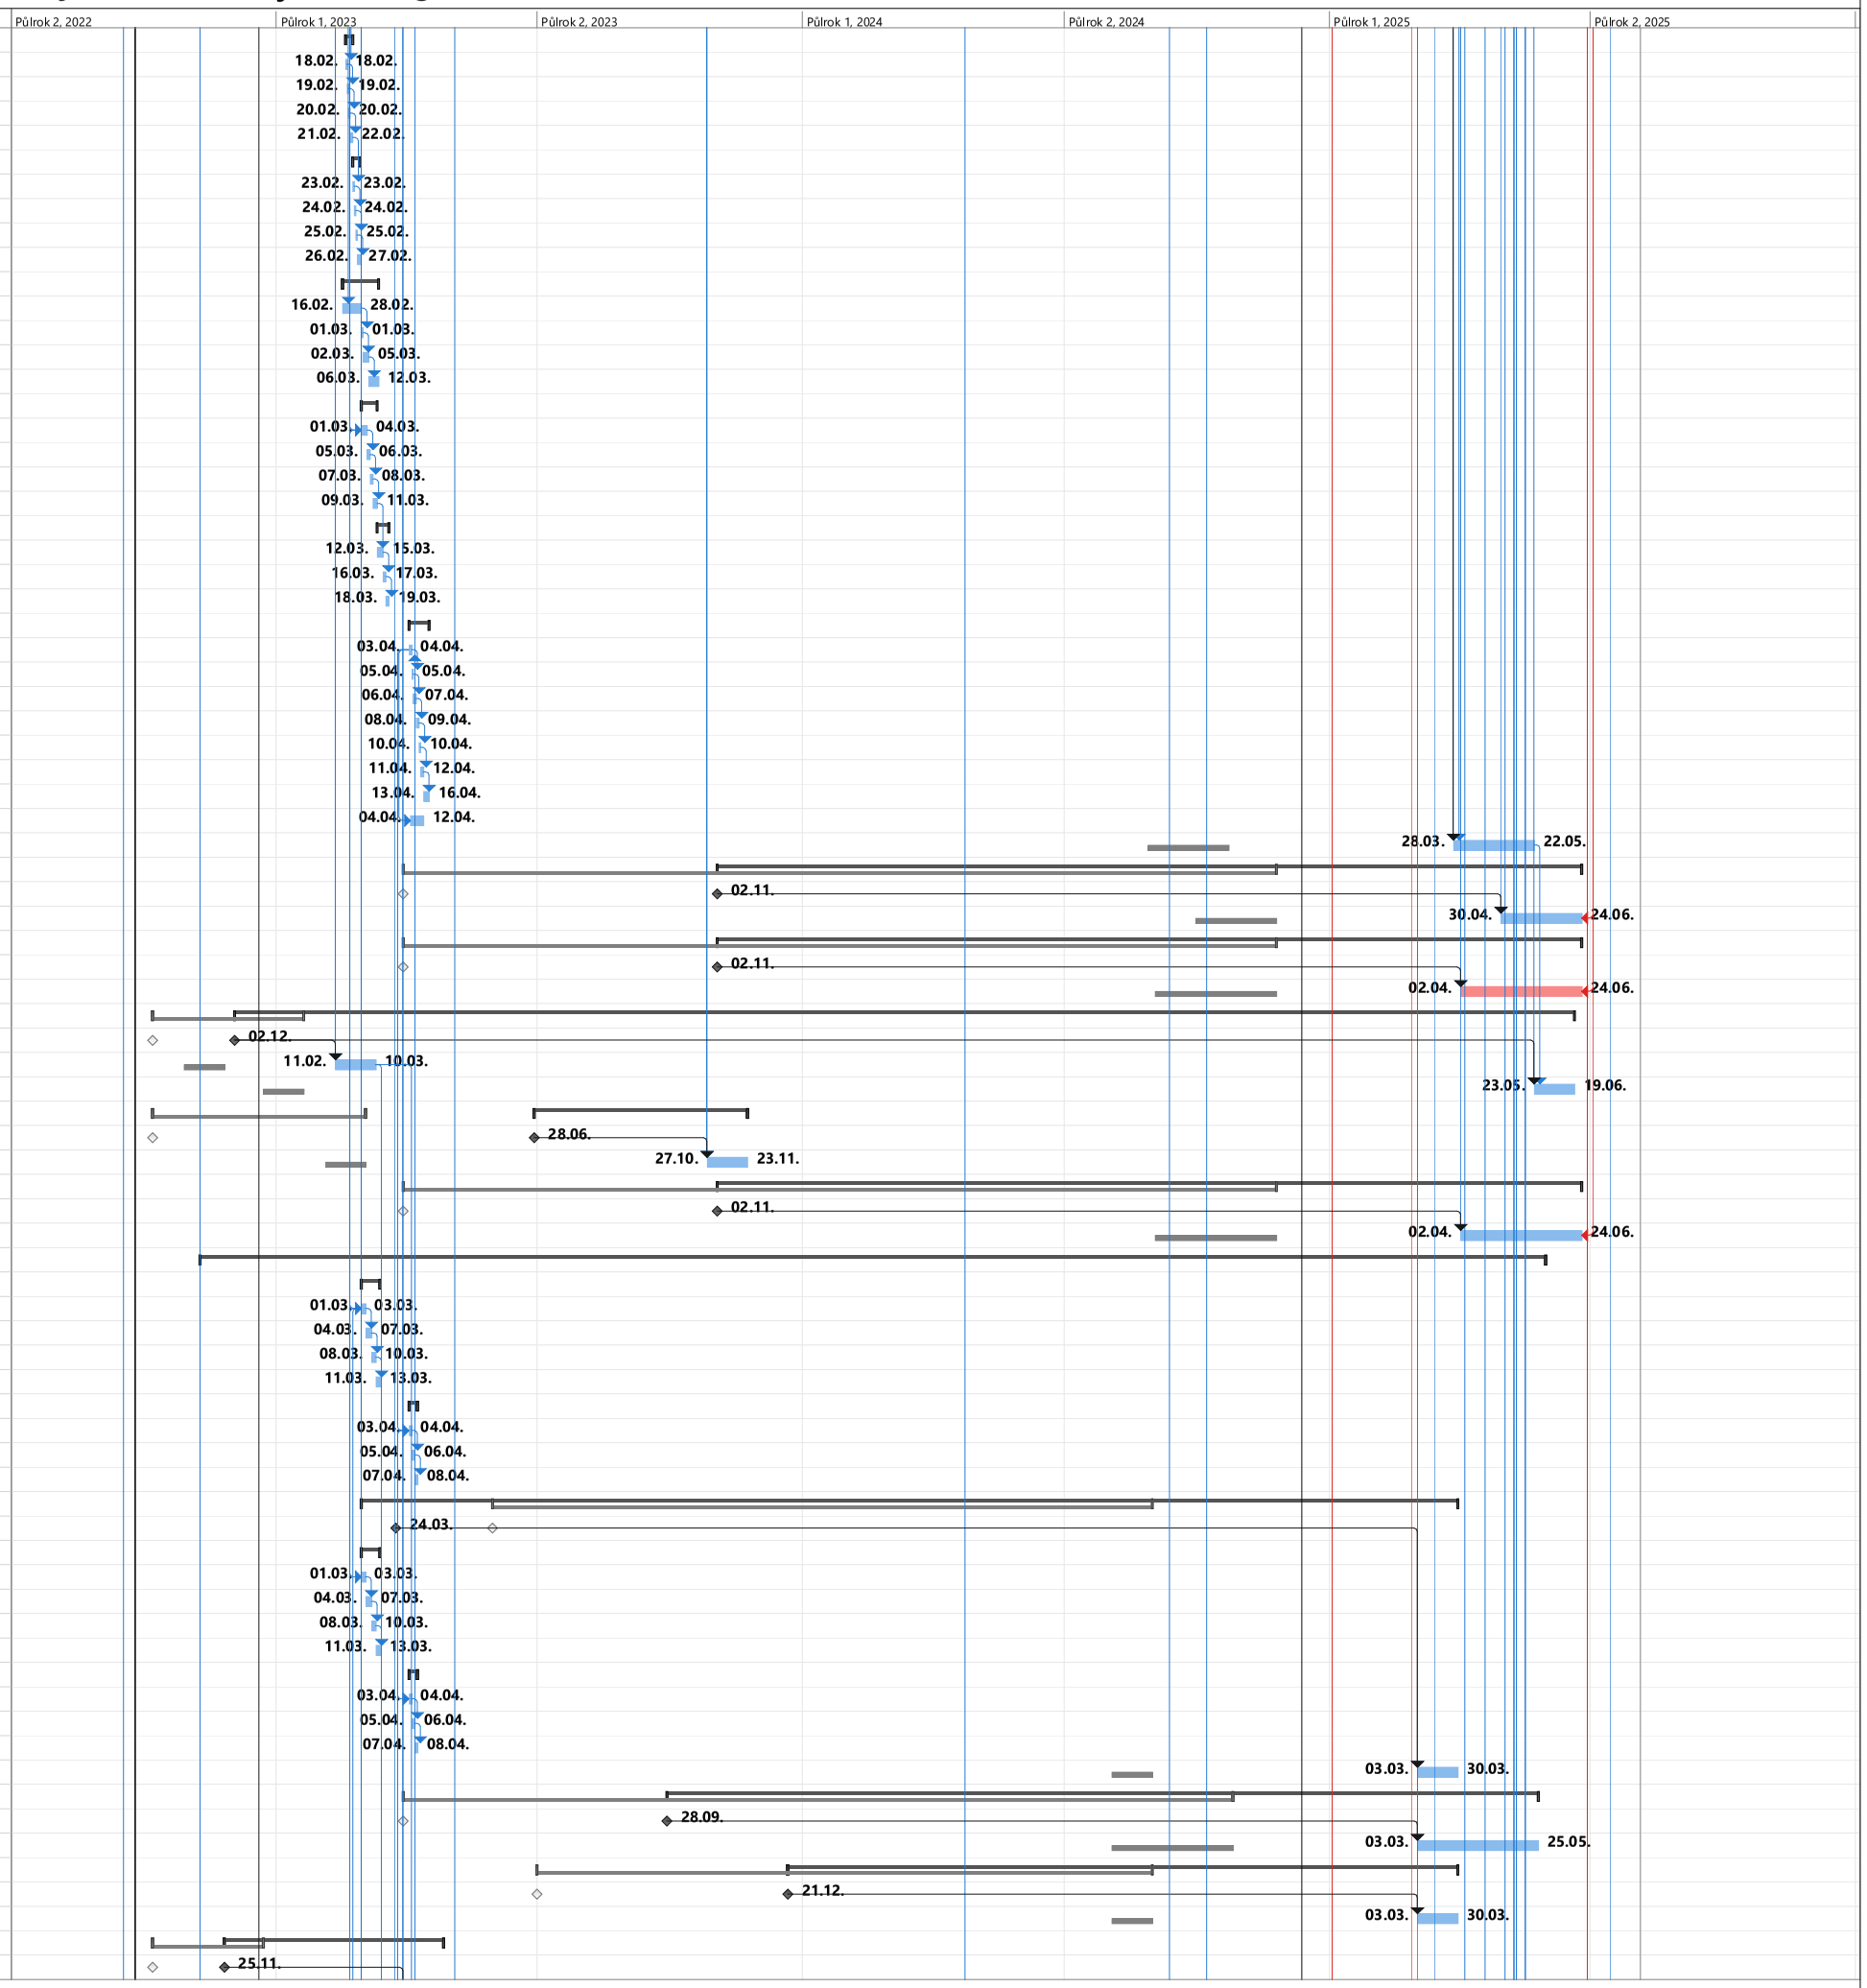

Dvorecký most - časový harmongram - Baseline - druhá aktualizace

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
601		Žluté lázně - úpravy rozvodů slaboproudu, CCTV	28 dny	30.03. 23	26.04. 23
602	462	**Žluté lázně - parkovací systém**	**148 dny**	**29.11. 22**	**26.04. 23**
603		RDS - schválení čistopisu	0 dny	29.11. 22	29.11. 22
604		Žluté lázně - parkovací systém	28 dny	30.03. 23	26.04. 23
605	491	**SSZ 5.888 NA Zlíchově - Dvorecký most**	**697 dny**	**05.06. 23**	**03.05. 25**
606		RDS - schválení čistopisu	0 dny	05.06. 23	05.06. 23
607		SSZ 5.888 NA Zlíchově - Dvorecký most	28 dny	05.04. 25	03.05. 25
608	492	**SSZ 4.777 Podolské nábřeží - Dvorecký most**	**820 dny**	**03.03. 23**	**30.05. 25**
609		RDS - schválení čistopisu	0 dny	04.05. 23	04.05. 23
610		**Směr DC ul. PN + chodník**	**13 dny**	**03.03. 23**	**15.03. 23**
611		Výkop (do ca 1,3m) s pažením	3 dny	03.03. 23	05.03. 23
612		Uložení chrániček a obetonování	4 dny	06.03. 23	09.03. 23
613		Zásyp	3 dny	10.03. 23	12.03. 23
614		Provizorní povrch	3 dny	13.03. 23	15.03. 23
615		**Pod TT**	**8 dny**	**03.04. 23**	**10.04. 23**
616		Výkop (do ca 1,7m) s pažením	3 dny	03.04. 23	05.04. 23
617		Uložení chrániček a obetonování	2 dny	06.04. 23	07.04. 23
618		Zásyp	3 dny	08.04. 23	10.04. 23
619		SSZ 4.777 Podolské nábřeží - Dvorecký most	28 dny	03.05. 25	30.05. 25
620	493	**SSZ 5.506 Strakonická - Nádraží**	**906 dny**	**09.11. 22**	**03.05. 25**
621		RDS - schválení čistopisu	0 dny	10.02. 23	10.02. 23
622		přípravné práce	14 dny	09.11. 22	23.11. 22
623		zbývající rozsah dle RDS	14 dny	19.04. 25	03.05. 25
624	500	**Objekty trubních vedení**	**718 dny**	**21.09. 22**	**08.09. 24**
625		Vytýčení a přeložení inženýrských sítí pro SO řady 500	11 dny	21.09. 22	01.10. 22
626	501	**Přeložka STL plynovodu - Podolí**	**708 dny**	**30.09. 22**	**08.09. 24**
627		RDS - schválení čistopisu	0 dny	30.09. 22	30.09. 22
628		Přeložka - část vrátnice	11 dny	02.10. 22	12.10. 22
629		Přeložka - část vrátnice - finální povrch	9 dny	23.03. 23	31.03. 23
630		Přeložka - část vjezd	30 dny	09.08. 24	08.09. 24
631	600	**Objekty drah**	**966 dny**	**21.09. 22**	**13.05. 25**
632		Vytýčení a přeložení inženýrských sítí pro SO řady 600	11 dny	21.09. 22	01.10. 22
633	611	**Tramvajová trať: Dvorecký most - Podolské nábřeží**	**785 dny**	**20.03. 23**	**13.05. 25**
634		RDS - schválení čistopisu	0 dny	20.03. 23	20.03. 23
635		demontáž TT	2 dny	01.04. 23	02.04. 23
636		Napojení UV, Bahníky (KJ3, KJ4), Překopy, Vodovod	15 dny	02.04. 23	16.04. 23
637		odstranění vrstev TT na stávající pláň ŠD	5 dny	13.04. 23	17.04. 23
638		zřízení pláně 32/63	5 dny	17.04. 23	21.04. 23
639		montáž KK a kolejí	9 dny	19.04. 23	27.04. 23
640		podbíjení	3 dny	27.04. 23	29.04. 23
641		odvodnění výhybek a zřízení štěrbinového žlabu	5 dny	27.04. 23	01.05. 23
642		svařování KK	5 dny	29.04. 23	03.05. 23
643		betonáž koleje 1.vrstva	3 dny	02.05. 23	04.05. 23
644		betonáž koleje 2.vrstva	3 dny	04.05. 23	06.05. 23
645		finální povrchy	2 dny	07.05. 23	08.05. 23
646		jízdy pro ověření zkušebního provozu	1 den	09.05. 23	09.05. 23
647		zahájení zkušebního provozu	1 den	10.05. 23	10.05. 23
648		**Tramvajová trať: Dvorecký most - Podolské nábřeží**	**140 dny**	**25.12. 24**	**13.05. 25**
649		**Etapa č. 1 - konstrukce na předmostí**	**68 dny**	**25.12. 24**	**03.03. 25**
650		Fáze A - TT 1x6 Podolská strana	46 dny	25.12. 24	08.02. 25
651		Fáze B - TT 1x6 Zlíchovská strana	31 dny	31.01. 25	03.03. 25
652		Etapa č. 2 - konstrukce na mostě W-Tram	72 dny	03.03. 25	13.05. 25
653	612	**Odvodnění TT**	**718 dny**	**29.03. 23**	**16.03. 25**
654		RDS - schválení čistopisu	0 dny	29.03. 23	29.03. 23
655		KJ1	6 dny	07.04. 23	12.04. 23
656		KJ3	6 dny	05.04. 23	10.04. 23
657		KJ4	6 dny	03.04. 23	08.04. 23
658		KJst. 1 - napojení odvodnění výhybka a štěrb. odvod.	5 dny	12.04. 23	17.04. 23
659		Napojení všech KJ a KJst na stávající kanalizaci vč. kufru	11 dny	29.04. 23	09.05. 23
660		Odvodnění TT	82 dny	25.12. 24	16.03. 25
661	613	**Přístřešky a mobiliář**	**530 dny**	**30.11. 23**	**13.05. 25**
662		RDS - schválení čistopisu	0 dny	30.11. 23	30.11. 23
663		Přístřešky a mobiliář	28 dny	16.04. 25	13.05. 25
664	614	**Elektrické zařízení tramvajových zastávek**	**683 dny**	**30.06. 23**	**13.05. 25**
665		RDS - schválení čistopisu	0 dny	30.06. 23	30.06. 23
666		Elektrické zařízení tramvajových zastávek	28 dny	16.04. 25	13.05. 25
667	621	**Dvorecký most: trolejové vedení TT**	**807 dny**	**27.02. 23**	**13.05. 25**
668		RDS - schválení čistopisu	0 dny	23.03. 23	23.03. 23
669		**Směr DC ul. PN**	**68 dny**	**27.02. 23**	**05.05. 23**
670		základy pro TS 8ks	14 dny	27.02. 23	12.03. 23
671		Osazení stožáru	16 dny	20.04. 23	05.05. 23
672		Překopy	14 dny	16.03. 23	29.03. 23
673		**Pod TT**	**28 dny**	**05.04. 23**	**02.05. 23**
674		základy pro sloupy TT 3 ks	5 dny	05.04. 23	09.04. 23
675		překopy a chráničky	5 dny	10.04. 23	14.04. 23
676		dokončovací práce	5 dny	28.04. 23	02.05. 23
677		Dvorecký most: trolejové vedení TT	84 dny	19.02. 25	13.05. 25
678	622	**Ovládání a vytápění výměn**	**790 dny**	**16.03. 23**	**13.05. 25**
679		RDS - schválení čistopisu	0 dny	23.03. 23	23.03. 23
680		**Směr DC ul. PN**	**8 dny**	**16.03. 23**	**23.03. 23**

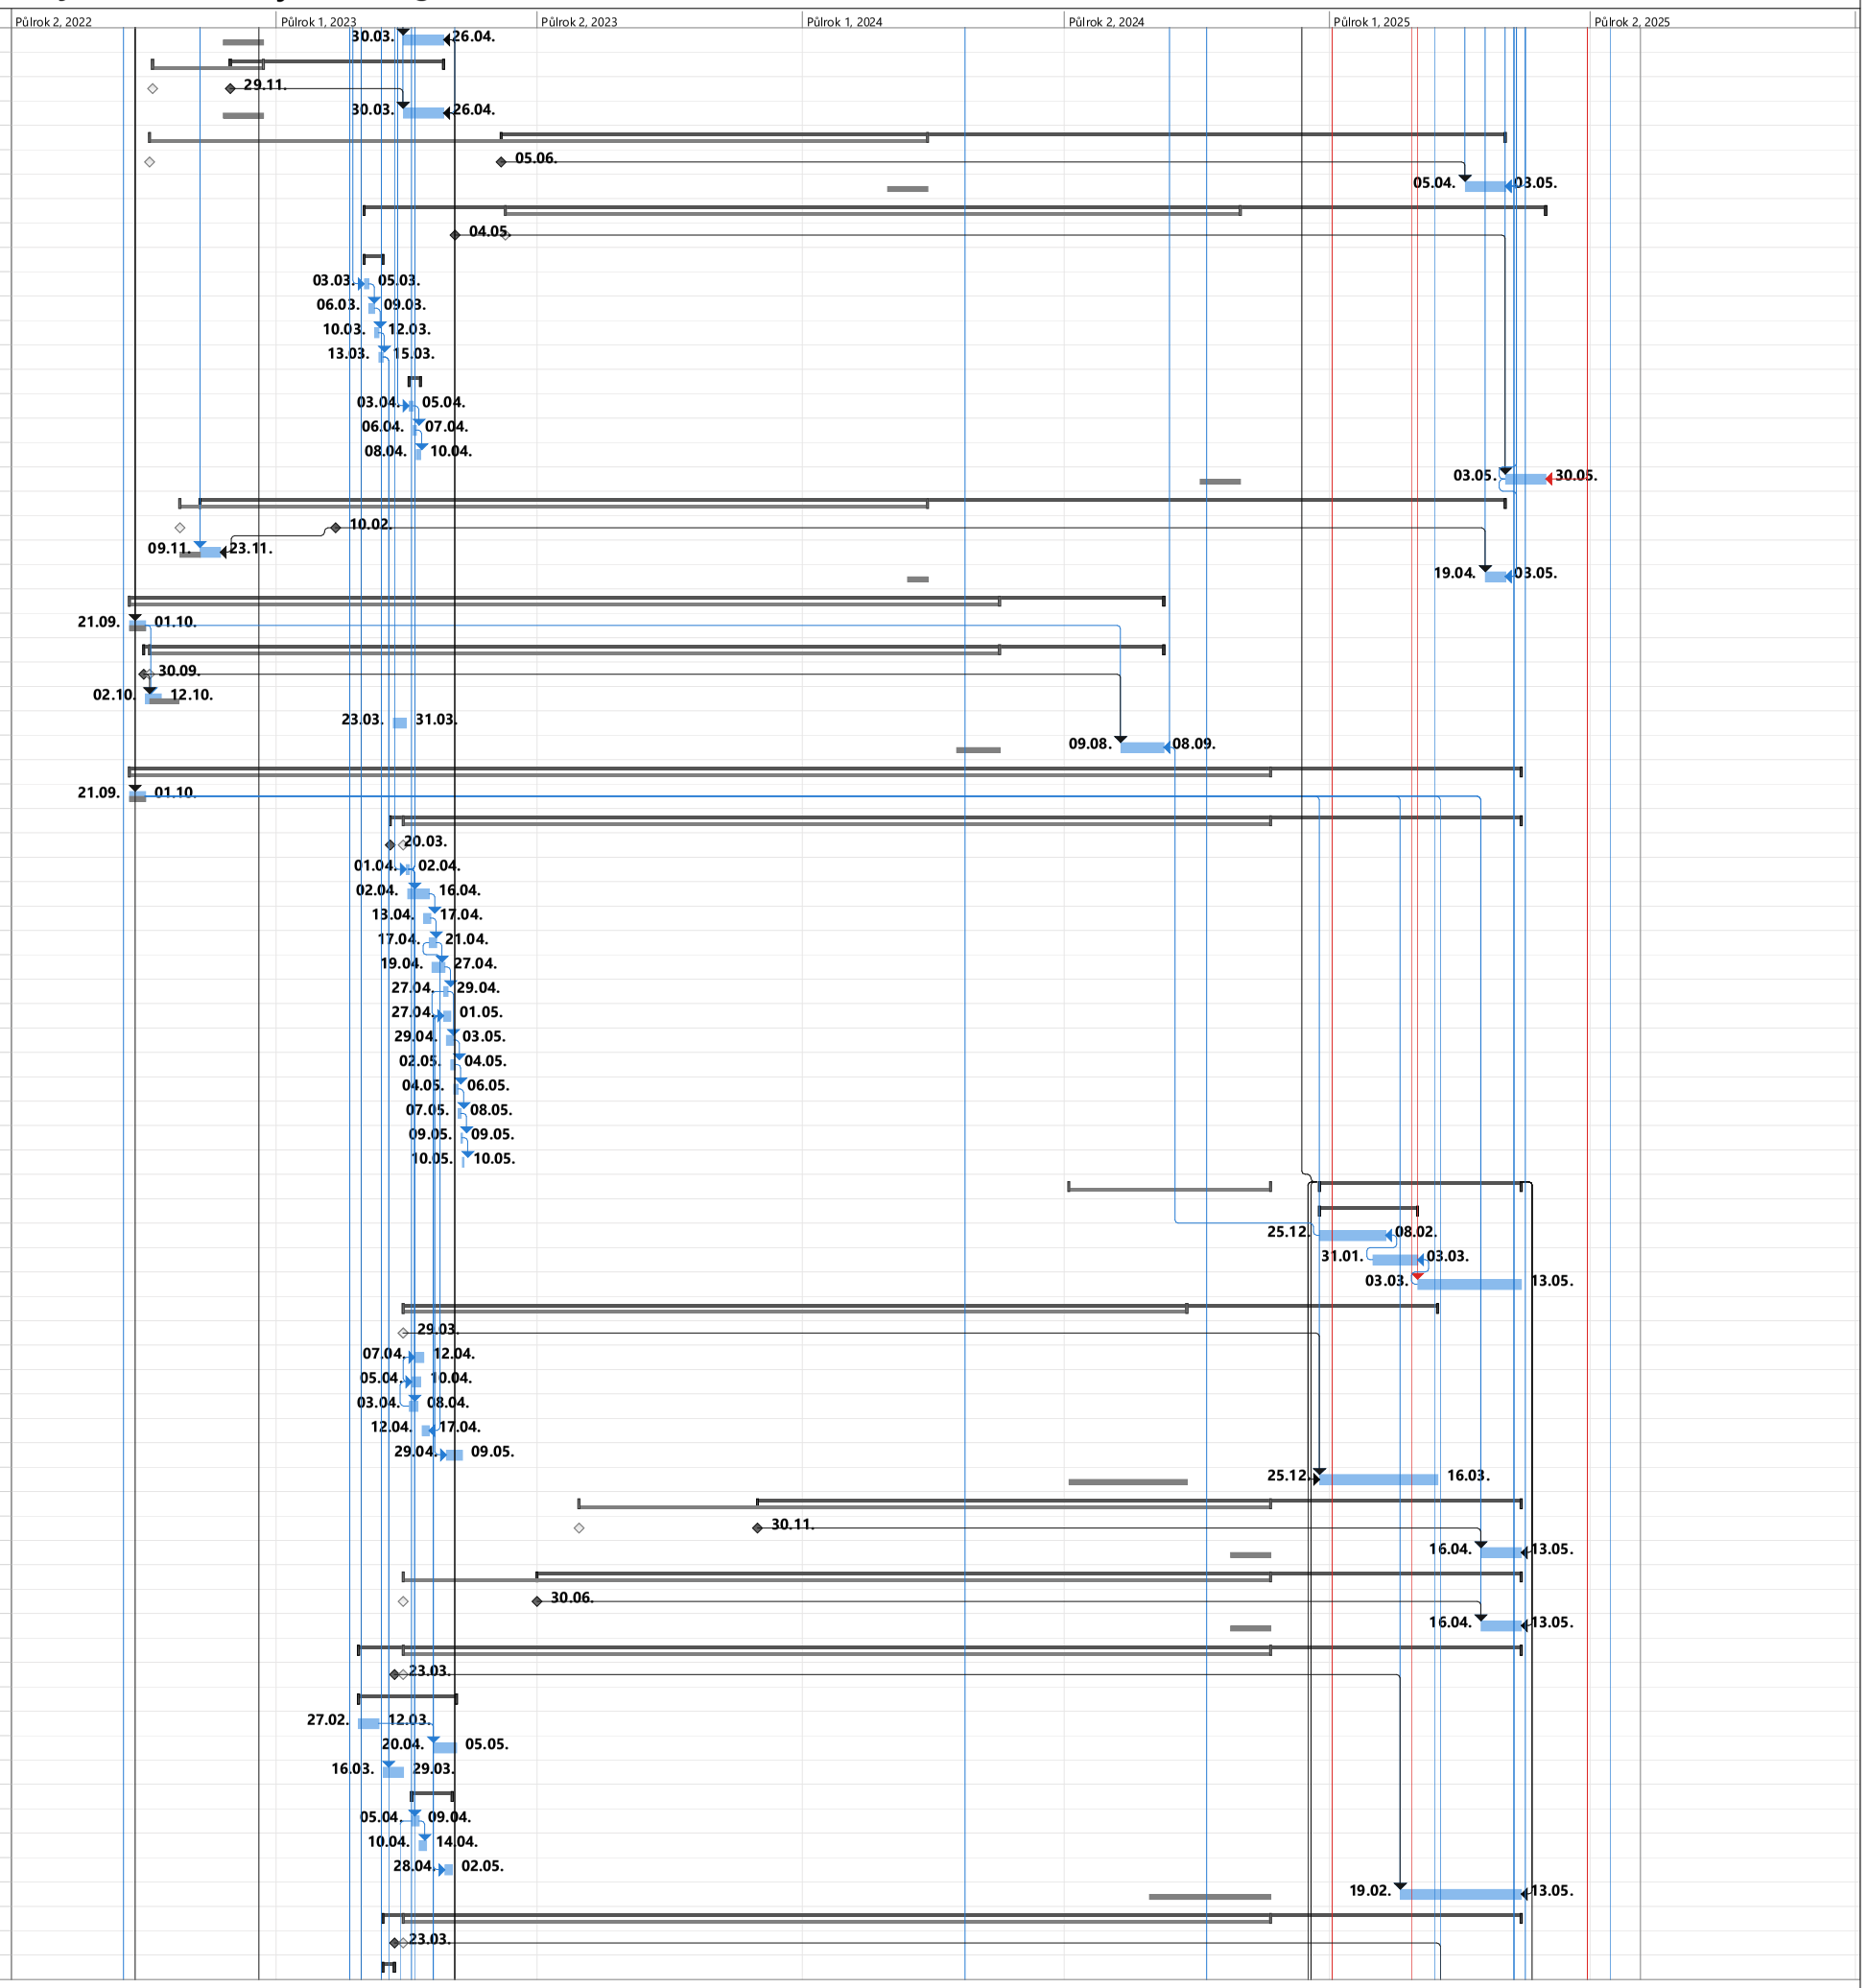

Společnost "TBR + Firesta + STRABAG - Dvorecký most "

Dvorecký most - časový harmongram - Baseline - druhá aktualizace

18.10.2023

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
681		Výkop	2 dny	16.03. 23	17.03. 23
682		Uložení chrániček a obetonování	2 dny	18.03. 23	19.03. 23
683		Zásyp	1 den	20.03. 23	20.03. 23
684		Provizorní povrch	3 dny	21.03. 23	23.03. 23
685		**Pod TT**	**28 dny**	**05.04. 23**	**02.05. 23**
686		Výkop (do ca 1,7m) s pažením	4 dny	05.04. 23	08.04. 23
687		Uložení chrániček a obetonování	2 dny	09.04. 23	10.04. 23
688		Zásyp	3 dny	11.04. 23	13.04. 23
689		dokončovací práce	5 dny	28.04. 23	02.05. 23
690		Ovládání a vytápění výměn	56 dny	19.03. 25	13.05. 25
691	624	**Dráhové kabely**	**848 dny**	**29.11. 22**	**26.03. 25**
692		RDS - schválení čistopisu A	0 dny	29.11. 22	29.11. 22
693		Provizorní úpravy u MR Zlíchov	28 dny	01.03. 23	28.03. 23
694		RDS - schválení čistopisu	0 dny	23.03. 23	23.03. 23
695		**Směr DC ul. PN + zeleň**	**22 dny**	**01.03. 23**	**22.03. 23**
696		**Směr DC ul. PN 1/2 polovina**	**11 dny**	**01.03. 23**	**11.03. 23**
697		Výkop (do ca 1m) bez pažení	4 dny	01.03. 23	04.03. 23
698		Uložení chrániček	2 dny	05.03. 23	06.03. 23
699		Zásyp	2 dny	07.03. 23	08.03. 23
700		Provizorní povrch	3 dny	09.03. 23	11.03. 23
701		**Směr DC ul. PN 2/2 polovina**	**11 dny**	**12.03. 23**	**22.03. 23**
702		Výkop (do ca 1m) bez pažení	4 dny	12.03. 23	15.03. 23
703		Uložení chrániček	2 dny	16.03. 23	17.03. 23
704		Zásyp	2 dny	18.03. 23	19.03. 23
705		Provizorní povrch	3 dny	20.03. 23	22.03. 23
706		Trasa pod chodníkem	26 dny	15.04. 23	10.05. 23
707		**Pod TT**	**10 dny**	**03.04. 23**	**12.04. 23**
708		Výkopy, uložení	10 dny	03.04. 23	12.04. 23
709		dokončovací práce	13 dny	28.04. 23	10.05. 23
710		Hlubočepy	28 dny	30.01. 25	27.02. 25
711		Podolí	56 dny	25.12. 24	18.02. 25
712		Most	28 dny	27.02. 25	26.03. 25
713	700	**Objekty pozemních staveb**	**1020 dny**	**21.09. 22**	**06.07. 25**
714		Vytýčení a přeložení inženýrských sítí pro SO řady 700	11 dny	21.09. 22	01.10. 22
715	701	**Informační centrum PID**	**469 dny**	**13.11. 23**	**24.02. 25**
716		RDS - schválení čistopisu	0 dny	13.11. 23	13.11. 23
717		Zakládání	84 dny	23.04. 24	15.07. 24
718		Hrubá stavba	140 dny	16.07. 24	02.12. 24
719		PSV a dokončovací práce	84 dny	03.12. 24	24.02. 25
720	711	**Žluté lázně - vrátnice**	**108 dny**	**08.01. 23**	**26.04. 23**
721		RDS - schválení čistopisu	0 dny	08.01. 23	08.01. 23
722		**Žluté lázně - vrátnice**	**108 dny**	**09.01. 23**	**26.04. 23**
723		Základy	35 dny	09.01. 23	12.02. 23
724		Osazení vrátnice	9 dny	13.02. 23	21.02. 23
725		Připojení na sítě	47 dny	11.03. 23	26.04. 23
726	751	**Oplocení pozemků dotčených stavbou**	**896 dny**	**23.01. 23**	**06.07. 25**
727		RDS - schválení čistopisu	0 dny	28.02. 23	28.02. 23
728		**Oplocení pozemků dotčených stavbou**	**896 dny**	**23.01. 23**	**06.07. 25**
729		Přípravné práce	37 dny	23.01. 23	28.02. 23
730		Základy	35 dny	01.03. 23	04.04. 23
731		Osazení brány včetně montáže oplocení	40 dny	05.04. 23	14.05. 23
732		Oplocení u SO 201	30 dny	07.06. 25	06.07. 25
733	791	**Zajištění a rekonstrukce skladu lodí VK Smíchov**	**579 dny**	**28.02. 23**	**30.09. 24**
734		RDS - schválení čistopisu	0 dny	28.02. 23	28.02. 23
735		část zajištění	56 dny	01.03. 23	25.04. 23
736		část rekonstrukce a dokončovací práce	56 dny	05.08. 24	30.09. 24
737	792	**Zajištění objektu Sportovního klubu Zlíchov**	**883 dny**	**06.11. 22**	**06.04. 25**
738		RDS - schválení čistopisu	0 dny	19.12. 22	19.12. 22
739		Přípravné práce	44 dny	06.11. 22	19.12. 22
740		Zajištění objektu Sportovního klubu Zlíchov	28 dny	20.12. 22	16.01. 23
741		Práce po dokončení NK a říms So 201v místě SK Zlíchov	45 dny	21.02. 25	06.04. 25
742	800	**Objekty úpravy území**	**374 dny**	**06.06. 24**	**15.06. 25**
743	801	**Sadové úpravy - Hlubočepy**	**374 dny**	**06.06. 24**	**15.06. 25**
744		RDS - schválení čistopisu	0 dny	06.06. 24	06.06. 24
745		Sadové úpravy - Hlubočepy	30 dny	17.05. 25	15.06. 25
746	802	**Sadové úpravy - Podolí**	**374 dny**	**06.06. 24**	**15.06. 25**
747		RDS - schválení čistopisu	0 dny	06.06. 24	06.06. 24
748		Sadové úpravy - Podolí	30 dny	17.05. 25	15.06. 25
749	900	**Ostatní objekty**	**961 dny**	**23.11. 22**	**10.07. 25**
750	901	**Plavební znaky**	**961 dny**	**23.11. 22**	**10.07. 25**
751		RDS - schválení čistopisu	0 dny	07.12. 23	07.12. 23
752		Provizorní po dobu výstavby	961 dny	23.11. 22	10.07. 25
753		Plavební znaky	12 dny	25.06. 25	06.07. 25
754		Časová rezerva Projektu z úkolu hlubinné založení	27 dny	07.07. 25	02.08. 25
755		Dokončení stavby	2 dny	03.08. 25	04.08. 25

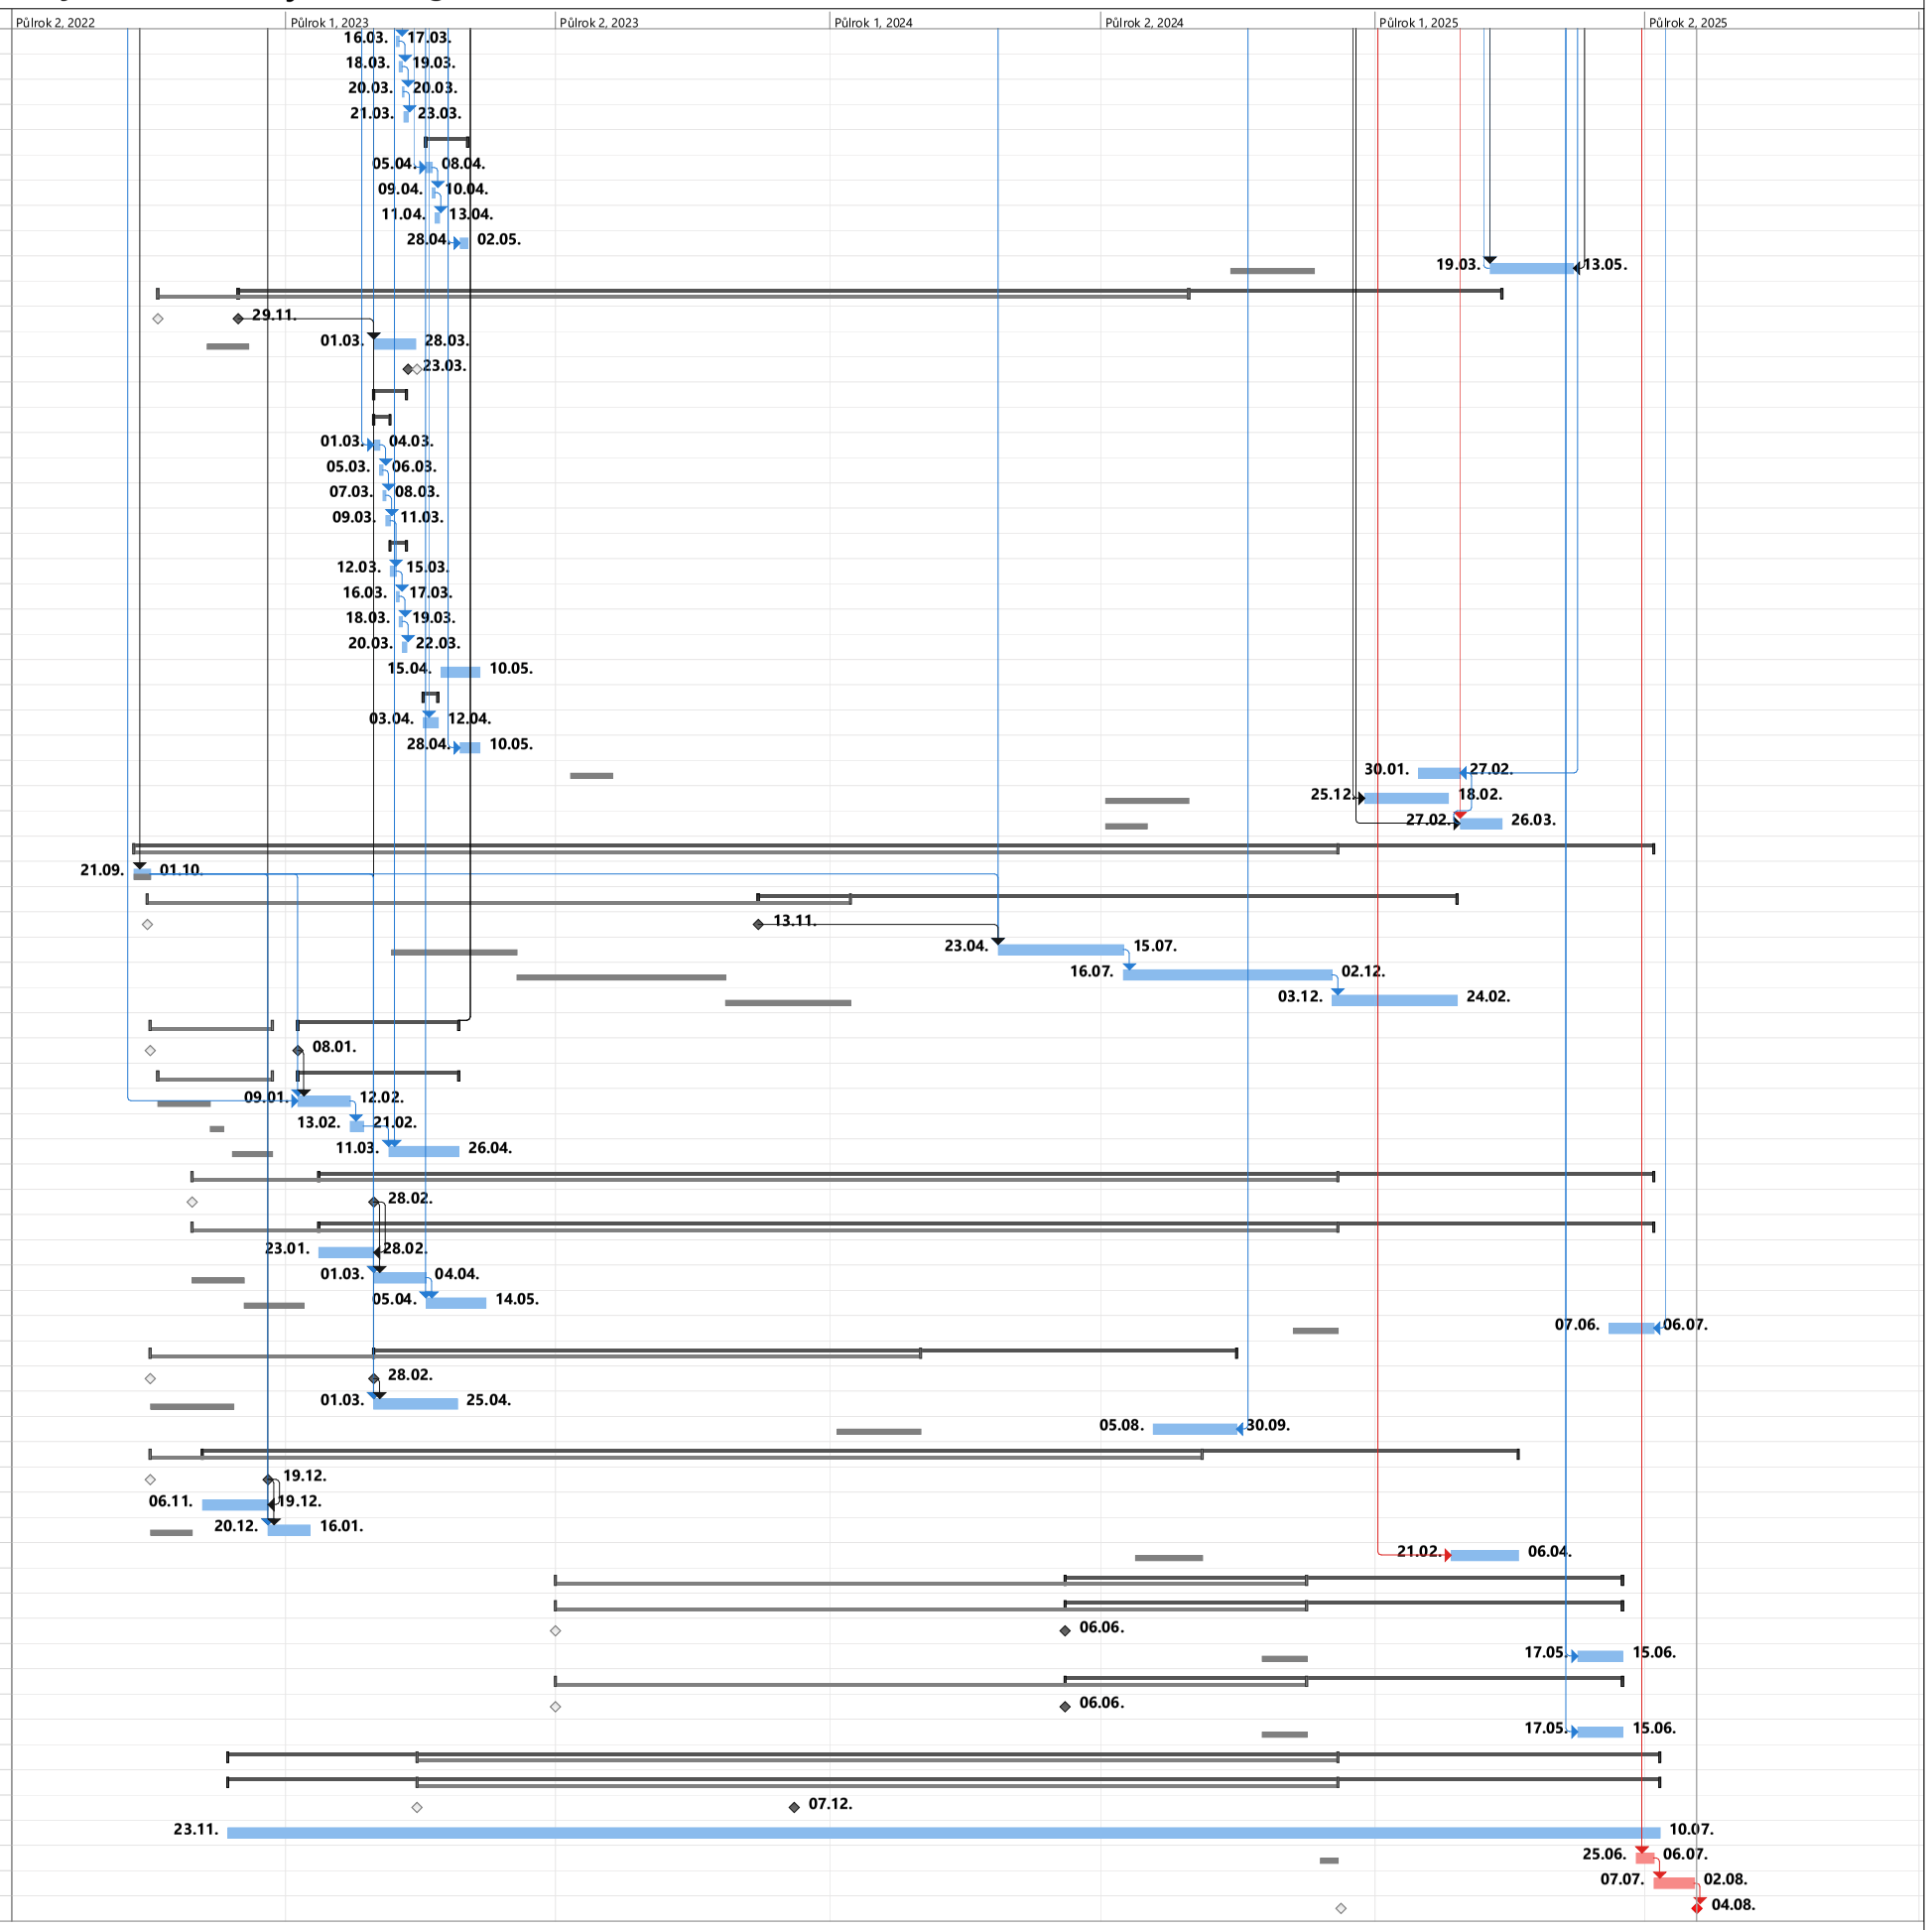

Ing. Aleš Gothard — Podepsal Ing. Aleš Gothard DN: cn=Ing. Aleš Gothard, c=CZ, o=Metrostav TBR a.s., ou=994444, email=ales.gothard@m-TBR.cz Datum: 2023.12.12 15:30:26 +01'00'

Mgr. Jakub Pikna — Digitálně podepsal Mgr. Jakub Pikna Datum: 2023.12.12 15:03:00 +01'00'

Ing. Pavel Borek — Digitálně podepsal Ing. Pavel Borek Datum: 2023.12.12 14:38:01 +01'00'

Ing. Pavel Brychcín — Digitálně podepsal Ing. Pavel Brychcín Datum: 2023.12.12 13:34:48 +01'00'

Dipl. Ing. Moritz Freyborn — Podepsal Dipl. Ing. Moritz Freyborn DN: cn=Dipl. Ing. Moritz Freyborn, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841 3615, email=moritz.freyborn@strabag.com Datum: 2023.12.12 13:23:05 +01'00'
