Technologický postup výlukových prací

Pracovní doba: 6,00 - 22,00

Oprava železničního násypu Červený potok

Den stavby

PS,SO	Název objektu
	Oprava železničního násypu Červený potok - část A
	Přípravné práce
SO 103 A	**Železniční svršek - Demontáž koleje č. 2**
	demontáž TK č.2 v km 51,900 - 52,450
SO 104 A	**Železniční svršek - nová kolej č. 2**
	instalace nové TK č.2
	konečná úprava GPK v TK č.2
SO 401	**Opěrná zeď v km 51,937 - 52,003**
	instalace zápor pažení
	výkopy a odstranění gabionů
	instalace ražených litinových pilot
	provedení podkladních betonů
	bednění a betonáž patní zídky
	odbednění a izolace patní zídky
	zásyp patní zídky
	odstranění zápor pažení
	provedení konstrukční vrstvy
	ostatní zásypy, úpravy svahů a odlážděni
SO 603-132	**Demontáž trakčního vedení v koleji č.2**
	demontáž TV uv TK č.2
SO 604-132	**Nové trakční vedení v koleji č.2 - stožár 132**
	nové základové patky TV 132, 132K
	instalace TV v TK č.2
	Oprava železničního násypu Červený potok - část B
SO 101	**Železniční svršek - Demontáž koleje č.1**
	odstranění převýšení v TK č.2
	demontáž TK č.1 v km 52,049 - 52,450
SO 102	**Železniční svršek - nová kolej č. 1**
	instalace nové TK č. do zapaženého kol.lože
	demontáž pažení kol. lože TK č.1
	konečná úprava GPK v TK č.1
SO 103 B	**Železniční svršek - Demontáž koleje č. 2**
	demontáž TK č.2 v km 51,900 - 52,450
SO 104 B	**Železniční svršek - nová kolej č. 2**
	instalace nové TK č.2
	konečná úprava GPK v TK č.2
SO 105	**Sanace železničního spodku v km 52,100 - 52,450**
	provedení ŠP v TK č.1
	výkop 30cm pod pláň v TK č.1
	násyp rozrážeci vrstvy v TK č.1
	položení geomembrány a ochranných vrstev
	násyp konstrukčních vrstev
	provedení ŠP v TK č.1
	výkop 30cm pod pláň v TK č.1
	násyp rozrážeci vrstvy v TK č.1
	položení geomembrány a ochranných vrstev
	násyp konstrukčních vrstev
	zpětný zásyp mezi drenáží a SO 106
	instalace a zásyp drenáže
	ozelenění a rekultivace povrchu
SO 106	**Úprava původního násypu**
	odtěžení vrstvy původního násypu
	položení geomembrány a ochranných vrstev
	instalace a zásyp drenáže
	položení drenážního kompozitu
	zpětný zásyp
	ozelenění a rekultivace povrchu
SO 402	**Opěrná zeď v km 52,063-52,100**
	instalace kotevních zápor KZ1 - KZ13
	instalace zápor pažení Z34 - Z38
	instalace zápor pažení Z01 - Z33
	výkop pod TK č.1
	instalace ražených litinových pilot s prefa hlavou
	podkladní beton v přechodovém klínu mostu
	izolace v přechodovém klínu mostu
	instalace drenáže v přechodovém klínu mostu
	armovaný zásyp po úroveň římsových zídek
	drenážní beton po úroveň římsových zídek
	podkladní beton římsových zídek
	instalace římsových zídek
	izolace římsových zídek
	zásyp po finální úroveň
	položení geomembrány a ochranných vrstev
	drenážní beton po finální úroveň
	bednění a betonáž římsy římsových zídek
	konstrukční vrstvy pod TK č.1
	výkop mimo TK č.2
	výkop pod TK č.2
	instalace ražených litinových pilot s prefa hlavou
	podkladní beton v přechodovém klínu mostu
	izolace v přechodovém klínu mostu
	instalace drenáže v přechodovém klínu mostu
	drenážní beton v přechodové oblasti
	armovaný zásyp pod TK č.2
	položení geomembrány a ochranných vrstev
	zpětný zásyp mimo TK č.2
	konstrukční vrstvy pod TK č.2
	instalace a zásyp drenáže
	ozelenění a rekultivace povrchu
SO 601	**Demontáž trakčního vedení v koleji č.1**
	demontáž TV uv TK č.1
	regulace TV v kol.č.2
SO 602	**Nové trakční vedení v koleji č. 1**
	nové základové patky TV 137 - 145
	instalace TV v TK č.1
SO 603	**Demontáž trakčního vedení v koleji č.2**
	demontáž TV uv TK č.2
SO 604	**Nové trakční vedení v koleji č. 2**
	nové základové patky TV 138 - 146
	instalace TV v TK č.2
SO 610	**610**
	stranové vymístění kabelů SSZT na povrch v km 52,100 - 52,320
	stranové vymístění kabelů SSZT na pažení v km 52,049 - 52,100
	nová kabelová skříň KO T3
	přepojení kabelů SSZT na novou skříň - vypnutí TZZ
SO 611	**611**
	definitivní uložení kabelů SSZT na povrch v km 52,049 - 52,100
	definitivní uložení kabelů SSZT na pažení v km 52,100 - 52,320

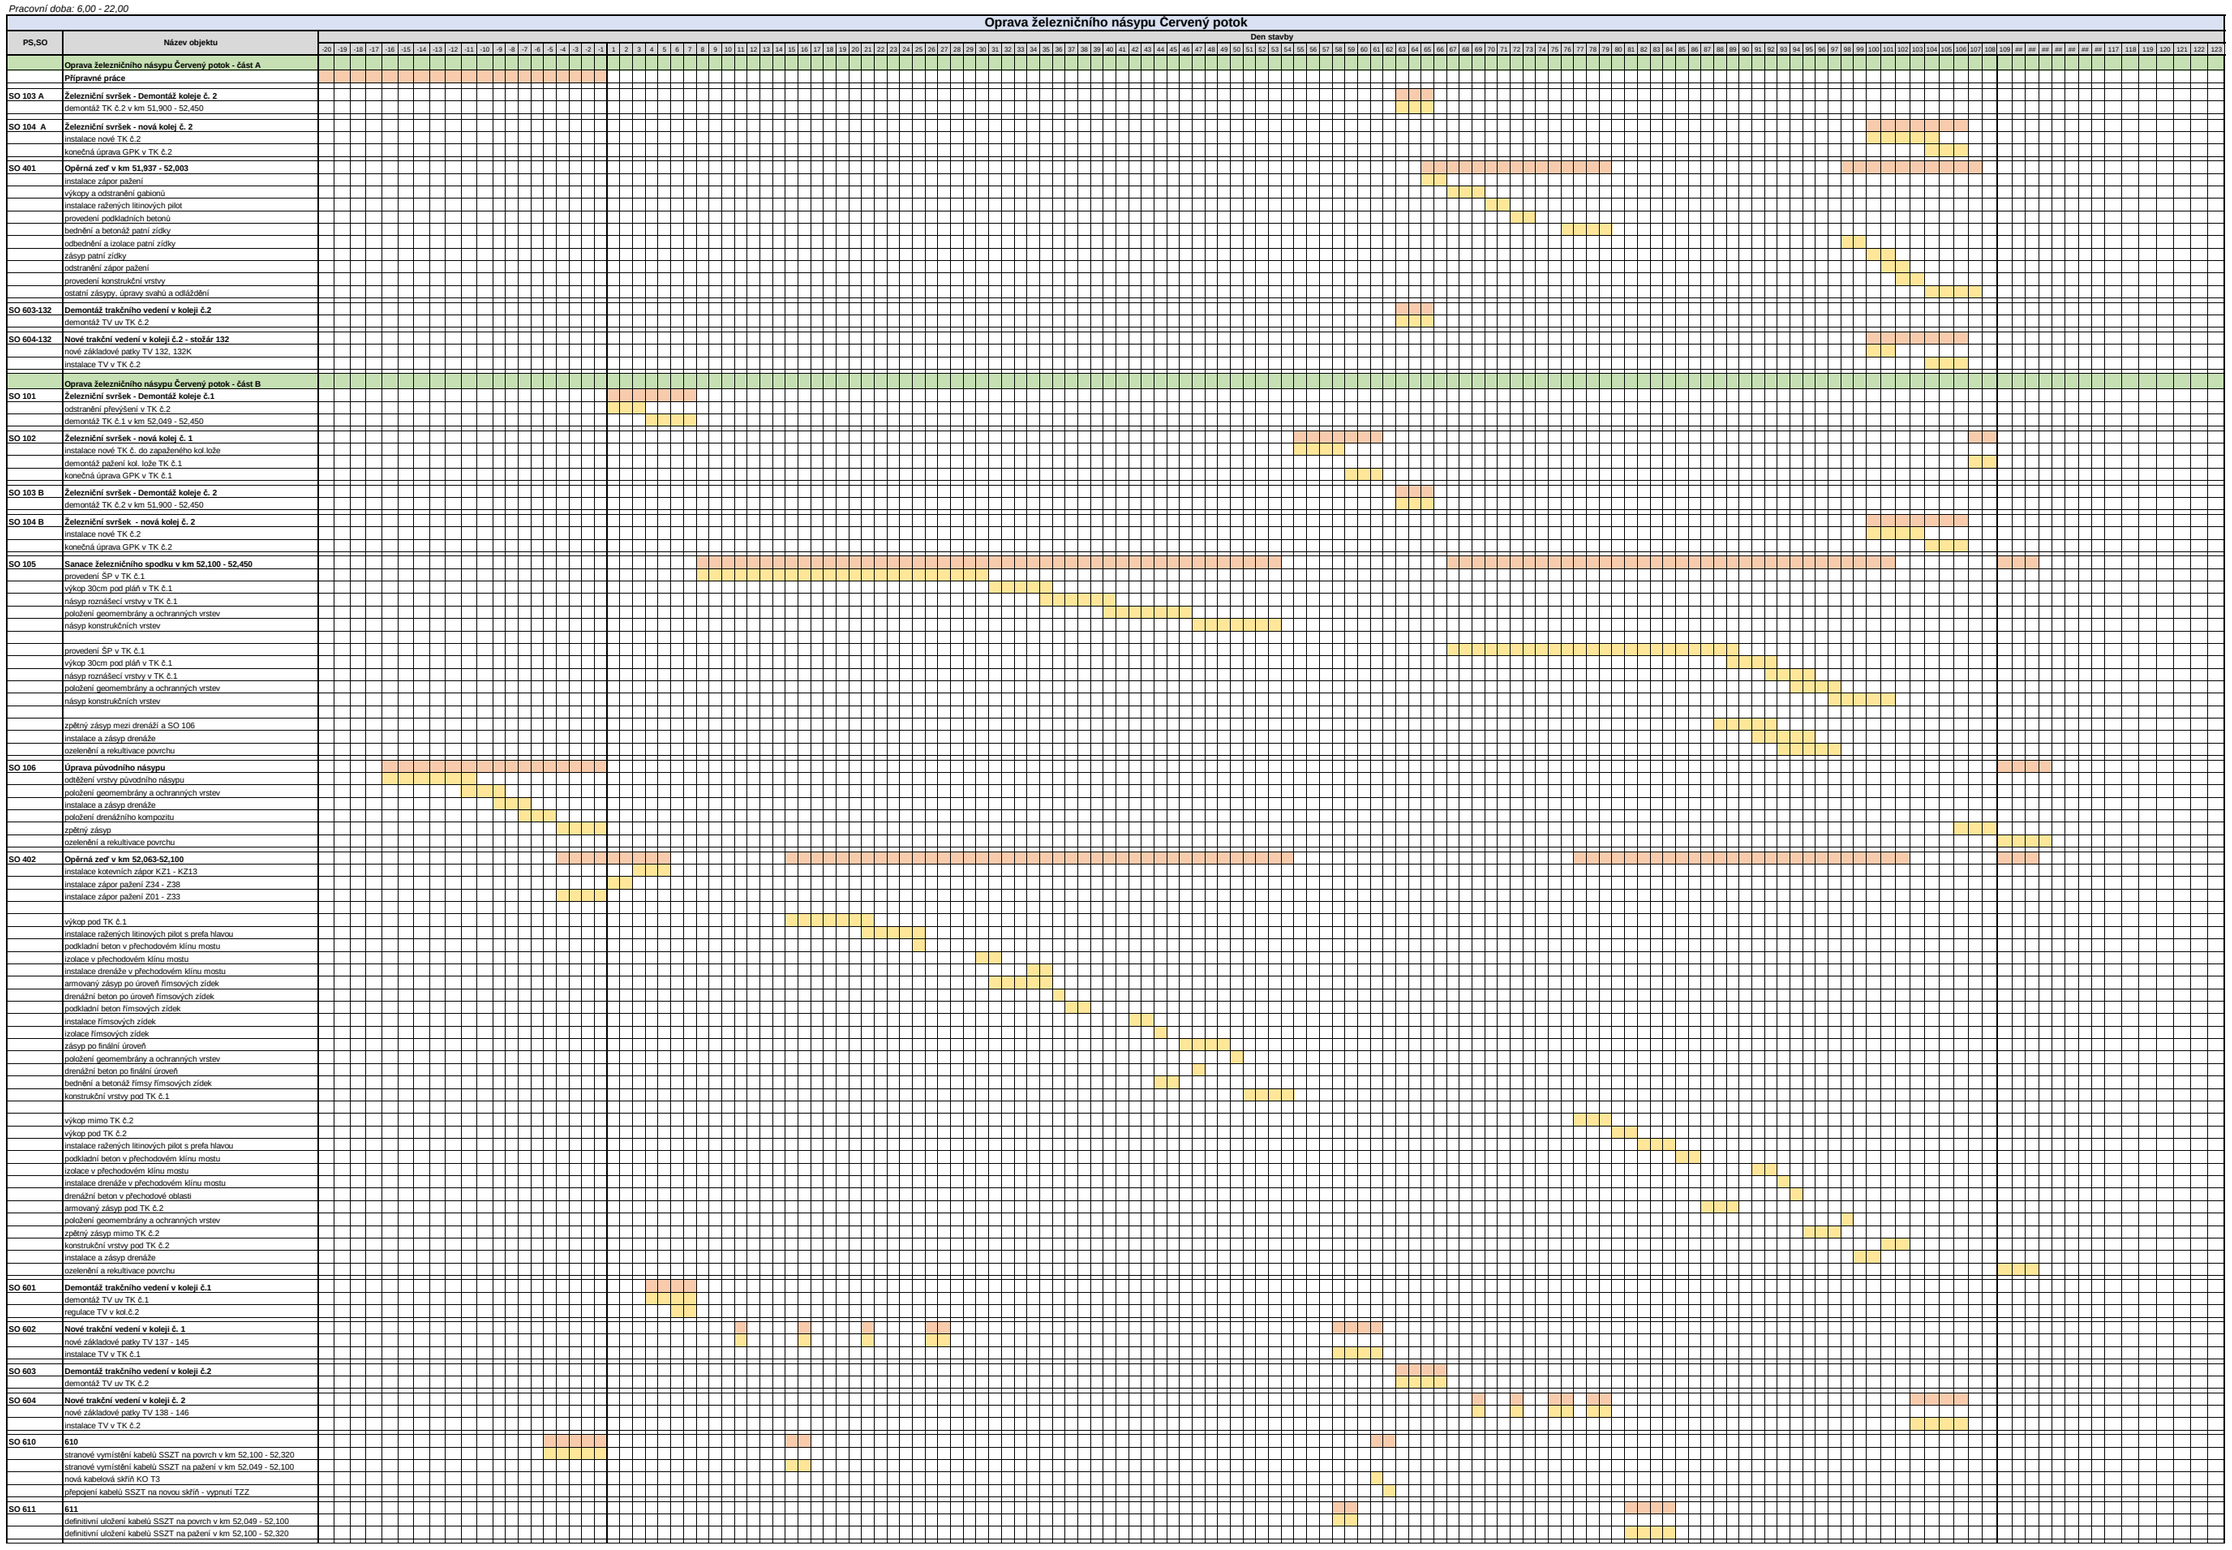

| | | |
