Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:		Číslo ZBV:
II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov - stavební práce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 180 / 001	03

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.1	0,00	98 199,00	98 199,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
03	**0,00**	**98 199,00**	**98 199,00**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list	Číslo paré:

Příloha č.1: DIO (SITUACE) – umístění dopravního značení

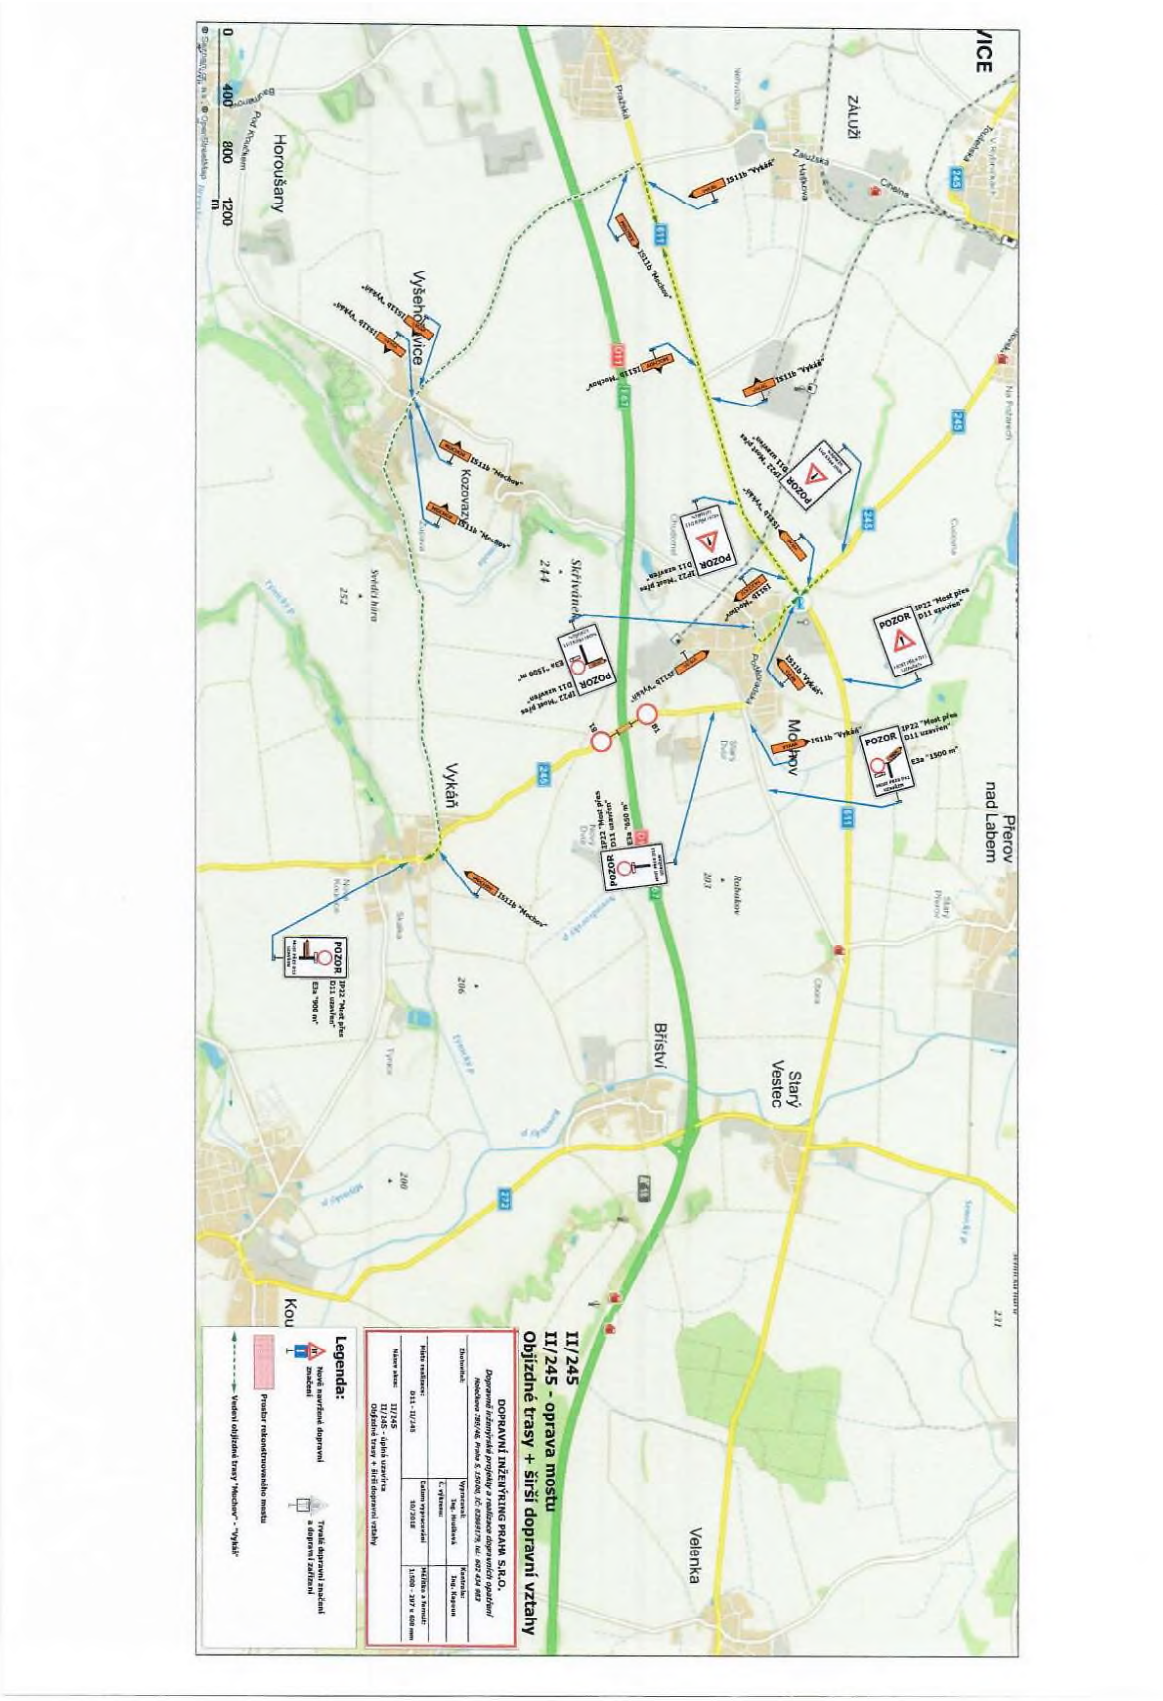

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Odbor dopravy

Naše čj.: MÚBNLSB-OD-113512/2021-KENJI
Naše sp. zn.: OD-29026/2021-KENJI
Vyřizuje: Mgr. Bc. Jiří Kenda
Tel.:
E-mail:
Datum: 04.11.2021

SEDOZ DZ s.r.o.
IČ 24218537
Primátorská č. p. 296/38
180 00 PRAHA 8

Rozhodnutí

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, rozhodl v řízení o žádosti, kterou dne 21.10.2021 podala spol. HOCHTIEF CZ a.s., Divize dopravní stavby, IČ: 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 15000 Praha 5 (dále jen „žadatel"), v zastoupení spol. SEDOZ DZ s.r.o., IČ: 24218537, se sídlem Primátorská 296/38, 18000 Praha 8 - Libeň, na základě plné moci, ve věci povolení uzavírky silnice II. třídy v k.ú. Mochov a nařízení její objížďky z důvodu realizace akce s názvem: „Demolice mostu II/245 přes D11", t a k t o:

I. Podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, **povoluje úplnou uzavírku silnice č. II/245** v úseku provozního staničení od 13,280 km do 13,390 km (most přes dálnici D11 ev. č. 245 - 009), v k.ú. Mochov [698067], okres Praha - východ, z důvodu realizace akce s názvem: „Demolice mostu II/245 přes D11". Termín uzavírky je **od 15.11.2021 do 15.12.2022.**

II. Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích **nařizuje objížďku** uzavírky uvedené v bodě I. tohoto rozhodnutí a stanoví ve shodném termínu objízdnou trasu po silnicích č. III/2455, II/611 a II/245 v k.ú. Mochov [698067], Vyšehořovice [788503], Kozovazy [788490], Nehvizdy [702404], okres Praha - východ a k.ú. Vykáň [787558], okres Nymburk. Objízdná trasa je obousměrná, pro veškerou dopravu a bude označena přechodným dopravním značením a zařízením.

Název stavby:	Demolice mostu II/245 přes D11
Místo uzavírky (stavby):	Silnice č. II/245, k.ú. Mochov
Termín provádění prací:	od 15.11.2021 do 15.12.2022
Stavebník:	HOCHTIEF CZ a.s., IČ: 46678468,
Investor stavby:	Středočeský kraj
Odpovědná osoba za DZ a stavbu:	Ing. Zdeněk Novotný, tel. - 602362904, HOCHTIEF CZ a.s.
Dopravní opatření:	Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka, objížďka

Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek:

1. Žadatel zajistí splnění podmínek uvedených v předchozím souhlasu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát, ÚO Praha venkov - VÝCHOD, pro povolení uzavírky a nařízení objížďky, č.j.- KRPS-242199-1/ČJ-2021-011506 ze dne 30.9.2021 a ÚO Nymburk č.j. - KRPS-238581-1/ČJ-2021-010806-ZU ze dne 18.10.2021, dále Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 15021 Praha 5, č.j.-7784/21/KSUS/MHT/POL ze dne 20.10.2021 a č.j.-8429/21/KSÚS/KHT/KUK ze dne 3.11.2021.

2. Dotčený úsek silnice smí být uzavřen max. na dobu uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí. Žadatel je povinen využít všech možností ke zkrácení doby uzavírky.
3. Pracovní místo, uzavírka i objížďka musí být označeny dopravními značkami v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu. Po celou dobu povolení uzavírky bude dopravní značení udržováno v řádném stavu. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku a objížďku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
4. Osoba odpovědná za uzavírku a provoz stavby je Ing. Zdeněk Novotný, tel. - 602362904.
5. V případě vzniku dopravních komplikací zajistí žadatel řízení dopravy za pomoci dostatečného počtu pověřených osob, vybavených a označených dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
6. Škody způsobené uzavírkou a objížďkou budou neprodleně odstraněny a komunikace budou uvedeny do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky a objížďky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
7. Po ukončení stavebních prací a uzavírky budou přechodné dopravní značky a zařízení umístěné na pozemních komunikacích v rámci přechodné úpravy provozu neprodleně odstraněny.
8. Dotčené obce budou informovat o uzavírce a o objízdné trase způsobem v místě obvyklým.
9. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na místě akce ke kontrole osobám pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.

Účastník řízení, na něhož se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
- HOCHTIEF CZ a.s., Divize dopravní stavby, IČ: 46678468, Plzeňská 16/3217, 15000 Praha 5

Odůvodnění

MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, obdržel dne 21.10.2021 žádost společnosti HOCHTIEF CZ a.s., Divize dopravní stavby, IČ: 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 15000 Praha 5 (dále jen „žadatel“), podanou v zastoupení spol. SEDOZ DZ s.r.o., IČ: 24218537, se sídlem Primátorská 296/38, 18000 Praha 8 - Libeň, na základě plné moci, ve věci povolení uzavírky silnice č. II/245 v k.ú. Mochov a nařízení její objížďky z důvodu realizace akce s názvem: „Demolice mostu II/245 přes D11“.

K žádosti byly doloženy potřebné podklady a dne 25.10.2021 bylo oznámeno zahájení řízení ve věci všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Ústní jednání pak proběhlo 2.11.2021. Řízení bylo ve stanovené lhůtě doplňováno o podstatné skutečnosti potřebné pro rozhodnutí ve věci. V řízení nebyly uplatněny žádné připomínky nebo námitky.

Silniční správní úřad žádost dle předložených podkladů posoudil, žádosti vyhověl a povolil uzavírku a objížďku za podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, neboť byly předloženy zákonem požadované náležitosti a úřad neshledal důvody žádosti nevyhovět.

Poučení

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím podání u Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pracoviště Mariánské náměstí 28, odbor dopravy, Stará Boleslav. Odvolání nemá odkladný účinek.

Účastník řízení má právo vzdát se písemně u správního orgánu práva na odvolání v dané věci. Tímto dále pozbývá práva na poskytnutí 15. denní odvolací lhůty.

Při nedodržení podmínek rozhodnutí odejme silniční správní úřad na základě § 25, odst. (3), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydané povolení.

-otisk úředního razítka-

Mgr. Bc. Jiří Kenda
referent silničního hospodářství

Doručuje se:

Účastníci řízení:

- Středočeský kraj - vlastník PK (KSÚS, Oblast Mnichovo Hradiště, správce PK)
- HOCHTIEF CZ a.s., žadatel - (prostřednictvím SEDOZ DZ s.r.o., na základě plné moci)

Dotčené orgány a ostatní:

- Obec Mochov
- Obec Vyšehořovice
- Městys Nehvizdy
- KŘP Středočeského kraje, DI, ÚO Praha venkov-VÝCHOD
- KŘP Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Nymburk
- Lékařská záchranná služba SK - Kladno, Vančurova 1544, Kladno
- Krajské ředitelství HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, Kladno

Příloha č. 1 - DIO - uzavírka, objízdná trasa

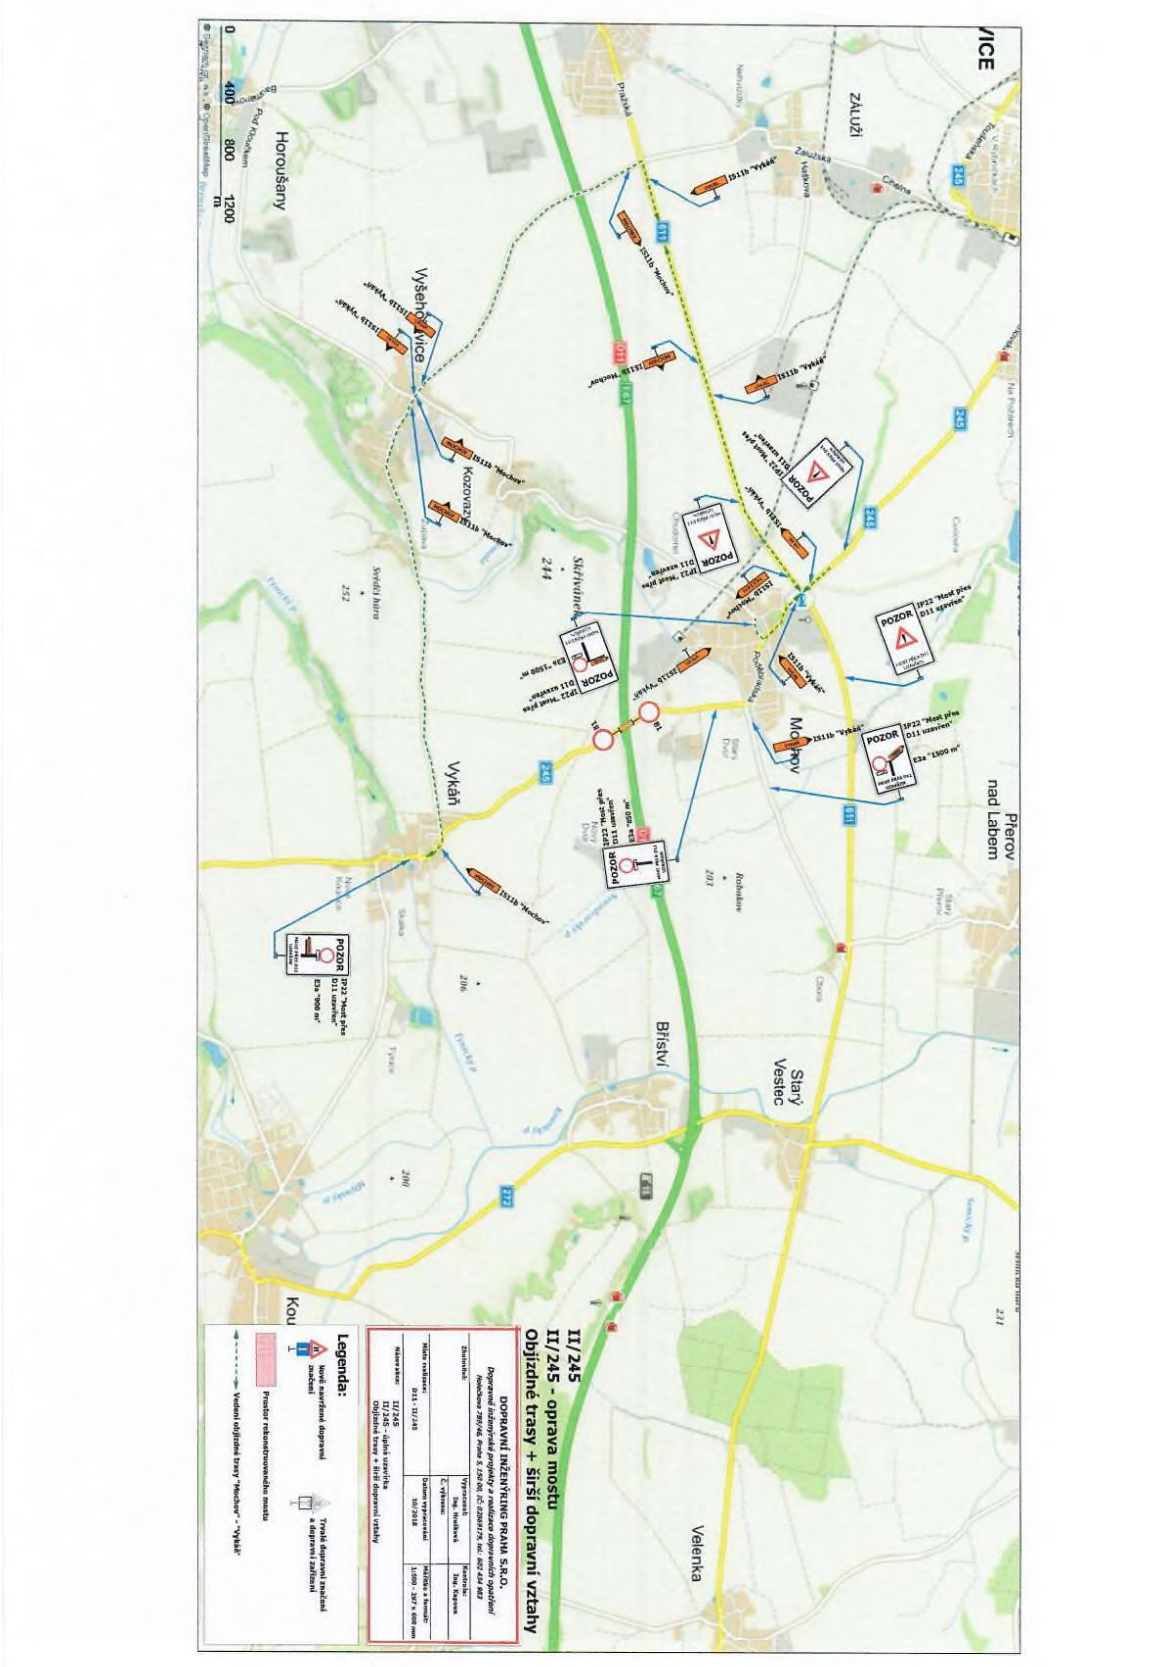

Doklad č. 11
Výzva Objednatele

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

VÝZVA

V souladu s čl. 3., odst. 3.1. a 3.2., Smlouvy o dílo č. S-1604/00066001/2021 ze dne 8.7.2021 (dále jen SoD) a na základě dohody vyzývá Krajská správa a údržba silnic, , zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468 se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, k plnění předmětu díla SoD tj. zahájení realizace akce "**II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov** ".

12 -11- 2021

Ing. Jan Lic

Ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.

Převzal:

OPTYS®
VŽDY O KROK NAPŘED

MOCHOV - II/245 MACHOV, MOST EV. Č. 245-009
PŘES DÁLNICI D1

Doklad č. 1
SD_2021_11_15_Předání staveniště

Stavební deník

SAMOPROPIS
128 listů

SD č. 1

www.optys.cz | budete překvapeni

Základní list – adresář

pro objekt Most Mochov ev.č. 245-009	kraj Středočeský
část / úsek	okres Praha východ
obec Mochov	místo / adresa Dálnice D11 - km 15,2

Zúčastněné strany	Jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců
Objednatel (Investor)	SÚS Středočeský kraj Ing. Zachostelský J. -
Technický (stavební) dozor investora	IBH spol. s.r.o.
Stálý	Ing. Petr Burger -
Průběžný	
Generální zhotovitel (dodavatel)	Hochtief CZ a.s.
Zhotovitel stavební části	Hochtief CZ a.s.
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Jan Žák - 724 809 31
Stavbyvedoucí	
Generální projektant	Pontex spol. s.r.o.
Odpovědný projektant	Ing. Petr Matoušek -
Autorský dozor	PUDIS a.s.

Změny a doplňky

KOORDINÁTOR BOZP - IBH s.r.o
ONDŘEJ PATĚRA
DAVID BUCHTA - pomocný

WWW.OPTYS.CZ

List č. 2414241

Datum	Denní záznamy stavby
15.11. 2021	ONEŠNÍHO DNE PRO BĚHU PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ VIZ. SAMOSTATNÝ
PONDĚLÍ	PROTOKOL ZA HT INŽ. ŠEINER
	PŘEDPOVĚĎ: POLOJASNO +11°C ~ +6°C
	PRAC. DOBA: 7:00 – 17:00
	PRACOVNÍCI: THP – INŽ. ŠEINER, 3×D, GEODET
	MECHANIZACE: —
	PRO. PRÁCE: ZNAČENÍ OBJÍŽDĚNÝCH TRAS A VLAVIČENÍ MÍSTU
	NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÍ OIP
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN OLE DENDROLOG. PRŮZKUMU – 4/M2
	KÁCENÍ STROMŮ OLE DENDROLOG. PRŮZKUMU – 4 KUSY
	GEODET. PRÁCE: ZAMĚŘENÍ PRO FRÉZOVÁNÍ ASFALTU
	– ZAMĚŘENÍ PŮDORYSU ASFALTU
	ZA HT INŽ. ŠEINER
16.11. 2021	PŘEDPOVĚĎ: POLOJASNO +11°C ~ +9°C
ÚTERÝ	PRAC. DOBA: 7:00 ~ 13:00
	PRACOVNÍCI: THP – INŽ. ŠEINER, 5× ŘIDIČ, MTS – 2× STROJNÍK
	MECHANIZACE: SILNIČNÍ FRÉZA, 5× VOZIDLO
	PRO. PRÁCE: FRÉZOVÁNÍ ASPALTU NA MÍSTĚ A NAKLÁDÁNÍ V
	TLOUŠŤCE 111 MM CELKEM 87,35 M3
	ODVOZ ASPALTU NA SKLÁDKU
	ZA HT INŽ. ŠEINER
17.11.2021	PŘEDPOVĚĎ: POLOJASNO +4°C ~ +11°C
ČTVRTEK	PRAC. DOBA: 7:00 ~ 17:00
	PRACOVNÍCI: THP – INŽ. ŠEINER, 3×D, GEODET
	MECHANIZACE: —
	PRO. PRÁCE: DEMONTÁŽ LÁVOVADELNÍCH SVODIDEL NA MÍSTĚ – 164 M
	DEMONTÁŽ DOPRAVNÍCH ZNAČEK – 5 KUSŮ
	DEMONTÁŽ SLOUPKŮ 32 – 3 KUSY
	GEODET. PRÁCE: ZAMĚŘENÍ VYTÝČENÉ ZÁMĚRNÉ ASFALTU
	VYTÝČENÍ ZÁBRANY STAVENIŠTĚ.
	ZA HT INŽ. ŠEINER
	EXTRAS TÝM: Pavlína Hlavní
18.11.2021	DNEŠNÍHO DNE PROBĚHLO PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENÍ
PÁTEK	MEZI ŘSD A HIGHTIGHT CZ PRO DEMOLICI MÍSTU MOSTU.
	ZA HT INŽ. ŠEINER

ZDE ODTRHNĚTE
WWW.OPTYS.CZ
3486

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Číslo jednací:
Spisová značka:

F.8.05.PÚP v1.2

Počet stran: 2
Počet výtisků:
Výtisk číslo:
Klasifikace: V

Zápis z předání a převzetí staveniště

Zábor D11 v rámci demolice II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov

1. Základní údaje stavby

Místo provádění Údržbových prací - Staveniště	
Číslo silnice	D11
Staničení	Km 15,20 – 15,30 LS a PS
Jiné upřesnění	

Objednatel – Předávající	
Organizace	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 14000 Praha 4
Zastoupený	SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany
Pověřená osoba	Bc. Tomáš Skála, vedoucí Střediska SSÚD 13 Poříčany Správy dálnic
Kontaktní údaje	

Zhotovitel – Přebírající	
Organizace	HOCHTIEF CZ a. s., Divize dopravní stavby, Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Statutární zástupce	Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva
Kontaktní údaje	
Pověřený zástupce	Ing. Zdeněk Novotný, Vedoucí Výrobního střediska Mosty a Mechanizace
Kontaktní údaje	602 632 904, zdenek.novotny2@hochtief.cz

Osoba vykonávající stavební dozor (dohled)	
Organizace	HOCHTIEF CZ a.s.
Jméno	Ing. Kamil ŠEINER
Kontaktní údaje	

Další osoby

Funkce	Jméno	Organizace (útvar)	Telefon	Mail

2. Předmět předání a převzetí

2.1. Staveniště

Dnešního dne jsou předávány všechny plochy záboru staveniště v rámci demolice **II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov** a to v rozsahu dle záborového elaborátu.

Stav tělesa dálnice před zahájením prací byl zdokumentován, fotodokumentace je přílohou tohoto protokolu.

Uzavírka dálnice je od 20. 11. 2021 - 14.00 hod do 21. 11. 2022 - 20.00 hod

Pověřená osoba tímto konstatuje, že jsou předána veškerá dostupná rozhodnutí pro realizaci stavby.

2.2. Příjezdy na staveniště

Hlavní příjezdy na staveniště budou probíhat po stávajících komunikacích a záborech stavby.

3. Různé

V předaném úseku nebylo při předání nalezeno žádných vad či poškození na vozovce a ani na dálničním zařízení.

4. Závěr

Objednatel předává Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel ho přejímá s těmito výhradami: bez výhrad

Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývající z nedodržení hranic staveniště.

V Poříčanech dne 19. 11. 2021

Za Objednatele

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

Jméno a funkce: Bc. Tomáš Skála, vedoucí Střediska SSÚD 13 Poříčany

Podpis

Za Zhotovitele

Jméno a funkce: Ing. Kamil Šeiner Hochtief CZ a.s. Divize dopravní stavby

Podpis

List č. 2414242

Datum	Denní záznamy stavby
	PŘÍJEZD: ZAHÁJENÍ +6 ~ +11°C
	PRAC. DOBA: 7:00 — 15:00
	MECHANIZACE: THP - INV. ŠEINER, APB - ZÁSTAVNÍK, TGM - 3x0
	MECHANIZACE: RYPADLO - 2x, PÁSOVÉ RYPADLO CAT 345 - 2x
	PÁSOVÉ RYPADLO CAT 325 - 4x
	PRAC. PRÁCE: NÁVOZ MECHANIZACE NA DEMOLICI MOSTU
	PŘÍPRAVY NA PŘELOŽKU KABELŮ ČEZ TN
	ZA HT INŽ. ŠEINER
20.11.2021	ZÁPIS KOORDINÁTORA BOZP
	KONTROLA STAVENIŠTĚ A DOKUMENTACE
	PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ
	- AKTUALIZACE PLÁN BOZP (VIZ ZÁPIS
	V KNIZE KOO BOZP)
21.11.2021	PŘÍJEZD: POLOJASNO +6°C ~ +11°C
SOBOTA	PRAC. DOBA: 12:00 — 0:00
	PRAC. ZAŘÍZENÍ: THP - INŽ. ŠEINER, INŽ. ŽÁK, INŽ. NOVOTNÝ
	HT - 4x0, TGM - 3x0, APB - 3x THP + 12x STAVBYVEDOUCÍ
	MECHANIZACE: 4x CAT 325, 2x CAT 345, 6x PÁSOVÁ RYPADLA
	PRAC. PRÁCE: ODSTRAŇOVÁNÍ OPLECENÍ Z KOLEJIVA - 41 M
	DEMONTÁŽ NÁBĚHŮ SVODIDEL PŘED A ZA MOSTEM - 48 M
	NÁVOZ RECYKLÁTU PRO VYHOVANÍ OBÁLKOVÉ PŘI DEMOLICI - 241,725 m3
	ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA OBÁLKOVÉ 14:00 — 20:00 PRAVÁ 1/1
	DEMONTÁŽ KOTVÍCÍCH OBÁLKOVÝCH SVODIDEL - 240 M
	ODSTRAŇOVÁNÍ MOSTNÍ IZOLACE A ASFALTU NA SKLÁDKU (665 m2 / 6,65 t)
	OBÁLKOVÁ UZAVÍRKA OBÁLKOVÉ: 20:00 — 0:00
	PŘELOŽKA KABELŮ ČEZ TN
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OBÁLKOVÝCH SVODIDEL - 96 M
	DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ MOSTU - 164 M
	ROZPROSTŘENÍ GEOTEXTILIE A RECYKLÁTU TL. 300 MM
	BOURÁNÍ PILÍŘŮ - 73,8 m3
	BOURÁNÍ DESKY MOSTOVKY - 148,1 m3
	BOURÁNÍ DŘÍKOVÉ ČÁSTI VÝSUVKY - 42 m3
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KIVŮ/ŘÍMS - 24 T
	BOURÁNÍ VÝSUVKY VK - 327,6 m3
	ZA HT INŽ. ŠEINER
	ZAPSAL TKO: Barbora Hrabcová.

ZDE ODTRHNĚTE

WWW.OPTYS.CZ

List č. 2414243

Datum	Denní záznamy stavby
21.11.2021	POČASÍ: PŘÍJEMNÉ +3°C — +7°C
NEDĚLE	PRACOVNÍ DOBA 0°° — 18°°
	PRACOVNÍCI: THP - INŽ. ŠEVČÍK, INŽ. MAŠTNÝ, UVČ. ŽÁK
	HT - 4Ú, APB - 3x THP, 12x STAVAŘ
	MECHANIZACE: 4x LKT 325, 2x LKT 345, 8x OTOČKA, 1x KOLOVÝ NAKLADAČ
	1x KAMIÓN BABA, 1x ČISTÍCÍ VŮZ, 1x KROPÍCÍ VŮZ
	PRŮZ. PRÁCE: ÚPRAVA PLOCHY PLATFORMY OD 0°° — 12°°
	DEMOLICE PŘÍČNÍKŮ NAD OPĚRAMI - 34,56 M³
	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - PILOVÉ - 10,8 M
	DEMOLICE PILÍŘŮ - 33,41 M³
	VYBOURÁNÍ DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ - 24 M
	VYBOURÁNÍ LOŽISEK ELASTOMER - 12 KUSŮ
	VYBOURÁNÍ LOŽISEK OCELOVÝCH - 12 KUSŮ
	OSAZENÍ BETONOVÝCH SVODIDEL STŘEDOVÝCH - 68 M
	ÚKLID SUTĚ MIMO DÁLNICI
	ODVOZ PLOCHANÉ HMOTY Z RECYKLÁTU NA SKLÁDKU - 483,45 T
	ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE REŽIM 1/1 VE 12:30
	OSAZENÍ BETONOVÝCH SVODIDEL SMĚR PRAHA - 49 M
	ZPROVOZNĚNÍ SMĚR PRAHA Z PRUHU 16°°
	OSAZENÍ BETONOVÝCH SVODIDEL SMĚR HRADEC - 49 M
	ZPROVOZNĚNÍ SMĚR HRADEC 18°°
	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU
	ZA HT INŽ. ŠEVČÍK
22.11.2021	POČASÍ: +2°C — +7°C PŘÍJEMNÉ
PONDĚLÍ	PRACOVNÍ DOBA: 7°° — 17°°
	PRACOVNÍCI: THP - INŽ. ŠEVČÍK HT - 1x STAVAŘ, 3x O
	APB - 1x THP 8x STAVAŘ
	MECHANIZACE: AUTO S PLOŠINOU, 4x LKT 325, 4x OTOČKA
	PRŮSTUP PRACÍ: ODVOZ ODMONTOVANÝCH SVODIDEL DO ÚSTAVU
	ODSTRAŇOVÁNÍ ODVÁŽDĚNÍ PRO MOSTEM - 130,125 M³
	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU
	ZA HT INŽ. ŠEVČÍK
23.11.2021	POČASÍ: PŘÍJEMNÉ -1°C — 4°C
ÚTERÝ	PRACOVNÍ DOBA: 7°° — 17°°
	PRACOVNÍCI: APB - 1x THP, 8x STAVAŘ
	MECHANIZACE: 4x LKT 325, 4x OTOČKA
	PRŮSTUP PRACÍ: BOURÁNÍ OPĚR - 138,85 M³
	BOURÁNÍ KŘÍDEL - 47,06 M³
	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU HT INŽ. ŠEVČÍK

OP 1278 VY 3/13 126486

→ ZDE ODTRHNĚTE →

WWW.OPTYS.CZ

From: Seiner Kamil
Sent: Wednesday, December 1, 2021 10:25 AM
To:
Cc: Novotny Zdenek ing. · Petr Burger <
Subject: Most Mochov - zimní přestávka

Dobrý den,

V příloze Vám zasílám aktuální foto ze stavby. Práce na demolici mostu a odvozu sutě byly dokončeny. Staveniště je zajištěno betonovými svodidly a mobilním oplocením.

Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám a dlouhodobé předpovědi Vás žádám dle smlouvy o dílo číslo S-1604/00066001/2021, článek 4. Doba a místo plnění, odstavec 4.2. o povolení zahájit zimní přestávku dnešním dnem počínaje.

Předem děkuji

S pozdravem

Ing. Kamil Šeiner
Hlavní stavbyvedoucí
II/242 Mochov – most přes dálnici D11

HOCHTIEF CZ a. s.
divize Dopravní stavby
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Česká republika
Mobil:
E-mail:
www.hochtiet.cz

List č. 2414244

Datum	Denní záznamy stavby
24.11.2021	POČASÍ: POLOJASNO 3°C ~ 7°C
STŘEDA	PRACOVNÍ DOBA: 7:00 ~ 17:00
	PRACOVNÍCI: 1x THP, 8x STAVBYVEDOUCÍ
	MECHANIZACE: 4x CAT 325, 4x OSOBNÍ AUTA
	PRŮBĚH PRACÍ: ODSTRAŇOVÁNÍ PROVIZORNÍCH ŽELEZOBETONOVÝCH DESEK - 65,8 m²
	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU
	ZA HT INV. ŠEIDLER
25.11.2021	POČASÍ: OBLAČNO +1°C ~ +7°C
ČTVRTEK	PRAC. DOBA: 7:00 ~ 17:00
	PRACOVNÍCI: 1x THP, 8x STAVBYVEDOUCÍ
	MECHANIZACE: 4x CAT 325, 4x OSOBNÍ AUTA
	PRŮBĚH PRACÍ: ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU
	ZA HT INV. ŠEIDLER
	ZÁPIS PŘEČETL: Jaroslava Šedá
26.11.2021	POČASÍ: ZATAŽENO 0°C ~ +3°C
PÁTEK	PRAC. DOBA: 7:00 ~ 17:00
	PRACOVNÍCI: 1x THP, 8x STAVBYVEDOUCÍ
	MECHANIZACE: 4x CAT 325, 4x OSOBNÍ AUTA
	PRŮBĚH PRACÍ: ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU
	ZA HT INV. ŠEIDLER
29.11.2021	POČASÍ: -1°C ~ +2°C, SNĚHOVÉ PŘEHÁNĚNÍ
PONDĚLÍ	PRAC. DOBA: 7:00 ~ 17:00
	PRACOVNÍCI: APB 1x THP + 8x STAVBYVEDOUCÍ
	MECHANIZACE: 4x CAT 325, 4x OSOBNÍ AUTA
	PRŮBĚH PRACÍ: ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU
	ZA HT INV. ŠEIDLER
30.11.2021	POČASÍ: -1°C ~ +3°C ZATAŽENO
ÚTERÝ	PRAC. DOBA: 7:00 ~ 17:00
	PRACOVNÍCI: APB 1x THP + 5x STAVBYVEDOUCÍ
	MECHANIZACE: 4x CAT 325, NAKLADAČ
	PRŮBĚH PRACÍ: ODVOZ MECHANIZACE
	TERÉNNÍ ÚPRAVY
	ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ - BET. SLOUPKY + PLOTY
	ZA HT INV. ŠEI
	ZÁPIS PŘEČETL: Jaroslava Šedá
1.12.2021	ZÁPIS ZHOTOVITELE: PRÁCE NA DEMOLICI BYLY PRO VELKÝ MRAZ
	UKONČENY. VZHLEDEM K NAROSTLÝM KLIM. PODMÍNKÁM BYLA OBJEDNATELI
	ZASLÁNÁ ŽÁDOST O ZAHÁJENÍ ZIMNÍ PAUZY. ŠEIDLER

From: Zákostelský Jan
Sent: Monday, March 14, 2022 2:40 PM
To: Seiner Kamil <
Cc: Novotny Zdenek ing.
Subject: RE: Most Mochov - zimní přestávka

Dobrý den,

Investor v souladu se smlouvou o dílo souhlasí se započetím zimní technologické přestávky.

S pozdravem

Jan Zákostelský, Dis.
Projektový manažer
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1, Říčany u Prahy 251 01
tel.:
e-mail:

www.ksus.cz

This email was scanned by Bitdefender

From: Seiner Kamil
Sent: Wednesday, December 1, 2021 10:25 AM
To: Zákostelský Jan <
Cc: Novotny Zdenek ing. ; Petr Burger <
Subject: Most Mochov - zimní přestávka

Dobrý den,

V příloze Vám zasílám aktuální foto ze stavby. Práce na demolici mostu a odvozu sutě byly dokončeny. Staveniště je zajištěno betonovými svodidly a mobilním oplocením.

Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám a dlouhodobé předpovědi Vás žádám dle smlouvy o dílo číslo S-1604/00066001/2021, článek 4. Doba a místo plnění, odstavec 4.2. o povolení zahájit zimní přestávku dnešním dnem počínaje.

Předem děkuji

S pozdravem

Ing. Kamil Šeiner
Hlavní stavbyvedoucí
II/242 Mochov – most přes dálnici D11

HOCHTIEF CZ a. s.
divize Dopravní stavby
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Česká republika
Mobil:
E-mail:
www.hochtief.cz

This email was scanned by Bitdefender

Most Hlochov ev. č. 245-009

SD č. 1 List č. 2414245

Datum	Denní záznamy stavby
24.3.2022 ČTVRTEK	Dnes byl zahájen pasport přijezdových komunikací k mostu. Pasport provádí laboratoř SQZ – Ing. Matula Žák
25.3.2022 PÁTEK	Pokračování v provádění pasportizace přijezdových komunikací k mostu. Dle doporučení laboratoře SQZ, kvůli velmi špatnému stavu komunikace, by se měla provést diagnostika podkladních vrstev + vývrty. Naceněno na přibližně 58 000 Kč bez DPH. Probráno se zástupcem investora p. Janem Záhostelským, DiS → stanovisko investora neprovádět diagnostiku, že oprava přijezdových komunikací bude prováděna v navrženém minimálním rozsahu bez ohledu na stav komunikací. Žák
29.3.2022 ÚTERÝ	Pokračování v provádění pasportizace přijezdových komunikací k mostu. Dnes konec. Proveden pasport komunikací v celkové délce 2,8 km. Žák
4.4.2022 Pondělí	Počasí: Polojasno: + 2°C; + 6°C Pracovní doba: 7⁰⁰ – 18⁰⁰ Počet pracovníků: 2x THP Hochtief CZ 5x Hinton; 3x Zapa 1x Geodet Azimut – Ing. T. Bartík Popis prací: 1x Geolog; 1x Laborator SQZ Dnes došlo k vytyčení pilot na O1 P1-P6a na O2 P1-P6. Nadmořská výška vrtací lavice na O1 je cca 194 m.n.m a na O2 je cca 195,8 m.n.m. Došlo k vytyčení výškových bodů na O1 = 198,700 m.n.m. a na O2 = 196,300 m.n.m. O vytyčení bude zhotoven geodetický protokol. Zápis vedl: Pavel Kroutil

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU

Stavba: II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov
Vyjádření projektanta PD PDPS k předloženému návrhu „Změnového listu" (ZBV 1-6) zhotovitelem stavby ze dne 11.4.2023:

ZBV 1 se týká zvýšení ceny za provoz staveniště „03100. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ" vzhledem k prodloužení doby výstavby kvůli vzniklé zimní technologické přestávce.

Prodloužení výstavby nemá vliv na výsledné technické řešení – AD souhlasí.

ZBV 2 se týká zvýšení ceny za nájem svodidel „911FC9.N2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M – NÁJEM" vzhledem k prodloužení doby výstavby kvůli vzniklé zimní technologické přestávce.

Prodloužení výstavby nemá vliv na výsledné technické řešení – AD souhlasí.

ZBV 3 se týkají navýšení ceny za dopravně inženýrská opatření „02720.3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY" vzhledem k prodloužení doby výstavby kvůli vzniklé zimní technologické přestávce.

Prodloužení výstavby nemá vliv na výsledné technické řešení – AD souhlasí.

ZBV 4 se týká změny množství výztuže v pilotách a provedení pilot pomocí metody hluchého vrtání, která souvisí se zvýšením úrovně vrtání oproti dokumentaci PDPS. Hluché vrtání zohledňuje původní položka „264142. VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM".
Použití metody hluchého vrtání nemá vliv na výsledné technické řešení – AD souhlasí.

ZBV 5 se týká:

1) Přecenění demontáže původních svodidel s úrovní zadržení H2 oproti naceněným svodidlům s úrovní zadržení H1. AD souhlasí.
2) Nová položka „74B830R. OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ", která zohledňuje propojení ocelového a betonového svodidla. AD se domnívá, že se jedná o standardní díl, který nemusí být vyráběn na zakázku. Nicméně dočasné řešení v průběhu výstavby nemá vliv na výsledné technické řešení – AD souhlasí.

ZBV 6 se týká záměny svodidel pod mostem z původní úrovní zadržení H1 na svodidla s úrovní zadržení H2 v důsledku nového požadavku ŘSD.

AD souhlasí s použitím svodidel H2.

Vyjádření AD se vztahují k technickému řešení bez zohlednění dopadu na cenu.

V Praze dne: **16.5.2023** Za AD (PUDIS a.s.) : **Ing. Ludvík Kolpaský, Ph.D.**

IBH spol. s r.o.

V Kladně dne: 19.dubna 2023

Vyřizuje: P. Burger

KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5

Věc: II/245 Mochov, most ev. č. 245-009 přes dálnici D11 za obcí Mochov

Změny oproti PDPS

Vyjádření TDS **ZBV 3**

Předmětem změny je:

Navýšení nákladů na DIO po dobu výstavby vč. trvání zimní technologické přestávky (ZTP)

Popis a zdůvodnění Změny:
Smlouva o Dílo určuje dobu provádění Díla na 8 měsíců, s možností přerušení prací po dobu zimní technologické přestávky ZTP.
V době podání nabídky nebyl znám měsíc zahájení prací na Díle, a proto Zhotovitel nacenil náklady na DIO na požadovaných 8 měsíců (tj. 243 dnů).
Staveniště bylo předáno Zhotoviteli dne 15.11.2021 a Zhotovitel provedl do zimní technologické přestávky snesení původního mostu
Od 01.12.2021 do 03.04.2022 vč. (tj. 124 dnů) probíhala ZTP, o kterou byla tedy posunuta Doba pro dokončení Díla byla upravena v Dohodě o narovnání mezi Objednatelem a Zhotovitelem (od 15.11.2021 do 4.12.2022 vč., tj. 385 dnů.
Navýšení množství vycházející z prodloužení doby skutečného nasazení DIO po dobu výstavby – jedná se o navýšení o **0,5844 násobek** nad rámec původně předpokládaný ve výkazu výměr SoD.

Změna má vliv na rozsah díla.
Položky v návrhu změny byly převzaty z již naceněného soupisu prací, jež je součástí SoD a výčet a množství měněných položek soupisu prací je přiměřený a odpovídající dle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele s předloženými navrhovanými **technickými řešeními výstavby souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Z návrhu změn vyplývá, že byly nezbytné pro realizaci stavby.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger
