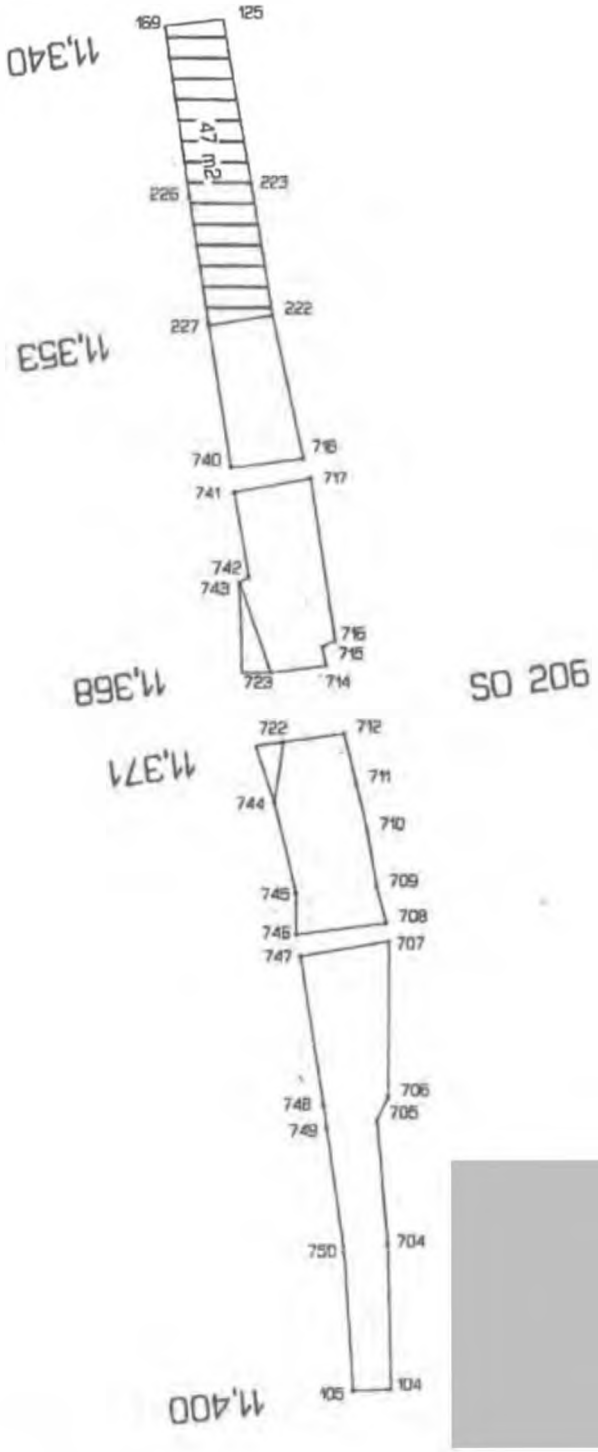


| | | | |
|---|---|---|---|
| **STRABAG a.s.**<br>Kačírkova 982/41, Praha 5 | Číslo zakázky | | |
| | ověřil | Ing. S. Blek | |
| | datum | 19.12.2022 | |
| | číslo ověření | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| akce | **II/102 Hr. hl. Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa II**<br>SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stěchovice<br>Úsek B, km 10,340 - 10,400 - vlevo - obložení svahu kamenem | | | | výkres číslo |
| | | | | měřítko | bez |
| zaměřil | Ing. Stanislav Blek | datum | 19.12.2022 | souř. systém | S-JTSK |
| kreslil | Ing. Stanislav Blek | datum | 19.12.2022 | výšk. systém | Bpv |

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

**Stavba:** II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
**Dodavatel:** STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

**Číslo předávacího protokolu: Š II 4/2023**

**Předmět měření:** SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 10,947 – 11,031 – vlevo – obložení svahu kamenem

km 10,947 – 11,031 - **165,6 m²**

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

| | |
|---|---|
| **Souřadnicový systém:** | S-JTSK |
| **Výškový systém:** | Bpv |
| **Přílohy:** | Seznam souřadnic |
| | Náčrt |

| | | |
|---|---|---|
| **Zaměřil:** | 7.2.2023 | Ing. S. Bílek |
| **Zpracoval:** | 7.2.2023 | Ing. S. Bílek |
| **Ověřil:** | 7.2.2023 | Ing. S.Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě podle §13 odst 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**Stavba:** II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
**Dodavatel:** STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

**Číslo předávacího protokolu:** Š II 11/2023

**Předmět měření:** SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
**Úsek C – km 14,410 – 14,460 – vlevo – obložení svahu kamenem**

km 14,410 - 75,4 m²
km 14,460 - 21,5 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

| | |
|---|---|
| **Souřadnicový systém:** | S-JTSK |
| **Výškový systém:** | Bpv |
| **Přílohy:** | Seznam souřadnic |
| | Náčrt |

| | | |
|---|---|---|
| **Zaměřil:** | 3.2023 | Ing. S. Bílek |
| **Zpracoval:** | 21.3.2023 | Ing. S. Bílek |
| **Ověřil:** | 21.3.2023 | Ing. S.Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

## II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
## SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek C

**km 14,410 a 14,460 – vlevo – obložení svahu kamenem**

**Seznam souřadnic**

| Bod | Y | X | Výška |
|---|---|---|---|
| 33 | 747713.16 | 1068667.88 | 205.12 |
| 34 | 747709.78 | 1068671.43 | 205.82 |
| 100 | 747716.80 | 1068666.45 | 204.69 |
| 101 | 747716.33 | 1068666.11 | 204.66 |
| 102 | 747713.43 | 1068668.09 | 205.11 |
| 105 | 747708.48 | 1068672.87 | 205.78 |
| 106 | 747709.71 | 1068674.32 | 205.88 |
| 107 | 747710.96 | 1068672.99 | 205.88 |
| 108 | 747711.98 | 1068672.06 | 205.70 |
| 109 | 747712.16 | 1068671.77 | 205.65 |
| 110 | 747714.48 | 1068669.47 | 205.16 |
| 111 | 747714.89 | 1068669.90 | 206.05 |
| 120 | 747739.82 | 1068640.28 | 203.43 |
| 121 | 747741.14 | 1068642.34 | 203.71 |
| 122 | 747742.78 | 1068643.67 | 205.08 |
| 123 | 747743.22 | 1068644.28 | 205.13 |
| 124 | 747748.61 | 1068637.60 | 205.02 |
| 125 | 747748.81 | 1068638.10 | 205.07 |
| 126 | 747749.14 | 1068638.43 | 205.15 |
| 127 | 747747.28 | 1068635.44 | 204.76 |
| 128 | 747750.73 | 1068636.25 | 205.38 |
| 129 | 747751.05 | 1068636.48 | 205.81 |
| 130 | 747751.24 | 1068636.75 | 206.14 |
| 131 | 747751.47 | 1068636.95 | 206.12 |
| 132 | 747753.86 | 1068634.44 | 205.96 |
| 133 | 747753.63 | 1068634.24 | 205.86 |
| 134 | 747751.73 | 1068632.66 | 205.48 |
| 135 | 747757.35 | 1068629.03 | 205.83 |
| 136 | 747759.44 | 1068627.66 | 205.91 |
| 137 | 747760.65 | 1068626.91 | 205.94 |
| 138 | 747761.68 | 1068626.07 | 205.98 |
| 139 | 747757.43 | 1068630.57 | 205.94 |

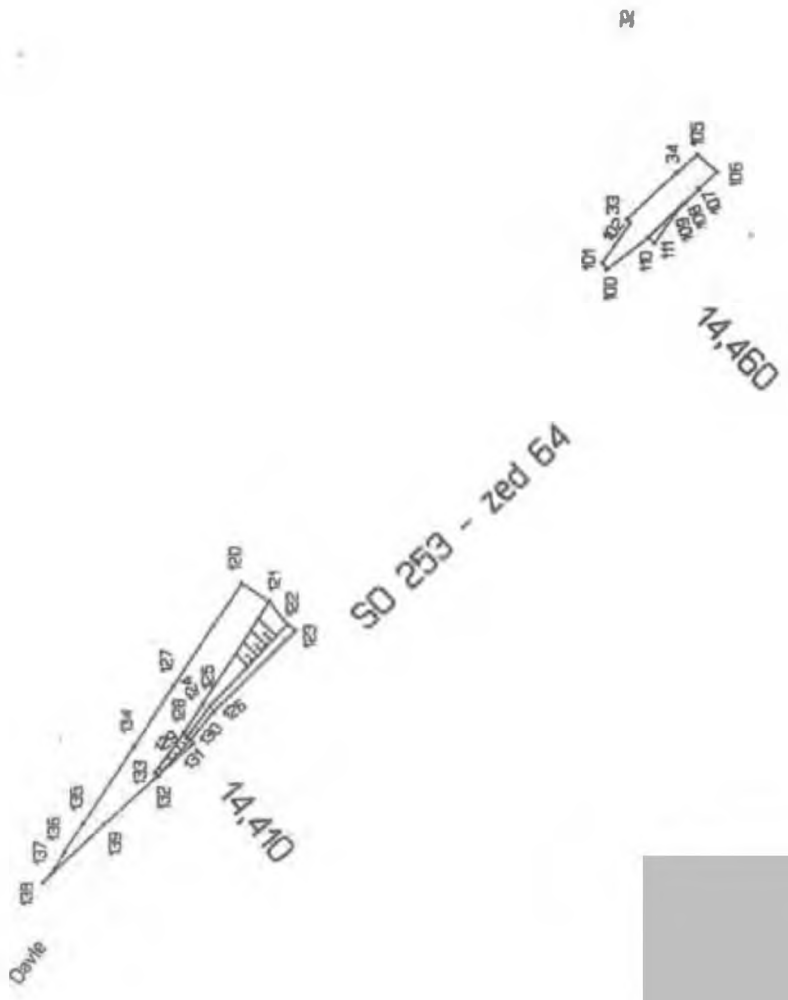


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **STRABAG a.s.**<br>Kačírkova 982/41, Praha 5 | | | Číslo zakázky | | |
| | | | ověřil | Ing. S. Bílek | |
| | | | datum | 21.3.2023 | |
| | | | Číslo ověření | | |
| akce | **II/102 Hr. hl. města Prahy – Stěchovice, rekonstrukce, etapa II**<br>SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stěchovice<br>Úsek C, km 14,410 – 14,460 – vlevo - obložení svahu kamenem | | | | výkresa číslo |
| | | | | měřítko | 1 : 500 |
| zpracoval | Ing. Stanislav Bílek | datum | 3.2023 | souř. systém | S-JTSK |
| kreslil | Ing. Stanislav Bílek | datum | 21.3.2023 | výšk. systém | Bpv |

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**Stavba:** II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
**Dodavatel:** STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

**Číslo předávacího protokolu: Š II 13/2023**

**Předmět měření:** SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
**Úsek C – km 14,425 – vlevo – obložení svahu kamenem**

km 14,425 - 22,4 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

| | |
|---|---|
| Souřadnicový systém: | S-JTSK |
| Výškový systém: | Bpv |
| Přílohy: | Seznam souřadnic |
| | Náčrt |

| | | |
|---|---|---|
| **Zaměřil:** | 12.4.2023 | Ing. S. Bílek |
| **Zpracoval:** | 12.4.2023 | Ing. S. Bílek |
| **Ověřil:** | 12.4.2023 | Ing. S.Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

[redacted]

## II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II

## SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek C

**km 14,425 – vlevo – obložení svahu kamenem**

**Seznam souřadnic**

| Bod | Y | X | Výška |
|---|---|---|---|
| 120 | 747739.82 | 1068640.28 | 203.43 |
| 121 | 747741.14 | 1068642.34 | 203.71 |
| 212 | 747739.46 | 1068643.58 | 203.14 |
| 213 | 747737.67 | 1068644.39 | 202.69 |
| 214 | 747736.93 | 1068644.65 | 202.51 |
| 215 | 747735.70 | 1068643.24 | 202.47 |
| 216 | 747735.27 | 1068642.79 | 202.28 |
| 217 | 747735.76 | 1068641.95 | 202.18 |
| 218 | 747736.98 | 1068641.02 | 202.34 |
| 219 | 747738.58 | 1068639.13 | 202.17 |
| 220 | 747738.65 | 1068638.79 | 202.16 |
| 221 | 747739.54 | 1068637.93 | 202.07 |
| 222 | 747740.01 | 1068638.70 | 202.62 |
| 223 | 747740.24 | 1068639.13 | 202.67 |
| 224 | 747739.25 | 1068639.71 | 202.94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **STRABAG a.s.**<br>Kačírkova 982/41, Praha 5 | Číslo zakázky | | |
| | ověřil | Ing. S. Brtek | |
| | datum | 12.4.2023 | |
| | Číslo ověření | | |
| stav: **II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stechovice, rekonstrukce, etapa II**<br>SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stechovice<br>Úsek C, km 14,425 - vlevo - obložení svahu kamenem | | | výkres číslo |
| | | měřítko | 1 : 500 |
| zpracoval: Ing. Stanislav Brtek | datum: 12.4.2023 | souř. systém | S-JTSK |
| kreslil: Ing. Stanislav Brtek | datum: 12.4.2023 | výšk. systém | Bpv |

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**Stavba:** **II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE**
**Dodavatel:** **STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5**

**Číslo předávacího protokolu: Š II 16/2023**

**Předmět měření:** **SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE**
**Úsek B – km 11,928 – 12,060 – vpravo – zpevnění svahu kamenem**

**Zpevnění svahu kamenem**
*km 11,928 – 12,060* *279,5 m²*

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

**Souřadnicový systém:** S-JTSK
**Výškový systém:** Bpv
**Přílohy:** Seznam souřadnic
Náčrt

**Zaměřil:** 17.4.2023 Ing. S. Bílek
**Zpracoval:** 17.4.2023 Ing. S. Bílek
**Ověřil:** 17.4.2023 Ing. S.Bílek
Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě podle §13 odst 1 písm c) zák. č. 200/1994 Sb

## II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II

## SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

**Zpevnění svahu kamenem v km 11,928 – 12,060 - vpravo**

**Seznam souřadnic**

| Bod | Y | X | Výška |
|---|---|---|---|
| 1 | 748153.296 | 1066241.066 | 203.989 |
| 2 | 748151.833 | 1066253.143 | 203.927 |
| 3 | 748152.379 | 1066253.137 | 203.843 |
| 4 | 748149.350 | 1066273.044 | 203.915 |
| 5 | 748149.794 | 1066273.010 | 203.826 |
| 6 | 748146.854 | 1066293.223 | 203.905 |
| 7 | 748147.446 | 1066293.248 | 203.810 |
| 8 | 748144.823 | 1066312.980 | 203.868 |
| 9 | 748142.445 | 1066332.943 | 203.918 |
| 10 | 748139.775 | 1066352.641 | 204.075 |
| 11 | 748138.669 | 1066362.248 | 203.959 |
| 12 | 748137.438 | 1066372.152 | 203.993 |
| 13 | 748138.791 | 1066372.323 | 203.198 |
| 14 | 748139.783 | 1066369.762 | 202.745 |
| 15 | 748141.414 | 1066352.832 | 202.960 |
| 16 | 748143.737 | 1066333.121 | 203.246 |
| 17 | 748146.431 | 1066313.771 | 203.046 |
| 18 | 748149.438 | 1066292.533 | 202.742 |
| 19 | 748152.191 | 1066273.416 | 202.201 |
| 20 | 748154.281 | 1066253.856 | 202.497 |
| 21 | 748155.290 | 1066241.118 | 202.758 |

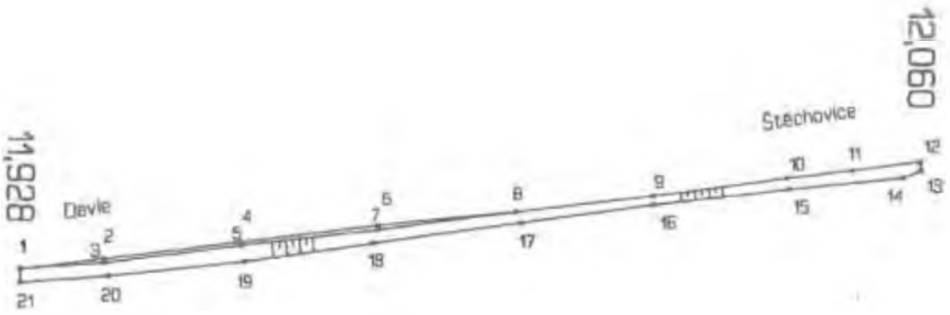


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **STRABAG a.s.**<br>Kačírkova 982/41, Praha 5 | | | číslo zakázky | | |
| | | | ověřil | ing. S. Bílek | |
| | | | datum | 17.4.2023 | |
| | | | číslo ověření | | |
| akce | **II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa II**<br>SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stěchovice<br>Úsek B, km 11,928 - 12,060 - vpravo - zpevnění svahu kamenem | | | | výkres číslo |
| | | | | měřítko | 1 : 1000 |
| zpracoval | ing. Stanislav Bílek | datum | 17.4.2023 | souř. systém | S-JTSK |
| kreslil | ing. Stanislav Bílek | datum | 17.4.2023 | výš. systém | Bpv |

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

**Stavba:** II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
**Dodavatel:** STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

**Číslo předávacího protokolu: Š II 27/2023**

**Předmět měření:** SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
**Úsek B – km 11,733 – 11,832 – vpravo – obložení svahu kamenem**

km 11,733 – 11,832 - 332,7 m²

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny.

| | |
|---|---|
| Souřadnicový systém: | S-JTSK |
| Výškový systém: | Bpv |
| Přílohy: | Seznam souřadnic |
| | Náčrt |

| | | |
|---|---|---|
| **Zaměřil:** | 6.2023 | Ing. S. Bílek |
| **Zpracoval:** | 5.6.2023 | Ing. S. Bílek |
| **Ověřil:** | 5.6.2023 | Ing. S.Bílek |

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

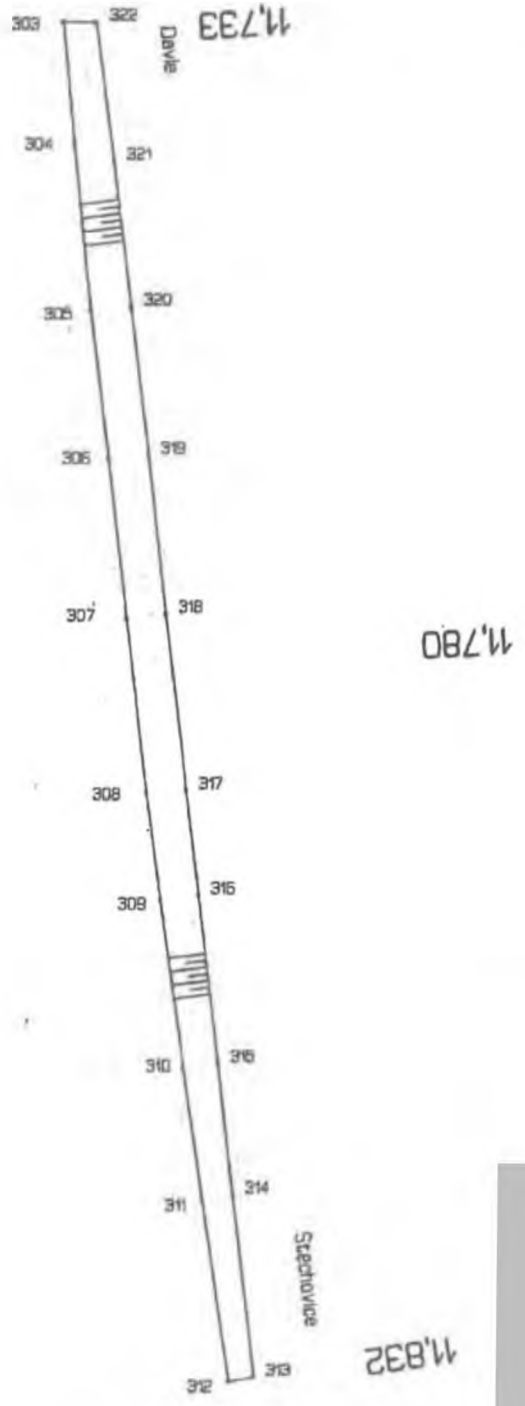


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **STRABAG a.s.**<br>Kačírkova 982/41, Praha 5 | | | číslo zakázky | | |
| | | | ověřil | Ing. S. Brát | |
| | | | datum | 5.6.2023 | |
| | | | číslo ověření | | |
| akce | II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Stěchovice, rekonstrukce, etapa II<br>SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stěchovice<br>Úsek B, km 11,733 - 11,832 - vpravo - obložení svahu kamenem | | | | výkres číslo |
| | | | | měřítko | 1 : 500 |
| zaměřil | Ing. Stanislav Brát | datum | 6.2023 | souř. systém | S-JTSK |
| kreslil | Ing. Stanislav Brát | datum | 5.6.2023 | výšk. systém | Bpv |

## II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II

## SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

**Obložení svahu kamenem v km 11,733 – 11,832 - vpravo**

**Seznam souřadnic**

| Bod | Y | X | Výška |
|---|---|---|---|
| 301 | 748179.706 | 1066038.785 | 203.992 |
| 302 | 748178.985 | 1066040.901 | 203.904 |
| 303 | 748180.707 | 1066047.527 | 202.302 |
| 304 | 748179.712 | 1066056.431 | 201.932 |
| 305 | 748178.421 | 1066068.465 | 201.759 |
| 306 | 748177.071 | 1066079.196 | 201.701 |
| 307 | 748175.640 | 1066090.907 | 201.752 |
| 308 | 748174.115 | 1066103.536 | 201.843 |
| 309 | 748173.004 | 1066111.402 | 201.923 |
| 310 | 748171.267 | 1066123.596 | 202.064 |
| 311 | 748169.803 | 1066133.320 | 202.323 |
| 312 | 748167.718 | 1066146.705 | 202.724 |
| 313 | 748165.882 | 1066146.397 | 203.922 |
| 314 | 748167.561 | 1066132.971 | 203.871 |
| 315 | 748168.719 | 1066123.347 | 203.909 |
| 316 | 748170.251 | 1066111.050 | 203.892 |
| 317 | 748171.195 | 1066103.405 | 203.931 |
| 318 | 748172.796 | 1066090.531 | 203.913 |
| 319 | 748174.163 | 1066078.951 | 203.854 |
| 320 | 748175.530 | 1066068.191 | 203.919 |
| 321 | 748176.915 | 1066057.629 | 203.963 |
| 322 | 748178.324 | 1066047.557 | 203.993 |



ZABAG

List č.: 3521707

SO 02

Dat[illegible]: 8. 12. 2022 Den týdne: ST

[illegible] středisko: [illegible] Název akce: [illegible]

[illegible] doba: [illegible] Pracovní přestávka: [illegible]

[illegible]ci (jména a příjmení): [illegible]

[illegible]nismy: [illegible]

[illegible]ál: [illegible]

[illegible]šky:

[illegible]vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PROVÁDĚNÍ FRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉHO ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OS OSTNÍ V KM 11,300 - 11,400 PRAVÉ VOZOVKA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ ASFALTOVÁNÍ OPRAVNÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV V RÁMCI VÝŠE ÚPRAVY DO ÚROVNĚ PLÁNĚ V KM 11,300 - 11,400 PRAVÁ VOZOVKA VE SMĚRU STANIČENÍ + PŘEJMUTÍNÍ PLÁNĚ MECHEM ORLEM WR

- PROVÁDĚNÍ KONTROLNÍCH VRTŮ S SO KE OBRUSNÉ VRSTVY V TL. 40 MM VE VYŠŠÍCH STÁVAJÍCÍ OS OSTNÍ

- PROVÁDĚNÍ VYSÁVÁNÍ ODSTRANĚNÉHO MATERIÁLU DO SBĚRNÉHO KONTEJNERU - ODVOZ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU K PŘEJMUTÍ NA VLASTNÍ SKLÁDKU

Jana Svatošová, Petr Svatoš, Svatošová Jana, Svatoš Petr, Svatoš a.s. provádí na této stavbě stavební dozor a koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění kontrolních vrtů v SO 516 v tl. 40 mm v rámci výše úpravy OS ostní v km 11,300 - 11,400 pravá vozovka ve směru staničení

ZÁPIS TDI: Pokračuj frézování lokálních oprav z ic. opravy budou geodetický zaměřeny

[redacted]

- provádění kontrolních vrtů v SO 516 v tl. 40 mm v rámci výše úpravy OS ostní v km 11,300 - 11,400 pravá vozovka ve směru staničení

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stavbyve[redacted]

BAG

List č.: 3521705

SO 102

Datum: 6. 12. 2022 Den týdne: [illegible]

isko: [illegible] Název akce: 11/102 [illegible], [illegible], II. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible]

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

na a příjmení): [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible], 3x [illegible] auto, [illegible] [illegible]

SD Fr. 0/32 mm a, beton C 20/25 XF3, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] Fr. 4/8 mm

é práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - Provádění odtěžení betonových [illegible] v místech nově budovaného [illegible] v km 11,687 - 11,720 pravá strana ve směru stanicení + odvoz betonových [illegible] na [illegible]

- Provádění odtěžení stávajících konstrukčních vrstev v místě nového [illegible] (autobus. zastávka Portus) + odvoz [illegible] materiálu

- Provádění konstrukčních vrstev pod [illegible] (autobus. zastávka Portus) & SD Fr. 0/32 mm a + betonové podlahy & betonu C 20/25 XF3

- odvoz nevhodného [illegible] materiálu & [illegible] na [illegible] [illegible]

- Provádění [illegible] [illegible] do betonového [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

- Provádění [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] v km 11,300 - 11,800 pravá strana ve směru stanicení

odpis zástupce investora (TDI) [redacted] Podpis stavbyv [redacted]

TRABAG

List č.: 3521704

SO 102

Datum: 5. 12. 2022 Den týdne: PO

...vé středisko: 841 (ZDAC) Název akce: 11/102 HZ. HL. M. PRAHA - ŠTĚCHOVICE, KERONSTRUKCE, II. ETAPA ... DÁNO + 4°C, POL. + 8°C, ODPOL. + 7°C

...ní doba: 8⁰⁰ - 16⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

...ci (jména a příjmení): VÁCLAV ZIEMEN, FRANTIŠEK JEDLIČKA, ZDENĚK KOUTENSKÝ, VASIL KLAD, MICHAL CHENDET, JIŘÍ LUKEŠ, JAROSLAV ŠTÍPEK, OLEH KUCHKA, MICHAL DIVÍŠ, RAKEL FENKL, JAN JURIK

...anismy: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, 3x NÁKLADNÍ AUTO, 2x FORD TRANSIT, MOTOROVÁ PŘEZAČKA, TLAKOVÁ VOZ, KRAMERI ČELNÍ NAKLADAČ.

...ériál: REGULAČNÍ KÁMEN, BETON, KAMENIVO FR. 4/8 mm

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PROVÁDĚNÍ GEODETICKÉHO MĚŘENÍ ŠTERBINOVÉHO ŽLABU PODÉL AUTOBUSOVÉ ZA ZASTÁVKY PORTUS V km 11,654 - 11,420 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ ŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍ OB DESKY PRO PROVÁDĚNÍ NOVÉHO ŠTERBINOVÉHO ŽLABU V km 11,654 - 11,420 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OB DESKY BALKEM LIEBHERR 914 + HYDRAULICKÉ KLADIVO

- PROVÁDĚNÍ ODLÁŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,300 - 11,400 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE TLAKOVÝM VOZEM (LEVÉ + PRAVÉ PŘEKOPOJÍ MOSTU SO 206) PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- ODVOZ NEVHODNÉHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU KOVÍ VRCH

- PROVÁDĚNÍ VYPLNĚNÍ MFOUKANÝCH SPAR STÁVAJÍCÍ OB DESKY V km 11,300 - 11,800 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

Podpis zástupce investora ([redacted] Podpis stavb[redacted]

STRABAG

List č.: 3521698

SO 102

Datum: 29. 11. 2022 Den týdne: VT

Nákladové středisko: 841 [illegible] Název akce: 11/102 HD. NL. 17. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, [illegible], [illegible]

Počet: [illegible], [illegible], POL. +6°C, POL. +8°C

Pracovní doba: 8°00 - 17°00 Pracovní přestávka: 11°00 - 12°00

Pracovníci (jména a příjmení): JAROSLAV ŠTÍPEK, OLEH [illegible], ZDENĚK [illegible], MICHAL [illegible], VASIL VLAD, [illegible], VÁCLAV [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

Mechanismy: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, 3x NÁKLADNÍ AUTO, 2x FORD TRANSIT, MOTOROVÁ ČEČÁTKA SPARI

Materiál: PLASTOVÉ ROVAT SN 2 DN 400, REGULAČNÍ KÁMEN, BETON, PÍSEK FR. 0/2 mm

Zvláštní:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - PROVÁDĚNÍ PROPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PRAVÉ A LEVÉ PŘÍEDPOLÍ MOSTU SO 206) S MÚSTĚNÍM DO STÁVAJÍCÍ VODOTĚČE POD MOSTEM (POKLÁDKA PLASTOVÝCH ROUR DO BETONOVÉHO LOŽE)
- PROVÁDĚNÍ OBSYPU PVC ROUR (PRAVÉ A LEVÉ PŘÍEDPOLÍ MOSTU SO 206) PÍSKEM FR. 0/2 mm
- PROVÁDĚNÍ ZAŘEZÁNÍ HRAN ASFALTOBETONU + ODBOURÁNÍ V km 14,580 - 14,450 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + + ODVOZ ASFALTOVÝCH REK NA MEZIDEPONII
- PROVÁDĚNÍ ODLAŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,300 - 11,400 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

ZÁPIS ZHOTOVITELE: ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE (F. STRABAG A.S.) MARTIN LÍSA ŽÁDÁ STAVEBNÍ DOZOR INVESTORA O PŘEVZJENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z SC 5/6 V km 14,580 - 14,450 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ A O POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU EMULZÍ 1,0 kg/m² A PROVÁDĚNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ ~~ACO~~ 16+~~PMB~~, ACL 16+PMB, ACO 11+PMB, SAL S MODIF.

ZÁPIS TDI: PO VIZUÁLNÍ KONTROLE A ZA PODMÍNKY VYHOVUJÍCÍCH KONTROL. ZKOUŠEK POVOLUJI POKLÁDKU TYAV V UVEDENÝCH ÚSEKU [redacted]

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stavbyve [redacted]

STRABAG

List č.: 3521694

SO 102

Datum: 15.11.2022 Den týdne: Út.

Stavební středisko: ÚHEBO Název akce: MÍSTO MC. NL. II. KOM, ÚSEKOVCE, DÁLNICE/RÝCHLOSTNÍ SILNICE I. STUPEŇ, MOST + PZ, PDZ, MK, DIO, +ZÚ

Pracovní doba: 6:00 - 16:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 11:30

Jména a příjmení: [redacted]

Strojní: [redacted]

Materiál: BETON, DEHTOVÁNÍ, BETON

Poznámky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PODKLADNÍ KONSTRUKCE VRSTVY 2 SC 1/6 V KM KOM PŘÍJEZ - PŘÍJEZ PRAVÁ VOZOVKA NA SMĚR PRAHA/ÚSTÍ - KONTROLA VRSTVY 2 SC 1/6 KÁLCEM MATIT - PENETRAČNÍ ASFALTOVÁNÍ, PLOCHU TĚLESA KOMUNIKACE 2 OBRUSNÉHO BETONU DO STANOVENÉHO LOŽE V KM 11,300 - 11,612 LEVÁ VOZOVKA NA SMĚR PRAHA/ÚSTÍ - ASFALT MYCÍHO INTERPRETU MASTIXOVÉ 2 HEDVOSTNÍ NA SMĚR PRAHA/ÚSTÍ - KONTROLA ÚČESNÍ ASFALTOVÁNÍ (TĚS) PŘÍJEZ OS DESET V KM 11,300 - 11,360 VOZOVKA SMĚRU NA SMĚR PRAHA/ÚSTÍ - PENETRAČNÍ ASFALTOVÁNÍ ÚČESNÍ ASFALTOVÁNÍ (TĚS) PŘÍJEZ OS DESET V KM 11,300 - 11,360 PRAVÁ VOZOVKA NA SMĚR PRAHA/ÚSTÍ + ASFALT MYCÍHO INTERPRETU OS DESET - PENETRAČNÍ ASFALTOVÁNÍ ASFALTOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY V MÍSTĚ VJEZDU DO ÚSEKOVCE PŘÍJEZ V KM 11,300 - 11,360 PRAVÁ VOZOVKA NA SMĚR PRAHA/ÚSTÍ + PŘÍKOP VLÉVÁ KOMUNIKACE ÚSEKOVCE DPL

Podpis zástupce investora (T[redacted] Podpis [redacted]

STRABAG

List č.: 3521684

SO 102

Datum: 11.11.2022 Den týdne: Pá

...vé středisko: Smíchov Název akce: A/102 AR. AZ. 11, PRAHA, STĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

...: POLOJASNO, RÁNO + 1°C, POL. 7°C, ODPOL. 1°C

...vní doba: 7⁰⁰ – 15⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ – 12⁰⁰

...ovníci (jména a příjmení): FRANTIŠEK JEDLIČKA, VÁCLAV SLEMEN, PATRIK LEHEČKA, OLEH KUCHKA, MICHAL DNIŠ, KAREL FENCL, JAN JUNIK, ZDENĚK KOLÁŘ, OLEH KUCHKA, MATOUŠ POSKOČIL, VASIL VLAD, MICHAL CHENDEJ

...hanismy: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914 + BOURACÍ KLADIVO, MOTOROVÁ ŘEZAČKA, 3x NÁKLADNÍ AUTO, 2x FORD TRANSIT, VÁLEC HAMM

...teriál: ŠD FR. 0/32mm A, REGULAČNÍ KÁMEN, BETON

...oušky:

...ovedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): – PROVÁDĚNÍ ODLAŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,300 – 11,053 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
– PROVÁDĚNÍ ŘEZÁNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍ OB DESKY V km 11,300 – 11,800 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ (DLE ZÁPISU Z POCHŮZKY)
– PROVÁDĚNÍ VYBOURÁNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍ OB DESKY (LIEBHERR 914 + BOURACÍ KLADIVO) V km 11,300 – 11,800 PR. STR. VE SM. ST.
– PROVEDENÍ NAKLÁDKY VYBOURANÝCH ČÁSTÍ OB STÁVAJÍCÍ OB DESKY + ODVOZ NA MEZIDEPONII
– PROVÁDĚNÍ KONTROLY ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ
– PROVÁDĚNÍ OCHRANY PRÁVĚ Z ŠD FR. 0/32mm A V TL. 5cm V km 14,580 – 11,440 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + MÍNĚNÍ KÁLOVÝ HAMM

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stavbyvedou[redacted]

STRABAG

List č.: 3521682

SO 102

Datum: 4.11.2022 Den týdne: Pá

Stavební středisko: Přibram Název akce: II/102 MO. HL. N. PRAHY, ŠKEŘÁKOVICE, REKONSTRUKCE, 2. ETAPA

Počasí: oblačno, přeháňky +3°C, mírný vítr, déšť +1°C

Pracovní doba: 7:00 - 16:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení): PLOTNIČEK JAROSLAV, HOLUB MILOŠ, ČERNÝ EMIL, ŠKRABÁK EDUARD, JEDLIČKA PETR, OLEJ MILOŠ, HOLÝ KAREL, MICHAL ČERNOCH, MICHAL DITĚ, KAREL PÁNEK, JAN ONDRÁČEK

Mechanismy: NAKLADAČ 912, LOŽNÝ AUTO 9T, 3T MINIDUMPER AUTO, ZÁVĚSNÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

Materiál: 30 MP. OBRUSY, ŠTĚRKODRŤ, BETON

Poznámky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PROVÁDĚNÍ ODTĚŽENÍ SILNIČNÍ SANAČNÍ VRSTVY ŠTĚRKODRTĚ MP. 0-32 mm V KM 11,560 - 11,440 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ + ODVOZ MATERIÁLU NA SKLÁDKU NEBO VLASTNÍ POTŘEBU
- PROVÁDĚNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ NEVYHOVUJÍCÍHO ZEMNÍHO PODLOŽÍ V KM 11,560 - 11,440 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ + ODVOZ MATERIÁLU NA SKLÁDKU
- PROVÁDĚNÍ PŘÍP. KONTAMINACE DO ÚROVNĚ PLÁNĚ + PŘEFILTROVÁNÍ PLÁNĚ KOLEM RÝHY V KM 11,560 - 11,440 PRAV. STRANA VE SMĚRU
- U PROVÁDĚNÍ ODHUMUSOVÁNÍ PLOCH U SJ MP. 0-32 mm V TL. 15 cm V KM 11,560 - 11,440 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ + NAKLÁDÁNÍ HMOTY
- PROVÁDĚNÍ ODTĚŽENÍ SILNIČNÍ ŽELEZNÉ KONTAMINACE U ZÁKLADOVÉHO BETONU DO SBĚRNÉHO KOŠE V KM 11,300 - 11,053 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ

Podpis zástupce investora: [redacted] Podpis stavby: [redacted]

STRABAG

List č.: 3521680

SO 102

Datum: 7.11.2022 Den týdne: PO

Vedoucí středisko: [illegible] Název akce: II/102 HR. H. M. PRAHY, [illegible], [illegible], II. ETAPA

Počasí: [illegible], [illegible] + 6°C, [illegible] + 10°C, [illegible] + 14°C

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 16⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): [illegible]

Mechanismy: [illegible]

Materiál: [illegible]

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - PROVÁDĚNÍ ČÁSTEČNÉ DEMONTÁŽE DIO V KM 14,200 - 14,610 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ NOVÉHO DIO V KM 14,610 - 14,500 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ V KM 11,580 - 14,460 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU NA OBALOVNU STÁŠOV
- PROVÁDĚNÍ ČÁSTEČNÉ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE V KM 11,300 - 14,050 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ ODVÁŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE S REZULEČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V KM 11,300 - 11,053 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

ZÁPIS ZHOTOVITELE: Z DŮVODU ZMĚNY NIVELETY KOMUNIKACE SO 102 V KM 14,460 - 11,550 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ BUDE PROVEDENO OZFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ OB DESKY + PROVEDENÍ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV (SO FR. 0/32mm A, SC 5/6) DLE VYVÁDĚNÍ ADS PROVEŘTANÍ A AD STAVBY

ZÁPIS TDI: POŘADUJE PŘED PROVÁDĚNÍM DOLOŽIT STANOVISKO AD V UVEDENÉ ZMĚNĚ NIVELETY V UVEDENÉM ÚSEKU

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stavb[redacted]

TRABAG

List č.: 3521678

SO 102

Datum: 6.11.2022 Den týdne: Pá

Pracoviště: [illegible] Název akce: [illegible]

Pracovní přestávka: [illegible]

Jména a příjmení: [illegible]

[illegible]

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): [illegible]

Podpis zástupce investora: [redacted]

Podpis st[redacted]

TRABAG

List č.: 3521677

SO 102

Datum: 3.11.2022 Den týdne: Ct.

...disko: [illegible] Název akce: [illegible] HR. NL. JT. [illegible], [illegible], [illegible], II. ETAPA

[illegible], JASNO, RÁNO +8°C, POL. +12°C, OD POL. +16°C

...: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

...(jména a příjmení): VÁCLAV [illegible], FRANTIŠEK [illegible], MICHAL DIVÍŠ, RAFAEL FENCL, JAN [illegible], JAROSLAV [illegible], [illegible], OLEH [illegible], MATOUŠ [illegible], MICHAL [illegible], [illegible], [illegible]

...: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, 3x NÁKLADNÍ AUTO, [illegible] ČELNÍ NAKLADAČ, 2x FORD TRANSIT

...: REGULAČNÍ RÁMEN, BETON, SCHVÁLENÁ SPÁROVACÍ [illegible]

...:

...dené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - PROVÁDĚNÍ SPÁROVÁNÍ REGULAČNÍHO RÁMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 14,570 - 14,520 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ ODVÁŽDĚNÍ SLEZU PEŠI OTÉRNÍM ZOMI Č. 63, Č. 64 km 14,430 - 14,000 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ Z REGULAČNÍHO RÁMENE DO BETONOVÉHO LOŽE

- PROVÁDĚNÍ DEMONTÁŽE BETONOVÝCH SVODIDEL V OSE KOMUNIKACE V km 14,460 - 14,200 + ODVOZ BETONOVÝCH SVODIDEL NA MEZIDEPONII

Podpis zástupce inv[redacted] Podpis stavby[redacted]

STRABAG

List č.: 3521671

SO 102

Datum: 26.10.2022 Den týdne: St.

...disko: 841/PUDAC Název akce: II/102 HR. HL. M. PRAHY, ŠTĚCHOVICE, RECONSTRUKCE, II. ETAPA

... RÁNO + 9°C, POL. + 14°C, ODPOL. + 17°C

...dobá: 6⁰⁰ - 17³⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

...(jména a příjmení): FRANTIŠEK JEDLIČKA, VÁCLAV ZELENA, OLDŘ LUKEŠ, ALEŠ PANCIR, MICHAL DILIŠ, KAREL FENCL, JAN NOVÁK, SPENĚK RAMENSKÝ, VOJTĚ ..., MICHAL OMENDET, JAROSLAV ŠTÍTEK, OLEH RUCHKA, ZDENĚK ...

...: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, 3t NÁKLADNÍ AUTO, LRADEC, VÁLEC HAMM, ... ČELNÍ NAKLADAČ, 2x FORD TRANSIT

...: SC 5/6, DEBULAČNÍ KÁMEN, BETON

...:

...dené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z SC 5/6 V km 11,200 - 11,580 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ ÚPRAVY SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE PRO PROVÁDĚNÍ ODVÁŽDĚNÍ Z DEBULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,300 - 11,053 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ ODVÁŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE Z DEBULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,300 - 11,053 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ MIKROTRHLIN NA VRSTVĚ SC 5/6 VÁLCEM HAMM

[redacted]

Podpis stavbyvedo[redacted]

TRABAG

List č.: 3522070

SO 102

Datum: 25.10.2022 Den týdne: Út

ové středisko: [illegible] Název akce: [illegible]

ní doba: [illegible] Pracovní přestávka: [illegible]

nici (jména a příjmení): [illegible]

nisy: [illegible]

ísl: [illegible]

ky:

vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): [illegible]

Podpis zástupce

Podpis

ABAG

List č.: 3522065

SO 102/

Datum: 17.10. 2022/ Den týdne: PO

Středisko: [illegible] Název akce: II/102 R2.12.17. [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]

Doba: 7 – 17 h Pracovní přestávka: 11^30 – 12^00

Jména a příjmení): [illegible]

[illegible]

[illegible]

Stroje: [illegible]

[illegible]

[illegible]

Vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): – POKRAČOVÁNÍ [illegible] SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE Z RECYKLOVANÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V KM 13,460 – 13,550 LEVÁ STRANA [illegible]

– POKRAČOVÁNÍ [illegible] ZÁSYPU TĚLESA KOMUNIKACE V KM 13,280 – 13,460 [illegible] (OPĚRNÁ ZEĎ Č. 63, Č. 64) + HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH [illegible]

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted]

Pod[redacted]

STRABAG

List č.: 3522054

SO 102

Datum: 6.10.2022 Den týdne: Čt

Nákladové středisko: [illegible] Název akce: [illegible]

Počasí: [illegible] 10 – 10 [illegible], RÁNO +8°C, POL. +14°C, ODPOL. +27°C

Pracovní doba: 8⁰⁰ – 17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ – 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): [illegible]

Mechanismy: [illegible]

Materiál: [illegible]

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): [illegible]

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis [redacted]

RABAG

List č.: 3522053

SO 102

Datum: 5.10.2022 Den týdne: ST

Středisko: PARDUBICE Název akce: MINOR MR. R2, ÚT. ROHY, ČÍŽOVICE, DŘÍSTEVICE, ŽELEZNÉ POLOMENY, ŘÍČKA ST, OK. + 1 °C, ASFALT. 179 °C

Hodina: 7⁰⁰ – 15⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ – 12⁰⁰

Jména a příjmení: HOŠEK ŠEFÁŘ, KOVALČÍK, JEDLIČKA, ŠPAČEK LUKÁŠ, OLEH, KOCMAN, MICHAL BARTOŠEK, KUBA, HAVLÍK, JAROSLAV ŠÍMEK, PETRUŠ, LEHNÍČEK, MATOUŠ PROCHÁZKA, BOBEK PÁVEK, MICHAL DVOŘ, MAL UBIK

Registr: LISTOPAD 22, LISTOPAD 23, MOŽEC MATKY, FIBR. DEFEKTOMETR, FINGRY ODBOČKA, PNEUMATIKY, HOUSKY VÍŠ

Práce: SPÁ S. ROHY, ASF. BB+PMB 45/55-60, ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍMÉHO, BETON, KONTROLNÍ OKRUHOVÉ ZÁMKOVÉ, ODVOZ MATERIÁLU

Poznámky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): – PROVÁDĚNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY VE SMĚRU JÍZDY VOZIDEL ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍMÉHO VÁŽENÍ ASFALTU V KM 11,500 – 11,800 LEVÁ STRANA VE SMĚRU ZVÝŠENÍ + NAČERPÁNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA
– PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU ASFALT 0,3 kg/m² V KM 11,500 – 11,800 LEVÁ STRANA VE SMĚRU ZVÝŠENÍ
– PROVÁDĚNÍ OBRUSNÉHO VRSTVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ASF. BB+PMB 45/55-60 V KM 11,500 – 11,800 LEVÁ STRANA VE SMĚRU ZVÝŠENÍ + NAČERPÁNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA
– PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU ASFALT 0,2 kg/m² V KM 11,500 – 11,800 LEVÁ STRANA VE SMĚRU ZVÝŠENÍ
– PROVÁDĚNÍ PODÉLNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ DILATAČNÍ SPÁRY V ZAMŘENÍ DILATAČNÍM PÁSEM SPÁROVÍCÍ OS ASFALT V KM 11,500 – 11,500 LEVÁ STRANA VE SMĚRU ZVÝŠENÍ
– PROVÁDĚNÍ PODÉLNÉ ASFALTOVÉ ASF. BB+PMB 45/55-60 V KM 11,500 – 11,800 LEVÁ STRANA VE SMĚRU ZVÝŠENÍ + NAČERPÁNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA
– PROVÁDĚNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ PRAHU TĚSNÍCÍ KONSTRUKCE A ČISTĚNÍ NA ŠÍŘKU DO BETONOVÉHO JÁDRA V KM 11,480 – 11,520 LEVÁ STRANA VE SMĚRU ZVÝŠENÍ
– PROVÁDĚNÍ NOVÉ PRAHU V KM 11,440 – 11,500
– PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO BETONU TĚSNÍCÍ KONSTRUKCE V KM 11,440 – 11,480 PROVEDEN BETONÁŽÍ DO 30° (BETONÁŽ OBRÁZEK Č. 63) + NAČERPÁNÍ DO VOZIDLA DO MÍCHAČKY

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis st[redacted]: [redacted]

ABAG

List č.: 3522052

SO 102

Datum: 4.10. 2022 Den týdne: Ví

...středisko: [illegible] Název akce: [illegible]

...doba: 5⁰⁰ – 17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ – 12⁰⁰

...(jména a příjmení): [illegible]

...ny: [illegible], FORD TRANSIT

...: [illegible] POSTŘIK 1,2 kg/m², [illegible], BETON

...ky:

...edené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): – PROVÁDĚNÍ INFILTRAČNÍHO SPOJOVACÍHO POSTŘIKU 1,2 kg/m² V km 11,300 – 11,800 LEVÁ STRANA
– PROVÁDĚNÍ LANKODRÁHY PRO POKLÁDKU ASFALTOBETONU V km 11,300 – 11,800 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
– PROVÁDĚNÍ ODLAŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE Z KEBULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 14,470 – 14,580 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stav[redacted]

List č.: 3522048

SO 102

Datum: 29. 9. 2022 Den týdne: ČT

Název akce: II/102 MO. MO. n. POST, STAVBA OPICE, DEZOLACE, II. STAVBA O, PŘÍSTAVBA, MOSTO +3 Z, TO. +1,0 C, 100 %, +16 C

Pracovní přestávka: 11:00-12:00

(ení): VEDOUCÍ SMĚNY, PRACOVNÍCI ÚDRŽBY, STROJNÍK DIVIŠ, KAREL HÁNCL, OLEG KUTRA, VEDOUCÍ ÚDRŽBY, ZDENĚK LENÉŘ, PAVEL NAD, MICHAL ČERNÝŠEK

MICHAL ČAP, ŘIDIČ NÁ (ZAMĚSTN), PAVEL KLÍMA, ŘIDIČ NÁ, MICHAL ČERNÝŠEK, ZAMĚSTNANEC AUTO, MISTR PRÁCE

MĚŘENÍ BETONŮ, ŘEZÁNÍ, ZKOUŠENÍ PŘÍPRAVKEM BETONU PRO

(včetně dodavatelů a jejich činností): PROVÁDĚNÍ ODVOZENÍ VRTŮ ŘEZÁNÍ ZKOUŠENÍ & ODSOUHLASENÍ NA ASFALTOVÉ ZÁKRYTÍ OD ŘEZNÉHO JÁDRA V KM 11,680 - 11,900 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍŠTĚ

- PROVÁDĚNÍ VRTÁNÍ ODVOZENÍ ZKOUŠENÍ VRTŮ & ODSOUHLASENÍ ASFALTOVÉ ZÁKRYTÍ VRTŮ PRO V KM 11,680 - 11,900 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍŠTĚ

- PROVÁDĚNÍ ASFALTOVÁNÍ [redacted] V KM 11,300 - 11,680 (ŘEZNÁ MÍSTA) - LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍŠTĚ) + OPRAVA NA [redacted] ODBOČKU SMĚR

- PROVÁDĚNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE V KM 11,300 - 11,900 OPRAVA VOZOVKY

PROVÁDĚNÍ FRÉZOVÁNÍ ŽLABŮ OD OPICE V KM 11,300 - 11,600 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍŠTĚ (ASFALTOVÉHO KRYTÍCÍ VRSTVY OPICE)

ŽÁDNÉ KOMPLIKACE PŘI PROVÁDĚNÍ FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KOBERCE V KM 11,300 - 11,620 (ŘEZNÁ MÍSTA) A ÚPRAVY KOMUNIKACE V KM 11,300 - 11,900 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍŠTĚ ASFALTO A ODVOZENÍ FRÉZOVÉHO ASFALTOVÉHO MATERIÁLU OD OPICE DÁLE BYLA ZAŘÍZENA MECHANICKÉHO ZAMETÁNÍ VE OPICE V KM 11,300 - 11,600 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍŠTĚ V ŠÍŘCE 2 m, PO ZAMETENÍ A VYSÁVÁNÍ V BOK PODÉLNÝCH ŽLABŮ, NA SPOJE A ZÁSUVKY SPOJŮ BYLO PROVEDENO O ODVOZENÍ ŽLABŮ OD OPICE V KM 11,300 - 11,600 A O ODVOZENÍ ASFALTOVÉHO FRÉZOVACÍHO MATERIÁLU V KM 11,300 - 11,600 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍŠTĚ, PROTO PROVÁDĚNÍ NOVÉHO FRÉZOVÁNÍ V KM 11,300 - 11,600 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍŠTĚ BUDE UKONČENÍ OD PROVÁDĚNÍ A PO OPICE

[redacted]

Zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího:

RABAG

List č.: 3522041

80 102

Datum: 20.9.2022 Den týdne: 15

...e středisko: 81 Bubec / Název akce: 11/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, 1. ETAPA (BLAŽNO, BÁNO + 3K, PZ. + 10K, ODPZ. + 14K)

...doba: 9⁰⁰ - 18⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

...ci (jména a příjmení): VÁCLAV ŠEVEN, JIŘÍ LUBEŠ, FRANTIŠEK JEDLIČKA, MICHAL DIVÍŠ, KAREL FENCL, JAN JUDIR, PATRIK LEMEŠKA, JAROSLAV ŠÍPEK, ONDŘEJ HANDLÍK, OLEA RUSHKA, KAZIL KLAJ, MICHAL HENDEL

...ismy: LIEBHERR 9R, LIEBHERR 9R, BRAMER ČELNÍ NAKLADAČ, 5X NÁKLADNÍ AUTO,

...dál: BEZULAČNÍ KÁMEN, BETON

...šky:

...vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PROVÁDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE Z BEZULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,680 - 11,800 LEVÁ STRANA VE STĚCU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ ÚPRAVY SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE V km 13,430 - 13,550 LEVÁ STRANA VE STĚCU STANIČENÍ (VÝPRAVA PRO PORLÁDKU BEZULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE)
- ODVOZ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU MOJÍ VRCH
- ÚPRAVA SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE V km 11,300 - 11,650 LEVÁ STRANA VE STĚCU STANIČENÍ

Podpis zástupce in[redacted] Podpis stavby[redacted]

STRABAG

List č.: 3522039

SO 102

Datum: 16.9.2022 Den týdne: PÁ

Nadřízené středisko: SILBAC Název akce: II/102 MB. H. V. PRAHY – ŠÉMOVICE, REKONSTRUKCE, I. ETAPA

Počasí: SLUNEČNO, BÁNO +17°C, POL. +19°C, ODPOL. +18°C

Pracovní doba: 8⁰⁰ – 15⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ – 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): VÁCLAV ŠETTEN, FRANTIŠEK JEDLIČKA, MICHAL DIVÍŠ, KAREL FENCL, ANTONÍN HEJTMÁNEK, JIŘÍ LUKEŠ, JAN ČURÍK, JAROSLAV ŠÍPEK, ONDŘEJ MANDLÍK, VASIL VLAD,

Mechanismy: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, 4 NÁKLADNÍ AUTA, KRAMER ČELNÍ NAKLADAČ

Materiál: DEGLAČNÍ RÁMEN, BETON

Doklady:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): – ODVOZ OTĚŽENÉHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU ANO FACH
– PROVÁDĚNÍ ODSTŘEDĚNÍ SPODKU TĚLESA KOMUNIKACE Z DEGLAČNÍHO RÁMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,680 – 11,800 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
– PROVÁDĚNÍ ÚPRAVY SPODKU TĚLESA KOMUNIKACE V km 11,470 – 11,580 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ (PŘÍPRAVA PRO POLOŽENÍ DEGLAČNÍHO RÁMENE DO BETONOVÉHO LOŽE)
– ODVOZ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII

Podpis zástupce investora (TDI) [redacted] Podpis sta[redacted]

STRABAG

List č.: 3522038

SO 102

Datum: 15. 9. 2022 Den týdne: Čt

Stavební středisko: 841 Brno Název akce: D/52 / 23. NL VP 0339 m - ŠEBETOVICE, PŘESTAVBA MOSTU, I. ETAPA

Počasí: oblačno, suchý déšť, ráno +10°C, 902 +15°C, odpoledne +17°C

Pracovní doba: 5:00 - 15:00 Pracovní přestávka: 11:30 - 12:00

Jména a příjmení: [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]

Mechanismy: ŽEBŘÍK 9Q, ŽEBŘÍK 9M, BETONOVÉ ČERPADLO MOBILNÍ, AUTOMIXÉR

Materiál: BETONOVÁ SMĚS, BETON

Závady:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - DOHLED ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA A PŘEVZETÍ DO VLASTNÍCH RUKOU MOJÍM - ZAHÁJENÍ BETONÁŽNÍCH PRACÍ PŘÍMOSTNÍHO ZÁVĚRNÉHO ZÁBRADLÍ - MÍSTO LEVÉ OPĚRY VE SMĚRU PŘEDNÁŠENÍ + PŘEDNÍ PLOCHY PRO PŘEVZETÍ - BETONÁŽ ZÁVĚRNÉHO ZÁBRADLÍ DO ŘEZNÉHO SPÁRU - DOHLED ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA NA VYBETONOVÁNÍ - PŘEVZETÍ ZÁVĚRNÉHO ZÁBRADLÍ PŘEDNÍ ŘEZNÉHO SPÁRU A BETONÁŽNÍCH PRACÍ ZÁVĚRNÉ ZÁBRADLÍ DO ŘEZNÉHO SPÁRU V KM 11,650 - 11,700 LEVÉ STRANY VE SMĚRU PŘEDNÁŠENÍ

ŽÁDNÉ ZJIŠTĚNÉ VADY NEBYLY PŘI PŘEVZETÍ ODSTRANĚNY PODPISEM OBOU STRAN (VLASTNÍ ČÁST) PŘÍSLUŠNÉ PROTOKOLU PŘEDÁNÍ

Podpis zástupce investo [redacted] Podpis [redacted]

STRABAG

List č.: 3522036

SO 102

Datum: 13.9.2022 Den týdne: ÚT

Nákladové středisko: [illegible] Název akce: [illegible]

Počasí: [illegible], [illegible] +8°C, POZ. +18°C, ODPOZ. +26°C

Pracovní doba: [illegible] Pracovní přestávka: [illegible]

Pracovníci (jmena a příjmení): [illegible]

Mechanismy: [illegible]

Materiál: [illegible]

Zvoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podp[redacted]

STRABAG

List č.: 3522034

SO 102

Datum: 8.9.2022 Den týdne: ČT

Nákladové střediko: [illegible] Název akce: [illegible] DR. HL. M. PRAHY – [illegible], RECONSTRUKCE, II. ETAPA

Počasí: OBLAČNO, DÉŠŤ, RÁNO +11°C, POL. +15°C, ODPOL. +21°C

Pracovní doba: 9⁰⁰ – 12⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ – 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): VÁCLAV [illegible], FRANTIŠEK [illegible], JIŘÍ [illegible], MICHAL DIVIŠ, JAN [illegible], JAROSLAV [illegible], [illegible], [illegible], MICHAL [illegible]

Mechanismy: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, 2x NÁKLADNÍ AUTO, KRAMER ČELNÍ NAKLADAČ

Materiál: REGULAČNÍ KÁMEN, BETON

Prostoje:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): – PROVÁDĚNÍ ODLÁŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,300 – 11,060 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
– PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZPADLÉHO KAMENNÉHO ODLÁŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE V km 11,680 – 11,800 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + ÚPRAVA SVAHU PRO ODLÁŽDĚNÍ
– ODVOZ ODTĚŽENÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII
– PROVÁDĚNÍ KONTROLY ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

ZÁPIS ZHOTOVITELE: VZHLEDEM KE ŠPATNÝM KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM (SILNÝ DÉŠŤ) STAVEBNÍ PRÁCE PŘERUŠENY

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis s[redacted]

STRABAG

List č.: 3522033

SO 102

Datum: 3.9.2022 Den týdne: ST

Základní středisko: [illegible] Název akce: [illegible]

Počasí: [illegible]

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 18⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 11⁰⁰

Pracovníci (jmenovitě a příjmení): [illegible]

Mechanismy: [illegible]

Materiál: [illegible]

Poznámky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - PROVÁDĚNÍ DRICENÍ BETONOVÝCH KER S OBJEKTU SO 102 DRTIČKOU BISON 280 (MEZIDEPONIE)
- PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZPADLÉHO KAMENNÉHO ODLÁŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE V km 11,300 - 11,060 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + ÚPRAVA SVAHU PRO ODLÁŽDĚNÍ
- ODVOZ ODTĚŽENÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII
- PROVÁDĚNÍ ODLÁŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,300 - 11,060 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

Podpis zás[redacted]

Podpis st[redacted]

STRABAG

List č.: 3522032

SO 102

Datum: 6.9.2022 Den týdne: ÚT

Stavbyvedoucí: [redacted] Název akce: I/102 HR. KR. N. OKRAJ – ŠTĚMONICE, REKONSTRUKCE II. ETAPA

Počasí: ZATAŽENO, DOPO 12°C, ODP. +22°C, ODPOL. +28°C

Pracovní doba: 6⁰⁰-15⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰-12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): MGR. LUBOŠ, MILOŠ BARTOŇ, FRANTIŠEK JEDLIČKA, JAN JANEC, EMIL FENCL, MICHAL DVOŘ, ALEŠ RUBÁŠ, JAROSLAV ŠÍPEK, LUBOŠ DOLEŽ, MICHAL ČERNOCH, MGR. MILAN

Mechanizmy: NÁKLADNÍ VOZ, NÁKLADNÍ VOZ, SAMOJÍZDNÝ VÁLEC, PNEUMATICKÝ VÁLEC, VIBRAČNÍ DESKA

Materiál: ASFALTOVÁ DRŤ, BETON, ASFALTOVÁ MASA

Doklady:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PROVEDENÍ FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY (FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉ DRTI DO SBĚRNÉHO KOŠE) V KM 11,120 – 11,410 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY

- PROVEDENÍ NÁTĚRU ASFALTOVÉHO POJIVA Z CISTY NA FRÉZOVANÉ PLOCHY

- PROVEDENÍ ASFALTOVÉHO KOBERCE MASTIXOVÉHO ACMS 11 (OBRUSNÁ VRSTVA) TL. 40 (MECHANICKY)

- PROVEDENÍ ÚPRAVY SVISLÝCH PLOCH ŘEZEM ASFALTOVÉHO KOBERCE V KM 11,120 – 11,410 (ČIŠTĚNÍ KOMPRESOREM + ASFALTOVÁNÍ NÁSTŘIKEM ZE STŘÍKACÍHO ASFALTOVÉHO ROZPRAŠOVAČE) LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY

- ČIŠTĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC NA MECHANICKÉ

- PROVEDENÍ ASFALTOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO ASFALTOVÉHO ZÁSOBENÍ (FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KOBERCE V KM 11,800 – 11,060 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY + ÚPRAVA PLOCH PRO ASFALTOVÁNÍ)

- PROVEDENÍ ASFALTOVÁNÍ PLOCH ŘEZEM ASFALTOVÉHO KOBERCE A PŘÍSTUPOVÉHO ASFALTOVÉHO ZÁSOBENÍ DO SBĚRNÉHO KOŠE V KM 11,800 – 11,060 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBY

- ČIŠTĚNÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC NA MECHANICKÉ

Podpis zástupce investor: [redacted] Podpis: [redacted]

List č.: 3522028

STRABAG

SO 102

Datum: 31.8.2022 Den týdne: St.

Stavové středisko: [illegible] Název akce: 11/102 MB. AL. M. PRAHY - ŠIŠOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Ani: OBLAČNO, KÁNO + 2°C, POZ. +15°C, ODPOZ. +18°C

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): MILAN BETEN, FRANTIŠEK OBLIČKA, JAROSLAV ŠTÍPEK, ZDENĚK [illegible], ONDŘEJ HANDLÍK, JAN JUNIK, MICHAL DIVÍŠ, KAREL FENCL

Charismy: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, 6x NÁKL. AUTO, 1x ČISTÍCÍ VŮZ (SAMOSBĚR), VIBRAČNÍ DESKA DPU, VÁLEC HAMM

Stavě: DESKOVÍ KÁMEN, BETON, SPÁROVACÍ HMOTA SIKA, ŠD FR. 0/32 mm A

Dušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - PROVÁDĚNÍ ODLÁŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE Z ARGILAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,520 - 11,650 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ SPÁROVÁNÍ REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE SPOLIVÁLENOU SPÁROVACÍ HMOTOU SIKA
- PROVÁDĚNÍ ÚPRAVY SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE PRO PROVÁDĚNÍ ODLÁŽDĚNÍ SVAHU TĚL. KOMUNIKACE V km 11,200 - 11,000 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- ODVOZ MÍROPOVÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII
- ODVOZ MÍROPOVÉHO MATERIÁLU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU MOCÍ VRCH
- PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU STAVENIŠTĚ ČISTÍCÍM VOZEM (PŘÍPRAVA PRO PROVÁDĚNÍ VOZ. PLASTEM)
- PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z ŠD FR. 0/32 mm A V km 11,520 - 11,630 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- MĚNĚNÍ VRSTVY ŠD FR. 0/32 mm A VÁLCEM HAMM + VIBR. DESKOU

Podpis zástupce Investo[redacted]

Podp[redacted]

List č.: 3522027

STRABAG

SO 102

Datum: 30. 8. 2022 Den týdne: VI

Hlavní středisko: [illegible] Název akce: M/102 HR. HL. M. PRAHY, ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, I. [illegible]

Čas: POLOVINA, [illegible], POL. +19°C, ODPOL +24°C

Pracovní doba: 8°° - 18°° Pracovní přestávka: 11°° - 12°°

Pracovníci (jména a příjmení): VÁCLAV ZEMEN, FRANTIŠEK JEDLIČKA, RAKEL FENCL, JAN JUNIK, MICHAL DIVIŠ, JAROSLAV ŠTÍPEK, ONDŘEJ HANZLÍK, ZDENĚK KOLÁŘ, JIŘÍ LUBES

Mechanismy: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, KRAMER ČELNÍ NAKLADAČ, 5x NÁKLADNÍ AUTO

Materiál: POKLÁDÁNÍ KÁMEN, BETON

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PROVÁDĚNÍ ODLAŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,520 - 11,650 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- ODVOZ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU MOLÍ VAOM
- ÚKLID STAVENIŠTĚ (SVAH TĚLESA KOMUNIKACE)
- NÁVOZ REGULAČNÍHO KAMENE Z LOMU NA STAVBU

ZÁPIS Z MOTOVITELE: ZÁSTUPCE Z MOTOVITELE (F. STRABAG a.s.) MARTIN LÍSA ŽÁDÁ STAVEBNÍ DOZOR INVESTORA p. MIROSLAVA VALENTU O PŘEVZETÍ PLÁNĚ (KONTROLA) V km 11,520 - 11,630 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ A O POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z ŠD FR. 0/32 mm A V TOMTO ÚSEKU

ZÁPIS TDV: PO VIZUÁLNÍ KONTROLE VA ZA PODMÍNKY VYMOVUJÍCÍCH KONTROL. ZKOUŠEK POVOLUJI ZAKRYTÍ ZEMNÍ PLÁNĚ OCHRANNOU VRSTVOU Z ŠD 0/32 V UVEDENÉM ÚSEKU.

[redacted] [redacted]

Podpis zástupce Inv[redacted] Podpis stavby [redacted]

List č.: 3522025

STRABAG

SO 102

Datum: 26.8.2022 Den týdne: Pá

Nákladové středisko: [illegible] Název akce: [illegible] PO. 102. 11. GRAMI - ŠTĚCHOVICE, BETONÁŽ KONSTRUKCE, II. ETAPA

Počasí: [illegible], JASNO, RÁNO +16°C, POL. +25°C, ODPOL. +23°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁵⁰ - 12⁴⁰

Pracovníci (jména a příjmení): VÁCLAV ZIETTEN, OLDŘICH LUKEŠ, MICHAL DIVÍŠ, KAREL FENCL, JAN [illegible], JAROSLAV ŠTÍPEK, ONDŘEJ HANZLÍK, ZDENĚK KOLÁŘ, MICHAL [illegible], VASIL VLAD, FRANTIŠEK JEDLIČKA

Mechanismy: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, BRAMER ČELNÍ NAKLADAČ, 5x NÁKLADNÍ AUTO

Materiál: [illegible], BETON

Poruchy:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PROVÁDĚNÍ ODLÁŽDĚNÍ SPODNÍ TĚLESA KOMUNIKACE & REGULAČNÍHO RAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,540 - 11,650 LEVÁ STRANA VE SMĚRU ZNIČENÍ
- ODVOZ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU & MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU MIMO VRCH
- KONTROLA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

Podpis zástupce investora [redacted] Podpis [redacted]

STRABAG

List č.: 3522022

SO 102

Datum: 23 8 2022 Den týdne: Úterý

...dové středisko: [illegible] Název akce: [illegible] Hr. Hr. H. Prahy - [illegible], [illegible], [illegible]

...ci: [illegible], [illegible], [illegible] + [illegible], [illegible] + [illegible]

...ovní doba: [illegible] Pracovní přestávka: [illegible]

...ovníci (jména a příjmení): [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

...charakter: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

...ovník: [illegible], [illegible]

...bušky:

...ovedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): - Provádění odlážděné spahu tělesa komunikace z regulačního kamene do betonového lože v km 11,520 - 11,650 levá strana ve směru sanačení - Provádění úklidu stavenište (spah tělesa komunikace v km 11,310 - 11,520 levá strana ve směru sanačení)

Zápis zhotovitele: Vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám (silný déšť) stavební práce přerušeny

Podpis zástupce [redacted]

Podpis stavbyvedo[redacted]

STRABAG

List č.: 3522021

SO (202)

Datum: 22.8.2022 Den týdne: PONDĚLÍ

Nákladové středisko: 841/2142 Název akce: 11/102 Hl. m. Prahy - Měchouice, rekonstr. II. etapa

Čas: oblačno až zataženo, ráno +15°C, v poledne +19°C, odpoledne +22°C

Pracovní doba: 7⁰⁰–11⁰⁰, 12⁰⁰ – 18⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ – 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):

Jiří Lukeš, Pavel Bláha, Patrik Lehečka, Jaroslav Štýpek, Ondřej Hanzlík, Olech Kuchka, Jan Jurík, Václav Zeman, Karel Fenkl, Michal Bivíš + 1 THP, 2 pracovníci - subd. Brunda

Mechanismy: Liebherr 914, Liebherr 912, Zemní válec Wyhood, Nákl. auto Scania, Nákl. auto Iveco a Iveco Trucker, Kramer 8557 - kolové nakladač

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

11,520 – 11,630 vlevo dláždění šikmého svahu ve sklonu 1:1,75 regul. kamenem do beton. lože a doslahování nového násyp. tělesa v k.ú. z konstr. vrstev z betonového recyklátu. Odvoz předyt. materiálu na meliderpolii u trasy (11/102).

km 14,480 – 14,580 odstraňování nestmel. konstr. vrstv původní vozovy vlevo, odvoz výkopku na meliderpolii u trasy.

Podpis zástupce Investora (TD [redacted]

RABAG

List č.: 3373878

SO 102

Datum: 13.9.2021 Den týdne: ČT

ové středisko: [illegible] Název akce: [illegible] HC. [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] JASNO, [illegible] +3°C, POL. +14°C, ODPOL. [illegible]

ní doba: 6⁰⁰–12⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰–12⁰⁰

nící (jména a příjmení): [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

anismy: [illegible] 912, 1x [illegible], 2x [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

riál: [illegible], [illegible]

ušky:

ovodené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): – PROVÁDĚNÍ ODLÁŽDĚNÍ SPAHU ČELA PROPUSTKU V km ~~[illegible]~~ 12,925 Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ)
– ZAŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ V km 12,840–13,200 V TL. 40 mm (STŘED KOMUNIKACE) + ODBOURÁNÍ ZAŘEZANÉHO ASF. SOUVRSTVÍ
– ODVOZ ASFALTOVÝCH KEC NA MEZIDEPONI

ABAG

List č.: 3373879

SO 102

Datum: 24.9.2021 Den týdne: PČ

Středisko: Mikulec Název akce: [illegible] Hl. [illegible] II. [illegible], [illegible], [illegible], II. [illegible], [illegible], [illegible] + 10°C, [illegible] + 8°C, [illegible] + 20°C

Doba: [illegible] - 16°° Pracovní přestávka: 11°° - 12°°

Jméno a příjmení): [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]: [illegible] VŮZ, [illegible] VŮZ, [illegible], [illegible] ČELNÍ NAKLADAČ, [illegible] TRANSIT

INFILTRAČNÍ EMULZE 1,2 kg/m², [illegible] KÁMEN, BETON

[illegible] práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - ÚKLID ODPRÉZOVANÉ KOMUNIKACE V km 12,840 - 13,200 ([illegible] VŮZ + SAMOZBĚR) PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

ZÁPIS ZHOTOVITELE: ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE (F. [illegible] a.s.) [illegible] LÍSA ŽÁDÁ STAVEBNÍ DOZOR INVESTORA p. MIROSLAVA [illegible] O PŘEVZETÍ ÚSEKU 12,840 - 13,200 (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ) A O POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ POSTŘIKU INFILTRAČNÍ EMULZÍ 1,2 kg/m² A O POVOLENÍ POKLÁDKY ASFALTOVÝCH KOSTEK [illegible] 8 MODIF, [illegible] PMB 25/55-60, [illegible] PMB 45/80-60

ZÁPIS TDI: NA ZÁKLADĚ VIHOUNIČTÍCH KONTROL ZK. POVOLUJI ZAVRTÍ STAV. CBK VRSTVOU [illegible], [illegible], [illegible] V UVEDENÉM ÚSEKU. (KONTROL. ZK = [illegible], CBK [illegible])

- PROVÁDĚNÍ POSTŘIKU INFILTRAČNÍ EMULZÍ 1,2 kg/m² V km 12,840 - 13,200 (PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ)
- PROVÁDĚNÍ PLATOVÉNÍ ČIRMÉHO ČELA PROPUSTKU Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 12,925 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

[redacted]

Podpis zástupce investora (TDI

STRABAG

List č.: 3373900

SO 102

Datum: 29.10.2021 Den týdne: PÁ

Nákladové středisko: 61/5202 Název akce: VÝSTAVBA II/602 MEZI ÚSTÍ, STŘEMCHOVICE, OBCHVAT A PŘELOŽKA II/602

Počasí: JASNO, RÁNO +6°C, 9:02 +11°C, 10:02 +15°C

Pracovní doba: 6:00 - 13:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Personální obsazení (jména a příjmení): ROBERT DOLEŽAL, PETR BLÁHA, MICHAL ONDRÁČEK, KAREL HLAD, PETR LEHEČKA, PETR SUKA, ROBERT HOLÁČ, OLEH BUCHAL, ANDREJ MANDÍK, PETR ŠIMEK, FRANTIŠEK JEDLIČKA, MICHAL DVOŘ, KAREL ŠEVČÍK, ANTONÍN MENCA, JIŘÍ LUKEŠ

Mechanismy: LIEBHERR 922, LIEBHERR 914, KOMATSU ČELNÍ NAKLADAČ, DAFFORD TRUCK, 3x NÁKLADNÍ AUTO, 2x BOBCAT, MOTOROVÉ KLADIVO

Materiál: ŽELEZOBETON, BETON, BETON

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - POKRAČOVÁNÍ ODKOPÁVKY ZEMINY DO 1. TŘ. A ODVOZ PŘEBYTEČNÝCH NEBO NEVHODNÝCH ZEMIN NA SKLÁDKU
- POKRAČOVÁNÍ ZÁSYPU OPĚR A KŘÍDEL ZEMINOU ZE ZÁSYPOVÉHO KOSTKU V KM 12,925 PŘES OPĚRU K2 PŘES STAVENIŠTĚ
- ODVOZ NEVHODNÉHO PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU A NEZHUTNĚNÉ NA SKLÁDKU
- POKRAČOVÁNÍ ZÁSYPU OPĚR K1 A K2 ZEMINOU ZE ZÁSYPOVÉHO KOSTKU V KM 10,353 - 10,364 A 10,433 - 10,449 PŘES OPĚRU K1 PŘES STAVENIŠTĚ (ŽELEZNÁ ROKLINA) KOMUNIKACE

[redacted]

Podpis zástupce investora (TI

STRABAG

List č.: 3110660

SO 102

Datum: 20. 6. 2023 Den týdne: ÚT

Stavbové středisko: Litvínov Název akce: II/102 HO. HZ. II. ETAPA, ŽÉROVICE, PŘEKLADIŠTĚ, II. ETAPA

Počasí: Počasí: Ráno + 8°C, POL. + 22°C, ODP. + 34°C Pracovní přestávka: 11°° - 12°°

Pracovní doba: 5 - 14°°

Pracovníci (jména a příjmení): FIMBINGER, GRULICH, HÁJEK, BARTEK, MICHAL, DIVIŠ, MAREK, FENCL, PAVEL HOLOUŠ, OLEHRUCKÁ, JAROSLAV, ŠÍTKÉ, PETRÍK, LEHKÝ, ZDENĚK HOUSENKA, HOSÍL, HLAD, MICHAL CHENDEŠ,

Mechanizmy: LIEBHERR 914, LIEBHERR 914, 12t NÁKLADNÍ AUTO, KRAMER ČELNÍ NAKLADAČ, 2x MOTOROVÉ LUCERNY, 1x FORD TRANZIT, FINIŠER JOŽELE, 3x VÁLEC HAMM, 1x ŠÍŘIČÍ VŮZ, 2x HROTICÍ VŮZ, DISTRIBUTOR

Materiál: ACO 11 + PMB, MODIFIKOVANÁ EMULZE ASFALTOVÁ, ACL 16 + PMB, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,

Poznámky:

Provedená práce: - POKRAČOVÁNÍ PŘÍPRAVY VÝSEKOVÝCH ČÁSTÍ ASFALTOBETONU ACL 16+PMB V KM 11,300 - 11,800 PRAVÁ STRANA VE STYKU SE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ (OPRAVA PO POŠKOZENÝCH PODKLADNÍCH PŘÍPOJKÁCH)
- POKRAČOVÁNÍ POKLÁDKY ASFALTOBETONU ACO 11+PMB V KM 11,300 - 11,800 PRAVÁ STRANA VE STYKU STÁVAJÍCÍ + INTIMNÍ ASFALTOBETON ACO 11+PMB KOLEM HRANY
- POKRAČOVÁNÍ ODFRÉZOVÁNÍ ŠKODLIVÝCH HRAN ACO 11+PMB V OSE KOMUNIKACE SO 102 V KM 13,700 - 14,424 + 20 ROZ ASFALTOVÝCH ZÁTOK
- POKRAČOVÁNÍ ODVODNĚNÍ SPODNÍ STAVBY TĚLESA KOMUNIKACE SO 102 A ODVODNĚNÍ HO POTRUBÍ DO BETONOVÉHO LOŽE V KM 13,700 - 13,710 LEVÁ STRANA VE STYKU STÁVAJÍCÍ
- POKRAČOVÁNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE SO 102 ČÁSTEČNÉ VÝŠKY + ČÁSTEČNÉ VÝŠKY A SO 103

ŽÁDNÉ ZMĚNY/VÍCEPRÁCE: ŽÁDNÉ ZMĚNY/VÍCEPRÁCE (Č. VÝKRESU a.s.)
PODPIS ZÁPISU STAVEBNÍ DOZOR INVESTORA P. MIROSLAVA ANDĚLA O POKLÁDCE POKRAČOVÁNÍ INFILTRAČNÍHO SPOJOVACÍHO EMULZE V KM 13,700 - 14,424 LEVÁ STRANA VE STYKU STÁVAJÍCÍ ACL 16 PMB A O POKLÁDCE POKLÁDKY ASFALTOBETONU ACO 11+PMB V RÁMCI ÚŘEDU

ZÁPIS SDI: NA ZÁKLADĚ MĚŘENÍCH KONTROL ZKOUŠEK POKLÁDKY POKRAČOVÁNÍ ACO 11+ V KM 13,700 - 14,424 L.S.

POKRAČOVÁNÍ INFILTRAČNÍHO SPOJOVACÍHO POTŘÍKU ALE EMS V KM 13,700 - 14,424 LEVÁ STRANA VE STYKU STÁVAJÍCÍ

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího:

List č.: 3110659

STRABAG

SO 102

Datum: 19. 6. 2023 Den týdne: PO

...dové středisko: [illegible] Název akce: II/102 HR. KL. M. PRAHY, ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

...se:

...ovní doba:

Pracovní přestávka:

...ovníci (jména a příjmení):

...hanismy:

...erát:

...ušky:

...ovedené práce: X 13,410 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVIČENÍ PRO PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE (ODLAŽDĚNÍ SVAHU TĚL. KOMUNIKACE)
- PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO INFILTRAČNÍHO POSTŘIKU
V km 11,300 - 11,850 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVIČENÍ DLE ADS

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted]

List č.: 3110658

STRABAG

SO 104

Datum: 19.6.2023 Den týdne: PO

Stavební středisko: Ostrava Název akce: II/604 HR. N. POVĚL, STŘEDOVICE, REKONSTRUKCE II. ETAPA

Počasí: polojasno, ráno +2°C, pol. +7°C, odp. +12°C

Pracovní doba: 7:00 - 15:00 Pracovní přestávka: 11:30 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení): MILOŠ USTEK, ANDREJ KEMOL, BOHUMÍR KOUTENSKÝ, MILOŠ PAVLÍČEK, MICHAL ŠIMONEK, ITALIA HUTTOVÁ, PAVLÍNA LEHOCZKÁ, JAROSLAV ŠPÍTÁL, ROSTISLAV PŘIKRYL

Mechanismy: FINISHER 414, NÁKLADNÍ AUTO, 4x FORD RANGER, 2x NÁKLADNÍ AUTO, 2x VÁLEC, DÍLNÍ AUTO, KOMPRESOR

Materiál: ASFALTOVÁ EMULZE, INFILTRAČNÍ EMULZE ČSTÉ 1,2 kg/m²

Poznámky:

Provedené práce:

- PROVEDENÍ ASFALTOVÉHO PODKLADNÍHO A KAMENIVOVÉHO KOBERCE MODIFIKOVANÉHO V MNOŽSTVÍ 30 10t/ V KM 11,300 - 11,800 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVEDENÍ ÚDRŽBY ASFALTOVÉHO KOBERCE SO 104/ V KM 11,800 - 11,800 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVEDENÍ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ASFALTOVÉHO KOBERCE U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V KM 11,060 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PO PROVEDENÍ PODKLADNÍCH ASFALTOVÝCH (PŘÍSTAVNÉ PRÁCE)

ZÁPIS ZHOTOVITELE: ZHOTOVENÉ ZHOTOVITELEM (K PODPISU A.S.) ZÁPIS ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE INSPEKTOREM O PROVEDENÍ PROVEDENÍ INFILTRAČNÍHO PODKLADNÍHO POTŘÍSTUP V KM 11,300 - 11,800 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ A O PROVEDENÍ PODKLADNÍCH ASFALTOVÝCH VRSTEV V DNEŠNÍ DEN

ZÁPIS VDI NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH KONTROL. ZKOUŠEK POVOLUJI POKLÁDKU MCO 11 V KM 11,300-11,800 P.S.

- PROVEDENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV ASFALTOVÝCH BETONŮ PROVEDL V KM 13,300 - 14,100 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVEDENÍ ÚDRŽBOVÝCH ŘEZÁNÍ PODÉLNÝCH ŘEZŮ V OSE KOMUNIKACE SO 104/ V KM 13,300 - 14,425
- PROVEDENÍ ÚPRAVY STYKU TĚLESA ZPEVNĚNÍ SO 104/ V KM 13,300 -

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stavbyvedoucího:

BAG

List č.: 3110743

SO 102

Datum: 1.6.2023 Den týdne: ČT

...lisko: SVÍTKOV Název akce: II/102 MB-HL. H. PRAHY, ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, 2. ETAPA
...o, DÁLNICE, POL. +19°C, ODPOL. +25°C
7⁰⁰ - 16⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

...na a příjmení): VÁCLAV ŠEBEK, FRANTIŠEK JEDLIČKA, JAROSLAV ŠTÍPEK, MICHAL DITÉ, ROBERT FENCL, ANTONÍN MELICL, PATRIK LEHEČKA, OLEH BUCHKA, MATOUŠ POSKOČIL, VITALIJ HRITSIK, VASIL TLAD, MICHAL CHENDEJ

LIEBHERR 912, LIEBHERR 912, DRABEK ČELNÍ NAKLADAČ, BYNÁKLADNÍ AUTO, MINIŠEK VIBRÁLE, 3x VÁLEC HAMM, KROPÍKOVÝ VIBR., 3x FORD TRANSIT, TY INTELIGENTNÍ CHÁVAČ

...IKA, ACL 16+, SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 kg/m², ~~ACL~~ SAL S MODIF., ACL 16+PMB, GEOTEXTILIE, C 20/25, SPOJOVACÍ POSTŘIK 1,2 kg/m²

...práce: - PROVÁDĚNÍ SPÁROVÁNÍ REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE SPÁROVACÍ HMOTOU SIKA V km 11,730 - 11,830 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ VÝKOPU STANIŠTĚ V km 13,060 - 13,380 ~~PRAVÁ~~ LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ (POBETONOVÁ POVODÍ VLTAVY)
- PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY (LEPENÍ - INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,2 kg/m²)
- GEOTEXTILIE V km 14,100 - 14,425 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY VYROVNÁVACÍ VRSTVY ACL 16+ V km 14,100 - 14,425 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + HUTNĚNÍ VRSTVY VÁLCI HAMM
- PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU 1,2 kg/m²
- PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY ASFALTOVÉ VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN SAL S MODIF. V km 14,100 - 14,425 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + HUTNĚNÍ VRSTVY VÁLCI HAMM
- PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU ~~0,3~~ 0,3 kg/m² V km 14,100 - 14,425 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY ASFALTOBETONU ACL 16+PMB V km 14,100 - 14,425 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + HUTNĚNÍ ACL 16+PMB VÁLCI HAMM
- PROVÁDĚNÍ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU 0,3 kg/m²
- PROVÁDĚNÍ BETONÁŽE ZÁKLADŮ PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁBRADLÍ U PŘEPUSTU V km 14,925 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

...zástupce Investora (TD [redacted]

BAG

List č.: 3110742

SO 102

Datum: 31.5. 2023 Den týdne: ST.

Místo: (Přístav) Název akce: II/102 MR. NL. 17. ROAD, STROMOVKA, EXISTENCE, II. ETAPA

+10, Beton + 19°C, Air. + 21°C, Asfalt. +25°C

Pracovní přestávka: 7:00 - 8:00

Jméno a příjmení: PONTIŠEK, UKOLOVÁ, HÁJEK, HÁJEK, JAROSLAV ŠÍLEK, PAVEL LEMEŠ, JAN BLOHER, MATOUŠ PAŘEZEK, MILAN ONDRUŠ, PETR NEP, KAREL HERTEL, MICHAL DAŇ, [illegible], ANTONÍN MELICH

LIBEREC 911, LIBEREC 911, KRAMEC ČSAD SEVEROČECH, SVÁŘEČSKÝ AUTO, BETONÁŘSKÝ

PRÁCE, SVAŘOVÁNÍ OPRAV, BETON, ŠALOVÉ KOSTRY, OPRAVY, INFILTRACE, POKLÁDKA FOLIÍ, ASFALTOVÁNÍ 1,2 kg/m²

ZÁPIS TDI PO PRŮBĚŽNÉ KONTROLE A 24 HODINOVÝCH VÝSLEDCH ZKOUŠEK BETONU. ZKOUŠKY POKLÁDKY FOLIÍ V ÚSEKU 14,000 - 14,430 P.V.

Práce: - PŘEMÍSTĚNÍ SMĚROVÉHO OBRUBNÍKU DO ROZHRANÍ MEZI ZPEVNĚNÍ MOSTU PRAVÉ V km 11,930 - 11,980 PRAVÉ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ ZAVĚŠENÍ + ODKLÁDÁNÍ ODSTRANĚNÉHO SAMOTNÍ PRO POKRAČOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍM OPRAV NA VÝŠKU A ČÁSTEČNÍ ČÁSTICE MOL + POKRAČOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍM OPRAV DO BETONOVÉHO LŮŽE

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ŽLABU A ŽELEZOBETONOVÉ DESKY DO BETONU (ŽLABOVÝ SKLUZ MOL - MÍSTO ČÁSTEČNÍ STAVBY MOL)

- ZAVĚŠENÍ + ODKLÁDÁNÍ ODSTRANĚNÉHO MATERIÁLU KONSTRUKCE SO 102 V km 11,100 - 11,430 PRAVÉ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ ÚPRAVY ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI KONSTRUKCE SO 102 V km 11,100 - 11,430 PRAVÉ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- DOVOZ NEBEZPEČNÉHO STAVEBNÍHO MATERIÁLU A MEZISKLADNĚNÍ NA STAVENIŠTI MAT' VRCH

- PROVÁDĚNÍ OBNAŽENÍ TĚLESA KONSTRUKCE SO 102 V KM 11,930 - 11,975 A KM 11,980 - 11,980 PRAVÉ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- POKLÁDÁNÍ INFILTRAČNÍHO PENETRAČNÍHO NÁTĚRU 1,2 kg/m² V KM 11,100 - 11,430 PRAVÉ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- ŽÁDOST DODAVATELE: ŽÁDOST DODAVATELE (Č. PŘÍLOHA Č.)

NAŠEM ŽÁDÁ ŽÁDÁ SMLUVNÍ ZÁSTUPCE MOSTEČKA P. PŘÍLOHA NA VOLENÍ O POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ STUDENÉHO INFILTRAČNÍHO NÁTĚRU 1,2 kg/m² V km 11,100 - 11,430 PRAVÉ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ A O POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ ASFALTOVÉHO VOZOVKY ACL 16+, ACL BINDIT, ACL 16+ PMB A ACO 11+ PMB V TOMTO ÚSEKU

Zástupce investora (TDI):

LABAG

List č.: 3110737

SO 102 /

Datum: 26.6.2023 Den týdne: PÁ

středisko: BRNO Název akce: II/602 MÍR. HL. II. ETAPA, ŠÍŘ. MOSTKU, REKONSTRUKCE, Z. STAVBA

ásivo, asfalt + 90°C, PMZ + 80°C, odpal. nátěr 0°C

doba: 7:00 - 15:30 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

e (jména a příjmení): JOSEF KOLÁŘSKÝ, KAREL HOLÝ, MICHAL ŠMÍDEK, MILOŠ HRUŠKA, PETR JANEČEK, ALEŠ KUCHAŘ, JAROSLAV LÍSNĚJŠKÝ, RADEK SVOBODA, EMIL ČERNÝ, ANTONÍN VENCL, FRANTIŠEK JEDLIČKA, PETR KUBÍN

ny: LIEBHERR 914, LIEBHERR 912, KOMATSU PC88MR-8, NAKLADAČ; ŠK NÁKLADNÍ AUTO, TANDEM VÁLEC, ŠK MALÝ NÁKL, ŠK PRŮD. FRÉZA, VIBRAČNÍ HŮL

C 30/37 XF3, PVC FÓLIE, SÍŤ S PROFILY, ASFALTOVÝ POSYPOVÝ (SPOJOVACÍ) STŘIK, SPÁROVÁNÍ: NOŽ. SVĚR

ené práce: - PODKLÁDÁNÍ ZPEVNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE ASF. BETON V tl. 11,830 - 11,560 m, 11,060 - 11,150 PRŮMĚR STROJNÍ KE STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÍ + ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ KRYTU

- PODKLÁDÁNÍ ZPEVNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE ASFALTOVÉ VRSTVY SE SNÍŽENOU ÚNOSNOSTÍ PRO I. STUPEŇ ZATÍŽENÍ TENKÁ VRSTVA SE 2 PROFILY V tl. 11,060 - 11,030 PRŮMĚR STROJNÍ KE STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÍ

- PODKLÁDÁNÍ ZPEVNĚNÍ SPOJOVACÍ STŘIKEM 0,3 kg/m² V tl. 11,840 - 11,800 PRŮMĚR STROJNÍ KE STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÍ

- PODKLÁDÁNÍ ZPEVNĚNÍ ASFALTOVÝM BETONEM ACL 16+ PMB V tl. 11,830 - 11,800 PRŮMĚR STROJNÍ KE STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÍ + ODŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU

- PODKLÁDÁNÍ ZPEVNĚNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU V tl. 13,963 - 13,903 PRŮMĚR STROJNÍ KE STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÍ Z BETONU C 30/37 XF4

- PODKLÁDÁNÍ SPÁROVÁNÍ ASFALTOVÉHO BETONU DO BETONOVÉHO LOŽE SOUVISLÉHO PŘÍSYPEM MÍSTNÍ SMĚS V tl. 11,830 - 11,830 PRŮMĚR STROJNÍ KE STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÍ

- ODVOZ NEVYUŽITÉHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU S PŘEMÍSTĚNÍM NA SKLÁDKU NOVÝ VRCH

- PODKLÁDÁNÍ ÚPRAVY STAVEBNÍCH V tl. 11,060 - 11,380 DLE VÝŠ. STROJNÍ KE STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÍ (PODKLADNÍ VRSTVY)

odpis zástupce investora (TDI):

STRABAG

List č.: 3110732

SO 102

Datum: 22. 8. 2023 Den týdne: PO

Stavební středisko: Praha Název akce: II/102 MÚK Hl. n. Praha, Štěrboholské, Rekonstrukce, 2. etapa

Počasí: dešťový, oblačno + 4°C, pol. + 22°C, odpo. + 23°C

Pracovní doba: 7:00 - 15:30 Pracovní přestávka: 11:00 - 11:30

Pracovníci (jména a příjmení): Františka Jedličková, Michal Dinis, Marek Pencl, Antonín Pešek, Jaroslav Šťáva, Ondřej Kubeček, Václav Motyčka, Karel Hnát, Marek Čmelík,

Mechanismy: Liebherr 912, Hitachi (pásák Bobo), 3t nákladní auto, kratší čelní nakladač, kolový traktor, vibrační deska

Materiál: Betonový panel, beton, SO 5/6

Geodetické práce: Stanovení souřadnic jednotlivých PO ke. Osazování

Provedené práce: - Rozebírání asfaltového stavu jízdního pruhu vozovky SO 102 v km 11,830 - 11,850 zpět čelní ke směru Štěrboholské z betonového ostrůvku do betonového lože

- Rozebírání dvouřadého obrubníku s SC 5/6 v km 11,830 - 11,860 a 11,880 - 11,900 zpět čelní ke směru stavidlům + ukládání SC 5/6 kolečky na hraně vnitř. oblouku

- Vyvážení suti asfaltové dle (Nedílnou součástí příkazu jsou fotografie místa odběru a množství)

- Rozebírání dvouřadého obrubníku v km 13,140 - 13,160 + ukládání do betonového lože

- Rozebírání dvouřadého obrubníku v km 13,165 - 13,225 (dl. 60 m) km 13,245 - 13,305 (dl. 60 m) + úprava na nivelačním + stávajícím betonovém podkl. pro osazení obrubníků a PO ke. Osazování + ukládání obrubníků vnitř. oblouku

Práce geodeta: Zaměření dne pro účely fakturace

Podrobné vytýčení obrubníků v km 11,860 - 11,880 a 11,900 - 11,920 zpět čelní ke směru stavidlům pro účely zaměření a pro zjištění množství odstraněného betonového podkladního vrstvení pod obrubníky a části přiléhající asfaltové vozovky. Zaměření bylo provedeno v rozsahu 20 m². Vytýčení a zaměření nové betonové lože (PO ke. Osazování + SC 5/6).

Podpis zástupce investora

RABAG

List č.: 3110728

SO 101

Datum: 18.5. 2023 Den týdne: ČT

...středisko: PŘÍBRAM, Název akce: II/102 RO. HL. M. PRAHZ, ŠTĚCHOVICE, PEKLOVICE/KOE, I. ETAPA

...LEŠNO, RÁNO +15°C, POL. +18°C, ODPOL. +17°C)

...doba: 6⁰⁰ – 17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ – 11³⁰

...ci (jména a příjmení): FRANTIŠEK VODIČKA, VÁCLAV BEBEN, JAROSLAV ŠTĚPEC, MICHAL DVOŘÁK, KAREL FRANCL, ANTONÍN MENCL, OLEH BUGHUR, MARTIN POSPÍŠIL, VITALIY HERSIR, JOSEF VLAD, MICHAL CHENDEY, ZDENĚK KRATÍMENKO

...nismy: LIEBHERR 918, LIEBHERR 914, 2× RCD FRANKIT, VÁLEC HAMM, VRTACÍ DESKA, 3× NÁKLADNÍ AUTO, MOTOROVÉ ČERPADLO, VRTACÍ DESKA

...iál: NEVHODNÝ KÁMEN, BETON, ŠTĚRKOVÉ MOSTY, SO PR. 0/32 mm

...sky: 2× BOUDY – NÁMĚSTÍ BUDOVA – PLÁN

...edené práce: – PROVÁDĚNÍ ODVOZENÍ SUTI DO DEPONIE SO 101 Z NEVHODNÉHO KAMENE DO SKLÁDKOVÉHO LOŽE V km 11,830 – 11,830 PRÁCE PŘÍSLUŠNÉ KE SMLOUVĚ ZHOTOVENÍ

– PROVÁDĚNÍ ČERPÁNÍ VODY Z VÝKOPU V km 11,225 – 11,296 PRÁCE PŘÍSLUŠNÉ KE SMLOUVĚ ZHOTOVENÍ (MOTOROVÉ ČERPADLO – VÝKOPY ŠTĚRK)

– PROVÁDĚNÍ ROZVOZU VÝKOPU DO DEPONIE (LIEBHERR 914 + HYDRAULICKÉ KLADIVO) + ODVOZ BETONOVÉHO MOSTU NA MEZIDEPONII (NÁKLADNÍ SOUPRAVA – ŠTĚRKOVÝ ŠTĚRK V km 11,225 – 11,296 PRÁCE PŘÍSLUŠNÉ KE SMLOUVĚ ZHOTOVENÍ)

– PROVÁDĚNÍ TĚŽENÍ MOSTU + ODVOZ NA MEZIDEPONII + PROVÁDĚNÍ PODSYPU Z SD PR. 0/32 mm + HUTNĚNÍ VIBR. DESKOU + PROVÁDĚNÍ PODKLADNÍHO BETONU (ŠTĚRKOVÝ ŠTĚRK V km 11,225 – 11,296 PRÁCE PŘÍSLUŠNÉ KE SMLOUVĚ ZHOTOVENÍ)

– PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTŮ V KOMUNIKACE SO 101 V km 11,060 – 11,170 PRÁCE PŘÍSLUŠNÉ KE SMLOUVĚ ZHOTOVENÍ DLE ZÁPISU Z 3.5. 2023 + ODVOZ NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII + HUTNĚNÍ PLÁNĚ ZÁKLADOVÉ MOSTY

– PROVÁDĚNÍ OPRAVY ZPEVNĚNÉ KRAJNICE Z ŠTĚRKOVÝCH MOSTŮ V km 10,700 – 10,840 PRÁCE PŘÍSLUŠNÉ KE SMLOUVĚ ZHOTOVENÍ (PROVÁDĚNÍ NAVOZENÍ ŠTĚRKOVÝCH MOSTŮ + PODBETONOVÁNÍ NA POŽADOVANOU VÝŠKU [illegible] + PMB + DOPLNĚNÍ ŠTĚRKOVÝCH MOSTŮ V CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTECH ZPEVNĚNÉ KRAJNICE

– PROVÁDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZATRUBNĚNÝCH [illegible] (PLÁN) V km 10,840 – 10,880 A 11,060 – 11,160 PRÁCE PŘÍSLUŠNÉ KE SMLOUVĚ ZHOTOVENÍ

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted]

RABAG

List č.: 3110727

SO 101

Datum: 8.5. 2013 Den týdne: ST

Středisko: Vlašim Název akce: Vlašim MO-NL, D. Postřižín, Čištěnice, obchvat I/18, II. stupeň
oblačno, bílo +8°C, max. + 10°C, odpr. -1‰

Doba: 7⁰⁰ - 15⁴⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 11³⁰

Jména a příjmení: Fojtíček, Urbánek, Mikeš Radek, Jaroslav Šípek, Jiří Mikš, Lacek Roman, Antonín Brych, Oleh Bondar, Ondřej Fojtíček, Vítek Martin, Mikš Mirek, Michal Dvořák

Stroje: Liebherr 912, Liebherr 914, Fadrá W 210, Bobcat 763, Komatsu (čelní lžíce), 5+ nákladní auto, nůžky Mikš

Odklízení kůlen, keřů, živých plotů

Provedené práce: - Rozšíření odstranění stavby železniční zastávky SO 101 a odklizení materiálu do kontejnerů v km 11,430 - 11,830 pravá strana ve směru staničení
- Odvoz nerozmělněného vegetačního materiálu a recyklátu na skládku mimo trasu
- Úplné odstranění zastávky v km 11,830 - 11,800 (čekárny)
- Provedení: Odstranění pásu na hranici mokřadního přírodního území v km 11,222,4 - 11,457,6 pravá strana ve směru staničení
- Rozšíření frézování stávající cesty v km 11,820 - 11,880 a 11,060 - 11,120 pravá strana ve směru staničení dle řezů a S.P. 2013 + odvoz asfaltového recyklátu na mezideponii
- Provedení odtěžení stávajících zemních/kamenných násypů zastávky SO 101 v km 11,820 - 11,880 pravá strana ve směru staničení dle řezů + odvoz přebytečného materiálu na mezideponii + hrubé urovnání pláně násypu
- Provedení úpravy svažitého terénu a živého plotu v km 15,300 - 15,340 pravá strana ve směru staničení (provedení řezu v živém plotu + odstranění nevhodných porostů) odvoz nevhodných porostů + založení živého plotu v odpovídajícím složení. Sadovnické provedení
- Provedení frézování stávajících asfaltových povrchů silnic (odfrézování krajnice) + pokládka nového povrchu silnic na štěrkového lože (asi 6m)

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího: //

TRABAG

List č.: 3110726

SO 102

Datum: 16.5.2013 Den týdne: [illegible]

...ové s řediskem: 841 [illegible] Název akce: [illegible] HR. AL. II. [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible] + [illegible], [illegible] + [illegible], [illegible] + [illegible]

...ní doba: [illegible] - [illegible] Pracovní přestávka: [illegible] - [illegible]

...ci (jména a příjmení): [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

...stroje: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

...ál: [illegible], [illegible], [illegible] FR. 0/32 mm a

...ky:

...dené práce: - PROVÁDĚNÍ ODLÁŽDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE SO 102 Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,830 - 11,880 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ ZPEVNĚNÍCH KRAJNIC Z ŠD FR. 0/32 mm V km 14,100 - 13,980 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + MYTNĚNÍ ŠTĚRKODRTI VIBRAČNÍ DESKOU DPU
- PROVÁDĚNÍ FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOBETONU FRÉZOU W 210 DLE RDS V km 10,840 - 11,300 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU NA OBALOVNU STAŠOV

ZÁPIS ZHOTOVITELE: PO ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ DLE RDS V km 10,840 - 11,300 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ SE NACHÁZÍ NA STÁVAJÍCÍ CB DESCE LOKÁLNÍ ZBYTKY STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ KTERÉ VYKAZUJÍ DEGRADACI. ŽÁDÁM ZÁSTUPCE RDS PROJEKTANTA, AD STAVBY A TDI STAVBY O STANOVISKO K ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ. BYLA PROVEDENA FOTODOKUMENTACE DEGRADOVANÝCH ČÁSTÍ ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ. DÁLE BYLA ~~[illegible]~~ PO ODFRÉZOVÁNÍ NALEZENA VE STÁVAJÍCÍ CB DESCE ULIČNÍ VPUST (km 11,280) ULIČNÍ VPUST BUDE VYZVEDNUTA NA ÚROVEŇ OBRUSNÉ VRSTVY

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted]

STRABAG

List č.: 3110725

SO 102

Datum: 15.5.2023 Den týdne: PO

...ové středisko: [illegible] Název akce: [illegible] NC. HL. M. PRAHY, [illegible], [illegible], II. ETAPA

[illegible] OBLAČNO, DÉŠŤ, DÁNO [illegible], POZ. + [illegible], ODPOZ. [illegible]

...doba: [illegible] Pracovní přestávka: [illegible]

...(jména a příjmení): [illegible]

...nismy: [illegible]

...: REGULAČNÍ KÁMEN, BETON

...ušky:

...vedené práce: - PROVÁDĚNÍ DIO V km 10,840 - 11,300 PRAVÁ STRANA VE STĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ ODTAŽDĚNÍ SVATU TĚLESA KOMUNIKACE SO 102 Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,730 - 11,830 PRAVÁ STRANA VE STĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU STAVENIŠTĚ
- PROVÁDĚNÍ NÁVOZU REGULAČNÍHO KAMENE NA MEZIDEPONII
- PROVÁDĚNÍ NÁVOZU ŠD FR. [illegible] NA MEZIDEPONII

Podpis zástupce investora (TD [redacted]

ABAG

List č.: 3110723

so 10/

Datum: 8.5.2023 Den týdne: so

Středisko: 41/Zibar Název akce: II/100 MB, AZ, D. PRAHY, ŠTĚRKOVICE, REKONSTRUKCE, 3. ETAPA

Počasí: OBLO +6°C, POL. +7°C, ODPAL +14°C

Doba: 6⁰⁰ - 14⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Jména a příjmení: NÁVRAT BERNEN, FRANTIŠEK HRDLIČKA, MICHAL DVOŘÁK, RADEK FRANC, ANTONÍN TIELCH, JAROSLAV ŠÍPEK, PATRIK LEHEČKA, ALEŠ RADILKA, ANTONÍN ŠKRDLÍK, MICHAL ONDRÁŠEK, PETR HLAD, VITALIJ MONTÍK

Stroje: LIEBHERR 914, LIEBHERR 914, NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORLD, 2 FORD + KRAMER, OŘ TŘEBÍČ - ÚSEK

Materiál: OBRUBNÍK BETON, BETON, KO FR. 0/32mm, ASFALTOVÉ SMĚSI A+ ŠPONTEZ

Provedené práce:
- POKRAČOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ SPODNÍ STAVBY VOZOVKY DO HL. 1,0 m S ODVOZEM SUTINY DO BETONÁRKY V KM 11,930 - 11,950 PRAVÉ STRANA VE SMĚRU STNIČENÍ
- POKRAČOVÁNÍ ODVODNĚNÍ KANALIZACÍ V KM 10,850 - 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STNIČENÍ
- POKRAČOVÁNÍ OPRAVY BETON. KRYCÍCH ŠTĚRBIN KO FR. 0/32mm + NÁTĚR ŠTĚRBIN PŘEDEM UPRAVENÝCH
- POKRAČOVÁNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSYPU KOMUNIKACE PODÉL ZÁSTAVBY V ROZSAHU 1 m DLE ČÁSTÍ 2 TÝDNY
- POKRAČOVÁNÍ BETONÁŽE OBRUBNÍKŮ A MONTÁŽE NOVÉHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABOVÉHO PROFILU V KM 10,850 - 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STNIČENÍ

Podpis zástupce investora (TD

RABAG

List č.: 3110722

80 102

Datum: 11.5.2022 Den týdne: Pá

...e středisko: [illegible] Název akce: II/102 [illegible] PRAHY, [illegible], [illegible] I. [illegible]
[illegible], RÁTVO + 10°C, POL. +14°C, ODPOL. +18°C

...doba: 5⁰⁰ - 16⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

...ci (jména a příjmení): VÁCLAV [illegible], [illegible], MICHAL [illegible], [illegible], ANTONÍN MENCL, PATRIK LEHEČKA, JAROSLAV [illegible], OLEH [illegible], MATOUŠ POSKOČIL, MICHAL [illegible], [illegible], VITALIJ [illegible]

...ismy: LIEBHERR 914, LIEBHERR 912, [illegible] ČELNÍ NAKLADAČ, 9x NÁKLADNÍ AUTO, FINISHER WÖLELE, 3x VÁLEC HAMM, 1x KROPICÍ W2

...il: REGULAČNÍ KÁMEN, BETON, ACO 11 + PMB

...ky:

...dené práce: - ODVOZ NEVHODNÉHO SÝROPOVÉHO MATERIÁLU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU HOLÝ VRCH
- PROVÁDĚNÍ ODLAŠKOVÁNÍ SPRAHU TĚLESA KOMUNIKACE SO 102 Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,930 - 11,850 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ PODKLADNÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY ACO 11 + PMB V km 13,900 - 14,100 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + HUTNĚNÍ ASFALTOBETONU VÁLCI HAMM
- PROVÁDĚNÍ PODKLADNÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY ACO 11 + PMB V km 10,840 - 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ + HUTNĚNÍ ASFALTOBETONU VÁLCI HAMM



Podpis zástupce Investora (TDI): [redacted]

STRABAG

List č.: 3110714

SO 102

Datum: 5.5.2023 Den týdne: PÁ

Stavební středisko: PRAHA Název akce: III/102 MO. NL. N. BEDNÁ, STŘÍBROVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Počasí: JASNO, RÁNO +5°C, POL. +7°C, ODPOL. +21°C

Denní režie: 7°° - 16°°

Pracovní přestávka: 11°° - 11°°

Pracovníci (jména a příjmení): FOLVARČÍK, JAROLÍMEK, MÁLEK, ŠIMEK, ŠAFÁŘ, HOLEC, HOLÝ, MICHAL ONDRÁŠ, JAROSLAV ŠÍPEK, OLEG PICHEA, MAREK KOLÁŘÍK, MICHAL ONDŘ, ANTONÍN MENCL, PETR ŠIMEK

Mechanizmy: UŘEZÁVAČ 914 + NÁŘADÍ, ZELENÝ, LISOVÝ 912, ŘEZNÁ ČÁRA ASFALTU, MOTOROVÁ ŠKÁRNICE, SE NÁŘADÍM NŮŽ, 2 LOPATA RUČNÍ, SK. CEMENTOLO, VÁLCOVÉ ČERPADLO, HRABÍM DÉLKA 3M, KOMPRESOR + VIBRAČNÍ DESKA S PŘÍTAHEM

Materiál: BO FE. 016mm, BETONU FE. 4-8mm, ASFALTOVÁ EMULZE, BETON

Poznámky:

Provedené práce: - PROVÁDĚNÍ ODŘEZÁNÍ OKRAJU ZÁLIVU KOMUNIKACE SO 102 A ODSTRANĚNÍ BETONU DO ŘEZNÉHO LOŽE V KM 11,230-11,830 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍŠTĚ

- ODVOZ ODSTRANĚNÉHO BĚŽNÉHO MATERIÁLU S NAKLADENÍM NA ODVOZNÍ NÁKLADNÍ VŮZ

- PROVÁDĚNÍ ČIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI (ODŘEZÁNÍ ČÁSTI VRSTVY ASFALTU - ZÁPIS Č. 3/2023) V KM 10,820-11,020 A 11,180-11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍ + ODVOZ ASFALTOVÉHO KRYTU NA MEZISKLÁDKU

- PROVÁDĚNÍ VYRUKÁNÍ ZPEVNĚNÍCH STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ SE STÁVAJÍCÍ SE ASFALTEM + PROVÁDĚNÍ VYKOPÁVEK PRO ZAMĚŘENÍ FE. 4-8mm (PŘÍPRAVA PRO PROVÁDĚNÍ MODIFIKOVANÉ SPOJOVACÍ)

- PROVÁDĚNÍ KONTROLNÍCH VRTŮ S SO FE. 0/32mm A BETONEM 4-8mm (ODBĚRNÍ ODSTRANĚNÉHO PODKLADU V KM 11,245 - 11,285 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍ + VÝTAHEM SO FE. 0/32mm A HRABÍM DÉLKA 3M

ZÁPIS DOPLNĚN DNE:

S PRACÍ ZAPOČATÉ PŘEDCHOZÍ KONTROLNÍCE SO 102 V KM 11,000 - 11,530 A ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ PŘED DOKONČENÍM (DOKONČENÍ ODSTRANĚNÉHO PODKLADU) V KM 11,245 - 11,285 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍ BYLO PROVEDENO NAPOJENÍ NOVÉHO JEDNOSTRANNÉHO OČELOVÉHO SPOJOVACÍHO ASFALTU V KM 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVENÍ A PŘÍPRAVU BEZPEČNOSTNÍ HRANICE NA DOKONČENÍ SO 102 *

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stavbyvedoucího:

ABAG

List č.: 3110712

SO 102

Datum: 4.5.2023 Den týdne: ČT

Středisko: (Praha) Název akce: I/102 MÍR. NÁ. 17. PRAHA, ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE II. ETAPA

Počasí: JASNO, BÁNO + 8°C, PŘÍ. +12°C, OBLOZ. + 19°C

Čas: 7:00 – 19:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 11:30

Jméno a příjmení: EUGENIUSZ KOTLEWSKI, PATRIK LEHEČKA, JAROSLAV ŠTĚPEK, NEO RUNEK, MOTOLIO POLOSEK, MICHAL BRESNER, KAREL VLAS, VITALIJ MATEJUK, MICHAL DVOŘ, KAREL FENCL, ANTONÍN HEJNÍ

Stroje: LIEBHERR 914, LIEBHERR 920, PRONAR ČELNÍ NAKLADAČ, MOTOROVÁ PILA, 2x PÁSOVÁ TERIÉRA, 3x NÁSTAVEC NA OLEJ, ŠTĚPKOVAČ (ZAPŮJČEN), MOBILNÍ ZÁSOBNÍK DFI)

BĚHLÁSENÍ KÁCENÍ, BETON, OBRUBY, SO KM. 0,830 mm

Provedené práce: - PROVEDENÍ ODSTRANĚNÍ VRCHNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SO 102 S DEMOLIČNÍM KLADIVEM NA BETONOVÉM LOŽI V km 11,320 - 11,880 PRAVÉ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ
- ODVOZ NEPOUŽITELNÉHO VÝLOMOVÉHO MATERIÁLU S NAKLADÁNÍM NA ODVOZOVÝ NÁKLADNÍ VOZIDLO
- PROVEDENÍ ÚPRAVY VRCHNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SO 102 V km 11,320 - 11,800 LEVÉ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ
- PROVEDENÍ GEODETICKÉHO PRACE PRO ZAMĚŘENÍ A ODSOUHLASENÍ ZÁSTAVBY OD OBCÍ (ODSOUHLASENÍ PRACE GEODETA STAVBY - ZAPŮJČENÍ Z 8.5.2023) + ZAMĚŘENÍ + ODSOUHLASENÍ V km 11,820 - 11,960 A 11,820 - 11,800 LEVÉ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ
- PROVEDENÍ ÚPRAVY KONSTRUKCE V km 11,820 - 11,800 LEVÉ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ (ZAPŮJČENÍ VČ. OBSLUHY)
- PROVEDENÍ VRATSTVU SO PO KM. 0,830 mm PRO ZÁSOBNÍKOVÉ OBRUBY + NATAŽENÍ (ODSOUHLASENÍ GEODETICKÉHO PRACE) - POLOHOVÉHO OBRUBY OBRUBY DO 2/3 - PÁSU) V km 11,820 - 11,860 LEVÉ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ + POMOCNÉ ZAFIXOVÁNÍ OBRUB DO BETONOVÉHO LOŽE
- PROVEDENÍ ASFALTOVÉHO PÁSU MOBILNÍ VRATI DO (LIEBHERR 914 + ŠÍŘKA PLOCHY) V km 11,820 PRAVÉ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ + ADHEZ ASFALTOVÉHO ŠPRY. NA ZAFIXOVÁNÍ
- PROVEDENÍ ČISTÍ PRO MOBILNÍ VRATI OLEJ PRO (ZAPŮJČENÍ PRACOVNÍKA)

Práce provedl:
Práce byly provedeny (F. ABAG a.s.) dnešní den bez závad a jsou připraveny k předání *

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího:

ABAG

List č.: 3110710

SO 102

Datum: 35.2023 Den týdne: St

Středisko: [illegible] Název akce: [illegible]

[illegible]

[illegible] 8⁰⁰ - 17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Jména a příjmení: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Provedené práce: - PROVÁDĚNÍ ODFRÉZOVÁNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE SO 102 A DEGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,830 - 11,850 PRAVÁ STRANA VE STÝKU STANIČENÍ

ZÁPIS ZHOTOVITELE: ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE (F. STRABAG a.s.) MARTIN LÍPA ŽÁDÁ ~~[illegible]~~ STAVEBNÍ DOZOR INVESTORA P. MIROSLAVA VALENTU O POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z SC 5/6 ~~[illegible]~~ V TL. 150 mm V km 10,840 - 10,880 A V km 11,060 - 11,180 LEVÁ STRANA VE STÝKU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z SC 5/6 V TL. 150 mm GREDEREM V km 10,840 - 10,880 A V km 11,060 - 11,180 LEVÁ STRANA VE STÝKU STANIČENÍ + HUTNĚNÍ SC 5/6 VÁLCEM HAMM + VIBR. DESKOU
- PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY OBRUBNÍKŮ DO BETONOVÉHO LOŽE V km 11,255 - 11,285 LEVÁ STRANA VE STÝKU STANIČENÍ (DOTLAČENÍ ODRAZNÉHO PRVKU) - POŽADAVEK OBCE DAVLE A DI - PČR)
- PROVÁDĚNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z ŠD FR. 0/32 mm A POD ZÁMKOVOU DLAŽBU V km 11,255 - 11,285 LEVÁ STRANA VE STÝKU STANIČENÍ

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

PŘI ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ OB DESKY V km 11,060 - 11,180 LEVÁ *

Podpis zástupce investora (TDI): [redacted] Podpis stavbyvedoucího:

TRABAG

List č.: 3110709

SO 102/

Datum: 2.5.2013 Den týdne: ÚT

Stavební středisko: (Ústí nad Labem) Název akce: II/101 MÍR. HR. ÚT. PŘEDMĚŘICE, SÚBOMOSTNÍ, PŘEDMĚŘICE, 1. ETAPA

Počasí: JASNO, POLOJASNO, RÁNO 12°C, PŘÍ. +15°C, ODPOL. +17°C

Doba: 5:00 - 17:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 11:30

Jména a příjmení: PODPISOVÁ LISTINA, KAREL ŠIMEK, JAROSLAV ŠIMEK, PETR LEHOVEC, TOMÁŠ POSPÍŠIL, ALEŠ RUCHKA, MICHAL ONDRÁČEK, KAREL HLOŽ, KAREL MOTYČKA, MICHAL ŠIMEK, KAREL FIALA, ANTONÍN FIALA, ALEŠ POLÁKY

Stroje: LIEBHERR 914, LIEBHERR 912, BOBCAT, KOMATSU ČELNÍ NAKLADAČ, ZAMÍŘENÝ AUTO, VÁLEC HAMM, ZÁ KORO KOMATSU,

Práce: OBOUSTRANNÁ KÁMEN, BETON, PŘÍMOČNÍ OBRUBY, ŠD PO KÓ. 0/32mm A

Poznámky: STAVENIŠTĚ SMĚTENÍ SNĚHU - PLOCHA 2a

Provedené práce: - POKRAČOVÁNÍ ODVÁŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY TĚLESA KOMUNIKACE SO 102/ A OBOUSTRANNÉHO KAMENE DO ODVOZOVÉHO LOŽE V KM 11,230 - 11,430 PRAVÉ STRANY VE SMĚRU STANIČENÍ

- POKRAČOVÁNÍ POKLÁDKY PŘÍMOČNÍHO OBRUBU DO ODVOZOVÉHO LOŽE V KM 11,215 - 11,247 LEVÉ STRANY VE SMĚRU STANIČENÍ (DOPLNĚNÍ ZBYTKOVÉHO ÚSEKU - POSLEDNÍCH CCA 8M OBRUBU A M - PÁSU)

- POKRAČOVÁNÍ KONTROLNÍHO VRSTVY Z ŠD FR. 0/32mm A V KM 10,840 - 11,420 A 11,060 - 11,140 LEVÉ STRANY VE SMĚRU STANIČENÍ (ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ) + VÁLENÍ ŠD FR. 0/32mm A KONEČNÉ VRSTVY

ZÁPIS GEODETICKÉ: GEODETICKÁ ZAMĚŘOVAČKA (P. BROŽEK A.S.) PROVÁDÍ LETOS ZÁVĚR STAVEBNÍCH DOZORU MINISTRA + PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ O PROVEDENÍ ZPEVNĚNÍ KONTROLNÍCH VRSTVY Z ŠD FR. 0/32mm A V Z. 220 mm V KM 11,240 - 10,880 A KM 11,060 - 11,140 LEVÉ STRANY VE SMĚRU STANIČENÍ

ZÁPIS TDI: PO PŘEVZETÍ GEODETICKÝCH A NA ZÁKLADĚ VÝSLEDNÝCH KONTROL GEODETEK BUDOU PODKLADY SO V GLEPERSTU ÚSEKU.

[redacted]

Podpis zástupce investora (TDI):

TRABAG

List č.: 3110705

SO 102/

Datum: 24. 4. 2013 Den týdne: Pá

Stavební středisko: Bytízko Název akce: II/102 HR. KL. - PODJÍ, STŘEDOVICE, REKONSTRUKCE, D. STAV

Počasí: zataženo, ráno + 4°C, pol. + 9°C, odpol. + 11°C

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 14⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Počet (jména a příjmení): BUCHTÍK ANTONÍN, HAJEK PAVEL, DOLNÍK EMANUEL, MIKULÍK HYACINT, JAROSLAV ŠTĚPÁN, OLDŘICH BUCHTA, MATOUŠ PODSEDNÍK, PAVEL ZELENKA, FRANTIŠEK HAVLÍČEK, ANTONÍN MĚNOŠ, MICHAL DAVID, ANDREJ KENCA

Stroje: LIEBHER 914, LIEBHER 912, MANITOU ČELNÍ NAKLADAČ, JCB FORD TRACTOR, W 210 - TRAKTOR, ŠKRTICÍ VŮZ (SOUPRAVA) - NEBOUDOUC, KROTICÍ VŮZ, UTAHOVÁČ + PODKLADNÍK, DVOUNÁPRAVOVÉ AUTO, LIAZ, MOTOROVÁ ŘEZAČKA, VIBRAČNÍ DESKA

Materiál: ŠD FR. 0/63 MM, RECYKLOVANÝ KAMENIVO, BETON

Poznámky:

Provedené práce: - PROVEDENÍ ODSTRANĚNÍ ORNICE Z PRAVÉ STRANY TĚLESA KOMUNIKACE SO 102/ A RECYKLOVANÉHO KAMENIVA DO BETONOVÉHO LOŽE V KM 11,930 - 11,830 PRAVÉ STRANA NE STYČNÍ STRANĚNÍ

- PROVEDENÍ HRUBÉHO ROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU V KM 13,800 - 14,100 PRAVÉ STRANA NE STYČNÍ STRANĚNÍ PRO ODVOZ + ODVOZ ASFALTOVÉHO GRANULÁTU NA RECYKLOVNU STĚTOV + ZAPRACOVÁNÍ ČÁST. ASFALTOVÉHO POVRCHU PRO PODKLADNÍ VRSTVU

- PROVEDENÍ ÚPRAVY ZAPRACOVANÉ ČÁSTI ASFALTOVÉHO POVRCHU (RECYKLÁŽE) V KM 13,900 - 14,100 PRAVÉ STRANA NE STYČNÍ STRANĚNÍ

- PROVEDENÍ HRUBÉHO ROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ CS DRŽKY V KM 10,840 - 10,880 LEVÉ STRANA NE STYČNÍ STRANĚNÍ PRO ODVOZ

- ODVOZ BETONOVÉHO GRANULÁTU NA RECYKLOVNU

- PROVEDENÍ ŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍ CS DRŽKY V KM 11,215 - 11,285 LEVÉ STRANA NE STYČNÍ STRANĚNÍ (DORAZNÍ ÚHELNÍK PEVNÉHO PROVEDENÍ - PODÉLNÉHO ŘEZU DÁLE V TI - PŘ)

- PROVEDENÍ BOURÁNÍ ČÁSTEČNÉ STÁVAJÍCÍ CS DRŽKY V KM 11,215 - 11,285 (LIEBHER 914 + BOURACÍ KLADIVO) + NAKLÁDÁNÍ + ODVOZ BETONOVÝCH KUSŮ NA MEZIDEPONII

- PROVEDENÍ ŘEZÁNÍ SPÁR PRO PŘÍČNOU ŠPÁRU V KM 11,253 - 11,285 LEVÉ STRANA NE STYČNÍ STRANĚNÍ + ODVOZ VÝZTUŽNÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII + ŘEZÁNÍ ŽÁROVÉHO SPÁR PŘÍČNÉHO DRŽKU

- PROVEDENÍ BETONOVÉHO PODKLADU PRO PŘÍČNOVÉ ŠPÁRU V KM 11,215 - 11,285 LEVÉ STRANA NE STYČNÍ STRANĚNÍ + NAKLÁDKA BETONOVÉHO DÍLU DO BETONOVÉHO LOŽE + NAKLÁDKA PRO BOKU DN 300 SN R/ DO BETONOVÉHO LOŽE

Podpis zástupce investora (TDI):

STRABAG

List č.: 3110704

SO 102

Datum: 17.4.2023 Den týdne: Po

Stavba a ředitelství: [illegible] Název akce: II/102 HK, HZ II. ETAPA, SEB. KOMUNIKACE, ENERGETICKÉ, II. ETAPA

Počasí dopoledne: OBLÁČNO + 8°C, POL. + 4°C, ODPOL. + 4°C

Počasí odpoledne: [illegible]

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Počet (jména a příjmení): ZDENĚK KOUTENSKÝ, OLEH BUDNIK, MICHAL VLČEK, MICHAL CHMELÍČEK, VÍTĚZSLAV HRDLIČKA, PETR LEHNERT, JAROSLAV ŠTIPEK, MILOŠ HOLUB, MICHAL VIVIÁN, MIROSLAV FENCL, ANTONÍN FENCL

Mechanizmy: LIEBHERR 914, 6x NÁVĚS, 3x NÁKLADNÍ AUTO, KOMATSU ČERMÍ MANIPULÁTOR, 2x FORD TRANSIT, TRAKTOR S RAD, ČERPACÍ VŮZ, HYDRAULICKÁ VRÁTA

Materiál: BETONOVÁ KOSTKA, ASFALT

Poznámky:

Provedené práce: - ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ NEPOTŘEBNÉHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU A NEBEZPEČNÉHO NA SPLAVENINU HRAZ VODNÍ

- PODMÍTÁNÍ ZBYTKŮ STROMŮ TĚLESA KOMUNIKACE SO 102/ A ZATRUBNĚNÍ MELIORAČNÍHO PŘÍKOPU V KM 11,230 - 11,850 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- PROVEDENÍ FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ V KM 10,840 - 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ NA KUBÍK + ODVOZ ASFALTOVÉHO DROLTU NA ODPADOVÝ STŘEDISKO

- PROVEDENÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ VOZOVKY (ASFALTOVÉ) V KM 10,840 - 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

Podpis zástupce investora (TD

[redacted]

STRABAG

List č.: 3110703

SO 102

Datum: 26.4.2023 Den týdne: 85

...adové středisko: [illegible] Název akce: II/104 AR. HL. II. PRAHY, [illegible], [illegible], II. ETAPA

...: [illegible], [illegible] +1°C, [illegible] +8°C, [illegible] +10°C

...ovní doba: 7⁰⁰–17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰–12⁰⁰

...ovníci (jména a příjmení): [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

...hanismy: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

...enál: [illegible], [illegible]

...ušky:

...edené práce: – PROVÁDĚNÍ LEODETICKÝCH PRACÍ V KM 10,800 – 11,800 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ (PROVÁDĚNÍ VYTYČENÍ KONKRÉTNÍ PRO FRÉZOVÁNÍ, STÁVAJÍCÍHO ASFALTOBETONU)
– ODVOZ NEVYHOVOVÉHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU SE MĚSÍDEPONIE NA SKLÁDKU HOLÍ VOCH
– PROVÁDĚNÍ ODVÁŠDĚNÍ SVAHU TĚLESA KOMUNIKACE SO 102 ~~[illegible]~~ Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V KM 11,730 – 11,830 PRAVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

...dpis zástupce investora (TDI): [redacted]

TRABAG

List č.: 3110702

SO 102

Datum: 25.4.2023 Den týdne: Čt

...dlisko: [illegible] Název akce: II/102 Hr. kl. II. Praha, [illegible], [illegible], II. etapa

[illegible], [illegible] +9°C, [illegible] +11°C, [illegible] +

[illegible] 8⁰⁰ - 19⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

...ména a příjmení): [illegible]

[illegible] LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, 2x NÁKLADNÍ AUTO, [illegible] SKFORD TRANSIT,

[illegible] KÁMEN, BETON, LANOVÉ BÁDLENÍ [illegible]

...né práce: - PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ LANOVÉHO BÁDLENÍHO STŘÍKU NA [illegible] PROPUSTKU V km 17,919 LEVÁ + PRAVÁ STRANA VE [illegible] SANACÍ

- PROVÁDĚNÍ ODLAŽDĚNÍ [illegible] TĚLESA KOMUNIKACE SO 102 Z [illegible] KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V km 17,930 - 17,830 PRAVÁ STRANA VE STŘEDU STANIČENÍ

- PROVÁDĚNÍ ODSTRANĚNÍ [illegible] NÁNOSŮ Z KRAJNIC KOMUNIKACE SO 102 V km 13,400 - 14,120 PRAVÁ STRANA VE STŘEDU STANIČENÍ + [illegible] NÁNOSŮ Z KRAJNIC NA MEZIDEPONII

- PROVÁDĚNÍ DEMONTÁŽE + ODVOZU [illegible] STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH [illegible] Z KRAJNIC KOMUNIKACE SO 102 NA MEZIDEPONII, V km 13,464 - 13,800 A V km 13,843 - 13,892 PRAVÁ STRANA VE STŘEDU STANIČENÍ

[redacted]

...s zástupce investora (TDI):

STRABAG

List č.: 3110701

SO 102

Datum: 24. 4. 2023 Den týdne: PO

Středisko: Brno Název akce: II/152 MÍČ. KŘ. - II. ETAPA, STŘEMCHOVICE, OBCHVAT, II. ETAP.

Počasí: SLUNEČNO, SUCHO, BEZVĚTRNO, RANNÍ 8°C, MAX. +12°C, ODPOL. +16°C

Pracovní doba: 5:00 - 15:00 Pracovní přestávka: 11:30 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení): VÁCLAV BARTEK, MICHAL DIVIŠ, RADEK FENCL, MICHAL OMELKA, JAKUB KLOD, VÍTOMÍR ROTREKL, OLEH RUDNEV, VLADIMÍR VOSKOBOJ, EDUARD SVITÁKOVÁ, JOZEFÍNA ŠÍPEK, PETRA LAŠTŮVKA

Mechanismy: LIEBHERR 914, ZÁ NAKLADAČ AUTO, ČLÁNKOVÝ DUMPER, HOMOGENIZÁTOR, LIEBHERR 912

Materiál: ASFALTOVÁ BETON, OBTOK

Poznámky:

Provedené práce: - ZAHÁJENÍ ASFALTOVÁNÍ OBTOKU VJO V KM 11,280 - KL 430 ŘEZIVO VEDENO VE SMĚRU STAVBĚNÍ

- POKRAČOVÁNÍ VJO V KM 10,800 - 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ

- POKRAČOVÁNÍ VJO V KM 10,300 - 11,280 ŘEZIVO VEDENA VE SMĚRU STAVBĚNÍ

- ZAHÁJENÍ ASFALTOVÁNÍ OBTOKU SPOJOVACÍHO ASFALTOVÉHO SPOJENÍ SPOJKY V KM 10,800 - 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ + ZAHÁJENÍ ASFALTOVÁNÍ VJO

- POKRAČOVÁNÍ ASFALTOVÉ MÁSY S KEMNIC V KM 10,800 - 11,300 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STAVBĚNÍ + ZBYTEK MÁSY NA ODSTAVNÉM PR.

- POKRAČOVÁNÍ ASFALTOVÉ MÁSY S KEMNIC V KM 10,300 - 10,800 ŘEZIVO VEDENO VE SMĚRU STAVBĚNÍ + ZBYTEK MÁSY S KEMNIC NA MEZIDEPONII

- POKRAČOVÁNÍ POKLÁDKY ASFALTOVÉHO BETONU VE ŠEDÉM LOŽE NA PRAHU TĚLESA SO 102 V KM 11,230 - 11,830 ŘEZIVO VEDENO VE SMĚRU STAVBĚNÍ

Podpis zástupce investora (TDI):

STRABAG

List č.: 3594631

Datum: 11.7.2023 Den týdne: [illegible]

[illegible] středisko: [illegible] Název akce: [illegible] M. PRAHY, ŠTĚCHOVICE, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible] 5⁰⁰ – 17⁰⁰ Pracovní přestávka: [illegible]

[illegible] a příjmení): [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible] LIEBHERR 914, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible] (včetně dodavatelů a jejich činnosti): – [illegible]
[illegible]
– [illegible] ([illegible])
[illegible]
[illegible] (2x 3 H)
– [illegible]

[illegible] investora (TDI): Podpis stavb[illegible]

STRABAG

List č.: 3594632

Datum: 17. 9. 2013 Den týdne: PO

Stavba: (SVRČEK) Název akce: M/102 HB. NL. N. PRAHY, ŘÍČANY, LIBEŇ, STŘELICE, B. KOPA
BUDČAS, OBLAČNO + 16°C, PRŠ. + DÉŠŤ, KOPŘ. +
[illegible]°.

Pracovní přestávka: 11°-13°

Jména a příjmení: KAŽDÝ ZAMĚN, FRANTIŠEK JEDLIČKA, MILOŠ BUREŠ, KAREL ERBEN, ANTONÍN HÁNEK

LIBEŇSKÉ SÍŇ, LIBEŇSKÉ SÍŇ, ČI MÍSTNÍ SÍŇ, ZVÝŠENÍ POVRCH MEZIPŘÍSTUPU, VÝ. OSTŘÍKÁNÍ, ZVÝŠENÍ ŠTĚRKODRTI, MEZIPŘÍSTUPU, ODVODNĚNÍ

POKLÁDKA KÁMEN, BETON, ŠD KE. 0/32mm.

Činnost (včetně dodavatelů a jejích činností): - DOVOZ MECHANIZMU VÝZBROJNÉHO MATERIÁLU
A TECHNOLOGICKÉ NÁ, PŘEJEZDU NÁ VRCH
- ROZPROSTŘENÍ ZHUTNĚNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY (ČLENĚNÍ VRSTVY 20 901)
A ODVOZ NÁ SKLÁDKU DO SKLÁDKOVÉHO PÁSU + ZPĚTNÝ NÁVOZ
KE ODVRŠKU + ZÁ DOVOZ ČERSTVÉHO (24 TUN)
- ROZPROSTŘENÍ ČÁSTEČNÉ VRSTVY
- ROZPROSTŘENÍ MATERIÁLU ZHUTNĚNÍ KOMUNIKACE K ŠD KE. 0/32mm
+ ČÁSTI MATERIÁLU PRO ZHUTNĚNÍ KOMUNIKACE + DOVOZ NÁ MEZIDEPONII
(BEZ ZHUTNĚNÍ KOMUNIKACE A ODVOZU NÁ SKLÁDKU DO SKLÁDKOVÉHO
PÁSU K MÍSTNÍ MEZIDEPONII PRO PŘÍPADNÉ MÍSTNÍ ZPĚTNÉ ZPRACOVÁNÍ) +
ROZPROSTŘENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU A ŠD KE. 0/32mm + HRUBÉNÍ VRCH
VRSTVY + POKLÁDKA ODVOZU NÁ SKLÁDKU DO SKLÁDKOVÉHO
PÁSU + VYTĚŽENÍ PŘÍSTUPU NÁ MÍSTNÍ SKLÁDKU

Zástupce investora (TDI): Podpis stavbyved

STRABAG

List č.: 3594633

Datum: 12.3.2003 Den týdne: ÚT

Stavební střelsko: [illegible] Název akce: 11/101 AB.AL.M. PRAHY, ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Ráno: 100, RÁNO + 17°C, POL. + 23°C, ODPOL. + 24°C

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovní (jmena a příjmení): VÁCLAV ZEMEN, FRANTISEK JEDLIČKA, MICHAL DIVIŠ, KAREL FENG, ANTONÍN MENCL

Mechanizace: LIEBHERR 912, LIEBHERR 914, BRAMEC ČELNÍ NAKLADAČ, 3x FORD TRANSIT, 5x NÁKLADNÍ AUTO, EL. CENTRÁLA, 2x KALOVÉ ČERPADLO, MOTOROVÁ HEŘÁČKA, 2x MOTOROVÉ BOURACÍ KLADIVO

Materiál: REGULAČNÍ KÁMEN, BETON

Poznámky:

Popis prostoru (včetně dodavatelů a jejich činností): - ODVOZ LEPHODNÉHO VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU NA 2. MEZIDEPONIE NA OBLÁDKU NOVÝ VRCH

- PROVÁDĚNÍ ODLAŽDĚNÍ PRAHU POTOKU (LESNÍ POTOK SO 901) Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO + ČERPÁNÍ VODY EL. CENTRÁLA + 2x KALOVÉ ČERPADLO (2x 10 H)
- PROVÁDĚNÍ ODTĚŽENÍ ZPEVNĚNÉ KRAJNICE Z ŠD FR. 0/32 mm + VÝKOP MATERIÁLU PRO ZPEVNĚNOU KRAJNICI + ODVOZ NA MEZIDEPONII (ZBV ZPEVNĚNÍ KRAJNICE Z REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE V MÍSTECH NÁJEZDŮ DLE POŽADAVKU MĚSTYSE DAVLE) + PROVÁDĚNÍ ŠTÉRKOVÉHO DROSTU Z ŠD FR. 0/32 mm + KUTNĚNÍ VBR. DESKOU + POLLÁDKA REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE + OPÁROVÁNÍ ZPÁRIVALÍ AMOTOU SIRA
- PROVÁDĚNÍ DEMONTÁŽE PROVIZORNÍCH ZÁBRAN (BETONOVÉ SO [illegible] SILNIČNÍ SVODIDLA) MEZI MOSTY SO 209 A LESNÍM POTOKEM SO 901 (ZBV) - LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ ROZEBRÁNÍ ZÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY U MOSTU SO 209 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ DIBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁHRADNÍCH OBRUB MEZI SO 209 A SO 901 LESNÍ POTOK LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ
- PROVÁDĚNÍ DIBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO REGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE U MOSTU PŘES LESNÍ POTOK SO 901 (ZBV - DLE VÝKRESU OD 7.0 STAVBY)
- OBĚŽENÍ BÍHY PRO BETONOVOU DESKU TL. [illegible] + 0,25 m ŠD FR. 0/32 mm A + ODVOZ VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU NA MEZIDEPONII (ZBV SO 209 - SO 901)

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího: [redacted]

STRABAG

List č.: 3594634

Datum: 19.7.2023 Den týdne: St.

[illegible] stavby: [illegible] Název akce: [illegible], [illegible], [illegible], II. [illegible]

[illegible]: [illegible], [illegible] + 17°C, [illegible] +

[illegible]: [illegible] Pracovní přestávka: [illegible]

[illegible] a příjmení): [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible] (včetně dodavatelů a jejich činností): – [illegible]
– [illegible]
– [illegible]
– [illegible]

[illegible] zástupce investora (TDI):

STRABAG

List č.: 3594635

Datum: 10. 9. 2013 Den týdne: Út

Stavební středisko: (H/36xx) Název akce: II/401 MÚ. MÚ. ST. PLOTY, ÚSEK MOSTU, REKONSTRUKCE, 2. ETAPA

Číslo akce: 5xx-xx-xx Pracovní přestávka: 11:00 - 11:30

Jména a příjmení: VÁCLAV ŠEVČÍK, ZDENĚK JEŘÁBEK, ROMAN ŠEVČÍK, MILOŠ ČERMÁK, JAROSLAV MOTYČKA, PETR LEHEČKA, ALEŠ KUČERA, MIROSLAV PETRŠ, ROSTISLAV JAGOŠ, JAROSLAV ŠIMEK, JOSEF PEŘINA, MICHAL BÍLEK, ROBERT PEŘINA

Technika: LIEBHERR 924, LIEBHERR 904, BOBCAT 334 + ZÁBĚRY, SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ, 5T KOLOVÝ NAKLADAČ, 24T PÁSOVÝ BAGR, NÁKLADNÍ AUTA, PŘÍVĚSY, DUMPER

Zboží: BETONOVÁ SMĚS, BETON C 16/20 XF1, PRO ZÁKLADY MOSTU,

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností): PŘEJÍMKA PRACOVIŠTĚ, ZAMĚŘENÍ PODKLADU A ÚČ PO ÚSEKU + MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ PRO SPOLEČNÉ ZAMĚŘENÍ, ZAMĚŘENÍ + ODVOZ DO MEZIDEPONIE ČÁSTI BETONÁŽNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY S PŘESAHEM KOTVENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE (MÍSTEČNÍ ZMĚŘENÍ DLE POŽADAVKŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUM.) + PŘEMÍSTĚNÍ ZAMĚŘOVACÍHO PRVKU A ÚČ PO ÚSEKU + MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ ODVOZU + PŘEJÍMKA OSAZENÉHO DOČASNÉHO KOTVENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE + PŘEMÍSTĚNÍ VRTNÉ SOUPRAVY + PŘEJÍMKA - PROVEDENÍ ODKRYTÍ KOTVENÍ PO ODTĚŽCE / ČIŠTĚNÍ POVRCH. PO 931 S PŘEJÍMKOU KOTVENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE + ČIŠTĚNÍ HRAN DL. ZÁKLADOVÉ DESKY + 24 KUSŮ ČEKATELŮ (24 10 H)

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyve

STRABAG

List č.: 3594636

Datum: 21. 9. 2023 Den týdne: Pá

Stavbyvedoucí: [illegible] Název akce: [illegible], II. [illegible]

[illegible]

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Provádění prací (včetně dodavatelů a jejich činností): - [illegible]

[illegible]

Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyv[redacted]

**RABAG**

List č.: 3594644

Datum: 2.8.2023 Den týdne: ST

Středisko: 847/2 [illegible] Název akce: 11/102 HB. HL. M. PRAHY, ŠÉCHOVICE, REKONSTRUKCE, II. ETAPA

Oblačno, RÁNO +15°C, TEL. 16°C, ODPOL. 17°C

Doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Jména a příjmení): VÁCLAV [illegible], MICHAL DIVÍŠ, [illegible] KOJTENSKÝ, [illegible], MICHAL CHENDEL, [illegible]

[illegible]: [illegible] 914, 1x NÁKLADNÍ AUTO, 2x FORD TRANSIT

[illegible]: BEGULAČNÍ KŘÍMEL, BETON

[illegible] práce (včetně dodavatelů a jejich činností): - PŘEVÁDĚNÍ ODLAŽDĚNÍ ČÁSTI SKLONU TĚLESA KOMUNIKACE SO 102 Z BEGULAČNÍHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE TODÉL ZVÝŠENÉHO ODRAZNÉHO PROUŽKU ZE ZÁTIKOVÉ DLAŽBY V KM 11,255 - 11,285 LEVÁ STRANA VE SMĚRU STANIČENÍ

- ÚKLID MEZIDETONIE
- PROVÁDĚNÍ REKTIFIKACE HRNEČKŮ (ŠOUPAT - VODA, KANALIZACE) V MOSTU SO 205

[illegible] zástupce investora (TDI): Podpi[redacted]

STRABAG

List č.: 3594645

Datum: 3. 8. 2023 Den týdne: ČT

Místo: [illegible] Název akce: [illegible]

Hodina: [illegible] Pracovní přestávka: [illegible]

Jméno a příjmení: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Další práce (včetně dodavatelů a jejich činností): [illegible]

Za zástupce investora (TDI): Podpis str

B 7634/RD683/MSPH
Fj 479008/2022/MSPH

# USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku**

**takto:**

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

**se vymazává**

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514
82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika
Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153
Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643
Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

**se zapisuje**

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.19. října 1962, r.č.626019/6514
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

**Poučení:**

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Ilona Žďárská

# Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

**Datum vzniku a zápisu:**
1. března 1994

**Spisová značka:**
B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

**Obchodní firma:**
STRABAG a.s.

**Sídlo:**
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**Identifikační číslo:**
608 38 744

**Právní forma:**
Akciová společnost

**Předmět podnikání:**
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: ( otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhacích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

**Statutární orgán:**

**předseda představenstva:**

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

**člen představenstva:**

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9

Den vzniku členství: 1. července 2020

**člen představenstva:**

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969
Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

**Počet členů:**

3

**Způsob jednání:**

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

**Prokura:**

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964
Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974
Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978
Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982
Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975
V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981
2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika
Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978
Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979
82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika
Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981
U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988
č.p. 228, 373 32 Jílovice

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973
U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

**Dozorčí rada:**

**předseda dozorčí rady:**

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970
05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika
Den vzniku funkce: 13. června 2022
Den vzniku členství: 13. června 2022

**člen dozorčí rady:**

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975
Bezručova 603, 250 91 Zeleneč
Den vzniku členství: 4. prosince 2018

**člen dozorčí rady:**

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964
7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika
Den vzniku členství: 12. ledna 2023

**Počet členů:**

3

**Jediný akcionář:**

Bau Holding Beteiligungs GmbH
9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 117476 i
Právní forma: společnost s ručeným omezeným

**Akcie:**

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

**Základní kapitál:**

1 119 600 000,- Kč
Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.
Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.
Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jajo zanikající společnosti.
Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

**Odštěpné závody:**

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

**Sídlo nebo umístění:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**Předmět podnikání:**

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar. 3. září 1979
Dělnická 443, 252 41 Dolní Břežany

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

**Sídlo nebo umístění:**

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

**Předmět podnikání:**

výkon zeměměřičských činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964
č.p. 5, 386 01 Radošovice

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

**Sídlo nebo umístění:**

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

**Předmět podnikání:**

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

**Sídlo nebo umístění:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**Předmět podnikání:**

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

**Sídlo nebo umístění:**

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

**Předmět podnikání:**

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

**Sídlo nebo umístění:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**Předmět podnikání:**

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

**Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu** (http://www.justice.cz).
Dne: 7.9.2023 10:56
Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/257/19-120/VM/23
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Tel. +
e-mai
Datum: 3. 11. 2023

**KSÚS Středočeského kraje**

**Ing. Milan PEŠKA**
**Technicko-provozní náměstek**

**Zborovská 11**
**150 21 Praha 5**

**Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.**

**Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 39 SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice.**

Zhotovitel stavby předložil dne 15. 8. 2023 a 23. 8. 2023 doplnil návrh ZBV č. 39 SO 102 (102/14) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Úprava svahu z lomového kamene).

Návrh změny řeší požadavek správce toku Povodí Vltavy, s.p. na provedení břehového opevnění typu B1 (odlážděný svah ve sklonu 1:1,25) namísto úpravy svahu typu A, B2 viz stanovisko AD č. 23 z 13. 4. 2021 a navazující stanoviska č. 46 z 28. 2. 2022 a 14. 6. 2023.

Změna ovlivnila výměry položek č. 11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 31, 33, 49, 124, 125 a nové položky č. 130, 132, 133, 137.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 39 SO 102 (102/14) Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice (Úprava svahu z lomového kamene)

Položky oceněného soupisu prací SO 102 (102/14) budou fakturovány na základě skutečné provedených prací doložených geodetickým zaměřením ÚOZI-Z a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Karel Šimek
