Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Radlická

Číslo	Popis	Týden 1–39
1	Převzetí staveniště + příprava stavby	
2	Zařízení staveniště	
3	Montáž pomocných a ochranných konstrukcí	
4	Přeložky silno a slaboproudu	
5	Demontáž obkladů ve vestibulu	
6	Bourání podlah a stěn	
7	Bourání stropní kce nad suterénem nástupiště	
8	Výstavba ŽB šachty v prostoru pod nástupištěm	
9	Montáž podpěrvých konstrukcí v prostoru nástupiště	
10	Výstavba ŽB šachty v prostoru nástupiště	
11	Bourání stropní kce nad prostorem nástupiště	
12	Výstavba ŽB šachty v prostoru vestibulu stanice	
13	Demontáž podpěrvých konstrukcí v prostoru nástupiště	
14	Přeložka suchovodu v suterénu	
15	Zděné konstrukce ve vestibulu	
16	Oprava vybouraných podlah	
17	Omítky a obklady	
18	Oprava demontovaných podhledů	
19	Montáž technologie výtahu	
20	Montáž elektrických rozvodů	
21	Malby a nátěry	
22	Kompletace zařízení	
23	Demontáž pomocných a ochranných konstrukcí	
24	Úklid staveniště	
25	Předání stavebniště	

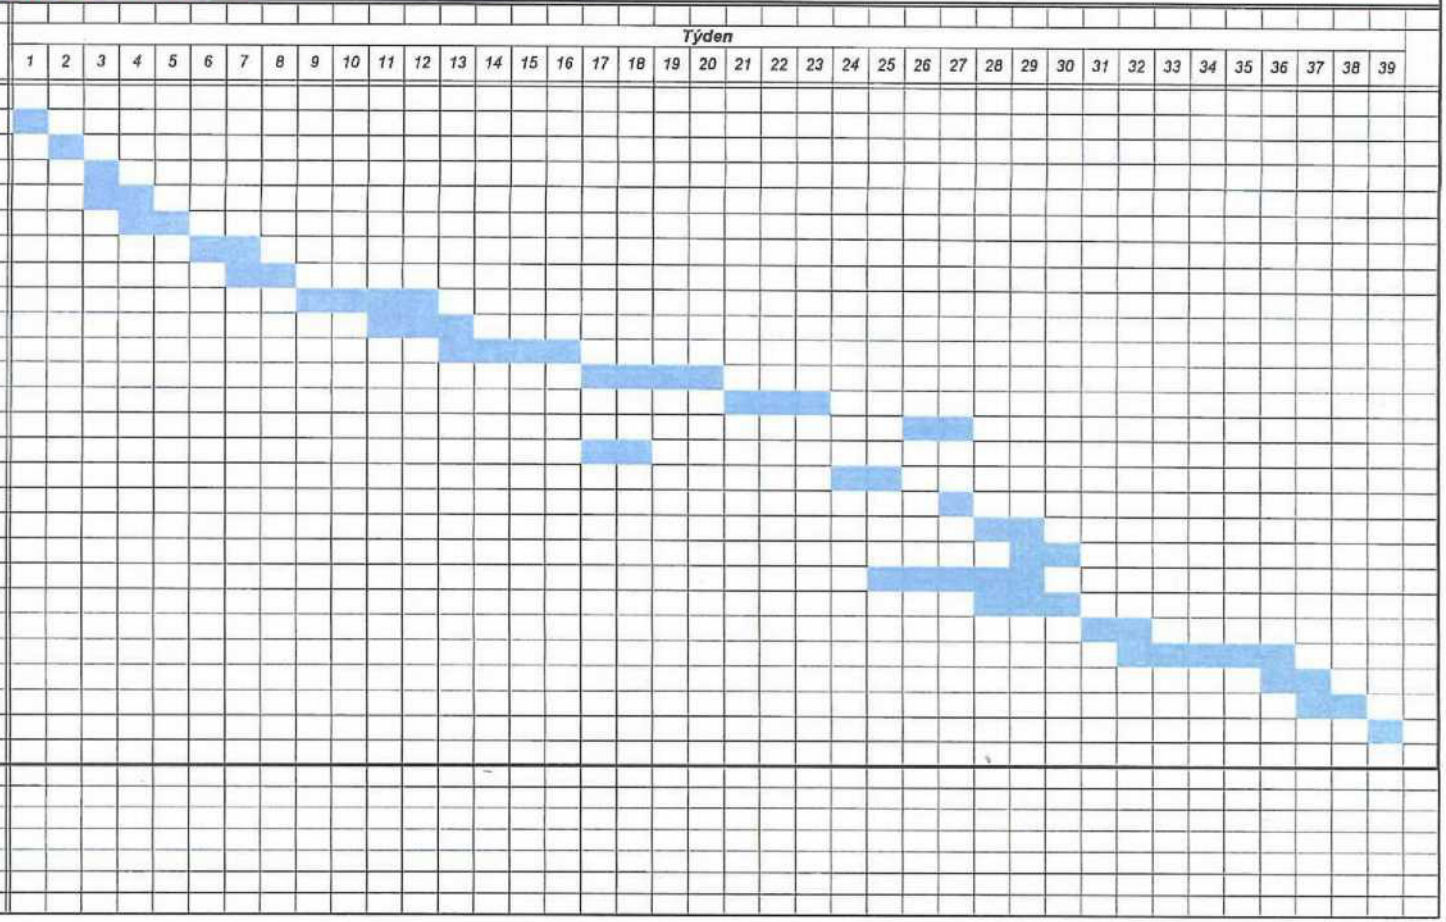

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Radlická - Tlakový uzávěr

Číslo	Popis	Týden 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	Převzetí staveniště + příprava stavby																																							
2	Zařízení staveniště																																							
3	Montáž pomocných a ochranných konstrukcí																																							
4	Provedení nových tlakových průchodek																																							
5	Přeložky silno a slaboproudu, VZT																																							
6	Demontáž obkladů ve vestibulu																																							
7	Bourání podlah a stěn																																							
8	Bourání v prostoru kuchyňky																																							
9	Bourání v prostoru nového vstupu do stanice																																							
10	Montáž podpěrných konstrukcí v prostoru nového vstupu																																							
11	Bourání obvodové stěny pro ocelové sloupy																																							
12	Osazení ocelových sloupů v novém vstupu																																							
13	Bourání průchodů mezi ocelovými sloupy																																							
14	Osazení ocelových výztuh nového otvoru																																							
15	Demontáž podpěrných konstrukcí v prostoru nového vstupu																																							
16	Zděné konstrukce ve vestibulu																																							
17	Oprava vybouraných podlah																																							
18	Omítky a obklady																																							
19	Oprava demontovaných podhledů																																							
20	Montáž provizorní ochrany OSM																																							
21	Montáž elektrických rozvodů, ZTI a VZT																																							
22	Malby a nátěry																																							
23	Kompletace zařízení																																							
24	Demontáž pomocných a ochranných konstrukcí																																							
25	Úklid staveniště																																							
26	Předání stavebniště																																							
