BOHEMIK

Denní harmonogram prací

Investor: Národní technické muzeum
Akce: Doplnění chlazení do 2. a 3. patra v budově Národního technického muzea

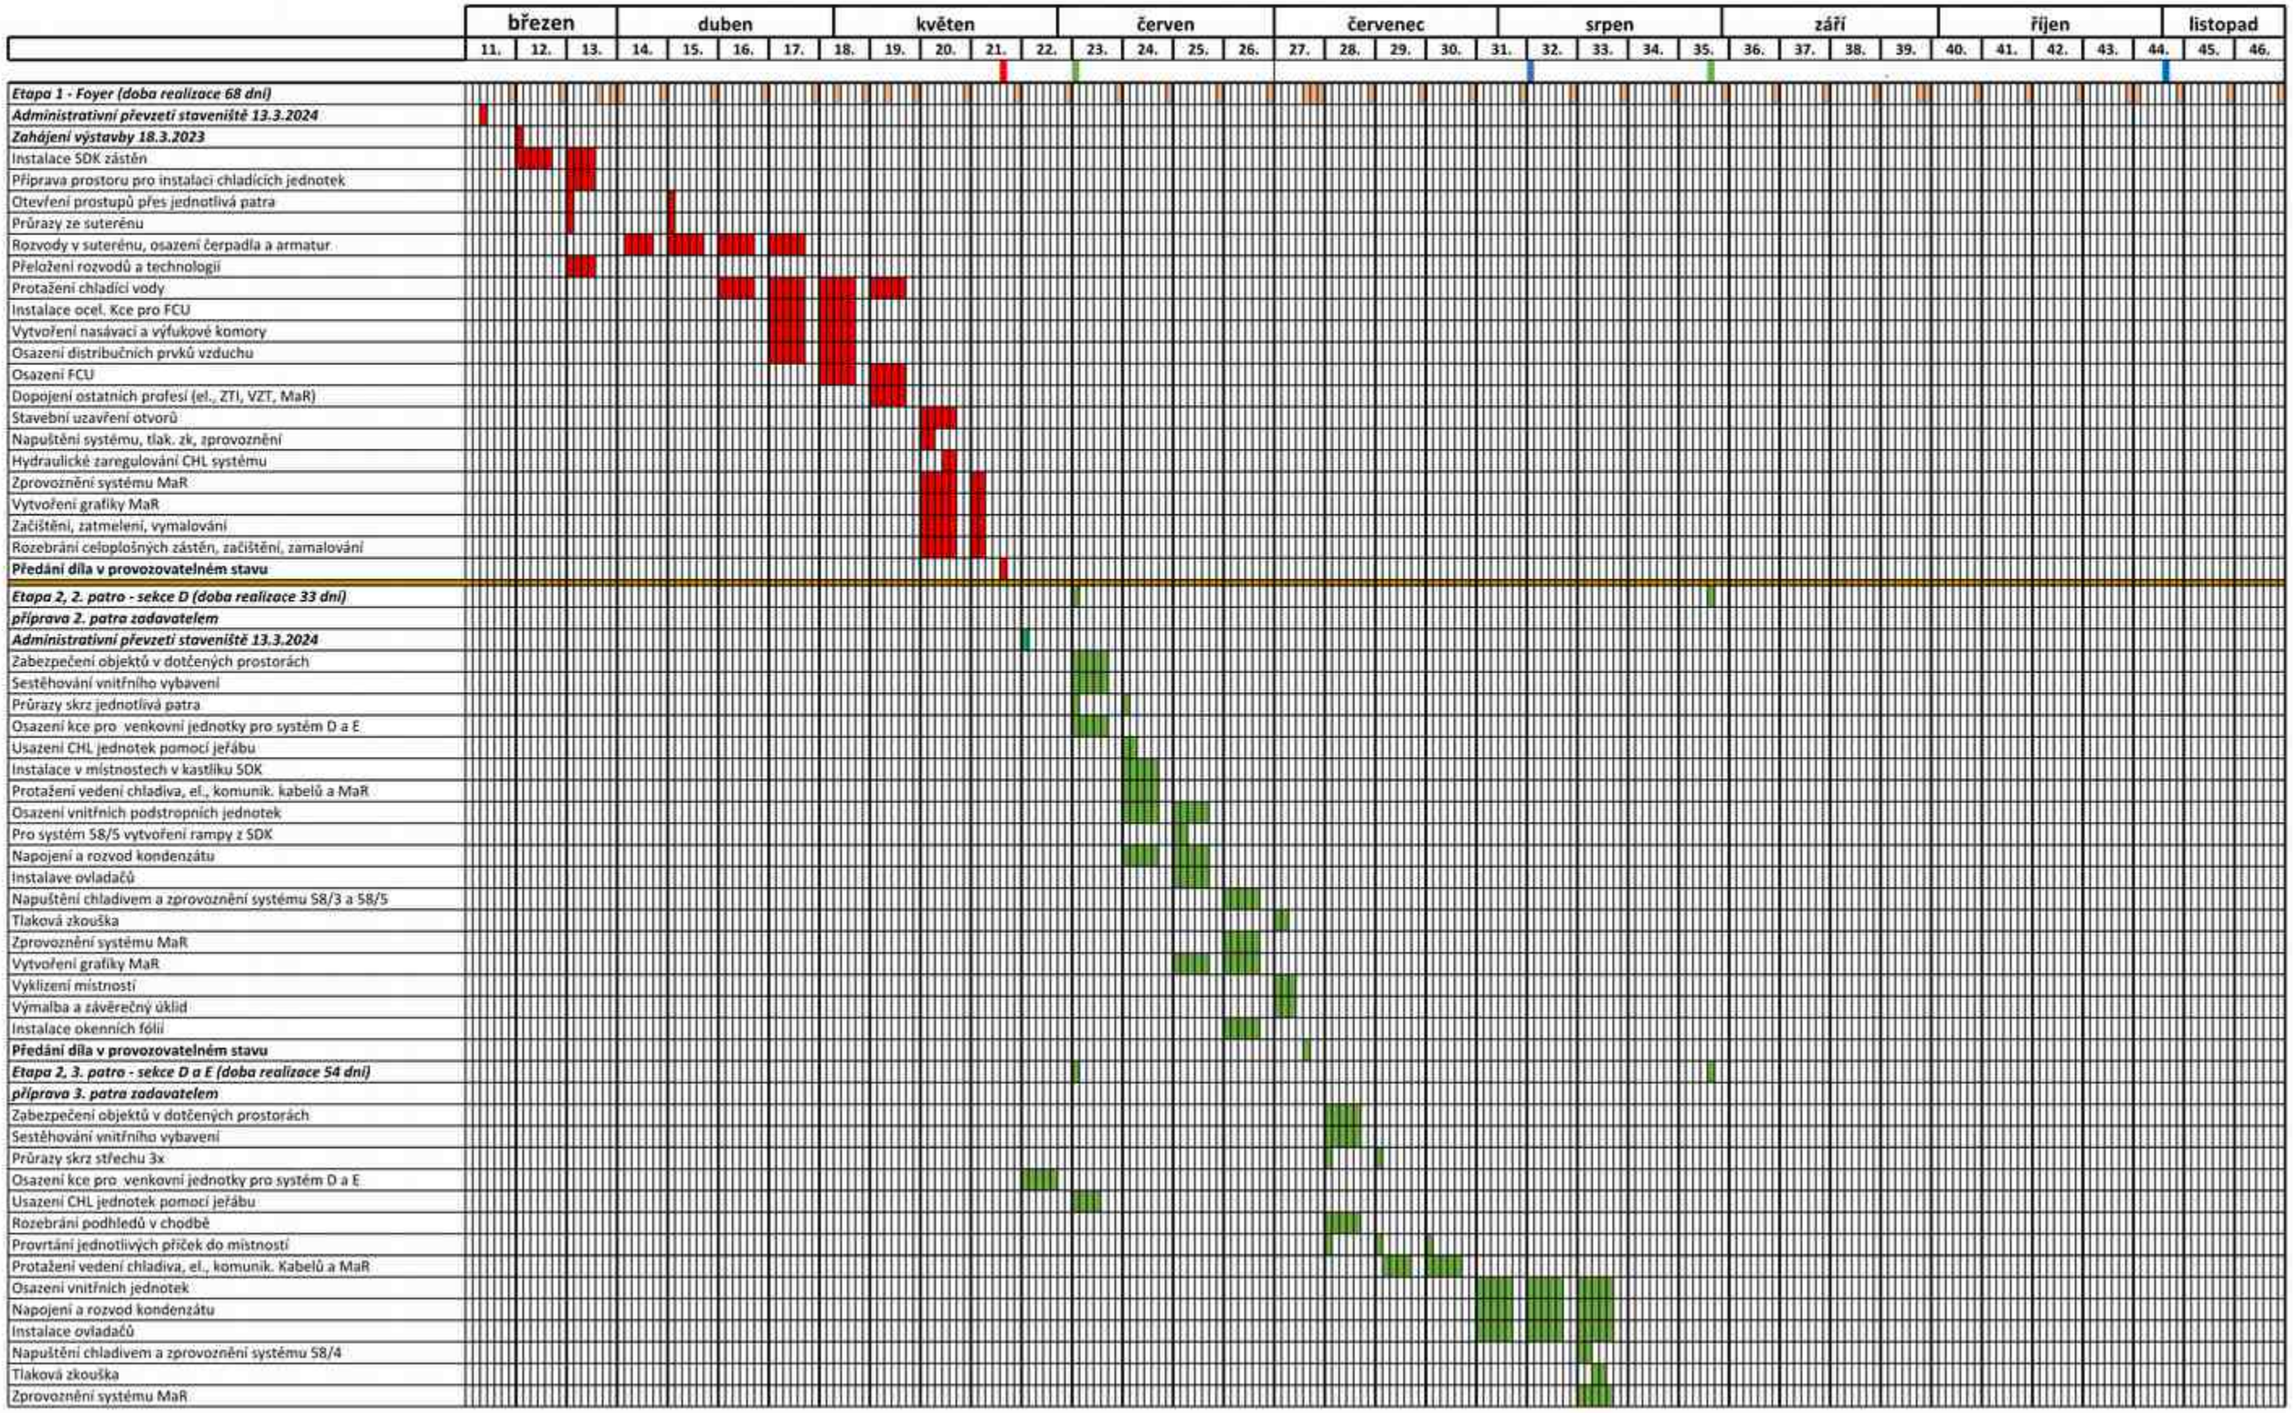

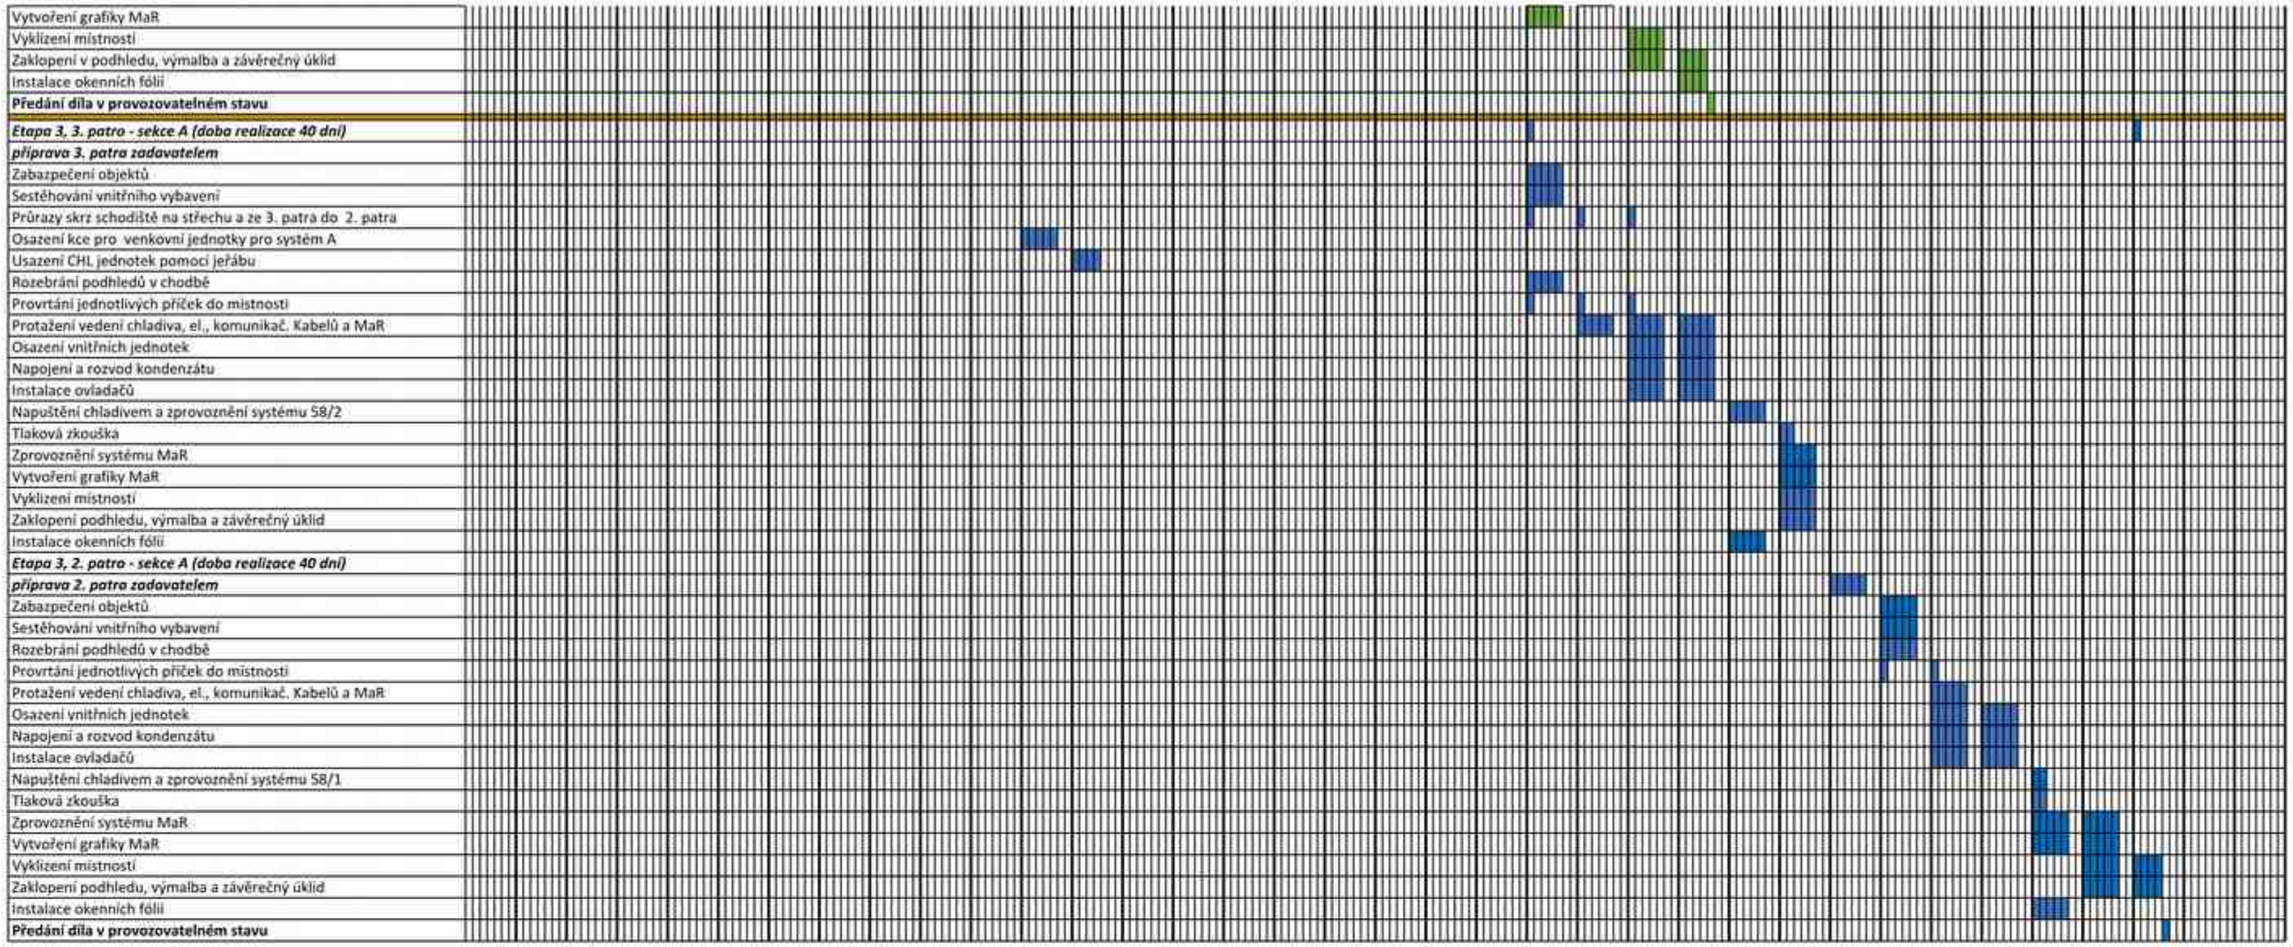
Vytvoření grafiky MaR
Vyklizení místností
Zaklopení v podhledu, výmalba a závěrečný úklid
Instalace okenních fólií
Předání díla v provozovatelném stavu
Etapa 3, 3. patro - sekce A (doba realizace 40 dní)
příprava 3. patra zadavatelem
Zabazpečení objektů
Sestěhování vnitřního vybavení
Průrazy skrz schodiště na střechu a ze 3. patra do 2. patra
Osazení kce pro venkovní jednotky pro systém A
Usazení CHL jednotek pomocí jeřábu
Rozebrání podhledů v chodbě
Provrtání jednotlivých příček do místností
Protažení vedení chladiva, el., komunikač. Kabelů a MaR
Osazení vnitřních jednotek
Napojení a rozvod kondenzátu
Instalace ovladačů
Napuštění chladivem a zprovoznění systému S8/2
Tlaková zkouška
Zprovoznění systému MaR
Vytvoření grafiky MaR
Vyklizení místností
Zaklopení podhledu, výmalba a závěrečný úklid
Instalace okenních fólií
Etapa 3, 2. patro - sekce A (doba realizace 40 dní)
příprava 2. patra zadavatelem
Zabazpečení objektů
Sestěhování vnitřního vybavení
Rozebrání podhledů v chodbě
Provrtání jednotlivých příček do místností
Protažení vedení chladiva, el., komunikač. Kabelů a MaR
Osazení vnitřních jednotek
Napojení a rozvod kondenzátu
Instalace ovladačů
Napuštění chladivem a zprovoznění systému S8/1
Tlaková zkouška
Zprovoznění systému MaR
Vytvoření grafiky MaR
Vyklizení místností
Zaklopení podhledu, výmalba a závěrečný úklid
Instalace okenních fólií
Předání díla v provozovatelném stavu

[redacted]
