| Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A | 1 |
|---|---|
| **ZMĚNOVÝ LIST** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pro :** | **Karlovarský kraj**<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary | | **Datum vydání požadavku :** | **15.12.2023** |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>x | faxem | osobně |

| | |
|---|---|
| **Název části stavby dotčené změnou:** | Statika (příčky, nosníky) |
| **Odkazy na:** | |
| specifikaci | |
| výkresy | |
| na zpracované podklady | |
| na jinou část podkladů smlouvy | |

**Popis změny, technické řešení:**

Nerealizace stropních nosníků pod nově zhotovované zděné příčky z důvodu nahrazení zděných příček za SDK konstrukce. Tímto dojde k odlehčení konstrukce a výztužné nosníky nejsou potřeba.

**Zdůvodnění změny:**

Předpokladem projektového řešení byla existence montovaných keramických stropů. Po provedení sond bylo zjištěno, že stropní konstrukce je monolitická, železobetonová. Z tohoto důvodu bylo provedeno posouzení a následné vypuštění nosníků s tím, že byla navržena záměna výzdívek za SDK konstrukce. Touto záměnou nebude dotčen prostor 1.NP toxikologie.

**Vliv změny na projektovou dokumentaci:**

Ano

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Počet připojených listů specifikací :** | — | | **Počet připojených listů výkresů:** | — |
| **Oznámení změny je vyvoláno :** | záměrem objednatele<br>X | záměrem provozovatele<br>X | chybou v dokumentaci | chybou zhotovitele | vyšší mocí nebo jinou okolností |

**Změnový list zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | **Datum :** | |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem | faxem | osobně |

**Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

Počet příloh / početlistů: 1/2

| **Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:** | | **Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:** | |
|---|---|---|---|
| odpočet celkem: | 276 414,33 | Termín: | ANO |
| připočet celkem: | 83 730,61 | Cena: | ANO |
| **cenový rozdíl:** | **-192 683,72** | | |

| | |
|---|---|
| **Předal :** | **Vyjádření zhotovitele stavby: Jindřich Chvojka** |
| | BAUSTAV a.s. [redacted] |
| Datum: | Datum: 6. [redacted] |
| **Vyjádření projektanta (autorského dozoru):** [redacted] | **Vyjádření provozovatele** [redacted] |
| JURICA a.s. [redacted] | PentaHospitals - Nemocnice Sokolov [redacted] |
| Datum: 6. 3. 2024 | Datum [redacted] |
| **Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar** | **Vyjádření objednatele:** [redacted] |
| INSCAN s.r.o. [redacted] | Karlovarský kraj [redacted] |
| Datum: 6. 3. 2024 | Datum: 6. 3. 2024 [redacted] |

# Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A

| Č. ZL | 1 |
|---|---|

| Odpočet | | | | | | | Připočet | | | | | | | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č | Typ | kod | Specifikace | m.j. | mn. | | č | | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | |
| 1 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 4,0 | | | | | | | | | | -3 662,12 |
| | W | | "m.č. 241" -((3,4+0,1)*1,56-0,7*2,0) | | 4,0 | | | | | | | | | | |
| 2 | K | 342272235 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm | m2 | 37,4 | | | | | | | | | | -40 708,71 |
| | W | | "m.č. 243" -(3,4+0,1)*3,57 | | 12,4 | | | | | | | | | | |
| | W | | "m.č. 247" -(3,4+0,1)*3,57*2 | | 24,9 | | | | | | | | | | |
| | W | | Součet | | 37,4 | | | | | | | | | | |
| 3 | K | 342291111 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | m | 4,0 | | | | | | | | | | -357,28 |
| 4 | K | 342291112 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | m | 10,7 | | | | | | | | | | -1 413,72 |
| | W | | u stropu tl. 125 mm | | | | | | | | | | | | |
| | W | | "m.č. 243" -3,57 | | 3,5 | | | | | | | | | | |
| | W | | "m.č. 247" -3,57*2 | | 7,1 | | | | | | | | | | |
| | W | | Součet | | 10,7 | | | | | | | | | | |
| 5 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 24,5 | | | | | | | | | | -3 503,50 |
| | W | | po výšce | | | | | | | | | | | | |
| | W | | -(3,4+0,1)*7 | | 24,5 | | | | | | | | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | | | | | |
| 6 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 0,8 | | | | | | | | | | -9 091,50 |
| | W | | zabetonování ocelových nosníků pod příčky | | | | | | | | | | | | |
| | W | | -(0,3-0,082)*0,2*6,65*3 | | 0,8 | | | | | | | | | | |
| 7 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm | t | 0,8 | | | | | | | | | | -33 148,50 |
| | W | | podlahové nosníky pod příčky I 180 = 21,9 kg/m | | | | | | | | | | | | |
| | W | | -21,9*2*6,55*3/1000 | | 0,8 | | | | | | | | | | |
| 8 | M | 13010720 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 | t | 0,8 | | | | | | | | | | -47 355,00 |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | |
| 9 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 83,0 | | | | | | | | | | -498,54 |
| | W | | nové příčky | | | | | | | | | | | | |
| | W | | -(2*37,485+4,06*2) | | 83,0 | | | | | | | | | | |
| 10 | K | 612321131 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 83,0 | | | | | | | | | | -16 451,82 |
| | W | | -2*(4,06+37,485) | | 83,0 | | | | | | | | | | |
| 11 | K | 612321321 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 83,0 | | | | | | | | | | -29 746,22 |
| 12 | K | 612321391 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 83,0 | | | | | | | | | | -6 896,47 |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | |
| 13 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | 0,3 | | | | | | | | | | -1 843,38 |
| | W | | drážky do podlahy pro uložení nosníků pod příčky | | | | | | | | | | | | |
| | W | | -6,65*0,2*0,1*3 | | 0,3 | | | | | | | | | | |
| | W | | Součet | | 0,3 | | | | | | | | | | |
| 14 | K | 973031325 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm | kus | 1,0 | | | | | | | | | | -352,00 |
| | W | | pro podlahové nosníky | | | | | | | | | | | | |
| | W | | -1 | | 1,0 | | | | | | | | | | |
| 15 | K | 977211111 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm | m | 39,3 | | | | | | | | | | -41 068,50 |
| | W | | do podlahy pro uložení podlahových nosníků I 180 pod nové příčky | | | | | | | | | | | | |
| | W | | -6,55*2*3 | | 39,3 | | | | | | | | | | |
| 16 | K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm | m | 39,3 | | | | | | | | | | -16 859,70 |
| | W | | do podlahy pro uložení podlahových nosníků I 180 pod nové příčky | | | | | | | | | | | | |
| | W | | -6,55*2*3 | | 39,3 | | | | | | | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | | | | | | | | | |
| 17 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0,9 | | | | | | | | | | -815,93 |
| 18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,9 | | | | | | | | | | -1 468,67 |
| 19 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 6,9 | | | | | | | | | | -6,92 |
| | W | | -0,989*7 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,9 | | | | | | | | | | |
| 20 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,9 | | | | | | | | | | -10,88 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | | |

# Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A

| Č. ZL | 1 |
|---|---|

| Odpočet | | | | | | | | Připočet | | | | | | | | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č | Typ | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem | č | | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem |
| 21 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 7,900 | 660,00 | 5 214,00 | | | | | | | | | -5 214,00 |
| | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | K | 045303000 | Koordinační činnost | % | 6,120 | 2 604,73 | 15 940,97 | | | | | | | | | -15 940,97 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | | |
| | | | | | | | | 22 | K | 763111333 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB | m2 | 3,904 | | | 4 528,64 |
| | | | | | | | | | VV | | "m.č. 241" 3,4*1,58-0,7*2,0 | | 3,904 | | | |
| | | | | | | | | 23 | K | 763111336 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB | m2 | 24,276 | | | 28 689,86 |
| | | | | | | | | | VV | | "m.č. 243" 3,4*3,57 | | 12,138 | | | |
| | | | | | | | | | VV | | "m.č. 247" 3,4*3,57 | | 12,138 | | | |
| | | | | | | | | | VV | | Součet | | 24,276 | | | |
| | | | | | | | | 24 | K | 763111761 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 40,318 | | | 8 950,60 |
| | | | | | | | | | VV | | 3,904+24,276+12,138 | | 40,318 | | | |
| | | | | | | | | 25 | K | 763111771 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 | m2 | 72,828 | | | 12 473,98 |
| | | | | | | | | | VV | | 12,138*3*2 | | 72,828 | | | |
| | | | | | | | | 26 | K | 763121425 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 112,5 mm, profil 100, Rw do 12 dB | m2 | 12,138 | | | 10 478,98 |
| | | | | | | | | | VV | | "m.č. 247" 3,4*3,57 | | 12,138 | | | |
| | | | | | | | | 27 | K | 763121621 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm | m2 | 12,138 | | | 994,22 |
| | | | | | | | | *28* | *M* | *59591004* | *deska SDK konstrukční s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl 12,5mm* | *m2* | *12,745* | | | 4 116,64 |
| | | | | | | | | | VV | | 12,138*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,745 | | | |
| | | | | | | | | 29 | K | 76380-R01 | Výztuhy pro zavěšení umyvadla (dod+mtž) | kpl | 2,000 | | | 4 740,00 |
| | | | | | | | | 30 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,285 | | | 1 837,55 |
| | | | | | | | | 31 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1,285 | | | 141,35 |
| | | | | | | | | 32 | K | ZL-R1 | Výztuhy pro zavěšení horních skříněk kuchyňské linky | kus | 1,000 | | | 1 950,00 |
| | | | | | | | | | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | |
| | | | | | | | | 100 | K | 100 | Projektová dokumentace | | | | | |
| | | | | | | | | 14 | K | 045303000 | Koordinační činnost | % | 6,120 | | | 4 828,79 |
| **Odpočet celkem** | | | | | | | **276 414,33** | **Připočet celkem** | | | | | | | **83 730,61** | **-192 683,72** |

| Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A | 2 |
|---|---|
| **ZMĚNOVÝ LIST** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pro :** | **Karlovarský kraj**<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary | | **Datum vydání požadavku :** | **21.12.2023** |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>x | faxem | osobně |

| | |
|---|---|
| **Název části stavby dotčené změnou:** | ZTI - vodovod |
| **Odkazy na:** | ZTI_projektová změna 2 z 9.12.2023 |
| specifikaci | |
| výkresy | D.1.4./ZTI-02 |
| na zpracované podklady | v.v.projektové změny |
| na jinou část podkladů smlouvy | |

**Popis změny, technické řešení:**

Změna provedení rozvodů TUV, SV a cirkulace, namisto napojení stávajících stoupaček pod stropem 1.NP navržen nový páteřní rozvod pod stropem 2.NP s napojením na páteřní rozvod v 1.NP.

**Zdůvodnění změny:**

Změna PD 12/2023, optimalizace páteřních rozvodů vody tak, aby při následné případné rekonstrukci 1.NP nedošlo k odstávkám v dodávkách vody pro 2 a 3 NP pavilonu.

**Vliv změny na projektovou dokumentaci:**

projektová změna

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Počet připojených listů specifikací :** | – | | **Počet připojených listů výkresů:** | – | |
| **Oznámení změny je vyvoláno :** | záměrem objednatele<br>X | záměrem provozovatele<br>X | chybou v dokumentaci | chybou zhotovitele | vyšší mocí nebo jinou okolností |

**Změnový list zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | **Datum :** | |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>X | faxem | osobně |

**Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

Počet příloh / početlistů: 1/2

| **Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:** | | **Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:** | |
|---|---|---|---|
| odpočet celkem: | 80 440,76 | Termín: | ANO |
| přípočet celkem: | 436 176,19 | Cena: | ANO |
| **cenový rozdíl:** | **355 735,43** | | |

| | |
|---|---|
| **Předal :** | **Vyjádření zhotovitele stavby:** [redacted] |
| Datum: | BAUSTAV a.s. [redacted]<br>Datum: 6. [redacted] |
| **Vyjádření projektanta (autorského dozoru):** [redacted] | **Vyjádření provozovatele:** [redacted] |
| JURICA a.s. [redacted]<br>Datum: 6.3.2024 | PentaHospitals - Nemocnice Sokolov<br>Datum: 6. [redacted] |
| **Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar** | **Vyjádření objednatele: Ing. Aleš Švajdler** |
| INSCAN s.r.o.<br>[redacted]<br>Datum: 6. 3. 2024 | Karlovarský kraj<br>[redacted]<br>Datum: 6.3.2024 |

# Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A

| Č. ZL | 2 |
|---|---|

## Odpočet

| č | | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 41 | K | 767646401 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm | kus | [redacted] | | 11 440,00 |
| 42 | M | 553-RD.1 | *dvířka instalačních šachet 400x600mm plechová uzamykatelná do ocelového rámečku EW30-DP2, nátěr bílé* | kus | | | 61 204,00 |
| 43 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | | | 429,00 |
| 44 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro | t | | | 429,00 |
| | | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | |
| 40 | K | 722130233 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 | m | | | 677,00 |

## Připočet

| č | | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Rozdíl Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | |
| 1 | K | 340271001 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm | m2 | 17,6 | [redacted] | | 11 496,24 |
| | W | | 3,4*0,4*13 | | 17, | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | | |
| 8 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 0,6 | | | 2 707,49 |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | | |
| 9 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 322,0 | | | 44 436,00 |
| | W | | 2.np | | | | | |
| | W | | "nově" 10+10+12+12+35+35 | | 114, | | | |
| | W | | "změna" 50+15+30+100+8+5 | | 208, | | | |
| 23 | M | 63154013 | *pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm* | m | 50,0 | | | 7 650,00 |
| 22 | M | 63154570 | *pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm* | m | 15,0 | | | 2 805,00 |
| 12 | M | 63154005 | *pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm* | m | 30,0 | | | 5 340,00 |
| 13 | M | 63154531 | *pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm* | m | 100,0 | | | 20 500,00 |
| 14 | M | 63154532 | *pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm* | m | 8,0 | | | 1 064,00 |
| 15 | M | 63154572 | *pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm* | m | 5,0 | | | 1 235,00 |
| 16 | M | 63154533 | *pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm* | m | 10,0 | | | 1 410,00 |
| 17 | M | 63154573 | *pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm* | m | 10,0 | | | 1 740,00 |
| 18 | M | 63154014 | *pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm* | m | 12,0 | | | 1 884,00 |
| 19 | M | 63154018 | *pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm* | m | 12,0 | | | 2 316,00 |
| 20 | M | 63154015 | *pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/30mm* | m | 35,0 | | | 7 735,00 |
| 21 | M | 63154019 | *pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm* | m | 35,0 | | | 9 800,00 |
| 24 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,2 | | | 775,86 |
| 25 | K | 998713181 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,2 | | | 326,12 |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | |
| 40 | K | 722130235 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 | m | 1,0 | | | 158,00 |
| 41 | K | 722174021 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7 | m | 50,0 | | | 40 050,00 |
| 26 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 15,0 | | | 9 165,00 |
| 27 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 130,0 | | | 70 850,00 |
| 28 | K | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | m | 13,0 | | | 8 515,00 |
| | W | | 117-104 2.NP | | 13, | | | |
| 29 | K | 722174025 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 | m | 20,0 | | | 13 193,20 |
| 30 | K | 722174026 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3 | m | 24,0 | | | 21 219,60 |

# Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A

| Č. ZL | 2 |
|---|---|

| Odpočet | | | | | | | | Připočet | | | | | | | | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č | | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem | č | | kod | Specifikace | m.j. | množství | j. cena | Celkem | Celkem |
| | | | | | | | | 31 | K | 722174027 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5 | m | 70,0 | [redacted] | [redacted] | 91 000,00 |
| | | | | | | | | 33 | K | 722232046 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" | kus | 1,0 | [redacted] | [redacted] | 761,53 |
| | | | | | | | | | W | | 1.np | | | [redacted] | [redacted] | |
| | | | | | | | | | W | | 2 | | 2,0 | [redacted] | [redacted] | |
| | | | | | | | | 34 | K | 722232048 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2" | kus | 2,0 | [redacted] | [redacted] | 3 112,18 |
| | | | | | | | | | W | | 1.np | | | [redacted] | [redacted] | |
| | | | | | | | | | W | | 2 | | 2,0 | [redacted] | [redacted] | |
| 35 | K | 722232071 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 3/8" | kus | [redacted] | [redacted] | 316,00 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | -316,00 |
| 36 | K | 722232072 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 1/2" | kus | [redacted] | [redacted] | 1 020,00 | | | | | | | [redacted] | [redacted] | -1 020,00 |
| | | | | | | | | 37 | K | 722232073 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 3/4" | kus | 2,0 | [redacted] | [redacted] | 924,00 |
| | | | | | | | | 38 | K | 722232074 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 2x vnější závit G 1" | kus | 2,0 | [redacted] | [redacted] | 1 289,82 |
| 39 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | [redacted] | [redacted] | 158,69 | 39 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,8 | [redacted] | [redacted] | 14 722,72 |
| 40 | K | 998722181 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | [redacted] | [redacted] | 128,01 | 40 | K | 998722181 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,8 | [redacted] | [redacted] | 11 876,20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | |
| 14 | K | 045303000 | Koordinační činnost | % | 6,120 | 758 | 4 639,06 | 14 | K | 045303000 | Koordinační činnost | % | 6,120 | 4 110 | 25 154,53 | 20 515,47 |
| **Odpočet celkem** | | | | | | | **80 440,76** | **Připočet celkem** | | | | | | | **436 176,19** | 355 735,43 |

| Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A | 3 |
|---|---|
| **ZMĚNOVÝ LIST** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pro :** | **Karlovarský kraj**<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary | | **Datum vydání požadavku :** | **15.12.2023** |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>x | faxem | osobně |

| | |
|---|---|
| **Název části stavby dotčené změnou:** | SDK - předstěny |
| **Odkazy na:** | |
| specifikaci | |
| výkresy | |
| na zpracované podklady | |
| na jinou část podkladů smlouvy | |

**Popis změny, technické řešení:**

Nerealizace SDK přestěn v některých pokojích. (konkrétní pokoje - viz výkaz výměr v ocenění)

**Zdůvodnění změny:**

Limitní neprůzvučnost předmětných stěn je dána stavební neprůzvučností dveří. Směrem do chodby není z provozního hlediska neprůzvučnost žádoucí ve vazbě na kontakt pacient x sestra.

**Vliv změny na projektovou dokumentaci:**

Ano

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Počet připojených listů specifikací :** | – | | **Počet připojených listů výkresů:** | | – |
| **Oznámení změny je vyvoláno :** | záměrem objednatele<br>X | záměrem provozovatele<br>X | chybou v dokumentaci | chybou zhotovitele | vyšší mocí nebo jinou okolností |

**Změnový list zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | **Datum :** | |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>X | faxem | osobně |

**Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

Počet příloh / početlistů: 1/2

| **Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:** | | **Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:** |
|---|---|---|
| odpočet celkem: | 91 918,55 | Termín: NE |
| přípočet celkem: | 61 857,69 | Cena: ANO |
| **cenový rozdíl:** | **-30 060,86** | |

| | |
|---|---|
| **Předal :** | **Vyjádření zhotovitele stavby:** [redacted] |
| | BAUSTAV a.s. [redacted] |
| Datum: | Datum: 6. [redacted] |
| **Vyjádření projektanta (autorského dozoru):** [redacted] | **Vyjádření provozovatele:** [redacted] |
| JURICA a.s. [redacted] | PentaHospitals - Nemocnice Sokolov |
| Datum: 6. 3. 2024 | Datum: 6. [redacted] |
| **Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar** | **Vyjádření objednatele:** [redacted] |
| INSCAN s.r.o. | Karlovarský kraj |
| [redacted] | [redacted] |
| Datum: 6. 3. 2024 | Datum: 6. 3. 2024 [redacted] |

# Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A

| Č. ZL | 3 |
|---|---|

| Odpočet | | | | | | | | Připočet | | | | | | | | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č | | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem | č | | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | [redacted] | | | | | | | | | | | |
| 13 | K | 763121481 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do | m2 | | | 75 165,20 | | | | | | | | | -75 165,20 |
| | VV | | "m.č. 231" -(3,20*2,7-0,8*2,0) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "m.č. 232" -(3,20*2,6-1,1*2,0) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "m.č. 233" -(3,20*2,6-1,1*2,0) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "m.č. 234" -(3,20*2,6-1,1*2,0) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "m.č. 235" -(3,20*2,6-1,1*2,0) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "m.č. 236" -(3,20*2,6-1,1*2,0) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "m.č. 237" -(3,20*2,6-1,1*2,0) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "m.č. 238" -(3,20*2,6-1,1*2,0) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "m.č. 239" -(3,20*2,6-1,1*2,0) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | "m.č. 240" -(3,20*2,6-1,1*2,0) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | | | 1 739,36 | | | | | | | | | -1 739,36 |
| 15 | K | 763121761 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | m2 | | | 6 833,20 | | | | | | | | | -6 833,20 |
| 16 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného | t | | | 2 674,10 | | | | | | | | | -2 674,10 |
| 17 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez | t | | | 205,70 | | | | | | | | | -205,70 |
| | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | K | 045303000 | Koordinační činnost | % | 6,120 | 866 | 5 300,99 | | | | | | | | | -5 300,99 |
| | | | | | | | | | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | [redacted] | | | |
| | | | | | | | | 1 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | | | 372,72 | 372,72 |
| | | | | | | | | | VV | | na stávající zdivo | | | | | |
| | | | | | | | | | VV | | 62,12 | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | K | 612131301 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn | m2 | | | 372,72 | 372,72 |
| | | | | | | | | | VV | | stávající otlučené zdivo | | | | | |
| | | | | | | | | | VV | | 62,12 | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | | | 4 705,59 | 4 705,59 |
| | | | | | | | | | VV | | na stávající zdivo (1/4) | | | | | |
| | | | | | | | | | VV | | 62,12/4 | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | K | 612321131 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | | | 12 299,76 | 12 299,76 |
| | | | | | | | | 5 | K | 612321321 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | | | 22 238,96 | 22 238,96 |
| | | | | | | | | | VV | | na stávající zdivo | | | | | |
| | | | | | | | | | VV | | 62,12 | | | | | |
| | | | | | | | | 6 | K | 612321391 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | | | 5 155,96 | 5 155,96 |
| | | | | | | | | | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | |
| | | | | | | | | 7 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | | | 6 530,04 | 6 530,04 |
| | | | | | | | | | VV | | 3,4*(1,6+0,9+0,9+0,8+0,9+0,8+0,8+0,8+0,9+1,3)*1,5 přenásobeno pro větší tloušťku omítek | | | | | |
| | | | | | | | | | D | 997 | Přesun sutě | | | | | |
| | | | | | | | | 8 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | | | 1 877,70 | 1 877,70 |
| | | | | | | | | 9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | | | 3 379,86 | 3 379,86 |
| | | | | | | | | 10 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | | | 15,93 | 15,93 |
| | | | | | | | | | VV | | 2,276*7 'Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| | | | | | | | | 11 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | | | 25,04 | 25,04 |
| | | | | | | | | | D | 998 | Přesun hmot | | | | | |
| | | | | | | | | 12 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní | t | | | 1 316,04 | 1 316,04 |

| Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A | | | | | | | | | | | | | | | | | Č. ZL | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odpočet | | | | | | | | | Přípočet | | | | | | | | | Rozdíl |
| č | | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem | | č | | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | | Celkem |
| | | | | | | | | | | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14 | K | 045303000 | Koordinační činnost | % | 6 [redacted] | | | | 3 567,37 |
| Odpočet celkem | | | | | | | 91 918,55 | | Přípočet celkem | | | | | | | 61 857,69 | | -30 060,86 |

| Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A | 4 |
|---|---|
| **ZMĚNOVÝ LIST** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pro :** | **Karlovarský kraj**<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary | | **Datum vydání požadavku :** | **21.12.2023** |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>x | faxem | osobně |

| | |
|---|---|
| **Název části stavby dotčené změnou:** | Změna specifikace zárubní dveří |
| **Odkazy na:** | |
| specifikaci | |
| výkresy | |
| na zpracované podklady | |
| na jinou část podkladů smlouvy | |

**Popis změny, technické řešení:**

Záměna v projektu navržených ocelových zárubní pro zazdívání za ocelové zárubně pro dodatečnou montáž.
Záměna povrchové úpravy zárubní z nátěru na stavbě emailovou barvou na lakování práškovou barvou.

**Zdůvodnění změny:**

Požadavek provozovatele z estetického hlediska. Sjednocení vzhledu zárubní, v projektu je část zárubní navržena pro zazdívání a část pro dodatečnou montáž. U zárubní pro dodatečnou montáž je výrazně jednodušší oprava(výměna ) při poškození zárubně.

**Vliv změny na projektovou dokumentaci:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Počet připojených listů specifikací :** | | – | **Počet připojených listů výkresů:** | | – |
| **Oznámení změny je vyvoláno :** | záměrem objednatele | záměrem provozovatele<br>x | chybou v dokumentaci | chybou zhotovitele | vyšší mocí nebo jinou okolností |

**Změnový list zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | **Datum :** | |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>x | faxem | osobně |

**Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval:**

BAU-STAV a.s. - Ing. Marek ZBORNÍK

Počet příloh / početlistů: 1/2

| **Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:** | | **Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:** | |
|---|---|---|---|
| odpočet celkem: | 157 725,30 | Termín: | NE |
| přípočet celkem: | 339 561,71 | Cena: | ANO |
| **cenový rozdíl:** | **181 836,41** | | |

| | |
|---|---|
| **Předal :** | **Vyjádření zhotovitele stavby** [redacted] |
| Datum: | BAUSTAV a.s. [redacted]<br>Datum: 6. |
| **Vyjádření projektanta (autorského dozoru)** [redacted] | **Vyjádření provozovatele** [redacted] |
| JURICA a.s. [redacted]<br>Datum: 6. 3. 2024 | PentaHospitals - Nemocnice Sokolov [redacted]<br>Datum: 6. 3. 2024 |
| **Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar** | **Vyjádření objednatele:** [redacted] |
| INSCAN s.r.o.<br>[redacted]<br>Datum: 6. 3. 2024 | Karlovarský kraj [redacted]<br>Datum: 6. 3. 2024 |

# Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A

**Č. ZL** 4

| Odpočet | | | | | | | | Přípočet | | | | | | | | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č | | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem | č | | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem |
| | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 25,000 | 2 200 | 55 000,00 | | | | | | | | | -55 000,00 |
| | Online PSC | | https://podmenu.urs.cz/item/CS URS 2022 02/642942111 | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 1+3+5+4+12 | | 25,000 | | | | | | | | | | | |
| 34 | M | dod342-01 | ocelová zárubeň pro zazdění se stínovou drážkou vč. těsnění 100/900/1970 mm | kus | 4,000 | 2 479 | 9 916,00 | | | | | | | | | -9 916,00 |
| 35 | M | dod342-02 | ocelová zárubeň pro zazdění se stínovou drážkou vč. těsnění 150/700/1970 mm | kus | 1,000 | 2 596 | 2 596,00 | | | | | | | | | -2 596,00 |
| 36 | M | dod342-03 | ocelová zárubeň pro zazdění se stínovou drážkou vč. těsnění 150/800/1970 mm | kus | 2,000 | 2 647 | 5 294,00 | | | | | | | | | -5 294,00 |
| 37 | M | dod342-04 | ocelová zárubeň pro zazdění se stínovou drážkou vč. těsnění 150/900/1970 mm | kus | 5,000 | 2 677 | 13 385,00 | | | | | | | | | -13 385,00 |
| 38 | M | dod342-05 | ocelová zárubeň pro zazdění se stínovou drážkou vč. těsnění 150/1100/1970 mm nemocniční | kus | 2,000 | 2 709 | 5 418,00 | | | | | | | | | -5 418,00 |
| 39 | M | dod342-06 | ocelová zárubeň pro zazdění se stínovou drážkou vč. těsnění 225/800/1970 mm | kus | 1,000 | 2 927 | 2 927,00 | | | | | | | | | -2 927,00 |
| 40 | M | dod342-07 | ocelová zárubeň pro zazdění se stínovou drážkou vč. těsnění 225/1100/1970 mm nemocniční | kus | 10,000 | 2 927 | 29 270,00 | | | | | | | | | -29 270,00 |
| 42 | M | dod342-09 | ocelová zárubeň pro zazdění se stínovou drážkou vč. těsnění 150/1800/1970 mm nemocniční | kus | 1,000 | 3 761 | 3 761,00 | | | | | | | | | -3 761,00 |
| | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | [redacted] | | | | | | | | | | | |
| 202 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | | 143 | 7 020,73 | | | | | | | | | -7 020,73 |
| | VV | | zárubně | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,25*((0,9+1,97*2)*4+(0,7+1,97*2)) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,275*(0,7*1,97*2)*2 | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,3*((0,7+1,97*2)+(0,8+1,97*2)*4+(0,9+1,97*2)*5+(1,1+1,97*2)*2+(1,8+1,97*2)) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,375*((0,8+1,97*2)+(1,1+1,97*2)*10+(0,9+1,97*2)) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | | 143 | 7 020,73 | | | | | | | | | -7 020,73 |
| | Online PSC | | https://podmenu.urs.cz/item/CS URS 2022 02/783315101 | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | zárubně | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,25*((0,9+1,97*2)*4+(0,7+1,97*2)) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,275*(0,7*1,97*2)*2 | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,3*((0,7+1,97*2)+(0,8+1,97*2)*4+(0,9+1,97*2)*5+(1,1+1,97*2)*2+(1,8+1,97*2)) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,375*((0,8+1,97*2)+(1,1+1,97*2)*10+(0,9+1,97*2)) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | | 143 | 7 020,73 | | | | | | | | | -7 020,73 |
| | Online PSC | | https://podmenu.urs.cz/item/CS URS 2022 02/783317101 | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | zárubně | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,25*((0,9+1,97*2)*4+(0,7+1,97*2)) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,275*(0,7*1,97*2)*2 | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,3*((0,7+1,97*2)+(0,8+1,97*2)*4+(0,9+1,97*2)*5+(1,1+1,97*2)*2+(1,8+1,97*2)) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | 0,375*((0,8+1,97*2)+(1,1+1,97*2)*10+(0,9+1,97*2)) | | | | | | | | | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | |
| | | | | | | | | 126 | K | 766682111 | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | kus | 14,000 | [redacted] | 28 644,00 | 28 644,00 |
| | | | | | | | | 130 | K | 766682112 | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm | kus | 10,000 | | 20 460,00 | 20 460,00 |
| | | | | | | | | 3400 | M | 3400 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž 100/900/1970 mm | kus | 4,000 | | 29 592,00 | 29 592,00 |
| | | | | | | | | 127 | M | 55331431 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž 150/700/1970 mm | kus | 1,000 | | 6 985,00 | 6 985,00 |
| | | | | | | | | 129 | M | 55331437 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž 150/800/1970 mm | kus | 2,000 | | 14 190,00 | 14 190,00 |
| | | | | | | | | 3700 | M | 3700 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž 150/900/1970 mm | kus | 5,000 | | 37 360,00 | 37 360,00 |

# Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A

| Č. ZL | 4 |
|---|---|

| Odpočet | | | | | | | | Připočet | | | | | | | | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č | | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem | č | | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem |
| | | | | | | | | 3800 | M | 3800 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž 150/1100/1970 mm | kus | 2,000 | [redacted] | 17 654,00 | 17 654,00 |
| | | | | | | | | 3900 | M | 3900 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž225/800/1970 mm | kus | 1,000 | | 7 451,00 | 7 451,00 |
| | | | | | | | | 4000 | M | 4000 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž 150/1100/1970 mm | kus | 9,000 | | 79 443,00 | 79 443,00 |
| | | | | | | | | 4001 | M | 4001 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž 225/1100/1970 mm | kus | 1,000 | | 10 163,00 | 10 163,00 |
| | | | | | | | | 4200 | M | 4200 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž 150/1800/1970 mm | kus | 1,000 | | 12 637,00 | 12 637,00 |
| | | | | | | | | 1000 | M | 1000 | Příplatek k zárubním za povrchovou úpravu lakováním (zárubně jednokřídlé a tloušťky stěny do 150mm) | kus | 28,000 | | 44 240,00 | 44 240,00 |
| | | | | | | | | 1000 | M | 1000 | Příplatek k zárubním za povrchovou úpravu lakováním (zárubně dvoukřídlé a širší než 150mm) | kus | 4,000 | | 11 160,00 | 11 160,00 |

Profil zárubně

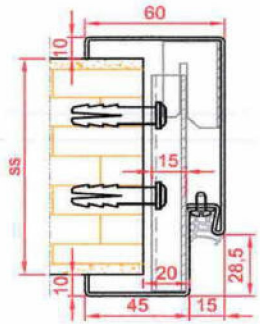


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | |
| 14 | K | 045303000 | Koordinační činnost | % | 6,120 | 1 486 | 9 096,11 | 14 | K | 045303000 | Koordinační činnost | % | 6,120 | 3 200 | 19 582,71 | 10 486,60 |
| **Odpočet celkem** | | | | | | | **157 725,30** | **Připočet celkem** | | | | | | | **339 561,71** | 181 836,41 |

| Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A | 5 |
|---|---|
| **ZMĚNOVÝ LIST** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pro :** | **Karlovarský kraj**<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary | | **Datum vydání požadavku :** | **15.12.2023** |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>x | faxem | osobně |

| | |
|---|---|
| **Název části stavby dotčené změnou:** | ÚT - rozvody stoupacího vedení |
| **Odkazy na:** | |
| specifikaci | |
| výkresy | ÚT vytápění |
| na zpracované podklady | |
| na jinou část podkladů smlouvy | |

**Popis změny, technické řešení:**

Výměna potrubí nad rámec zadávací dokumentace. Výměna stávajících stoupaček z oceli za stoupačky z měděného potrubí a doplnění stoupaček o uzávěry.

**Zdůvodnění změny:**

Stavební dokončení celého patra včetně napojení ve vazbě, na již rekonstruované oddělení ODN ve 3.NP.

Ano

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Počet připojených listů specifikací :** | – | | **Počet připojených listů výkresů:** | – |
| **Oznámení změny je vyvoláno :** | záměrem objednatele | záměrem provozovatele<br>x | chybou v dokumentaci | chybou zhotovitele | vyšší mocí nebo jinou okolností |

**Změnový list zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | **Datum :** | |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>x | faxem | osobně |

**Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

Počet příloh / početlistů: 1/1

| **Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:** | | **Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:** | |
|---|---|---|---|
| odpočet celkem: | 139 329,19 | Termín: | ANO |
| přípočet celkem: | 396 354,49 | Cena: | ANO |
| **cenový rozdíl:** | **257 025,30** | | |

| | |
|---|---|
| **Předal :** | **Vyjádření zhotovitele stavby:** [redacted] |
| Datum: | BAUSTAV a.s. [redacted]<br>Datum: 6. 3 |
| **Vyjádření projektanta (autorského dozoru)** [redacted] | **Vyjádření provozovatele:** [redacted] |
| JURICA a.s. [redacted]<br>Datum: 6.3.2024 | PentaHospitals - Nemocnice Sokolov [redacted]<br>Datum: 6. 3. |
| **Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar** | **Vyjádření objednatele:** [redacted] |
| INSCAN s.r.o. [redacted]<br>Datum: 6. 3. 2024 | Karlovarský kraj [redacted]<br>Datum: 6.3.2024 |

# Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A

| Č. ZL | 5 |
|---|---|

## Odpočet

| č | | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | |
| 11 | K | 733113113 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15 | kus | [redacted] | | 16 794,00 |
| 14 | K | 733322301 | Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 16/2,0 | m | | | 45 150,00 |
| 15 | K | 733322302 | Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,3 | m | | | 3 230,00 |
| 16 | K | 7338R-01 | Přechodky pro připojení nových rozvodu na ocelové stoupačky - Ocel 15/PEX 20 (dod+mtž) | kus | | | 16 170,00 |
| 17 | K | 7338R-02 | Přechodky pro připojení nových rozvodu na ocelové stoupačky - Ocel 15/PEX 16 (dod+mtž) | kus | | | 4 312,00 |
| 18 | K | 7338R-03 | Přechodky pro připojení nových rozvodu na ocelové stoupačky - Ocel 15/Cu 18 (dod+mtž) | kus | | | 2 200,00 |
| 20 | K | 7338R-04 | Kolenová garnitura RM 128 (16x2)x16/300 (dod+mtž) | kus | | | 34 968,00 |
| 21 | K | 7338R-05 | Kolenová garnitura RM 128 (16x2)x16/700 (dod+mtž) | kus | | | 3 630,00 |
| 22 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | | | 440,00 |
| 23 | K | 998733181 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | | | 4 400,00 |
| | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | |
| 14 | K | 045303000 | Koordinační činnost | % | | | 8 035,19 |
| **Odpočet celkem** | | | | | | | **139 329,19** |

## Přípočet

| č | | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Rozdíl Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | |
| | | | | | [redacted] | | | -16 794,00 |
| | | | | | | | | -45 150,00 |
| | | | | | | | | -3 230,00 |
| | | | | | | | | -16 170,00 |
| | | | | | | | | -4 312,00 |
| | | | | | | | | -2 200,00 |
| | | | | | | | | -34 968,00 |
| | | | | | | | | -3 630,00 |
| 10 | K | 733110803 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových | m | 264,000 | | | 13 200,00 |
| 11b | K | 733191924 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 20 | kus | 48,000 | | | 18 000,00 |
| 13 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | m | 254,000 | | | 254,00 |
| 50 | K | 230120041 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 | m | 254,000 | | | 12 827,00 |
| 99 | K | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm | m | 160,000 | | | 79 360,00 |
| 12 | K | 733222103 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 168,000 | | | 110 544,00 |
| 6 | K | 733222104 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1 | m | 96,000 | | | 60 384,00 |
| 19 | K | 733811231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru | m | 85,000 | | | 14 025,00 |
| 100 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 48,000 | | | 21 024,00 |
| 22 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,426 | | | 731,50 |
| 23 | K | 998733181 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,426 | | | 7 315,00 |
| | | 734 | Přeložka stoupačky | | | | | |
| 100 | K | 733322224 | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE–Xa) spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 32/4,4 | m | 14,000 | | | 11 508,00 |
| 102 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 2,000 | | | 1 256,00 |
| 21 | M | 28616070 | garnitura připojovací kolenová systém napojení otopných těles 17/250mm | kus | 4,000 | | | 988,00 |
| 102 | M | 19761076 | přechod mosaz pro topení a pitnou vodu 32xR1 | kus | 2,000 | | | 1 084,00 |
| 103 | M | 28616467 | koleno 90° plastové PPSU pro topení a pitnou vodu 32mm | kus | 8,000 | | | 3 536,00 |
| 104 | M | 28616137 | tvarovka T-kus systém napojení otopných těles a podlahového topení 32/20/32mm | kus | 4,000 | | | 3 048,00 |
| 105 | K | 734209115 | Montáž armatury | kus | 18,000 | | | 2 574,00 |
| 22 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,012 | | | 33,00 |
| 23 | K | 998733181 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku | t | 0,012 | | | 330,00 |
| | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | |
| 53 | K | 783614651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 95,000 | | | 1 805,00 |
| 54 | K | 783617611 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní | m | 115,000 | | | 4 830,00 |
| 1000 | K | 1000 | Projektová dokumentace | | | | | |
| | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | |
| 14 | K | 045303000 | Koordinační činnost | % | 6,120 | 3 735 | 22 857,99 | 14 822,80 |
| **Přípočet celkem** | | | | | | | **396 354,49** | **257 025,30** |

| Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A | 6 |
|---|---|
| **ZMĚNOVÝ LIST** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pro :** | **Karlovarský kraj**<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary | | **Datum vydání požadavku :** | **15.12.2023** |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>x | faxem | osobně |

| | |
|---|---|
| **Název části stavby dotčené změnou:** | Vnitřní dveře do pokojů |
| **Odkazy na:** | |
| specifikaci | |
| výkresy | |
| na zpracované podklady | |
| na jinou část podkladů smlouvy | |

**Popis změny, technické řešení:**

Změna standardu dveří oproti zadání. U dveří do pokojů klientů nově požadavek na akustiku min 27 dB. U všech dodávaných dveří je řešena změna kování na objektové provedení.

**Zdůvodnění změny:**

Ve vazbě na provoz a způsob využití dveří byla zvolena vhodnější varianta.

**Vliv změny na projektovou dokumentaci:**

NE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Počet připojených listů specifikací :** | – | | **Počet připojených listů výkresů:** | – | |
| **Oznámení změny je vyvoláno :** | záměrem objednatele | záměrem provozovatele<br>X | chybou v dokumentaci | chybou zhotovitele | vyšší mocí nebo jinou okolností |

**Změnový list zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | **Datum :** | |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>X | faxem | osobně |

**Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

Počet příloh / početlistů: 1/1

| **Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:** | |
|---|---|
| odpočet celkem: | 0,00 |
| přípočet celkem: | 35 332,65 |
| **cenový rozdíl:** | **35 332,65** |

**Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:**

Termín: NE

Cena: ANO

| | |
|---|---|
| **Předal :** | **Vyjádření zhotovitele stavby:** [redacted] |
| Datum: | BAUSTAV a.s. [redacted]<br>Datum: 6. [redacted] |
| **Vyjádření projektanta (autorského dozoru)** [redacted] | **Vyjádření provozovatele** [redacted] |
| JURICA a.s. [redacted]<br>Datum: 6.3.2024 | PentaHospitals - Nemocnice Sokolov [redacted]<br>Datum: 6. 3. 2[redacted] |
| **Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar** | **Vyjádření objednatele: Ing. Aleš Švajdler** |
| INSCAN s.r.o. [redacted]<br>Datum: 6. 3. 2024 | Karlovarský kraj [redacted]<br>Datum: 6.3.2024 |

# Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A

**Č. ZL** 6

| Odpočet č | | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem | Připočet č | | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Rozdíl Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | K | 1 | Příplatek ke dveřím a zárubním za akustické provedení 27dB - pro dveře do pokojů klientů | kus | 10,000 | 2 300 | [redacted] | 23 000,00 |
| | | | | | | | | | | | *Dveře označení - číslo místností* | | | | | |
| | | | | | | | | | | | *B4 - 232* | *1* | | | | |
| | | | | | | | | | | | *B4 - 233* | *1* | | | | |
| | | | | | | | | | | | *B4 - 234* | *1* | | | | |
| | | | | | | | | | | | *B4 - 235* | *1* | | | | |
| | | | | | | | | | | | *B4 - 236* | *1* | | | | |
| | | | | | | | | | | | *B4 - 237* | *1* | | | | |
| | | | | | | | | | | | *B4 - 238* | *1* | | | | |
| | | | | | | | | | | | *B4 - 239* | *1* | | | | |
| | | | | | | | | | | | *B4 - 240* | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | *B4 - 222* | *1* | | | | |
| | | | | | | | | 2 | K | 2 | Příplatek za dodávku za kování Twin vision H1802M4 - klíč, povrch nerez | kus | 25,000 | 199 | | 4 975,00 |
| | | | | | | | | 3 | K | 3 | Příplatek za dodávku za kování Twin vision H1802M4 - provedení WC, povrch nerez | kus | 7,000 | 760 | | 5 320,00 |
| | | | | | | | | | | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | |
| | | | | | | | | 14 | K | 045303000 | Koordinační činnost | % | 6,120 | 333 | | 2 037,65 |

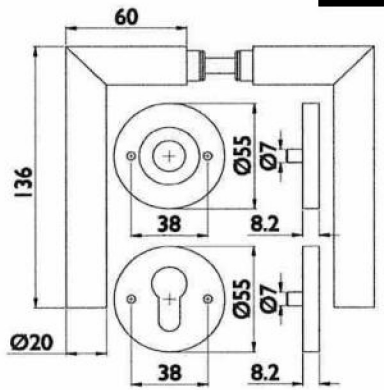


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Odpočet celkem** | **0,00** | **Připočet celkem** | **35 332,65** | 35 332,65 |

| Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A | 7 |
|---|---|
| **ZMĚNOVÝ LIST** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pro :** | **Karlovarský kraj**<br>Závodní 353/88<br>360 06 Karlovy Vary | | **Datum vydání požadavku :** | **15.01.2024** |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>x | faxem | osobně |

| | |
|---|---|
| **Název části stavby dotčené změnou:** | VZT - napojení na jednotku |
| **Odkazy na:** | |
| specifikaci | |
| výkresy | |
| na zpracované podklady | |
| na jinou část podkladů smlouvy | |

**Popis změny, technické řešení:**

Napojení rozvodů na VZT jednotku.

**Zdůvodnění změny:**

Práce a dodávky pro zprovoznění VZT jednotky. Nebylo součástí projektové dokumentace a výkazu výměr.

**Vliv změny na projektovou dokumentaci:**

Ano

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Počet připojených listů specifikací :** | – | | **Počet připojených listů výkresů:** | | – |
| **Oznámení změny je vyvoláno :** | záměrem objednatele<br>x | záměrem provozovatele<br>x | chybou v dokumentaci | chybou zhotovitele | vyšší mocí nebo jinou okolností |

**Změnový list zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OHODNOCENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | **Datum :** | |
| **Odesláno / Předáno** | poštou | e-mailem<br>X | faxem | osobně |

**Přílohu změnového listu, ohodnocení zpracoval:**

BAU-STAV a.s.

Počet příloh / početlistů: 1/1

| **Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:** | | **Předpokládaný vliv na termín a cenu díla:** | |
|---|---|---|---|
| odpočet celkem: | 0,00 | Termín: | ANO |
| přípočet celkem: | 233 822,75 | Cena: | ANO |
| **cenový rozdíl:** | **233 822,75** | | |

| | |
|---|---|
| **Předal :** | **Vyjádření zhotovitele stavby:** [redacted] |
| Datum: | BAUSTAV a.s. [redacted]<br>Datum: 6. [redacted] |
| **Vyjádření projektanta (autorského dozoru)** [redacted] | **Vyjádření provozovatele** [redacted] |
| JURICA a.s. [redacted]<br>Datum: 6.3.2024 | PentaHospitals - Nemocnice Sokolov [redacted]<br>Datum: 6.3.2024 [redacted] |
| **Vyjádření technického dozoru stavebníka: Jiří Fejfar** | **Vyjádření objednatele:** [redacted] |
| INSCAN s.r.o. [redacted]<br>Datum: 6.3.2024 | Karlovarský kraj [redacted]<br>Datum: 6.3.20[redacted] |

# Nemocnice Sokolov Pavilon D/2.NP - ONP A

**Č. ZL** 7

| Odpočet č | | kod | Specifikace | m.j. | mn. | j. cena | Celkem | Připočet č | | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Rozdíl Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | D | 721 | **Zdravotechnika - vnitřní kanalizace** | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | K | 721174041 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 | m | 5,000 | | | 2 965,00 |
| | | | | | | | | | Online PSC | | https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174041 | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | K | 721229111 | Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 | kus | 1,000 | | | 99,70 |
| | | | | | | | | | Online PSC | | https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721229111 | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | M | 1258 | zápachová uzávěra HL 138 | kus | 1,000 | | | 1 062,00 |
| | | | | | | | | | D | 741 | **Elektroinstalace - silnoproud** | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | K | 741120005 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2 | m | 140,000 | | | 2 100,00 |
| | | | | | | | | | Online PSC | | https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120005 | | | | | |
| | | | | | | | | 5 | M | dod741221 | CHAH-R 16 ZŽ B2ca, s1, d0 | m | 140,000 | | | 12 460,00 |
| | | | | | | | | 6 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 50,000 | | | 1 300,00 |
| | | | | | | | | | Online PSC | | https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016 | | | | | |
| | | | | | | | | 7 | M | dod74107 | CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0 | m | 50,000 | | | 1 800,00 |
| | | | | | | | | 8 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 90,000 | | | 2 610,00 |
| | | | | | | | | | Online PSC | | https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122031 | | | | | |
| | | | | | | | | 9 | M | dod741071 | CXKH-R 5C*6 B2ca, s1, d0 | m | 90,000 | | | 12 780,00 |
| | | | | | | | | 10 | K | 741200 | Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2 | kus | 10,000 | | | 390,00 |
| | | | | | | | | 11 | M | dod74110 | Svorka ochranného pospojení 4-16mm2 (U, UM, KP, ,P, DV, TOP, VZT, ZP atp...) | ks | 10,000 | | | 440,00 |
| | | | | | | | | 12 | K | 741210102 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg | kus | 2,000 | | | 12 840,00 |
| | | | | | | | | | Online PSC | | https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210102 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 | M | 7412-RMS | Doplnění rozvaděče RMS 2.2 (MDO/DO), přesný výkaz viz. níže | kus | 1,000 | | | 1 242,00 |
| | | | | | | | | 14 | M | 7412-R-VZP | Rozvaděč R-VZT3B, přesný výkaz viz. níže | kus | 1,000 | | | 14 724,00 |
| | | | | | | | | 15 | K | 74180013 | Montáž kabelového žlabu 50x62x0,7 | m | 20,000 | | | 3 720,00 |
| | | | | | | | | 16 | M | dod80023 | Kabelový žlab žárový zinek 50x62x0,7 s integrovanou spojkou | m | 20,000 | | | 5 080,00 |
| | | | | | | | | 17 | M | dod80033 | Oblouk 90° kabelového žlabu 50x62 žárový zinek | kus | 1,000 | | | 418,00 |
| | | | | | | | | 18 | M | dod8005 | Montážní bod kabelového žlabu 50x62x0,8, sestava dle zvyklostí konkrétního výrobce montáž žlabu v rámci pódy (závitové tyče, příčníky, šrouby, matky atp...) | kus | 20,000 | | | 2 700,00 |
| | | | | | | | | 19 | K | 741920301 | Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,1 m2 | kus | 2,000 | | | 3 080,00 |
| | | | | | | | | | Online PSC | | https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920301 | | | | | |
| | | | | | | | | 20 | K | 998741202 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 3,000 | | | 2 330,52 |
| | | | | | | | | | D | 751 | **Vzduchotechnika** | | | | | |
| | | | | | | | | 21 | K | 751-R0101 | D+M – Tepelná izolace tl. 20 mm s hliníkovou folií (tř. r. A1) | m2 | 80,000 | | | 58 720,00 |
| | | | | | | | | 22 | K | 751-R0102 | D+M - komunikační kabel ke kondenzační jednotce (LG UU30W U44) | m | 10,000 | | | 1 430,00 |
| | | | | | | | | 23 | K | 751-R0103 | D+M– řídící box VZT pro řízení přívodní teploty vzduchu + el. deska pro připojení k MAR, včetně propojení a kabeláže | kpl | 1,000 | | | 36 908,00 |
| | | | | | | | | 24 | K | 751-R0104 | D+M chladiva R410A 2000g, zprovoznění chladící jednotky vč. revize | kpl | 1,000 | | | 7 055,00 |
| | | | | | | | | 25 | K | 751-R0105 | Připojení VZT jednotky na rozvod topení, zprovoznění směšovacího uzlu (součinnost UT+dodavatel VZT) | kpl | 1,000 | | | 6 420,00 |
| | | | | | | | | 26 | K | 751-R0106 | Připojení VZT jednotky na rozvod chlazení | kpl | 1,000 | | | 1 435,00 |
| | | | | | | | | 27 | K | 751-R0107 | D+M pancéřová hadice 3/4" dl. 750mm vč. šroubení a těsnění | kpl | 2,000 | | | 1 814,00 |
| | | | | | | | | 28 | K | 751-R0108 | D+M pancéřová hadice 1/2" dl. 750mm vč. šroubení a těsnění | kpl | 2,000 | | | 1 928,00 |
| | | | | | | | | 29 | K | 751-R0109 | D+M kabel J-H(ST) 4x2x0,8 (ovládání VZT připojení termostatu) | m | 70,000 | | | 3 640,00 |
| | | | | | | | | 31 | K | 751-R0111 | Připojení klapek VZT1 a VZT2 na EPS | kus | 2,000 | | | 1 284,00 |
| | | | | | | | | 32 | K | 751-R0114 | Doprava materiálu na stavbu a přesuny hmot na stavbě – NAVÝŠENÍ | kpl | 1,000 | | | 4 080,00 |
| | | | | | | | | 33 | K | 998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | % | 6,000 | | | 7 482,84 |
| | | | | | | | | | D | VRN4 | **Inženýrská činnost** | | | | | |
| | | | | | | | | 35 | K | 044002000 | Revize | hod | 2,000 | | | 4 000,00 |
| | | | | | | | | 36 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % | 6,120 | | | 13 484,69 |
| **Odpočet celkem** | | | | | | | **0,00** | **Připočet celkem** | | | | | | | **233 822,75** | 233 822,75 |

[redacted]
