**Název Díla: II/284 Nová Paka - Lomnická ulice**

## HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

| Objekt | Pořad. č. položky/č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SO - 101 | | Komunikace - vozovka sil. II/284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO - 102 | | Chodníky pro pěší | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO - 103 | | Parkoviště a úpravy MK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO - 105 | | Dopravní opatření a objížďky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO - 110 | | Dopravní značení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO - 301 | | Kanalizace dešťová | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO - 302 | | Vodovod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO - 303 | | Kanalizace splašková | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO - 404 | | Rezervní chráničky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO - 501 | | Plynovod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO - 801 | | Vegetační úpravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Termín zahájení stavby:** | **01.04.2024** |
| **Termín ukončení stavebních prací 2024** | **20.10.2024** |
| **Termín zahájení přerušení díla v roce 2024** | **21.10.2024** |
| **Termín ukončení přerušení díla v roce 2025** | **30.03.2025** |
| **Termín zahájení stavebních prací 2025** | **31.03.2025** |
| **Termín dokončení stavebních prací:** | **26.10.2025** |
| **Termín dokončení díla** | **07.12.2025** |
| **Doba realizace Díla (Celkem bez přerušení plnění):** | **59 týdnů + 6 týdnů** |

Ladislav Stuchlík

Digitálně podepsal Ladislav Stuchlík
Datum: 2024.03.08 10:00:29 +01'00'

**Stavba se skládá ze 2 částí HMG. Pro každý rok je nutno vypracovat HMG na samostatném listu viz dolní lišta souboru EXCEL (HMG 2024, HMG 2025)**

**Zhotovitel (název a sídlo)**

**Schválil (jméno a podpis)**

## Název Díla: II/284 Nová Paka Lomnická ulice - rok 2024

# HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

| Objekt | Pořad. č. položky/č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |
|---|---|---|---|
| SO - 101 | Komunikace - vozovka sil II/284 | | |
| | 1/11332R | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného | |
| | 4/11353 | Odstranění chodníkových kamenných obrubníků | |
| | 5/11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových | |
| | 7/12373R | Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř.I | |
| | 8/13173R | Hloubení jam zapaž i nezapaž tř.I | |
| | 10/17130 | Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhutněním | |
| | 14/21263 | Trativody komplet z trub z plast hmot DN do 150mm | |
| | 18/56333+19/56335 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti | |
| | 26/574B34 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO11+, 11S tl.40mm | |
| | 27/574C56 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl.60mm | |
| | 29/574E46 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl.50mm | |
| | 30/58222 | Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC | |
| | 33/89712 | Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců | |
| | 37/917426 | Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 250mm | |
| SO - 102.1 | Chodníky pro pěší - uznatelné | | |
| | 1/11120 | Odstranění křovin | |
| | 4/11318R | Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic | |
| | 5/11332R | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného | |
| | 7/12373R | Odkop na spod stavbu silnic a železnic tř.I | |
| | 8/13173R | Hloubení jam zapaž i nepaž tř.I | |
| | 11/17481 | Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů | |
| | 19/327325 | Zdi opěrné, zárubní, nábřežní ze železového betonu do C30/37 | |
| | 23/56336 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 300mm | |
| | 24/58221 | Dlážděné kryty z drobných kostek do lože kameniva | |
| | 25/582311 | Dlážděné kryty z mozaik kostek jednobarevných do lože kameniva | |
| | 35/917424 | Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 150mm | |
| SO - 102.2 | Chodníky pro pěší - neuznatelné | | |
| | 20/43419 | Schodišťové stupně z dílců kamenných | |
| SO - 103 | Parkoviště a úpravy MK | | |
| | 2/11332R | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného | |
| | 5/11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových | |
| | 6/12373R | Odkop pro spod. stavbu silnic a železnic tř.I | |
| | 7/13273R | Hloubení rýh do 2m paž i nepaž tř.I | |
| | 14/56335 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 250mm | |
| | 17/574A34 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40mm | |
| | 18/574E66 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 70mm | |
| | 24/917424+25/917426 | Chodníkové obruby z kamenných obrubníků | |
| SO - 105 | Dopravní opatření a objížďky | | |
| SO - 110 | Dopravní značení | | |
| SO - 301 | Kanalizace dešťová - úsek D1 od KŠ 13, D1-III, D2 včetně přípojek | | |
| SO - 302 | Vodovod - úsek st. 0,415 - 0,666 včetně přípojek | | |
| SO - 303 | Kanalizace splašková - stoka S2, S2-I a S2-II, S3 | | |
| SO - 404 | Rezervní chráničky | | |
| SO - 501 | Plynovod | | |
| SO - 801 | Vegetační úpravy | | |

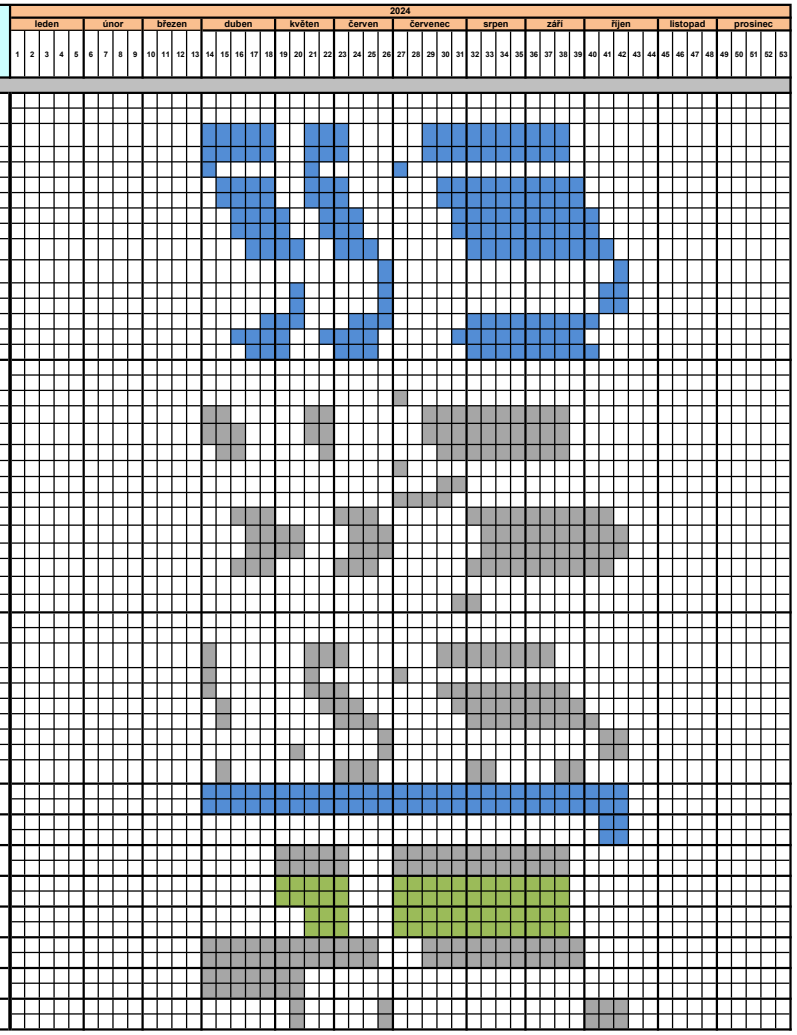


| | |
|---|---|
| Termín zahájení stavby: | 01.04.2024 |
| Termín ukončení stavebních prací v roce 2024 | 20.10.2024 |
| Termín zahájení přerušení díla v roce 2024 | 21.10.2024 |
| Nejzazší termín pro uvedení do provozu (předčasného užívání) | 31.10.2024 |
| Doba realizace stavby v roce 2024 | 29 týdnů |

! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!

## Název Díla: II/284 Nová Paka Lomnická ulice - rok 2025

## HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

| Objekt | Pořad. č. položky/č. položky | Činnost | Zhotovitel Podzhotovitelé |
|---|---|---|---|
| SO - 101 | | **Komunikace - vozovka sil II/284** | |
| | 1/11332R | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného | |
| | 4/11353 | Odstranění chodníkových kamenných obrubníků | |
| | 5/11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových | |
| | 7/12373R | Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř.I | |
| | 8/13173R | Hloubení jam zapaž i nezapaž tř.I | |
| | 10/17130 | Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhutněním | |
| | 14/21263 | Trativody komplet z trub z plast hmot DN do 150mm | |
| | 18/56333+19/56335 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrtl | |
| | 26/574B34 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO11+, tl.40mm | |
| | 27/574C56 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S tl.60mm | |
| | 29/574E46 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl.50mm | |
| | 30/58222 | Dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC | |
| | 33/89712 | Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců | |
| | 37/917426 | Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 250mm | |
| SO - 102.1 | | **Chodníky pro pěší - uznatelné** | |
| | 1/11120 | Odstranění křovin | |
| | 4/11318R | Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic | |
| | 5/11332R | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného | |
| | 7/12373R | Odkop na spod stavbu silnic a železnic tř.I | |
| | 8/13173R | Hloubení jam zapaž i nepaž tř.I | |
| | 11/17481 | Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů | |
| | 19/327325 | Zdi opěrné, zárubní, nábřežní ze železového betonu do C30/37 | |
| | 23/56336 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrtl tl. do 300mm | |
| | 24/58221 | Dlážděné kryty z drobných kostek do lože kameniva | |
| | 25/582311 | Dlážděné kryty z mozaik kostek jednobarevných do lože kameniva | |
| | 35/917424 | Chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř 150mm | |
| SO - 102.2 | | **Chodníky pro pěší - neuznatelné** | |
| | 20/43419 | Schodišťové stupně z dílců kamenných | |
| SO - 103 | | **Parkoviště a úpravy MK** | |
| | 2/11332R | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného | |
| | 5/11372 | Frézování zpevněných ploch asfaltových | |
| | 6/12373R | Odkop pro spod. stavbu silnic a železnic tř.I | |
| | 7/13273R | Hloubení rýh do 2m paž i nepaž tř.I | |
| | 14/56335 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrtl tl. do 250mm | |
| | 17/574A34 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 40mm | |
| | 18/574E66 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 70mm | |
| | 24/917424+25/917426 | Chodníkové obruby z kamenných obrubníků | |
| SO - 105 | | **Dopravní opatření a objížďky** | |
| SO - 110 | | **Dopravní značení** | |
| SO - 301 | | **Kanalizace dešťová - úsek D1 od KŠ 13, D1-III, D2 včetně přípojek** | |
| SO - 302 | | **Vodovod - úsek st. 0,415 - 0,666 včetně přípojek** | |
| SO - 303 | | **Kanalizace splašková - stoka S2, S2-I a S2-II, S3** | |
| SO - 404 | | **Rezervní chráničky** | |
| SO - 501 | | **Plynovod** | |
| SO - 801 | | **Vegetační úpravy** | |

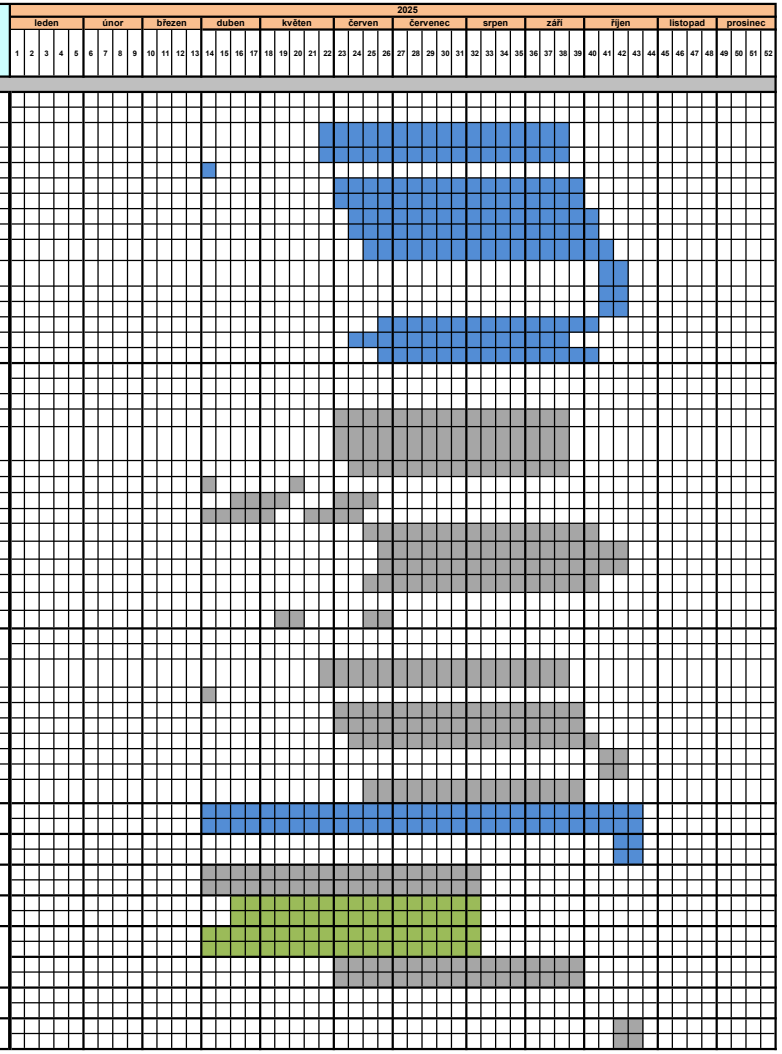


| | |
|---|---|
| **Termín ukončení přerušení díla v roce 2025** | **30.03.2025** |
| **Termín zahájení stavebních prací v roce 2025:** | **31.03.2025** |
| **Termín ukončení stavebních prací v roce 2025** | **26.10.2025** |
| **Termín dokončení díla** | **07.12.2025** |
| **Doba realizace stavby v roce 2025** | **30 týdnů** |

**! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!**
