Orientační HMG - může být upraven dle místních podmínek, na základě požadavků, nebo dohody s objednatelem

Popis	předpokládané datum	dnů	týden
Termín dle SoD k přejímce do ZP	15.4.2024 - 15.1.2025	275	39
Termín dle SoD na kompletní předání díla	15.4.2024 - 15.3.2025	334	48
Podpis SOD	15.04.2024	1	0,2
Objednání materiálu	15.04.2024	1	0,2
Dodací lhůta - předpoklad 10-12 týdnů	15.4.2024 - 1.7.2024	77	11
Legislativní činnost - zajištění případných povolení		70	10
Naskladnění materiálu	1.7.2024 - 3.7.2024	3	0,6
Předání staveniště - po naskladnění materiálu	3.7.2024 - 4.7.2024	2	0,4
Výměna svítidel	4.7.2024 - 20.12.2024	169	24
Výměna stožárů - průběžně s výměnou svítidel	15.7.2024 - 30.11.2024	138	20
Revizní zpráva	průběžně - 31.12.2024	176	25
Předání objednatel do zkušebního provozu	do 10.1.2025	7	1
Zpracování dokumentace pro přejímku	20.12.2024 - 7.1.2025	28	4
Zkušební provoz	10.1.2025 - 10.3.2025	59	8
Předání a převzetí kompletního díla	10.3.2025 - 12.3.2025	2	0,3
	do zkušebního provozu	270	38
	kompletní předání	331	47

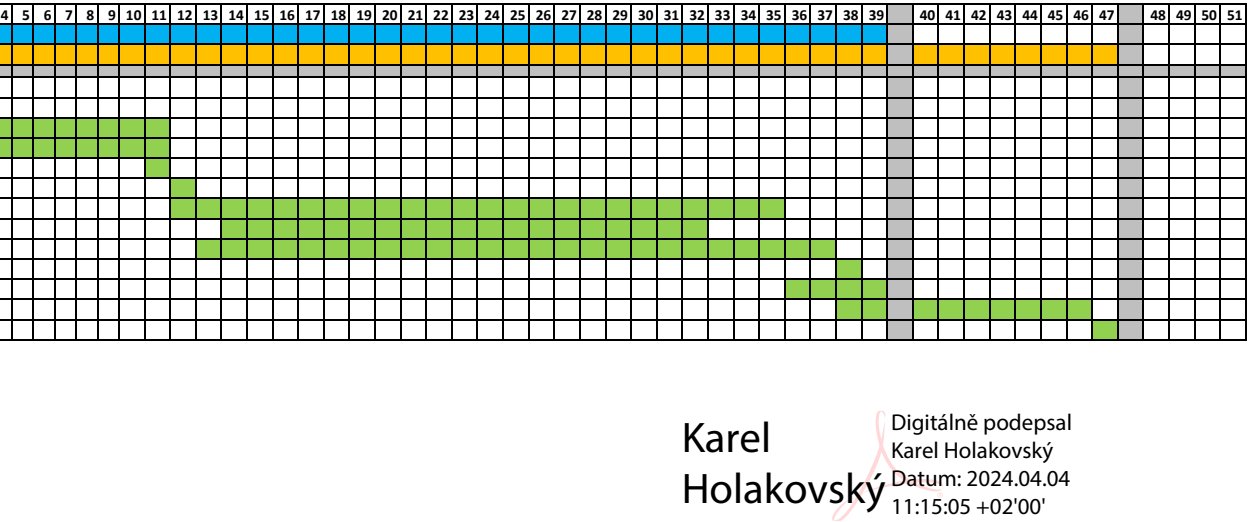

Karel Holakovský

Digitálně podepsal Karel Holakovský
Datum: 2024.04.04 11:15:05 +02'00'
