ID		Řadí	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Kritický	Odchylka dokončení
952			SO-02-20-01	Dřík	8 dny	04.11. 23	11.11. 23	951	953;954	Ne	0 dny
953			SO-02-20-01	Zpětný zásyp	10 dny	12.11. 23	21.11. 23	952		Ne	0 dny
954			SO-02-20-01	Ložiskové bločky	3 dny	12.11. 23	14.11. 23	952		Ne	0 dny
955			SO-02-20-01	**P6**	**120 dny**	**02.08. 23**	**29.11. 23**		967	**Ne**	**0 dny**
967			SO-02-20-01	Ložiska P8-P6	8 dny	30.11. 23	07.12. 23	955		Ne	0 dny
968			SO-02-20-01	**NK2**	**160 dny**	**06.08. 23**	**12.01. 24**			**Ne**	**0 dny**
969			SO-02-20-01	**P5**	**124 dny**	**06.08. 23**	**07.12. 23**			**Ne**	**0 dny**
970			SO-02-20-01	**Založení**	**19 dny**	**06.08. 23**	**24.08. 23**			**Ne**	**0 dny**
971			SO-02-20-01	Piloty	4 dny	06.08. 23	09.08. 23	957	972;973	Ne	0 dny
972			SO-02-20-01	Zápory	6 dny	15.08. 23	20.08. 23	971;958	973;974	Ne	0 dny
973			SO-02-20-01	Výkop	3 dny	21.08. 23	23.08. 23	972	974	Ne	0 dny
974			SO-02-20-01	Odbourání Náv pilot	1 den	24.08. 23	24.08. 23	973	976	Ne	0 dny
975			SO-02-20-01	**Základ**	**67 dny**	**14.09. 23**	**19.11. 23**			**Ne**	**0 dny**
976			SO-02-20-01	Podkład	2 dny	14.09. 23	15.09. 23	974;962	977;969	Ne	0 dny
977			SO-02-20-01	Základ	8 dny	12.11. 23	19.11. 23	976;963	979;989	Ne	0 dny
978			SO-02-20-01	Dřík	8 dny	20.11. 23	27.11. 23	977	979;980	Ne	0 dny
979			SO-02-20-01	Zpětný zásyp	10 dny	28.11. 23	07.12. 23	978		Ne	0 dny
980			SO-02-20-01	Ložiskové bločky	3 dny	28.11. 23	30.11. 23	978		Ne	0 dny
981			SO-02-20-01	**P4**	**130 dny**	**10.08. 23**	**17.12. 23**			**Ne**	**0 dny**
982			SO-02-20-01	**Založení**	**23 dny**	**10.08. 23**	**01.09. 23**			**Ne**	**0 dny**
983			SO-02-20-01	Piloty	5 dny	10.08. 23	14.08. 23	971	984;995	Ne	0 dny
984			SO-02-20-01	Zápory	7 dny	21.08. 23	27.08. 23	983;972	985;996	Ne	0 dny
985			SO-02-20-01	Výkop	3 dny	28.08. 23	30.08. 23	984	986	Ne	0 dny
986			SO-02-20-01	Odbourání Náv pilot	2 dny	31.08. 23	01.09. 23	985	988	Ne	0 dny
987			SO-02-20-01	**Základ**	**75 dny**	**16.09. 23**	**29.11. 23**			**Ne**	**0 dny**
988			SO-02-20-01	Podkład	2 dny	16.09. 23	17.09. 23	986;976	989;1000	Ne	0 dny
989			SO-02-20-01	Základ	10 dny	20.11. 23	29.11. 23	988;977	990;1001	Ne	0 dny
990			SO-02-20-01	Dřík	8 dny	30.11. 23	07.12. 23	989	991;992	Ne	0 dny
991			SO-02-20-01	Zpětný zásyp	10 dny	08.12. 23	17.12. 23	990		Ne	0 dny
992			SO-02-20-01	Ložiskové bločky	3 dny	08.12. 23	10.12. 23	990		Ne	0 dny
993			SO-02-20-01	**P3**	**133 dny**	**15.08. 23**	**25.12. 23**			**Ne**	**0 dny**
994			SO-02-20-01	**Založení**	**23 dny**	**15.08. 23**	**06.09. 23**			**Ne**	**0 dny**
995			SO-02-20-01	Piloty	4 dny	15.08. 23	18.08. 23	983	996;1007	Ne	0 dny
996			SO-02-20-01	Zápory	6 dny	28.08. 23	02.09. 23	995;984	997;1008	Ne	0 dny
997			SO-02-20-01	Výkop	3 dny	03.09. 23	05.09. 23	996	998	Ne	0 dny
998			SO-02-20-01	Odbourání Náv pilot	1 den	06.09. 23	06.09. 23	997	1000	Ne	0 dny
999			SO-02-20-01	**Základ**	**81 dny**	**18.09. 23**	**07.12. 23**			**Ne**	**0 dny**
1000			SO-02-20-01	Podkład	2 dny	18.09. 23	19.09. 23	988;998	1001;1012	Ne	0 dny
1001			SO-02-20-01	Základ	8 dny	30.11. 23	07.12. 23	1000;989	1002;1013	Ne	0 dny
1002			SO-02-20-01	Dřík	8 dny	08.12. 23	15.12. 23	1001	1003;1004	Ne	0 dny
1003			SO-02-20-01	Zpětný zásyp	10 dny	16.12. 23	25.12. 23	1002		Ne	0 dny
1004			SO-02-20-01	Ložiskové bločky	3 dny	16.12. 23	18.12. 23	1002		Ne	0 dny
1005			SO-02-20-01	**P2**	**137 dny**	**15.08. 23**	**02.01. 24**		1007	**Ne**	**0 dny**
1006			SO-02-20-01	**Založení**	**25 dny**	**15.08. 23**	**12.09. 23**			**Ne**	**0 dny**
1007			SO-02-20-01	Piloty	4 dny	15.08. 23	22.08. 23	995	1006;1021	Ne	0 dny
1008			SO-02-20-01	Zápory	6 dny	03.09. 23	08.09. 23	1007;996	1009;1022	Ne	0 dny
1009			SO-02-20-01	Výkop	3 dny	09.09. 23	11.09. 23	1008	1010	Ne	0 dny
1010			SO-02-20-01	Odbourání Náv pilot	1 den	12.09. 23	12.09. 23	1009	1012	Ne	0 dny
1011			SO-02-20-01	**Základ**	**87 dny**	**20.09. 23**	**15.12. 23**			**Ne**	**0 dny**
1012			SO-02-20-01	Podkład	2 dny	20.09. 23	21.09. 23	1010;1000	1013;1028	Ne	0 dny
1013			SO-02-20-01	Základ	8 dny	08.12. 23	15.12. 23	1012;1001	1014;1027	Ne	0 dny
1014			SO-02-20-01	Dřík	8 dny	16.12. 23	23.12. 23	1013	1015;1016	Ne	0 dny
1015			SO-02-20-01	Zpětný zásyp	10 dny	24.12. 23	02.01. 24	1014		Ne	0 dny
1016			SO-02-20-01	Ložiskové bločky	3 dny	24.12. 23	26.12. 23	1014		Ne	0 dny
1017			SO-02-20-01	Ložiska P5-P2	10 dny	03.01. 24	12.01. 24	1005		Ne	0 dny
1018			SO-02-20-01	**NK1**	**161 dny**	**23.08. 23**	**30.01. 24**			**Ne**	**0 dny**
1019			SO-02-20-01	**P1**	**143 dny**	**23.08. 23**	**12.01. 24**			**Ne**	**0 dny**
1020			SO-02-20-01	**Založení**	**29 dny**	**23.08. 23**	**20.09. 23**			**Ne**	**0 dny**
1021			SO-02-20-01	Piloty	5 dny	23.08. 23	27.08. 23	1007	1022;1030	Ne	0 dny
1022			SO-02-20-01	Zápory	7 dny	06.09. 23	15.09. 23	1021;1008	1023;1024	Ne	0 dny
1023			SO-02-20-01	Výkop	3 dny	16.09. 23	18.09. 23	1022	1024	Ne	0 dny
1024			SO-02-20-01	Odbourání Náv pilot	2 dny	19.09. 23	20.09. 23	1023	1026	Ne	0 dny
1025			SO-02-20-01	**Základ**	**95 dny**	**22.09. 23**	**25.12. 23**			**Ne**	**0 dny**
1026			SO-02-20-01	Podkład	2 dny	22.09. 23	23.09. 23	1024;1012	1027;1038	Ne	0 dny
1027			SO-02-20-01	Základ	10 dny	16.12. 23	25.12. 23	1026;1013	1028;1039	Ne	0 dny
1028			SO-02-20-01	Dřík	8 dny	26.12. 23	02.01. 24	1027	1029;1030	Ne	0 dny
1029			SO-02-20-01	Zpětný zásyp	10 dny	03.01. 24	12.01. 24	1028		Ne	0 dny
1030			SO-02-20-01	Ložiskové bločky	3 dny	03.01. 24	05.01. 24	1028		Ne	0 dny
1031			SO-02-20-01	**OP1**	**156 dny**	**28.08. 23**	**30.01. 24**			**Ne**	**0 dny**
1032			SO-02-20-01	**Založení**	**35 dny**	**28.08. 23**	**01.10. 23**			**Ne**	**0 dny**
1033			SO-02-20-01	Piloty	7 dny	28.08. 23	08.09. 23	1021	1034	Ne	0 dny
1034			SO-02-20-01	Zápory	10 dny	16.09. 23	25.09. 23	1033;1023	1035	Ne	0 dny
1035			SO-02-20-01	Výkop	4 dny	26.09. 23	29.09. 23	1034	1036	Ne	0 dny
1036			SO-02-20-01	Odbourání Náv pilot	2 dny	30.09. 23	01.10. 23	1035	1038	Ne	0 dny
1037			SO-02-20-01	**Základ**	**97 dny**	**02.10. 23**	**06.01. 24**			**Ne**	**0 dny**
1038			SO-02-20-01	Podkład	2 dny	02.10. 23	03.10. 23	1036;1026	1039	Ne	0 dny
1039			SO-02-20-01	Základ	12 dny	26.12. 23	06.01. 24	1038;1027	1040	Ne	0 dny
1040			SO-02-20-01	Dřík	14 dny	07.01. 24	20.01. 24	1039	1041;1042	Ne	0 dny
1041			SO-02-20-01	Zpětný zásyp	10 dny	21.01. 24	30.01. 24	1040	1107	Ne	0 dny
1042			SO-02-20-01	Ložiskové bločky	3 dny	21.01. 24	23.01. 24	1040	1043	Ne	0 dny
1043			SO-02-20-01	Ložiska P1-OP1	6 dny	24.01. 24	29.01. 24	1042		Ne	0 dny
1044			SO-02-20-01	**Horní stavba**	**411 dny**	**31.07. 23**	**13.09. 24**			**Ano**	**0 dny**
1045			SO-02-20-01	**NK9**	**218 dny**	**31.07. 23**	**04.03. 24**			**Ano**	**0 dny**
1046			SO-02-20-01	Příprava podkladu	20 dny	18.08. 23	06.09. 23	761FS-12 dny	1049FS-10 dny	Ano	0 dny
1047			SO-02-20-01	**Nosná konstrukce**	**123 dny**	**31.07. 23**	**30.11. 23**			**Ano**	**0 dny**
1048			SO-02-20-01	stavba ochranného rámu	26 dny	31.07. 23	25.08. 23		1049	Ano	0 dny
1049			SO-02-20-01	Stavba skruže	30 dny	28.08. 23	26.09. 23	1048FS-10 dny;710;730;750;762F	1050	Ano	0 dny
1050			SO-02-20-01	Armatura včetně předpínání	14 dny	27.09. 23	10.10. 23	1049	1051	Ano	0 dny
1051			SO-02-20-01	Betonáže + předpínání	12 dny	04.11. 23	15.11. 23	1050	1052	Ano	0 dny
1052			SO-02-20-01	Injektáže + dobetonování	5 dny	16.11. 23	20.11. 23	1051	1053	Ano	0 dny
1053			SO-02-20-01	Odbednění + přesun skruže	10 dny	21.11. 23	30.11. 23	1052	1053FS-7 dny;1056;1058	Ano	0 dny
1054			SO-02-20-01	**Římsy NK9**	**95 dny**	**01.12. 23**	**04.03. 24**		1085;1086	**Ano**	**0 dny**
1055			SO-02-20-01	**římsy nad tramvajovou tratí (nad rámem)**	**64 dny**	**01.12. 23**	**02.02. 24**	**1053FS-7 dny**		**Ano**	**0 dny**
1056			SO-02-20-01	Betonáže levá	39 dny	01.12. 23	08.01. 24	1053	1057FS=6 dny	Ano	0 dny
1057			SO-02-20-01	Betonáže střed	19 dny	15.01. 24	02.02. 24	1056FS=6 dny		Ano	0 dny
1058			SO-02-20-01	Betonáže pravá	39 dny	01.12. 23	08.01. 24	1053	1060	Ano	0 dny
1059			SO-02-20-01	**zbytek říms**	**56 dny**	**09.01. 24**	**04.03. 24**		**1425FS-14 dny**	**Ano**	**0 dny**
1060			SO-02-20-01	Betonáže levá	21 dny	09.01. 24	29.01. 24	1058	1061FS-3 dny	Ano	0 dny
1061			SO-02-20-01	Betonáže střed	21 dny	27.01. 24	16.02. 24	1060FS-3 dny	1062FS-4 dny	Ano	0 dny
1062			SO-02-20-01	Betonáže pravá	21 dny	13.02. 24	04.03. 24	1061FS-4 dny	1072	Ano	0 dny
1063			SO-02-20-01	**NK8**	**188 dny**	**08.11. 23**	**13.05. 24**			**Ano**	**0 dny**
1064			SO-02-20-01	Příprava podkladu	17 dny	08.11. 23	24.11. 23		1065;1101;1044	Ano	0 dny

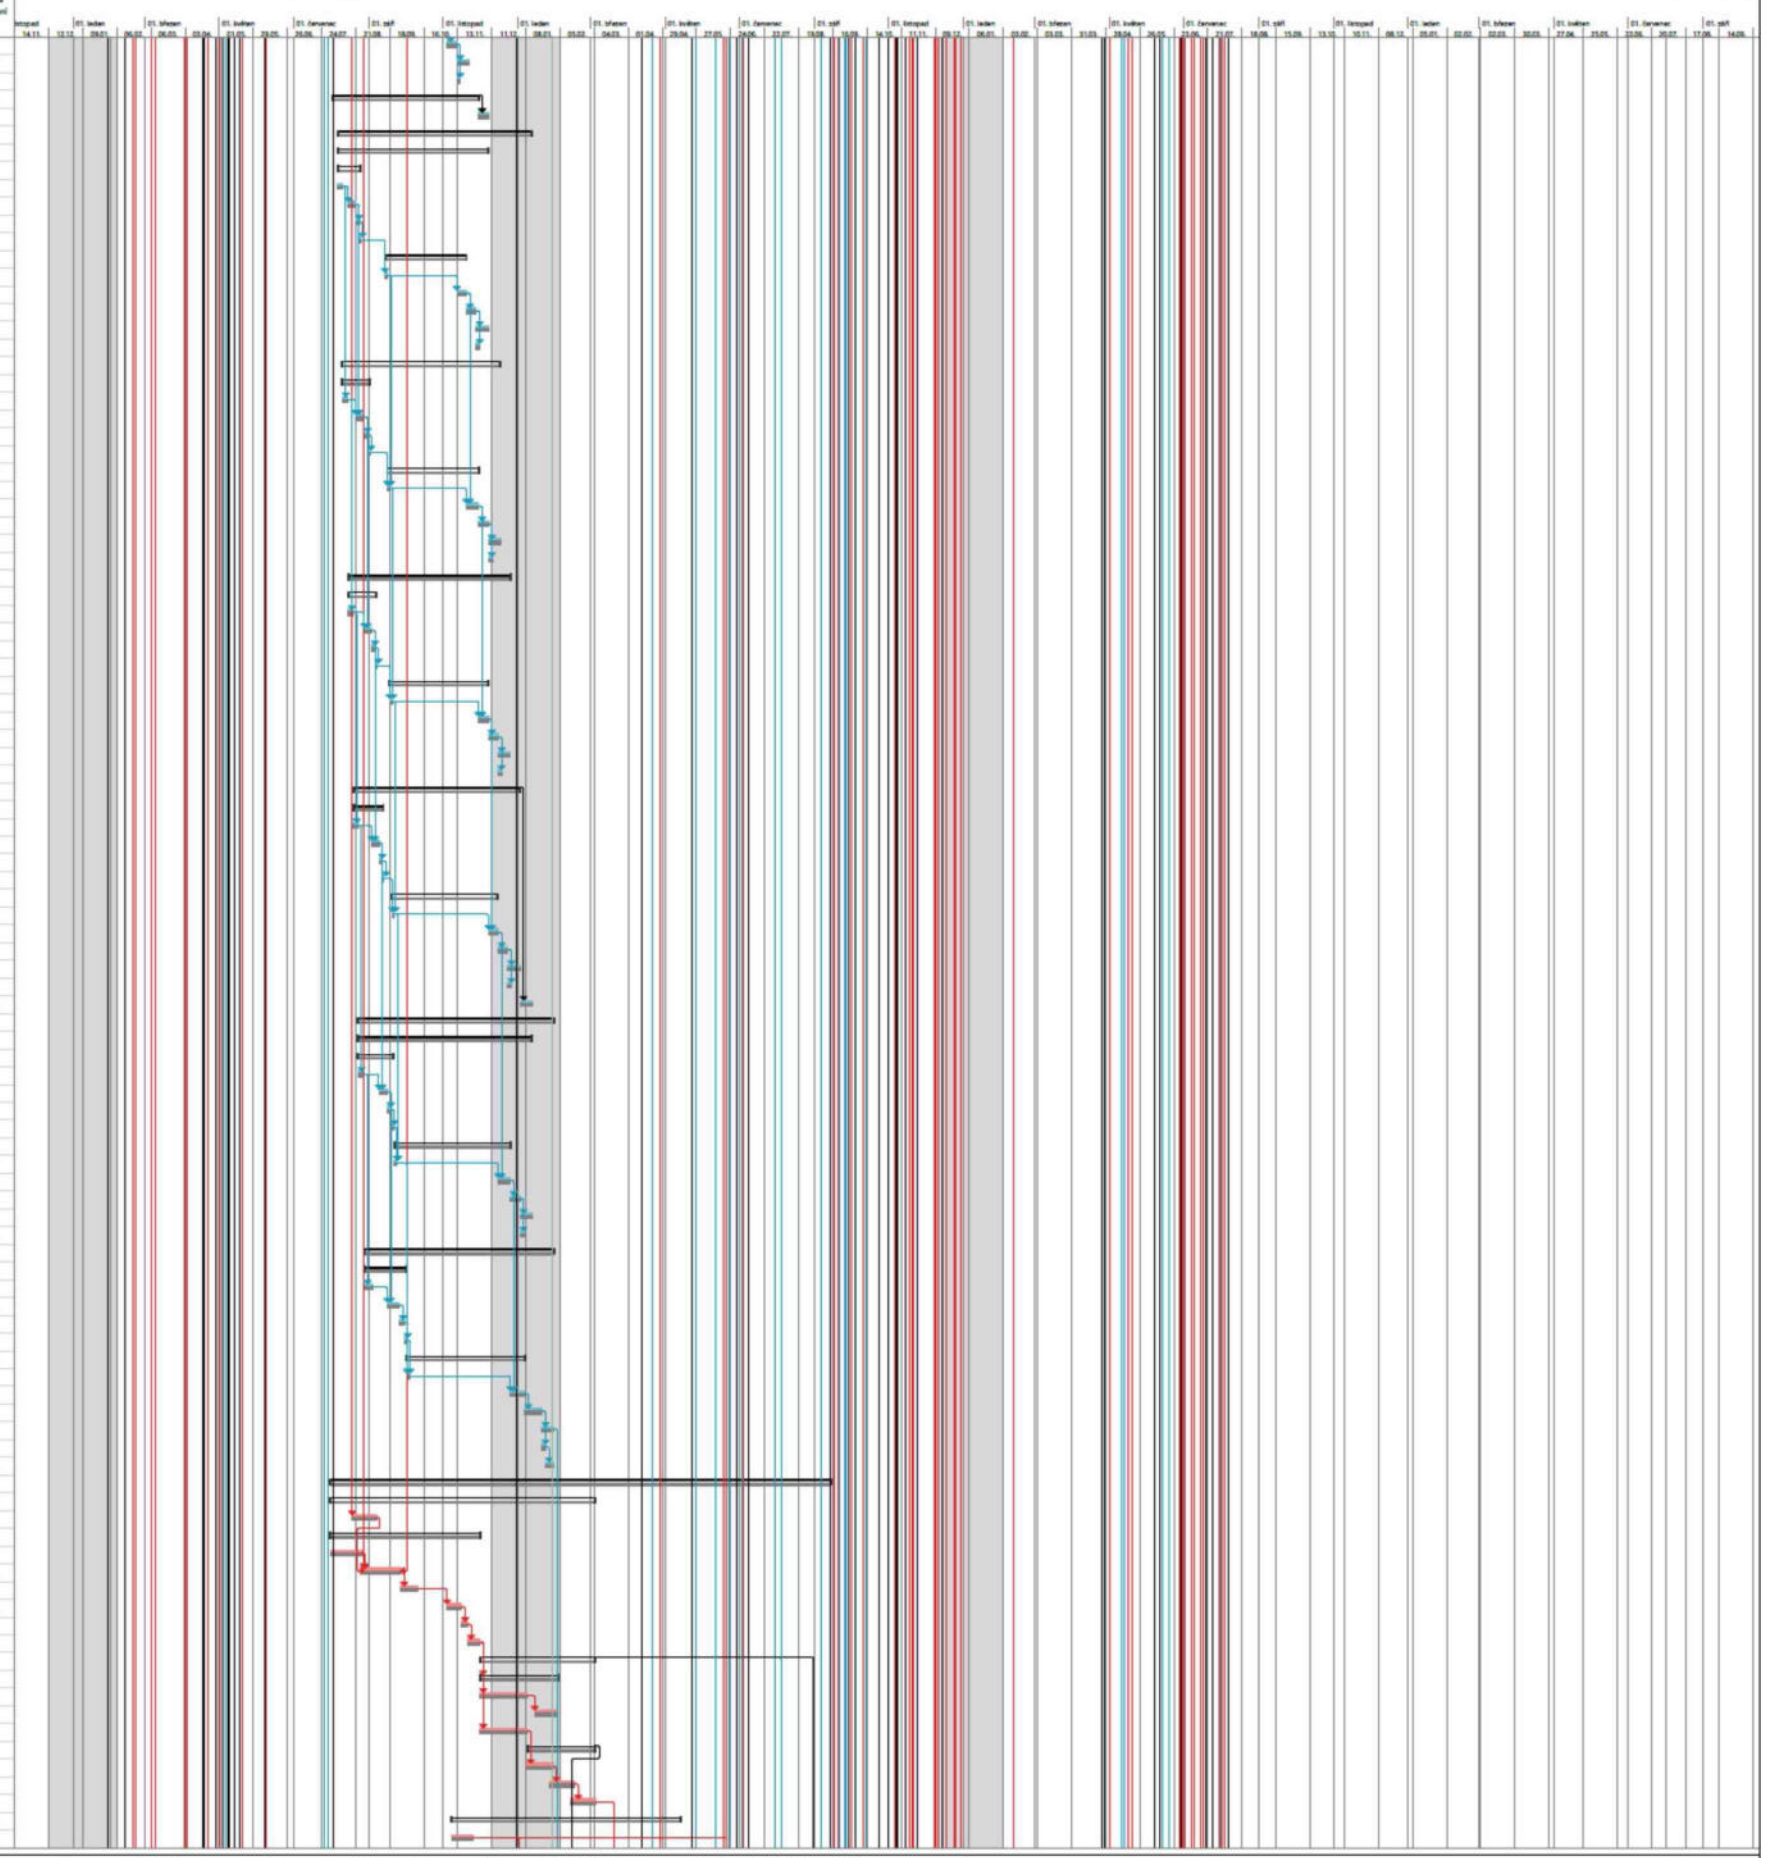

Harmonogram stavby "Modernizace trati Praha-Běchovice – Praha-Vršovice/Štětice"

ID		Identifikátor	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Trvání	Nákladová	Nákladové	Nákladové	Zbývající	Pružný	Celková
1065	Maj	00-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	78 dny				0 dny	Ano	0 dny
1066	Maj	00-00-0000	Studie pevné dráhy	20.01.24	21.02.24	1054	1067,1069,10-ms			0 dny	Ano	0 dny
1067	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	20.01.24	10.02.24	1066	1068			0 dny	Ano	0 dny
1068	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	11.02.24	25.03.24	1067	1069			0 dny	Ano	0 dny
1069	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	06.02.24	08.03.24	1068	1070			0 dny	Ano	0 dny
1070	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	06.02.24	15.03.24	1069	1071			0 dny	Ano	0 dny
1071	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	30.01.24	15.03.24	55 dny		1065		0 dny	Ano	0 dny
1072	Maj	00-00-0000	Betonáže tisíd	20.02.24	13.04.24	1070	1073-2 dny			0 dny	Ano	0 dny
1073	Maj	00-00-0000	Betonáže ztřed	23.04.24	15.05.24	1072	1074-2 dny			0 dny	Ano	0 dny
1074	Maj	00-00-0000	Betonáže jravá	11.04.24	05.05.24	1073	1075-2 dny			0 dny	Ano	0 dny
1075	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	30.01.24	15.03.24	55 dny		1071		0 dny	Ano	0 dny
1076	Maj	00-00-0000	Studie pevné dráhy	20.02.24	07.03.24	10 dny	1077			0 dny	Ano	0 dny
1077	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	20.02.24	08.03.24	72 dny				0 dny	Ano	0 dny
1078	Maj	00-00-0000	Studie pevné dráhy	08.03.24	29.03.24	1076	1079			0 dny	Ano	0 dny
1079	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	30.03.24	14.04.24	1078	1081			0 dny	Ano	0 dny
1080	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	15.04.24	28.04.24	1079	1082			0 dny	Ano	0 dny
1081	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	09.04.24	05.05.24	1080	1083,1084-7 dny			0 dny	Ano	0 dny
1082	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	06.05.24	18.05.24	1081	1084			0 dny	Ano	0 dny
1083	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	20.05.24	18.06.24	31 dny		1085,1086		0 dny	Ano	0 dny
1084	Maj	00-00-0000	Betonáže tisíd	19.05.24	06.06.24	1082,1073	1085-10 dny			0 dny	Ano	0 dny
1085	Maj	00-00-0000	Betonáže ztřed	20.05.24	11.06.24	1083,1074	1086-10 dny			0 dny	Ano	0 dny
1086	Maj	00-00-0000	Betonáže jravá	20.05.24	18.06.24	1083,1075-10 dny	1087			0 dny	Ano	0 dny
1087	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	27.02.24	06.06.24	182 dny				0 dny	Ano	0 dny
1088	Maj	00-00-0000	Příprava podkladů	27.02.24	07.03.24	20 dny		1089		0 dny	Ne	0 dny
1089	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	20.04.24	22.06.24	55 dny		1090		0 dny	Ne	0 dny
1090	Maj	00-00-0000	Studie pevné dráhy	20.04.24	15.05.24	17 dny	1088,1091,7-7 dny			0 dny	Ne	0 dny
1091	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	16.05.24	27.05.24	12 dny	1090	1092		0 dny	Ne	0 dny
1092	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	30.05.24	08.06.24	12 dny	1091	1093		0 dny	Ne	0 dny
1093	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	09.06.24	12.06.24	4 dny	1092	1094		0 dny	Ne	0 dny
1094	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	13.06.24	22.06.24	10 dny	1093	1095-4 dny		0 dny	Ne	0 dny
1095	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	19.06.24	06.08.24	45 dny		1096,1097,1098		0 dny	Ano	0 dny
1096	Maj	00-00-0000	Betonáže tisíd	19.06.24	06.07.24	10 dny	1095	1099-5 dny		0 dny	Ano	0 dny
1097	Maj	00-00-0000	Betonáže ztřed	04.07.24	22.07.24	15 dny	1095,1099-5 dny			0 dny	Ano	0 dny
1098	Maj	00-00-0000	Betonáže jravá	18.07.24	06.08.24	20 dny	1095,1099-5 dny	1100,1101		0 dny	Ano	0 dny
1099	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	25.06.24	15.08.24	142 dny		1100,1101		0 dny	Ne	0 dny
1100	Maj	00-00-0000	Příprava podkladů	25.06.24	11.08.24	30 dny		1101		0 dny	Ne	0 dny
1101	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	25.06.24	25.08.24	45 dny		1104,1106		0 dny	Ne	0 dny
1102	Maj	00-00-0000	Studie pevné dráhy	22.06.24	08.07.24	12 dny	1088,1103-4 dny			0 dny	Ne	0 dny
1103	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	09.07.24	29.07.24	15 dny	1102	1104		0 dny	Ne	0 dny
1104	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	30.07.24	10.08.24	12 dny	1103	1105		0 dny	Ne	0 dny
1105	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	11.08.24	16.08.24	6 dny	1104	1106		0 dny	Ne	0 dny
1106	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	17.08.24	25.08.24	9 dny	1105			0 dny	Ne	0 dny
1107	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	07.08.24	15.08.24	38 dny		1085,1108		0 dny	Ano	0 dny
1108	Maj	00-00-0000	Betonáže tisíd	07.08.24	27.08.24	1088	1109			0 dny	Ano	0 dny
1109	Maj	00-00-0000	Betonáže ztřed	17.08.24	15.09.24	1108,1110	1110			0 dny	Ano	0 dny
1110	Maj	00-00-0000	Betonáže jravá	21.08.24	27.08.24	1098	1109			0 dny	Ano	0 dny
1111	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	06.06.24	189 dny				0 dny	Ano	0 dny
1112	Maj	00-00-0000	Příprava podkladů	02.01.24	17.01.24	17 dny	1114			0 dny	Ne	0 dny
1113	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	18.01.24	09.07.24	108 dny				0 dny	Ano	0 dny
1114	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	18.01.24	11.04.24	25 dny	1112	1115		0 dny	Ne	0 dny
1115	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	23.04.24	20.05.24	20 dny	1114,1130			0 dny	Ne	0 dny
1116	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	21.05.24	07.06.24	12 dny	1115	1117		0 dny	Ne	0 dny
1117	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	08.06.24	21.06.24	14 dny	1116	1118,1132		0 dny	Ne	0 dny
1118	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	22.06.24	27.06.24	12 dny	1117	1119		0 dny	Ne	0 dny
1119	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	27.06.24	05.08.24	42 dny		1120,1121-2 dny		0 dny	Ne	0 dny
1120	Maj	00-00-0000	Betonáže tisíd	27.06.24	15.08.24	21 dny	1119	1122-7 dny		0 dny	Ne	0 dny
1121	Maj	00-00-0000	Betonáže ztřed	09.08.24	22.08.24	14 dny	1119	1123-7 dny		0 dny	Ne	0 dny
1122	Maj	00-00-0000	Betonáže jravá	16.08.24	05.08.24	17 dny	1120-7 dny	1129		0 dny	Ne	0 dny
1123	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	26.06.24	170 dny				0 dny	Ano	0 dny
1124	Maj	00-00-0000	Příprava podkladů	02.01.24	22.01.24	20 dny	1125-10 dny			0 dny	Ano	0 dny
1125	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	28.02.24	22.04.24	55 dny				0 dny	Ano	0 dny
1126	Maj	00-00-0000	Studie pevné dráhy	28.02.24	15.03.24	17 dny	1124,1127-10 dny	1127		0 dny	Ano	0 dny
1127	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	16.03.24	27.03.24	12 dny	1126	1128		0 dny	Ano	0 dny
1128	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	28.03.24	08.04.24	12 dny	1127	1129		0 dny	Ano	0 dny
1129	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	09.04.24	12.04.24	4 dny	1128	1130		0 dny	Ano	0 dny
1130	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	13.04.24	22.04.24	10 dny	1129	1131-2 dny		0 dny	Ano	0 dny
1131	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	18.04.24	20.06.24	45 dny		1132,1133,1134		0 dny	Ano	0 dny
1132	Maj	00-00-0000	Betonáže tisíd	18.04.24	06.05.24	15 dny	1131,1133-7 dny			0 dny	Ano	0 dny
1133	Maj	00-00-0000	Betonáže ztřed	29.04.24	17.05.24	15 dny	1132,1134-7 dny			0 dny	Ano	0 dny
1134	Maj	00-00-0000	Betonáže jravá	11.04.24	05.05.24	25 dny	1133-7 dny	1135		0 dny	Ano	0 dny
1135	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ano	0 dny
1136	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1137-2 dny	1138,1140		0 dny	Ano	0 dny
1137	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	11.01.24	18.01.24	5 dny	1136	1139		0 dny	Ano	0 dny
1138	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	22.01.24	25.01.24	2 dny	1136,1139-2 dny	1140		0 dny	Ano	0 dny
1139	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	22.01.24	25.01.24	2 dny	1137,1138-2 dny	1140		0 dny	Ano	0 dny
1140	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1138,1139,1141	1142		0 dny	Ano	0 dny
1141	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ano	0 dny
1142	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1143-2 dny	1144,1145		0 dny	Ano	0 dny
1143	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1142	1144		0 dny	Ano	0 dny
1144	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1142,1143-2 dny	1145		0 dny	Ano	0 dny
1145	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1142,1144-2 dny	1146		0 dny	Ano	0 dny
1146	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1145,1147	1148		0 dny	Ano	0 dny
1147	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ano	0 dny
1148	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1149-2 dny	1150,1151		0 dny	Ano	0 dny
1149	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1148	1150		0 dny	Ano	0 dny
1150	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1148,1149-2 dny	1151		0 dny	Ano	0 dny
1151	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1148,1150-2 dny	1152		0 dny	Ano	0 dny
1152	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1151,1153	1154		0 dny	Ano	0 dny
1153	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ano	0 dny
1154	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1155-2 dny	1156,1157		0 dny	Ano	0 dny
1155	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1154	1156		0 dny	Ano	0 dny
1156	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1154,1155-2 dny	1157		0 dny	Ano	0 dny
1157	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1154,1156-2 dny	1158		0 dny	Ano	0 dny
1158	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1157,1159	1160		0 dny	Ano	0 dny
1159	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ano	0 dny
1160	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1161-2 dny	1162,1163		0 dny	Ano	0 dny
1161	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1160	1162		0 dny	Ano	0 dny
1162	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1160,1161-2 dny	1163		0 dny	Ano	0 dny
1163	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1160,1162-2 dny	1164		0 dny	Ano	0 dny
1164	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1163,1165	1166		0 dny	Ano	0 dny
1165	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ano	0 dny
1166	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1167-2 dny	1168,1169		0 dny	Ano	0 dny
1167	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1166	1168		0 dny	Ano	0 dny
1168	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1166,1167-2 dny	1169		0 dny	Ano	0 dny
1169	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1166,1168-2 dny	1170		0 dny	Ne	0 dny
1170	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1169,1171	1172		0 dny	Ne	0 dny
1171	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1172	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1173-2 dny	1174,1175		0 dny	Ne	0 dny
1173	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1172	1174		0 dny	Ne	0 dny
1174	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1172,1173-2 dny	1175		0 dny	Ne	0 dny
1175	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1172,1174-2 dny	1176		0 dny	Ne	0 dny
1176	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1175,1177	1178		0 dny	Ne	0 dny
1177	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1178	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1179-2 dny	1180,1181		0 dny	Ne	0 dny
1179	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1178	1180		0 dny	Ne	0 dny
1180	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1178,1179-2 dny	1181		0 dny	Ne	0 dny
1181	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1178,1180-2 dny	1182		0 dny	Ne	0 dny
1182	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1181,1183	1184		0 dny	Ne	0 dny
1183	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1184	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1185-2 dny	1186,1187		0 dny	Ne	0 dny
1185	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1184	1186		0 dny	Ne	0 dny
1186	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1184,1185-2 dny	1187		0 dny	Ne	0 dny
1187	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1184,1186-2 dny	1188		0 dny	Ne	0 dny
1188	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1187,1189	1190		0 dny	Ne	0 dny
1189	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1190	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1191-2 dny	1192,1193		0 dny	Ne	0 dny
1191	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1190	1192		0 dny	Ne	0 dny
1192	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1190,1191-2 dny	1193		0 dny	Ne	0 dny
1193	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1190,1192-2 dny	1194		0 dny	Ne	0 dny
1194	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1193,1195	1196		0 dny	Ne	0 dny
1195	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1196	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1197-2 dny	1198,1199		0 dny	Ne	0 dny
1197	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1196	1198		0 dny	Ne	0 dny
1198	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1196,1197-2 dny	1199		0 dny	Ne	0 dny
1199	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1196,1198-2 dny	1200		0 dny	Ne	0 dny
1200	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1199,1201	1202		0 dny	Ne	0 dny
1201	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1202	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1203-2 dny	1204,1205		0 dny	Ne	0 dny
1203	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1202	1204		0 dny	Ne	0 dny
1204	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1202,1203-2 dny	1205		0 dny	Ne	0 dny
1205	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1202,1204-2 dny	1206		0 dny	Ne	0 dny
1206	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1205,1207	1208		0 dny	Ne	0 dny
1207	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1208	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1209-2 dny	1210,1211		0 dny	Ne	0 dny
1209	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1208	1210		0 dny	Ne	0 dny
1210	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1208,1209-2 dny	1211		0 dny	Ne	0 dny
1211	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1208,1210-2 dny	1212		0 dny	Ne	0 dny
1212	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1211,1213	1214		0 dny	Ne	0 dny
1213	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1214	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1215-2 dny	1216,1217		0 dny	Ne	0 dny
1215	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1214	1216		0 dny	Ne	0 dny
1216	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1214,1215-2 dny	1217		0 dny	Ne	0 dny
1217	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1214,1216-2 dny	1218		0 dny	Ne	0 dny
1218	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1217,1219	1220		0 dny	Ne	0 dny
1219	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1220	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1221-2 dny	1222,1223		0 dny	Ne	0 dny
1221	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1220	1222		0 dny	Ne	0 dny
1222	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1220,1221-2 dny	1223		0 dny	Ne	0 dny
1223	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1220,1222-2 dny	1224		0 dny	Ne	0 dny
1224	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1223,1225	1226		0 dny	Ne	0 dny
1225	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1226	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1227-2 dny	1228,1229		0 dny	Ne	0 dny
1227	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1226	1228		0 dny	Ne	0 dny
1228	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1226,1227-2 dny	1229		0 dny	Ne	0 dny
1229	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1226,1228-2 dny	1230		0 dny	Ne	0 dny
1230	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1229,1231	1232		0 dny	Ne	0 dny
1231	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1232	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1233-2 dny	1234,1235		0 dny	Ne	0 dny
1233	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1232	1234		0 dny	Ne	0 dny
1234	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1232,1233-2 dny	1235		0 dny	Ne	0 dny
1235	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1232,1234-2 dny	1236		0 dny	Ne	0 dny
1236	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1235,1237	1238		0 dny	Ne	0 dny
1237	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1238	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1239-2 dny	1240,1241		0 dny	Ne	0 dny
1239	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1238	1240		0 dny	Ne	0 dny
1240	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1238,1239-2 dny	1241		0 dny	Ne	0 dny
1241	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1238,1240-2 dny	1242		0 dny	Ne	0 dny
1242	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1241,1243	1244		0 dny	Ne	0 dny
1243	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1244	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1245-2 dny	1246,1247		0 dny	Ne	0 dny
1245	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1244	1246		0 dny	Ne	0 dny
1246	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1244,1245-2 dny	1247		0 dny	Ne	0 dny
1247	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1244,1246-2 dny	1248		0 dny	Ne	0 dny
1248	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1247,1249	1250		0 dny	Ne	0 dny
1249	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0 dny
1250	Maj	00-00-0000	Studie dráhy vrtné ochranného rámu	02.01.24	11.04.24	25 dny	1251-2 dny	1252,1253		0 dny	Ne	0 dny
1251	Maj	00-00-0000	Archivace výkresů jihozápadní	15.01.24	22.01.24	5 dny	1250	1252		0 dny	Ne	0 dny
1252	Maj	00-00-0000	Betonáže + jihozápadní	23.01.24	26.01.24	2 dny	1250,1251-2 dny	1253		0 dny	Ne	0 dny
1253	Maj	00-00-0000	Injektáže + odebetonování	23.01.24	26.01.24	2 dny	1250,1252-2 dny	1254		0 dny	Ne	0 dny
1254	Maj	00-00-0000	Odtěžování + jižní strana	30.01.24	08.02.24	5 dny	1253,1255	1256		0 dny	Ne	0 dny
1255	Maj	30-00-0000	Konečná kontrolních	02.01.24	15.03.24	55 dny				0 dny	Ne	0

Harmonogram stavby "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)"

Aktualizovaný harmonogram

TBR + OHLA + EŽ – BUBNY

ID		Řadí/skrýt	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Kritický	Odchylka dokončení
1167				Příprava podkladu	10 dny	27.11. 23	06.12. 23	1136	1169	Ano	0 dny
1168				**Nosná konstrukce**	**44 dny**	**15.01. 24**	**27.02. 24**			**Ano**	**0 dny**
1169				Stavba skruže včetně ochranného rámu	7 dny	15.01. 24	21.01. 24	1068FS-10 dny;1167	1170	Ano	0 dny
1170				Armatura včetně předpínání	15 dny	22.01. 24	05.02. 24	1169	1171	Ano	0 dny
1171				Betonáže + předpínání	10 dny	06.02. 24	15.02. 24	1170	1172	Ano	0 dny
1172				Injektáže + dobetonování	4 dny	16.02. 24	19.02. 24	1171	1173	Ano	0 dny
1173				Odbednění + přesun skruže	8 dny	20.02. 24	27.02. 24	1172	1175;1176	Ano	0 dny
1174				**Římsy**	**35 dny**	**21.06. 24**	**25.07. 24**		**1168FS+54 dny;1181**	**Ano**	**0 dny**
1175				Betonáže levá	14 dny	21.06. 24	04.07. 24	1173;1134	1178FS-4 dny	Ano	0 dny
1176				Betonáže střed	14 dny	01.07. 24	14.07. 24	1173FS-4 dny	1177FS-3 dny	Ano	0 dny
1177				Betonáže pravá	14 dny	12.07. 24	25.07. 24	1176FS-3 dny	1131;1180;1455	Ano	0 dny
1178				**Izolace**	**69 dny**	**14.09. 24**	**21.11. 24**			**Ano**	**0 dny**
1179				Příprava povrchu	27 dny	14.09. 24	10.10. 24	1108;1122	1180FS-14 dny	Ano	0 dny
1180				Izolace	35 dny	27.09. 24	31.10. 24	1179FS-14 dny	1181FS-14 dny;1442;1438	Ano	0 dny
1181				Ochrana izolace	35 dny	18.10. 24	21.11. 24	1180FS-14 dny	1188;1367	Ano	0 dny
1182				**Zábradlí**	**42 dny**	**06.08. 24**	**17.09. 24**	**1095**		**Ano**	**0 dny**
1183				Zahájení	0 dny	06.08. 24	06.08. 24	1054	1184	Ano	0 dny
1184				Dokončení	0 dny	17.09. 24	17.09. 24	1174FS+54 dny;1183	1189	Ano	0 dny
1185				**Terénní úpravy**	192 dny	22.07. 23	30.01. 24			**Ne**	**0 dny**
1186				Zahájení	0 dny	22.07. 23	22.07. 23	775		Ne	0 dny
1187				Dokončení	0 dny	30.01. 24	30.01. 24	1041		Ne	0 dny
1188				Předání mostu k realizaci kol. svršku	0 dny	21.11. 24	21.11. 24	1181	1192;1232;1433;452	Ano	0 dny
1189				Zatěžovací zkoušky	10 dny	04.07. 25	13.07. 25	3570;-1 den;1184	1190;F;74	Ano	1,63 dny
1190				Dokončovací práce	27 dny	17.06. 25	13.07. 25	1189FF	289	Ano	1,63 dny
1191				**SO 02-20-02 - Železniční most v ev. km 1,120 - zrušení**	**41 dny**	**31.03. 23**	**10.05. 23**			**Ano**	**0 dny**
1192				Odtížení rubu opěr, demontáž mostnic, podlah	10 dny	31.03. 23	09.04. 23	348	1193	Ano	0 dny
1193				Uvolnění převěsů z opěr po překotvení	10 dny	10.04. 23	19.04. 23	1192	1360;F;1194;1195;1303	Ano	0 dny
1194				demolice podchodu pro chodce na úr.vrtání	5 dny	20.04. 23	24.04. 23	1193		Ne	0 dny
1195				příprava plochy pro demontáž mostu	10 dny	20.04. 23	29.04. 23	1193	1196	Ano	0 dny
1196				Demontáž mostu	1 den	30.04. 23	30.04. 23	1195	1197;1;450;1198	Ano	0 dny
1197				Výluka TT, DIO	1 den	30.04. 23	30.04. 23	1196;451		Ne	0 dny
1198				Vybourání základů opěr	10 dny	01.05. 23	10.05. 23	1196	1199	Ano	0 dny
1199				Uvolnění pracoviště pro návazné práce NIS SO 02-20-01	0 dny	10.05. 23	10.05. 23	1198	717	Ano	0 dny
1200				**SO 03-23-01 - Opěrné zdi v km 1,223 - 1,341**	**508 dny**	**02.04. 23**	**21.08. 24**		**1249**	**Ne**	**0 dny**
1201				Zemní práce	42 dny	02.04. 23	13.05. 23	343	1202FS-10 dny;1203	Ne	0 dny
1202				Založení zdi	343 dny	14.05. 23	20.04. 24	1201FS-10 dny		**Ne**	**0 dny**
1203				Pilotové založení	21 dny	14.05. 23	03.06. 23	1201	1204	Ne	0 dny
1204				Podkladní beton SDD	21 dny	04.06. 23	24.06. 23	1203	1207	Ne	0 dny
1205				Podkladní beton JDD	14 dny	12.11. 23	25.11. 23	1211	1208	Ne	0 dny
1206				Podkladní beton JDD - dokončení výjezd	7 dny	07.04. 24	13.04. 24	1213	1209	Ne	0 dny
1207				Armatura a betonáž základů SDD	42 dny	25.06. 23	05.08. 23	1204	1211;1214FS+7 dny	Ne	0 dny
1208				Armatura a betonáž základů JDD	35 dny	26.11. 23	30.12. 23	1205	1213;1215FS-7 dny	Ne	0 dny
1209				Armatura a betonáž základů JDD - dokončení výjezd	7 dny	14.04. 24	20.04. 24	1206	1216	Ne	0 dny
1210				Dřík	245 dny	06.08. 23	06.04. 24		1217FS	**Ne**	**0 dny**
1211				Armatura a betonáž dříků SDD	58 dny	06.08. 23	31.11. 23	1207	1212;1,1218	Ne	0 dny
1212				Dodávka svornikového kolo podpěry TV	3 dny	06.08. 23	08.08. 23	1211;1,1	1461	Ne	0 dny
1213				Armatura a betonáž dříků JDD	58 dny	31.12. 23	06.04. 24	1208	1206;1216FS-50%	Ne	0 dny
1214				Izolace SDD, betonáže nad základem, drenáž	35 dny	13.08. 23	16.09. 23	1207FS+7 dny	1218	Ne	0 dny
1215				Izolace JDD, betonáže nad základem, drenáž	35 dny	24.12. 23	27.01. 24	1208FS-7 dny	1218	Ne	0 dny
1216				Izolace JDD, betonáže nad základem, drenáž - dokončení výjezd	21 dny	21.04. 24	11.05. 24	1209;1213FS-50%	1218FS-14 dny;1220	Ne	0 dny
1217				Schodiště	58 dny	06.08. 23	02.10. 23	1210;1,1	1219	Ne	0 dny
1218				Zábyly	35 dny	28.04. 24	01.06. 24	1216FS-14 dny;1215;1214	1219	Ne	0 dny
1219				Stavební připravenost pro osazení zastřešení	0 dny	01.06. 24	01.06. 24	1218;1217	1461	Ne	0 dny
1220				Zavěšené obkladové panely	100 dny	12.05. 24	19.08. 24	1216	1221FS-50%	Ne	0 dny
1221				Zábradlí	52 dny	01.07. 24	21.08. 24	1220FS-50%		Ne	0 dny
1222				**SO 03-24-01 - Zárubní zdi km 1,322-1,445**	**466 dny**	**08.05. 23**	**15.08. 24**		**1361;1390;1393**	**Ne**	**0 dny**
1223				Zemní práce, vyrovnání na úroveň hlav pilot	49 dny	08.05. 23	25.06. 23	1246	1224FS-7 dny	Ne	0 dny
1224				Realizace pilot	42 dny	19.06. 23	30.07. 23	1223FS-7 dny	1225	Ne	0 dny
1225				betonáž podkladního betonu horní převázky	35 dny	15.09. 23	19.10. 23	1224	1226FS-7 dny;1227	Ne	0 dny
1226				vrtání průchodu pro kotvení horní převázky	14 dny	13.10. 23	26.10. 23	1225FS-7 dny		Ne	0 dny
1227				Horní převázka pilot - armatura	49 dny	20.10. 23	07.12. 23	1225	1229;1228FS-35 dny	Ne	0 dny
1228				Horní převázka pilot - betonáž	49 dny	08.11. 23	21.12. 23	1227FS-35 dny		Ne	0 dny
1229				Vrtání kotev	28 dny	08.12. 23	04.01. 24	1227	1230	Ne	0 dny
1230				Napínání kotev	28 dny	05.01. 24	01.02. 24	1229	1231	Ne	0 dny
1231				Odtížení na úroveň dna stavební jámy	28 dny	02.02. 24	29.02. 24	1230	1232	Ne	0 dny
1232				Výplň ze stříkaného betonu	21 dny	01.03. 24	21.03. 24	1231	1233	Ne	0 dny
1233				Spodní převázka pilot	21 dny	22.03. 24	11.04. 24	1232	1234	Ne	0 dny
1234				Vrtání kotev spodní úroveň	21 dny	12.04. 24	02.05. 24	1233	1235	Ne	0 dny
1235				Napínání kotev spodní úrovně	21 dny	03.05. 24	23.05. 24	1234	1236	Ne	0 dny
1236				Krycí římsa se zábradlím	21 dny	24.05. 24	13.06. 24	1235	1237;1238	Ne	0 dny
1237				Odvodnění za římsami	49 dny	14.06. 24	01.08. 24	1236		Ne	0 dny
1238				Montáž obkladových panelů	63 dny	14.06. 24	15.08. 24	1236	1239	Ne	0 dny
1239				Stavební připravenost pro realizace žel. spodku	0 dny	15.08. 24	15.08. 24	1238		Ne	0 dny
1240				**SO 03-28-01 - Lávka pro pěší v km 1,400**	**112 dny**	**01.04. 24**	**21.07. 24**			**Ne**	**0 dny**
1241				Založení	48 dny	01.04. 24	18.05. 24		1242FS-27 dny	Ne	0 dny
1242				Horní stavba	42 dny	22.04. 24	02.06. 24	1241FS-27 dny	1243	Ne	0 dny
1243				Dovybavení	21 dny	03.06. 24	23.06. 24	1242	1244	Ne	0 dny
1244				Schodiště	28 dny	24.06. 24	21.07. 24	1243		Ne	0 dny
1245				**SO 03-28-02 - Úprava zdí Královské obory**	**643 dny**	**31.03. 23**	**01.01. 25**			**Ne**	**0 dny**
1246				Vybourání části zdi	38 dny	31.03. 23	07.05. 23	348	1247;1223	Ne	0 dny
1247				Podchycení, sanace zdi v km 1.204 – km 1.250	60 dny	08.05. 23	06.07. 23	1246	1248	Ne	0 dny
1248				Podchycení, sanace zdi v km 1.314 – km 1.341	49 dny	07.07. 23	24.08. 23	1247	1252	Ne	0 dny
1249				Přeložení zdi v km 1.250 – km 1.314	50 dny	22.08. 24	30.10. 24	1200	1254	Ne	0 dny
1250				Průchod v km 1.341 - km 1.386, napojení nást. na chodník	36 dny	16.08. 24	20.09. 24	1222	1254	Ne	0 dny
1251				Přeložení zdi v km 1.386 – km 1.415	45 dny	16.08. 24	29.09. 24	1222	1254	Ne	0 dny
1252				Podchycení, sanace zdi v km 1.415 – km 1.440	21 dny	25.08. 23	14.09. 23	1248	1254	Ne	0 dny
1253				Přeložení zdi v km 1.440 – km 1,501	45 dny	16.08. 24	29.09. 24	1222	1254	Ne	0 dny
1254				Kompletní sanace povrchu zdi, oprava koruny	83 dny	11.10. 24	01.01. 25	1252;1249;1251;1250;1253		Ne	0 dny
1255			D.2.1.5	**D.2.1.5 - Ostatní inženýrské objekty**	**866 dny**	**12.03. 23**	**24.07. 25**			**Ano**	**180 dny**
1256				**SO 01-53-01.1 - Přeložka potrubní pošty - trubní část**	**69 dny**	**17.05. 25**	**24.07. 25**			**Ne**	**180 dny**
1257				Instalace potrubí, dvourourové propojení, 380 m	45 dny	17.05. 25	30.06. 25	4230	1258	Ne	180 dny
1258				Tlaková zkouška, zkouška průjezdnosti	8 dny	01.07. 25	08.07. 25	1257	1261	Ne	180 dny
1259				Zásyp	14 dny	11.07. 25	24.07. 25	1261		Ne	180 dny
1260				**SO 01-53-01.2 - Přeložka potrubní pošty - doprovodný kabel**	**2 dny**	**09.07. 25**	**10.07. 25**			**Ne**	**180 dny**
1261				Pokládka kabelu k potrubní poště, 380 m, spojkování	2 dny	09.07. 25	10.07. 25	1258	1259	Ne	180 dny
1262				**SO 01-54-31 - Definitivní VO příjezdové komunikace km cca 0,4**	**30 dny**	**20.10. 24**	**18.11. 24**			**Ne**	**0 dny**
1263				Kabelizace	14 dny	20.10. 24	02.11. 24	1448	1264;1	Ne	0 dny
1264				Montáž stožárů VO, dělicí skříně	30 dny	20.10. 24	18.11. 24	1263;1		Ne	0 dny
1265				**SO 02-53-02 - Přeložka sděl. vedení T-Mobile ul. Bubenská - Strojnická**	**76 dny**	**06.01. 24**	**21.03. 24**			**Ne**	**0 dny**
1266				přeložka sdělovacího vedení bez přerušení	15 dny	06.01. 24	20.01. 24	47;1;1	1267	Ne	0 dny
1267				uložení do chráničky, obetonování, zásyp; zahloubení další části trasy	25 dny	26.02. 24	21.03. 24	1266;1462		Ne	0 dny
1268				**SO 02-53-04 - Přeložka sděl. vedení Digi Telecom ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště**	**18 dny**	**12.03. 23**	**29.03. 23**			**Ne**	**0 dny**

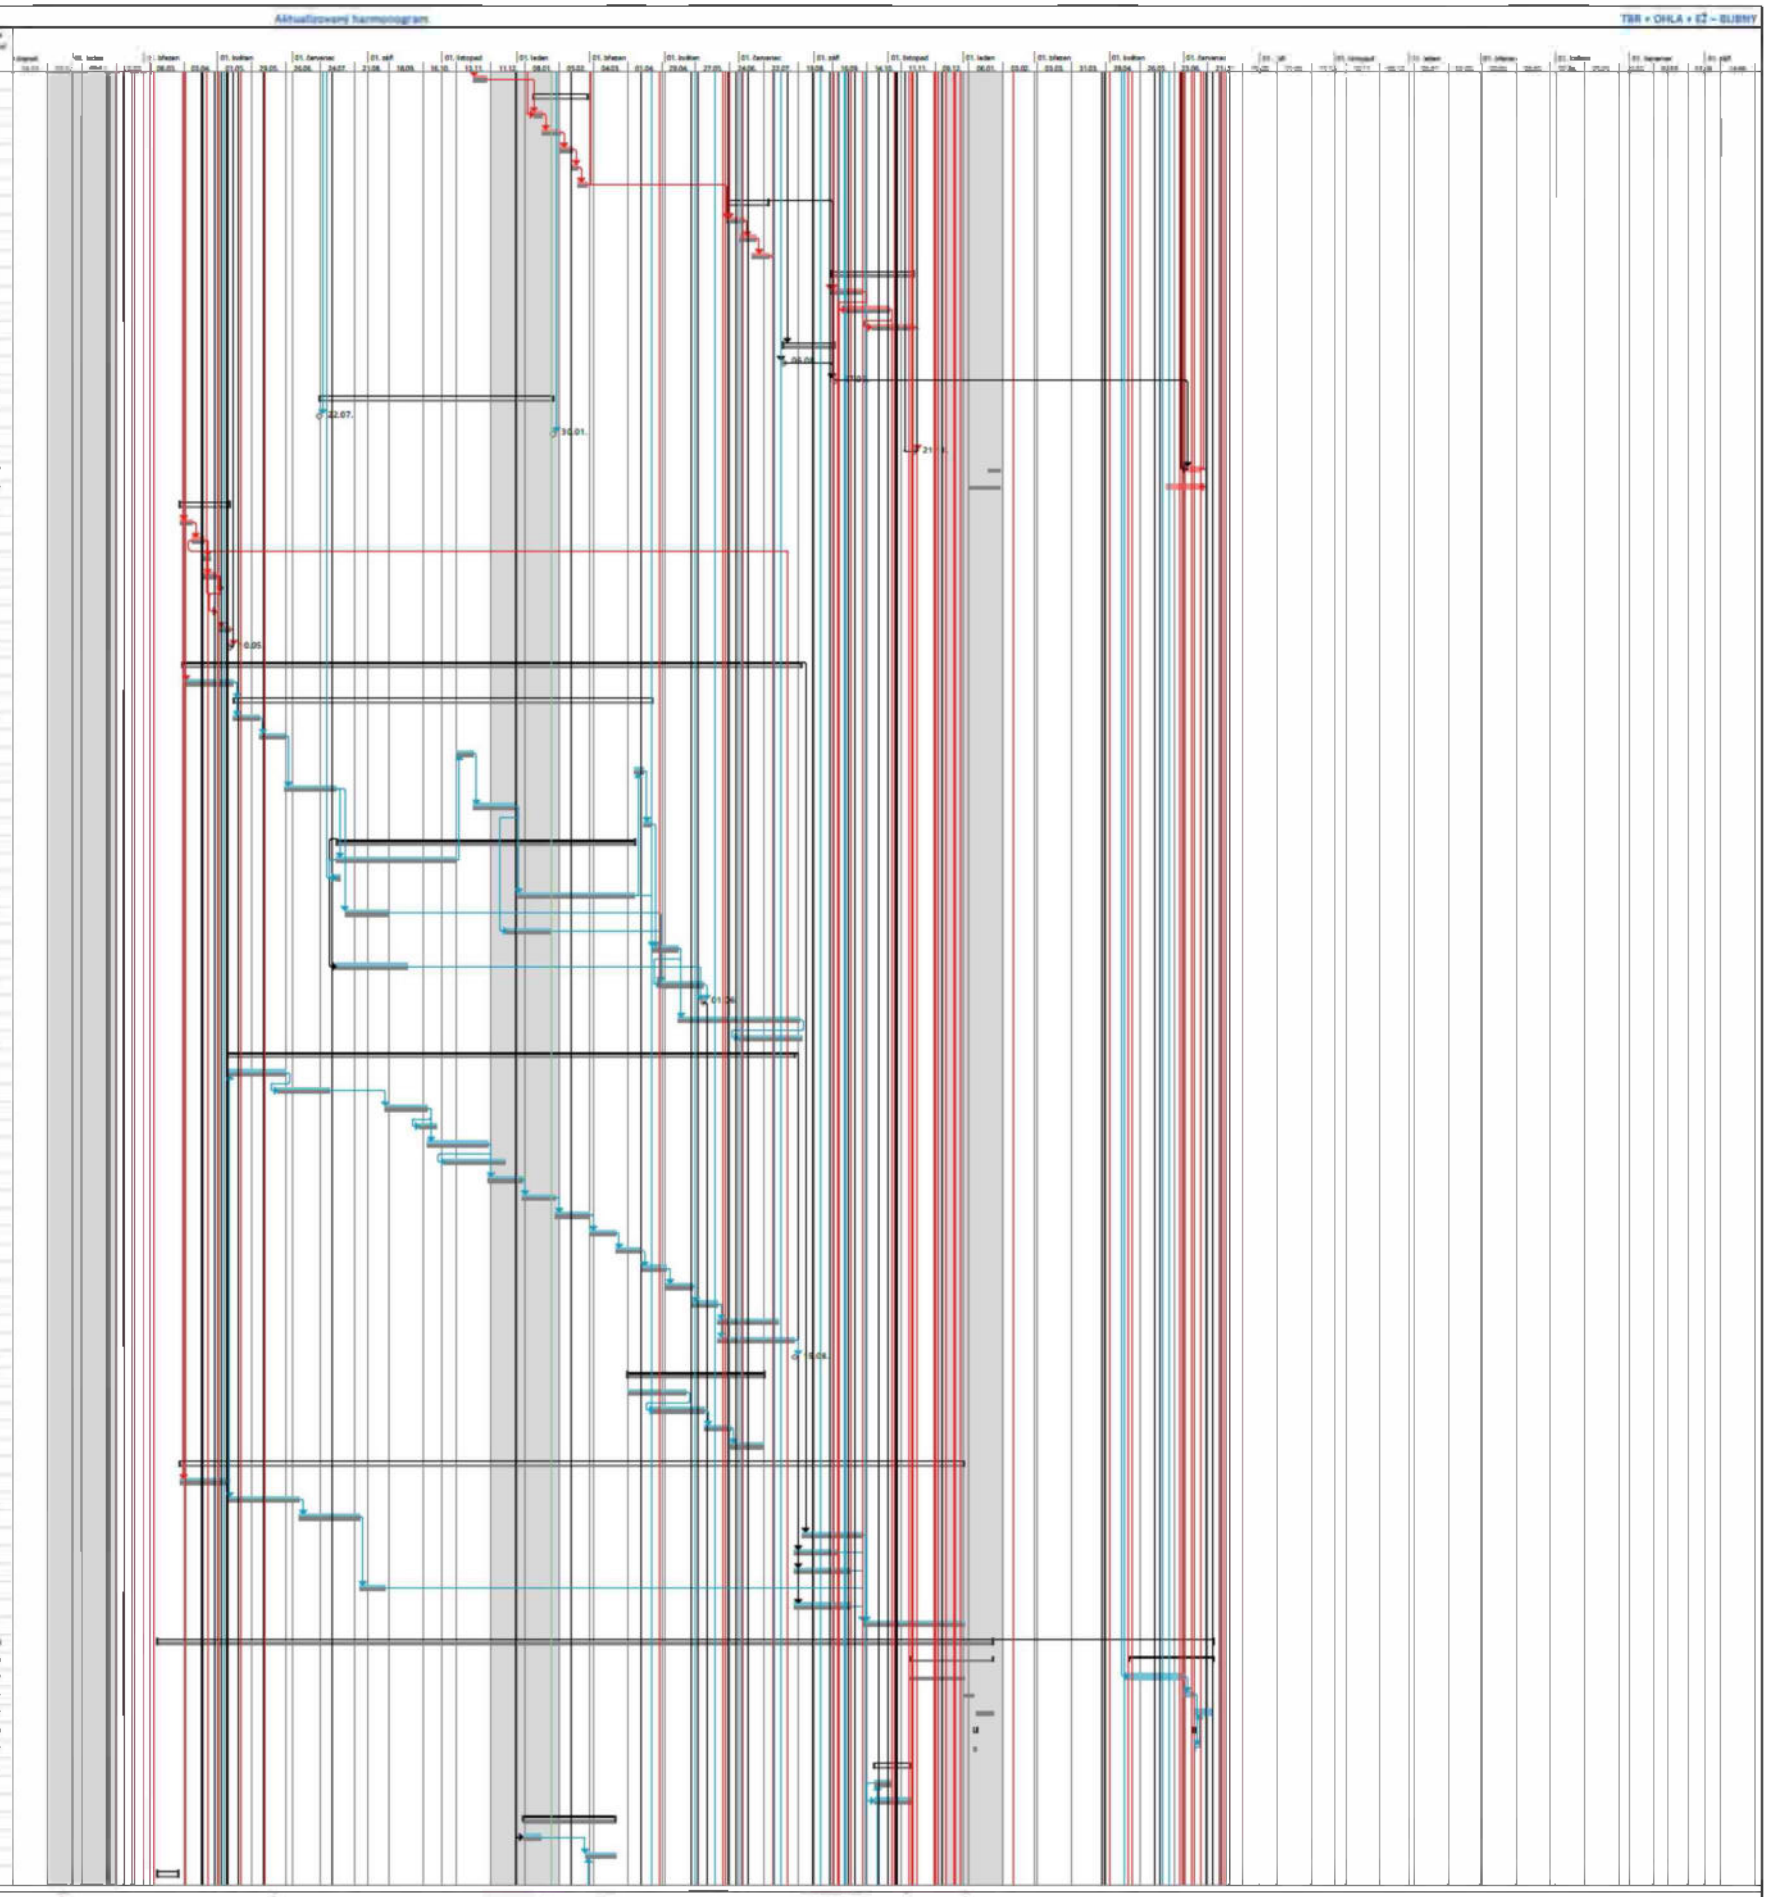

Harmonogram stavby "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)"

Aktualizovaný harmonogram

TSB + OHLA + TZ – BUBNY

ID		Řadí SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Kritický	Odchylka dokončení
1269			zemní práce	3 dny	12.03. 23	14.03. 23	71102	1270	Ne	0 dny
1270			přeložka sdělovacího vedení bez přerušení	10 dny	15.03. 23	24.03. 23	1269	1271	Ne	0 dny
1271			uložení do chráničky, obetonování, zásyp	5 dny	25.03. 23	29.03. 23	1270		Ne	0 dny
1272			**SO 02-53-05 - Přeložka sděl. vedení T-Mobile ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště**	**18 dny**	**12.03. 23**	**29.03. 23**			**Ne**	**0 dny**
1273			zemní práce	3 dny	12.03. 23	14.03. 23	71102	1274	Ne	0 dny
1274			přeložka sdělovacího vedení bez přerušení	10 dny	15.03. 23	24.03. 23	1273	1275	Ne	0 dny
1275			uložení do chráničky, obetonování, zásyp	5 dny	25.03. 23	29.03. 23	1274		Ne	0 dny
1276			**SO 02-53-06 - Ochrana sděl. vedení MV ČR ve Stromovce**	**30 dny**	**01.09. 24**	**30.09. 24**			**Ne**	**0 dny**
1277			Odkrytí, ochrana	5 dny	01.09. 24	05.09. 24	1498FF	1278	Ne	0 dny
1278			Uložení do chrániček	25 dny	06.09. 24	30.09. 24	1277		Ne	0 dny
1279			**SO 02-54-30 - Provizorní přeložky VO Bubenská - Strojnická**	**21 dny**	**29.03. 24**	**18.04. 24**			**Ne**	**0 dny**
1280			zemní práce, založení chrániček	7 dny	29.03. 24	04.04. 24	1418FS-3 dny	1281	Ne	0 dny
1281			zatažení kabelu, připojení	7 dny	05.04. 24	11.04. 24	1280	1282;1285	Ne	0 dny
1282			odstranění stávajícího vedení VO	5 dny	12.04. 24	16.04. 24	1281	1283	Ne	0 dny
1283			odstranění provizorního VO	2 dny	17.04. 24	18.04. 24	1282		Ne	0 dny
1284			**SO 02-54-31 - Definitivní přeložky VO Bubenská - Strojnická**	**110 dny**	**27.03. 24**	**14.07. 24**			**Ne**	**0 dny**
1285			odstranění stávajících převěsů a stožárů VO	2 dny	12.04. 24	13.04. 24	478;1281		Ne	0 dny
1286			zemní práce, založení chrániček	7 dny	27.03. 24	02.04. 24	1397	1287	Ne	0 dny
1287			kabely	3 dny	03.04. 24	05.04. 24	1286	1288	Ne	0 dny
1288			stožáry, výstroj, připojení	14 dny	01.07. 24	14.07. 24	1287;1464		Ne	0 dny
1289			**SO 02-54-32 - Osvětlení podjezdu Bubenská**	**72 dny**	**14.09. 24**	**24.11. 24**			**Ne**	**0 dny**
1290			Založení stožárků, kabelizace	14 dny	14.09. 24	27.09. 24	1099	1291	Ne	0 dny
1291			Montáž osvětlení	30 dny	28.09. 24	27.10. 24	1290	1292	Ne	0 dny
1292			Zprovoznění, revize	28 dny	28.10. 24	24.11. 24	1291		Ne	0 dny
1293			**SO 02-54-33 - Osvětlení podjezdu Dukelských hrdinů**	**72 dny**	**14.09. 24**	**24.11. 24**			**Ne**	**0 dny**
1294			Založení stožárků, kabelizace	14 dny	14.09. 24	27.09. 24	1099	1295	Ne	0 dny
1295			Montáž osvětlení	30 dny	28.09. 24	27.10. 24	1294	1296	Ne	0 dny
1296			Zprovoznění, revize	28 dny	28.10. 24	24.11. 24	1295		Ne	0 dny
1297			**SO 02-54-34 - Přeložky VO Dukelských hrdinů**	**600 dny**	**12.03. 23**	**31.10. 24**			**Ano**	**0 dny**
1298			Přeložení kabelizace, provizorní	20 dny	12.03. 23	31.03. 23	71155	1301	Ano	0 dny
1299			Přeložení kabelizace ve výluce TT	20 dny	02.10. 24	21.10. 24	5P5-30 dny	1300	Ne	0 dny
1300			Posun osvětlení do nové pozice dle chodníku	10 dny	22.10. 24	31.10. 24	1299	2	Ne	0 dny
1301			Připravenost pro most	0 dny	31.03. 23	31.03. 23	1298	717	Ano	0 dny
1302			**SO 02-54-35 - Přeložky VO Strojnická**	**28 dny**	**20.04. 23**	**17.05. 23**			**Ne**	**0 dny**
1303			přesun stožáru v kolizi vč. kabelového pole	28 dny	20.04. 23	17.05. 23	1185	2	Ne	0 dny
1304			**SO 02-54-40 - TT Dukelských hrdinů, úprava TV**	**486 dny**	**07.04. 23**	**04.08. 24**			**Ne**	**0 dny**
1305			provizorní stavy	3 dny	07.04. 23	09.04. 23			Ne	0 dny
1306			Nové stožáry, překotvení trakce TT	3 dny	02.08. 24	04.08. 24	11955T		Ne	0 dny
1307			**SO 02-54-41 - TT Dukelských hrdinů, přeložky kabelů DP**	**569 dny**	**12.03. 23**	**01.10. 24**			**Ano**	**0 dny**
1308			zemní práce	11 dny	12.03. 23	22.03. 23	71155	1309	Ano	0 dny
1309			vymístění kabelů	4 dny	23.03. 23	26.03. 23	1308	1310	Ano	0 dny
1310			Připravenost pro most	0 dny	26.03. 23	26.03. 23	1309	717	Ano	0 dny
1311			zemní práce	16 dny	31.08. 24	16.09. 24	1312SF		Ne	0 dny
1312			přeložka kabelů ve výluce TT	15 dny	16.09. 24	01.10. 24	1475SF	131,15F	Ne	0 dny
1313			**SO 02-54-42 - TT Dukelských hrdinů, elektrické ovládání a vytápění výměn**	**153 dny**	**01.06. 24**	**31.10. 24**			**Ne**	**0 dny**
1314			demontáž	1 den	01.06. 24	01.06. 24	955		Ne	0 dny
1315			posun řídící skříně	3 dny	28.10. 24	31.10. 24	1317SF;1316SF		Ne	0 dny
1316			montáž	1 den	31.10. 24	31.10. 24	9FF	1315SF	Ne	0 dny
1317			DIO	62 dny	01.06. 24	01.08. 24	955	1315SF	Ne	0 dny
1318			**SO 03-54-30 - Osvětlení pěších cest v okolí zast. Praha-Výstaviště**	**40 dny**	**06.10. 24**	**14.11. 24**			**Ne**	**0 dny**
1319			Kabelizace	10 dny	06.10. 24	15.10. 24	144855	1320S1	Ne	0 dny
1320			Založení stožárků	10 dny	06.10. 24	15.10. 24	131955	1321	Ne	0 dny
1321			Montáž, zapojení, revize	30 dny	16.10. 24	14.11. 24	1320		Ne	0 dny
1322			**SO 52-54-30 - Přeložky VO Železničářů**	**30 dny**	**17.05. 25**	**15.06. 25**			**Ne**	**180 dny**
1323			Obnova zapojení VO v ulici Železničářů	30 dny	17.05. 25	15.06. 25	343		Ne	180 dny
1324			**D.2.1.6 - Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)**	**868 dny**	**20.02. 23**	**06.07. 25**			**Ano**	**180 dny**
1325			**SO 01-50-03 - Kanalizační přípojka kolejí**	**30 dny**	**17.05. 25**	**15.06. 25**			**Ne**	**180 dny**
1326			Šachta ŠD8-1, OLK komplet	14 dny	17.05. 25	30.05. 25	545;1341	1327	Ne	180 dny
1327			zaústění trativodů do areálové dešťové k.SO 01-50-05, DN 200	16 dny	31.05. 25	15.06. 25	1326		Ne	180 dny
1328			**SO 01-50-04 - Splašková kanalizace, Praha Bubny**	**554 dny**	**24.05. 23**	**27.11. 24**			**Ne**	**0 dny**
1329			výkop, pokládka DN 300, 320 m, zásyp se zhutněním vč. šachet	554 dny	24.05. 23	27.11. 24			Ne	0 dny
1330			trasa ŠS19 - ŠS4	60 dny	25.06. 23	23.08. 23	134SSS		Ne	0 dny
1331			kompletace ŠD8	16 dny	24.05. 23	08.06. 23	137SSS	1377	Ne	0 dny
1332			trasa ŠS0 - ŠS4	7 dny	30.06. 23	06.07. 23	137155	1372	Ne	0 dny
1333			trasa ŠD14 - ŠD15-5	14 dny	14.11. 24	27.11. 24	1444	1446	Ne	0 dny
1334			**SO 01-51-01 - Vodovod DN 150, Praha-Bubny**	**364 dny**	**01.07. 24**	**29.06. 25**			**Ne**	**180 dny**
1335			**SO 01-51-01.2 Neveřejná část**	**228 dny**	**14.11. 24**	**29.06. 25**			**Ne**	**180 dny**
1336			část pod provizorní kolejí	14 dny	16.06. 25	29.06. 25	422	1435	Ne	180 dny
1337			část pod komunikací 01-30-01	14 dny	14.11. 24	27.11. 24	1444	1446	Ne	0 dny
1338			SO 01-51-01.1 Veřejná část	10 dny	01.07. 24	10.07. 24			Ne	0 dny
1339			**SO 01-50-05 - Dešťová kanalizace, Praha-Bubny**	**166 dny**	**27.04. 23**	**09.10. 23**			**Ne**	**0 dny**
1340			Hlavní větev dešťové kanalizace, šachty	**119 dny**	**27.04. 23**	**23.08. 23**		1369	**Ne**	**0 dny**
1341			hlavní větev Vltava - ŠD1	16 dny	12.07. 23	27.07. 23	137655	1382;1326	Ne	0 dny
1342			hlavní větev ŠD1 - ŠD2	7 dny	17.05. 23	23.05. 23	137455		Ne	0 dny
1343			hlavní větev ŠD2 - ŠD3 (vystrojení štoly)	11 dny	24.05. 23	03.06. 23	137355		Ne	0 dny
1344			kompletace ŠD3	16 dny	24.05. 23	08.06. 23	137SSS	1377	Ne	0 dny
1345			hlavní větev ve stavební jámě budovy	60 dny	25.06. 23	23.08. 23	153955+30 dny	133055;134855;134755	Ne	0 dny
1346			hlavní větev ŠD4 - ŠD5	10 dny	27.04. 23	06.05. 23	1358	1360;1347;1348	Ne	0 dny
1347			vedlejší větev ŠD5 - ŠD5-3	14 dny	25.06. 23	08.07. 23	1346;134SSS		Ne	0 dny
1348			vedlejší větev ŠD4-1 - ŠD4-3	14 dny	25.06. 23	08.07. 23	1346;134SSS		Ne	0 dny
1349			Vedlejší větev dešťové kanalizace	22 dny	24.08. 23	14.09. 23	1340	1350FS-4 dny	Ne	0 dny
1350			Odvodnění UV1	12 dny	11.09. 23	22.09. 23	1349FS-4 dny	1351FS-10 dny	Ne	0 dny
1351			Odvodnění mostu	27 dny	13.09. 23	09.10. 23	1350FS-10 dny	1352	Ne	0 dny
1352			Předání pro následné práce	0 dny	09.10. 23	09.10. 23	1351		Ne	0 dny
1353			**SO 01-50-05.1 - Ražené objekty pro kanalizaci, Praha-Bubny**	**190 dny**	**20.02. 23**	**28.08. 23**			**Ano**	**0 dny**
1354			Zahájení prací, úřední stavební povolení	0 dny	20.02. 23	20.02. 23		136101;136102;4001;136111;365	Ne	0 dny
1355			Jímka na Vltavě	84 dny	20.02. 23	14.05. 23	155401	1360	Ne	0 dny
1356			Noubení ŠD 3	52 dny	27.02. 23	19.04. 23		1365;1385	Ne	0 dny
1357			Noubení ŠD 4	50 dny	20.02. 23	10.04. 23		1364;1380	Ano	0 dny
1358			kompletace ŠD4	16 dny	11.04. 23	26.04. 23	1357	1360;1356;1346	Ano	0 dny
1359			Uvolnění pro realizaci založení st. jámy SO 01-41-01	0 dny	26.04. 23	26.04. 23	1358	4302;1538	Ano	0 dny
1360			Zásyp ŠD4	9 dny	07.05. 23	15.05. 23	1358;1346		Ne	0 dny
1361			Noubení ŠD 1	27 dny	20.02. 23	18.03. 23	155401	1362	Ne	0 dny
1362			Noubení ŠD 2	34 dny	19.03. 23	21.04. 23	1361	1366;1365	Ne	0 dny
1363			ražba ŠD3 - ŠD4	56 dny	20.04. 23	14.06. 23	1358;1354;1357	1367;1370	Ne	0 dny
1364			Mírná ražby kanalizace pro GPK provizorní přeložky	0 dny	25.04. 23	25.04. 23		4001;357	Ano	0 dny
1365			ražba ŠD3 - ŠD2	29 dny	22.04. 23	20.05. 23	1358;1362;1354	1371	Ne	0 dny
1366			protlak ŠD1 - ŠD2	25 dny	22.04. 23	16.05. 23	1362	1368;1374	Ne	0 dny
1367			ražba ŠD3 - OV	20 dny	15.06. 23	04.07. 23	1363	1369	Ne	0 dny
1368			protlak ŠD1 - Vltava	56 dny	17.05. 23	11.07. 23	1366;1355	1376	Ne	0 dny
1369			otevřený výkop	11 dny	05.07. 23	15.07. 23	1367		Ne	0 dny
1370			vystrojení štoly ŠD3 - ŠD4	15 dny	15.06. 23	29.06. 23	1363	1371	Ne	0 dny

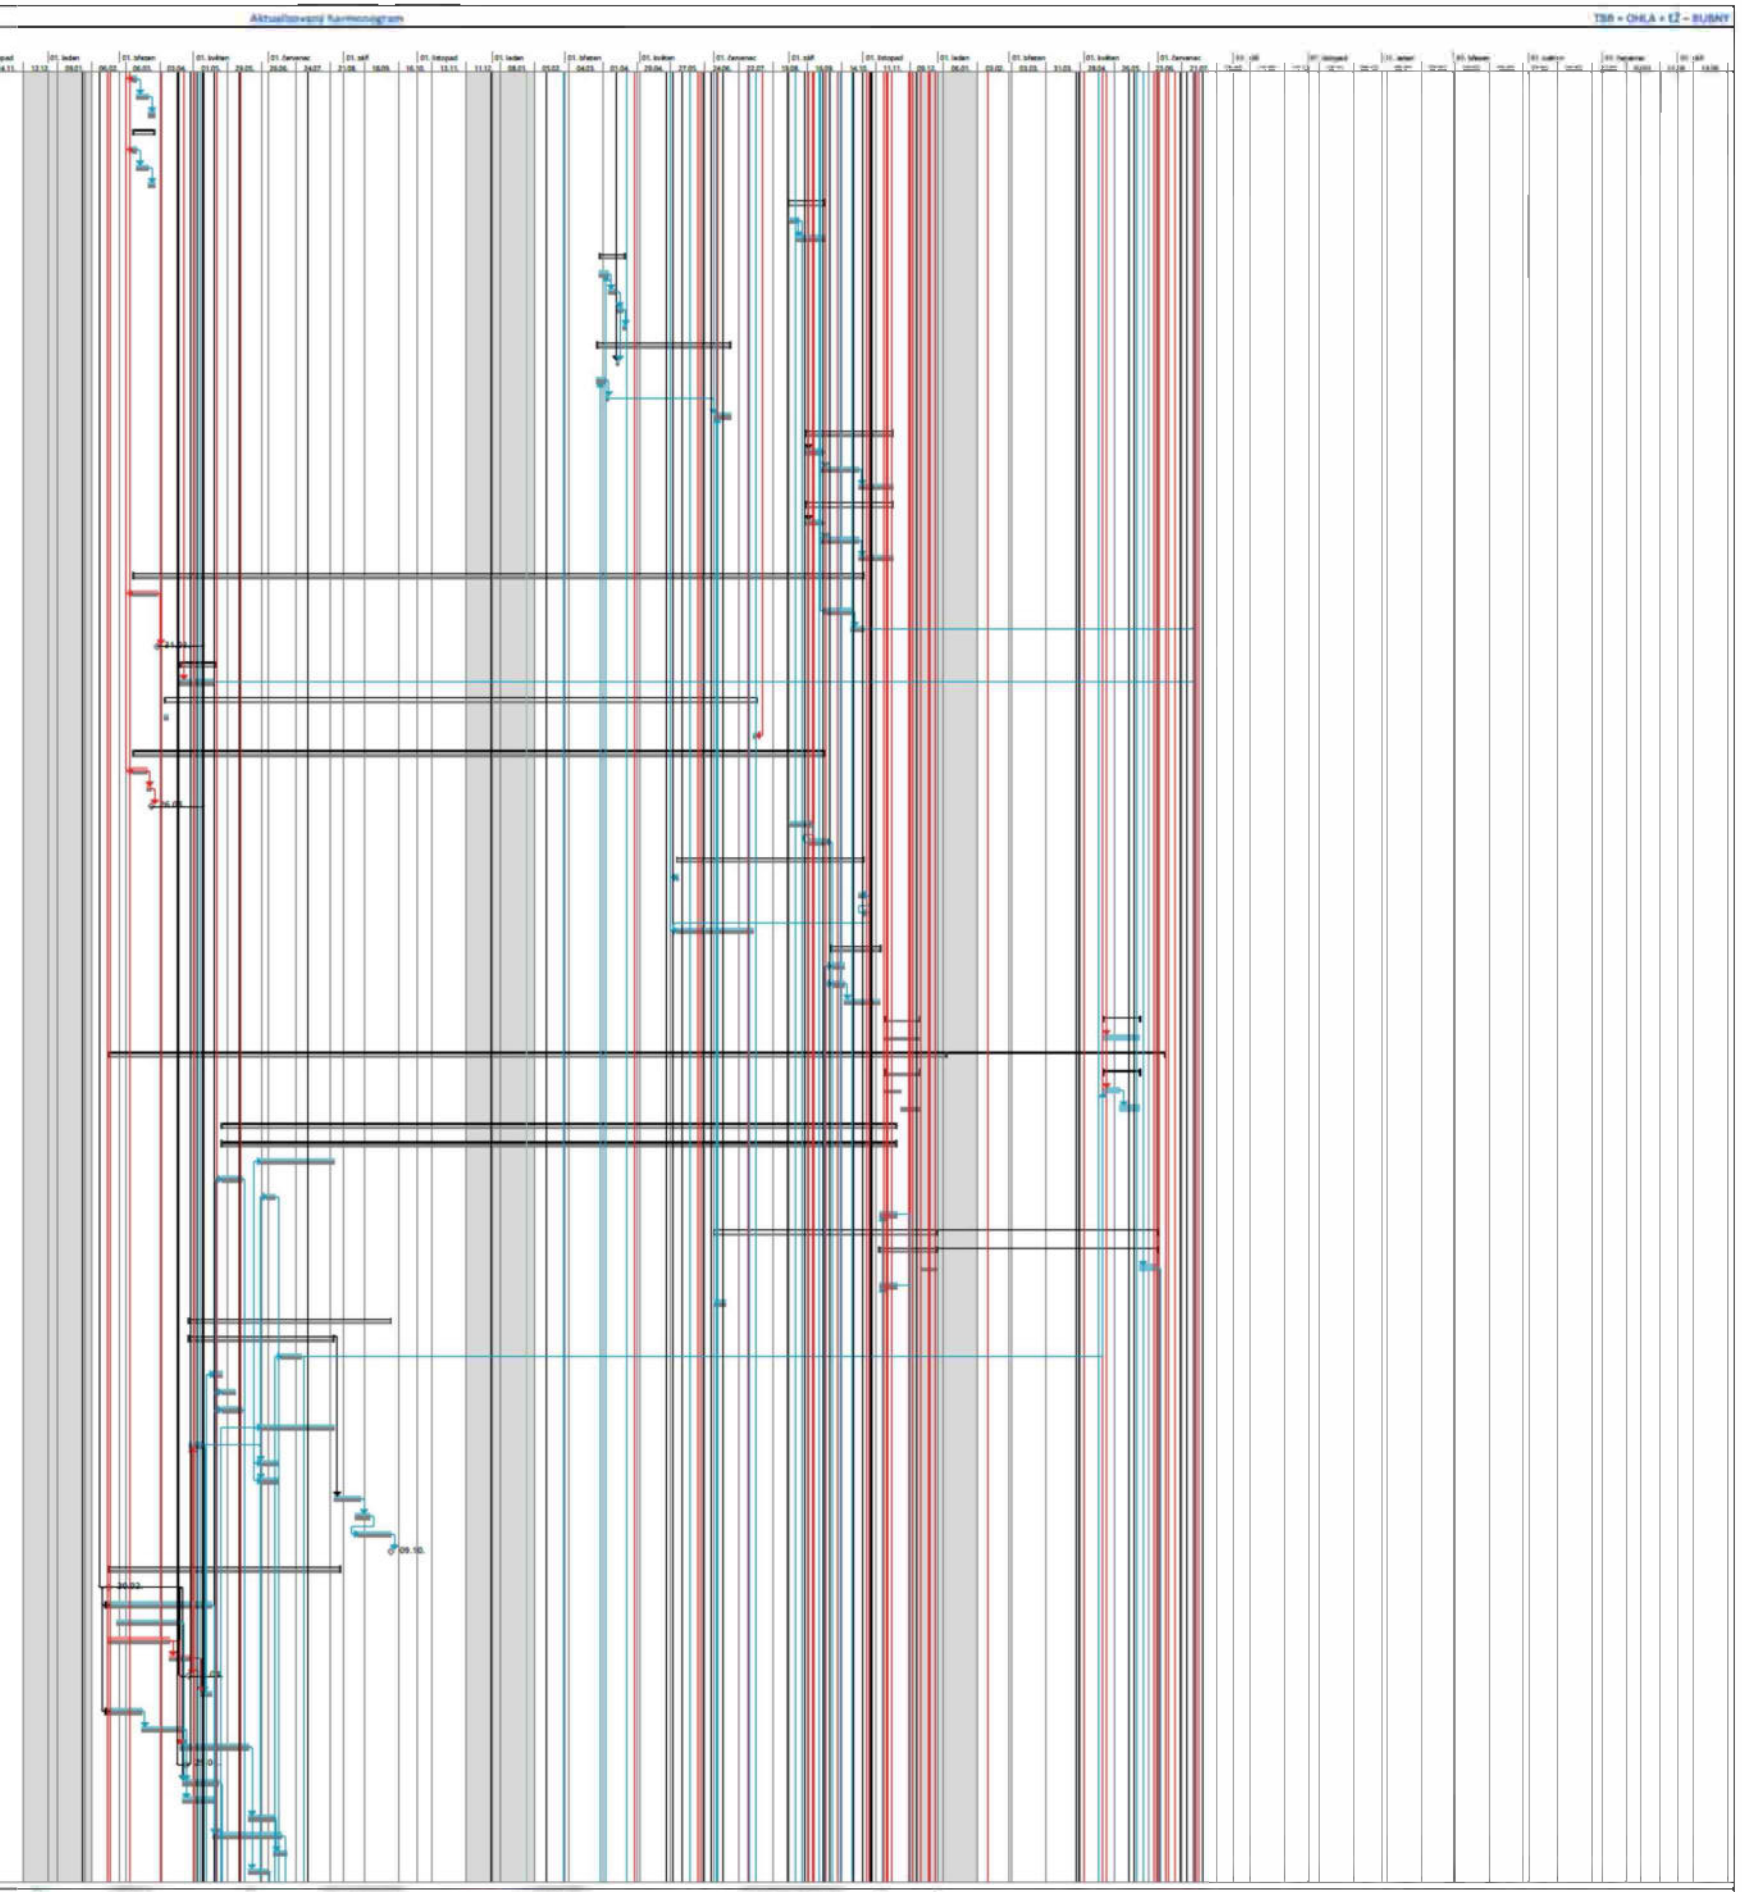

Strana 15 / 19

ID	Kritický úkol	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Kritický	Odchylka dokončení
1371		SO 01-50-01.1	vystrojení tkoly ŠD8 - OV	7 dny	30.06. 23	06.07. 23	1370	1372;1332	Ne	0 dny
1372		SO 01-50-01.1	Likvidace OV	5 dny	07.07. 23	11.07. 23	1371;1332		Ne	0 dny
1373		SO 01-50-01.1	vystrojení tkoly ŠD2 - ŠD9	11 dny	24.05. 23	08.06. 23	1365;1374	1365;1	Ne	0 dny
1374		SO 01-50-01.1	vystrojení protlaku ŠD1 - ŠD2	7 dny	17.05. 23	23.05. 23	1360	1375;1373;1342;1	Ne	0 dny
1375		SO 01-50-01.1	kompletace ŠD8	16 dny	24.05. 23	08.06. 23	1374	1377;1332;1344;1	Ne	0 dny
1376		SO 01-50-01.1	vystrojení protlaku ŠD1 - Vltava	16 dny	12.07. 23	27.07. 23	1368	1378;1365;1	Ne	0 dny
1377		SO 01-50-01.1	Zásyp ŠD8	13 dny	09.06. 23	21.06. 23	1375;1332;1344	1379	Ne	0 dny
1378		SO 01-50-01.1	kompletace ŠD1	14 dny	28.07. 23	10.08. 23	1376		Ne	0 dny
1379		SO 01-50-01.1	kompletace ŠD2	14 dny	22.06. 23	05.07. 23	1377	1381	Ne	0 dny
1380		SO 01-50-01.1	Zásyp ŠD1	8 dny	13.07. 23	20.07. 23	1381		Ne	0 dny
1381		SO 01-50-01.1	Zásyp ŠD2	7 dny	06.07. 23	12.07. 23	1379	1380;1382	Ne	0 dny
1382		SO 01-50-01.1	Likvidace jímky	32 dny	28.07. 23	28.08. 23	1381;1541	2	Ne	0 dny
1383		SO 02-50-00	**SO 02-50-03 - Odvodnění komunikací, ul. Bubenská**	**163 dny**	**15.02. 24**	**30.07. 24**			**Ne**	**0 dny**
1384		SO 02-50-01	přípojky odvodnění - výkop, lože, potrubí, obsyp	14 dny	15.02. 24	03.03. 24	146295-7 dny	1385	Ne	0 dny
1385		SO 02-50-01	šachty	3 dny	04.03. 24	06.03. 24	1384;1462	1386	Ne	0 dny
1386		SO 02-50-01	poklopy, nivelace	3 dny	28.07. 24	30.07. 24	1385;1486FS-1 den		Ne	0 dny
1387		SO 02-51-01	**SO 02-51-01 - Přeložka vodovodu DN 200, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště**	**56 dny**	**12.02. 24**	**07.04. 24**			**Ne**	**0 dny**
1388		SO 02-51-01	realizace vodovodního řadu	42 dny	12.02. 24	24.03. 24	146295-14 dny	1389;1390;1390FS-3 dny	Ne	0 dny
1389		SO 02-51-01	zrušení řadu vpravo ve směru staničení	5 dny	12.02. 24	16.02. 24	1388;1		Ne	0 dny
1390		SO 02-51-01	přípojky	10 dny	22.03. 24	31.03. 24	1388FS-3 dny	1391;1	Ne	0 dny
1391		SO 02-51-01	přepojení na nový řad	1 den	31.03. 24	31.03. 24	1390FF	1392;1410FS-21 dny;1403;1404	Ne	0 dny
1392		SO 02-51-01	zrušení řadu vlevo ve směru staničení	7 dny	01.04. 24	07.04. 24	1391		Ne	0 dny
1393		SO 02-51-02	**SO 02-51-02 - Suchovod**	**35 dny**	**22.11. 24**	**26.12. 24**			**Ano**	**0 dny**
1394		SO 02-51-02	SO 02-51-02 - Suchovod	35 dny	22.11. 24	26.12. 24	150755	151	Ano	0 dny
1395		SO 02-52-01	**SO 02-52-01 - Přeložka plynovodu STL PE dn160, km cca 0,820**	**49 dny**	**12.02. 24**	**31.03. 24**			**Ne**	**0 dny**
1396		SO 02-52-01	realizace nového plynovodu	42 dny	12.02. 24	24.03. 24	146295-14 dny	1397	Ne	0 dny
1397		SO 02-52-01	přepojení na nový řad	2 dny	25.03. 24	26.03. 24	1396	1398;1398	Ne	0 dny
1398		SO 02-52-01	odstranění původního vedení	5 dny	27.03. 24	31.03. 24	1397	1410FS-21 dny;1402;1404	Ne	0 dny
1399		SO 02-52-02	**SO 02-52-02 - Přeložka plynovodu STL PE dn225, km cca 1,160**	**15 dny**	**12.04. 23**	**27.04. 23**			**Ano**	**0 dny**
1400		SO 02-52-02	Připravenost pro zahájení prací přeložka STL	0 dny	12.04. 23	12.04. 23	711;1E+03 dny	1401	Ano	0 dny
1401		SO 02-52-02	zemní práce - výkop rýhy	3 dny	13.04. 23	15.04. 23	1400	1402	Ano	0 dny
1402		SO 02-52-02	uložení potrubí	5 dny	16.04. 23	20.04. 23	1401	1403	Ano	0 dny
1403		SO 02-52-02	2x bypass	3 dny	21.04. 23	23.04. 23	1402	1404	Ano	0 dny
1404		SO 02-52-02	přepojení na nový řad	1 den	24.04. 23	24.04. 23	1403	1405	Ano	0 dny
1405		SO 02-52-02	odstranění původního vedení, zásyp	3 dny	25.04. 23	27.04. 23	1404	1406	Ano	0 dny
1406		SO 02-52-02	Připravenost pro realizaci mostu	0 dny	27.04. 23	27.04. 23	1405	717	Ano	0 dny
1407		SO 02-55-02	**SO 02-55-02 - Dočasná úprava kanálu pro horkovod, km cca 1,100**	**10 dny**	**23.05. 23**	**02.06. 23**			**Ne**	**0 dny**
1408		SO 02-55-02	odstranění kolee se zatěžením pálíře P20	0 dny	02.06. 23	02.06. 23	777SF	1410FS-10 dny;1410FF	Ne	0 dny
1409		SO 02-55-02	odstávka horkovodu	**10 dny**	**23.05. 23**	**01.06. 23**			**Ne**	**0 dny**
1410		SO 02-55-02	v komoře HLS02STR (ul. Strojnická) horkovod přerušen	10 dny	23.05. 23	01.06. 23	1408FS-10 dny	1411;1	Ne	0 dny
1411		SO 02-55-03	**SO 02-55-03 - Dočasná úprava kanálu pro horkovod, km cca 1,100**	**93 dny**	**23.05. 23**	**23.08. 23**			**Ne**	**0 dny**
1412		SO 02-55-03	rozšíření šachty HLS02STR o 0,9m - výkop, ubourání	20 dny	23.05. 23	13.06. 23	1410;1	1413	Ne	0 dny
1413		SO 02-55-03	osazení nové stropní desky, ŽB stěny, hydroizolace	25 dny	12.06. 23	06.07. 23	1412		Ne	0 dny
1414		SO 02-55-03	vybourání vypažnice pod pův. nápěrem	10 dny	23.05. 23	02.06. 23	1408FF		Ne	0 dny
1415		SO 02-55-03	obnova vypažnice	14 dny	31.07. 23	13.08. 23	777	1416	Ne	0 dny
1416		SO 02-55-03	obnova vozovky TSK	10 dny	14.08. 23	23.08. 23	1415		Ne	0 dny
1417		SO 02-55-01	**SO 02-55-01 - Zrušení stávajícího parovodu DN200, km cca 0,820**	**28 dny**	**11.03. 24**	**07.04. 24**			**Ne**	**0 dny**
1418		SO 02-55-01	výkopy + demolice - zbylá část	21 dny	11.03. 24	31.03. 24	139;FS-21 dny;1398FS-21 dny	1419;1398FS-3 dny;1403;1404	Ne	0 dny
1419		SO 02-55-01	převaření + hydroizolace na ukončení	7 dny	01.04. 24	07.04. 24	1418		Ne	0 dny
1420		SO 03-50-01	**SO 03-50-01 - Kanalizační přípojka jednotná, Praha-Výstaviště**	**30 dny**	**27.03. 24**	**25.04. 24**			**Ne**	**0 dny**
1421		SO 03-50-01	přípojka DN 200 zaústěná do jednotné kanalizace VP 600/1100	30 dny	27.03. 24	25.04. 24	1424;1		Ne	0 dny
1422		SO 03-50-01	revizní šachty 2ks	30 dny	27.03. 24	25.04. 24	1424;1		Ne	0 dny
1423		SO 03-50-02	**SO 03-50-02 - Kanalizační přípojka dešťová, Praha-Výstaviště**	**58 dny**	**20.02. 24**	**17.04. 24**			**Ne**	**0 dny**
1424		SO 03-50-02	přípojka dešťové kanalizace DN 400, výkop, pokládka	22 dny	27.03. 24	17.04. 24	1425FS-14 dny	1424;1;1425;1;1423	Ne	0 dny
1425		SO 03-50-02	Vsakovací galerie z plastových boxů	50 dny	20.02. 24	08.04. 24	1038FS-14 dny	1424FS-14 dny	Ne	0 dny
1426		SO 03-50-03	**SO 03-50-03 - Odvodnění komunikací, ul. Dukelských hrdinů**	**30 dny**	**17.09. 24**	**16.10. 24**			**Ne**	**0 dny**
1427		SO 03-50-03	SO 03-50-03 - Odvodnění komunikací, ul. Dukelských hrdinů	30 dny	17.09. 24	16.10. 24	1476SS-14 dny		Ne	0 dny
1428		SO 03-51-01	**SO 03-51-01 - Vodovodní přípojka, Praha-Výstaviště**	**31 dny**	**27.03. 24**	**26.04. 24**			**Ne**	**0 dny**
1429		SO 03-51-01	Výkop	10 dny	27.03. 24	05.04. 24	1424;1	1430	Ne	0 dny
1430		SO 03-51-01	Podsyp, pokládka potrubí, obsyp	15 dny	06.04. 24	20.04. 24	1429	1431	Ne	0 dny
1431		SO 03-51-01	Zásyp se zhutněním	6 dny	21.04. 24	26.04. 24	1430		Ne	0 dny
1432		SO 52-50-01	**SO 52-50-01 - Kanalizační přípojka kolejí, Praha-Bubny - Stromovka**	**30 dny**	**07.05. 25**	**05.06. 25**			**Ne**	**180 dny**
1433		SO 52-50-01	SO 52-50-01 - Kanalizační přípojka kolejí, Praha-Bubny - Stromovka	30 dny	07.05. 25	05.06. 25	45;1;1;1		Ne	180 dny
1434		SO 01-51-02	**SO 01-51-02 - Vodovodní přípojka, Praha-Bubny**	**7 dny**	**30.06. 25**	**06.07. 25**			**Ne**	**180 dny**
1435		SO 01-51-02	SO 01-51-02 - Vodovodní přípojka, Praha-Bubny	7 dny	30.06. 25	06.07. 25	1336		Ne	180 dny
1436		SO 02-50-01	**SO 02-50-01 - Likvidace dešťových vod, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště**	**466 dny**	**23.08. 23**	**30.11. 24**			**Ne**	**0 dny**
1437		SO 02-50-01	trasa ŠDC6 - ŠDC10	90 dny	23.08. 23	20.11. 23	201;FS-35 dny		Ne	0 dny
1438		SO 02-50-01	trasa ŠDC10, ŠDC10.1, ŠDC11	30 dny	01.11. 24	30.11. 24	1180		Ne	0 dny
1439		SO 02-50-01	přípojky z malých estakád	14 dny	18.06. 24	01.07. 24	700;594		Ne	0 dny
1440		SO 02-50-02	**SO 02-50-02 - Odvodnění estakády, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště**	**100 dny**	**27.09. 24**	**04.01. 25**		1469	**Ne**	**0 dny**
1441		SO 02-50-02	potrubí, šachty, napojení na odvodnění estakády	100 dny	27.09. 24	04.01. 25	118;1;1;1	147;FS-7 dny	Ne	0 dny
1442		D.2.1.8	**D.2.1.8 - Pozemní komunikace**	**548 dny**	**06.01. 24**	**06.07. 25**			**Ne**	**156 dny**
1443		SO 01-30-01	**SO 01-30-01 - Příjezdová komunikace Praha-Bubny**	**75 dny**	**31.10. 24**	**13.01. 25**			**Ne**	**0 dny**
1444		SO 01-30-01	Zemní práce	14 dny	31.10. 24	13.11. 24	1920;1921	1445;1;1;1

Harmonogram stavby "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)"

Aktualizovaný harmonogram

TSR + OHLA + EŽ – BUBNY

ID	Řadit úkoly	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Kritický	Odchylka dokončení
1473		SO 03-30-01	mlatová cesta pod mostem	30 dny	29.12. 24	27.01. 25	1443FS-7 dny		Ne	0 dny
1474		SO 03-30-01	**SO 03-30-01 - Úprava komunikací Praha-Výstaviště**	**31 dny**	**01.10. 24**	**31.10. 24**			**Ne**	**0 dny**
1475		SO 03-30-01	zemní práce	5 dny	01.10. 24	05.10. 24	3FS-31 dny	1475FS-2 dny;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575	Ne	0 dny
1476		SO 03-30-01	obruby	15 dny	04.10. 24	18.10. 24	1475FS-2 dny	1477	Ne	0 dny
1477		SO 03-30-01	podkladní vrstvy	8 dny	19.10. 24	26.10. 24	1476	1478	Ne	0 dny
1478		SO 03-30-01	pokládka asfaltu	5 dny	27.10. 24	31.10. 24	1477		Ne	0 dny
1479		SO 03-30-01	DIO	31 dny	01.10. 24	31.10. 24	1475SS		Ne	0 dny
1480		SO 03-30-01.1	**SO 03-30-01.1 - Úprava komunikací Praha-Výstaviště, opěrné zdi**	**35 dny**	**01.10. 24**	**04.11. 24**			**Ne**	**0 dny**
1481		SO 03-30-01.1	výkopy, podkladní beton	5 dny	01.10. 24	05.10. 24	1475SS	1482;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575	Ne	0 dny
1482		SO 03-30-01.1	opěrná zídka, armatura, bednění, betonáž	28 dny	06.10. 24	02.11. 24	1481	1483	Ne	0 dny
1483		SO 03-30-01.1	stěryp	1 den	03.11. 24	03.11. 24	1482	1484	Ne	0 dny
1484		SO 03-30-01.1	Zábradlí	1 den	04.11. 24	04.11. 24	1483		Ne	0 dny
1485		SO 03-30-01.2	**SO 03-30-01.2 - Úprava komunikací Praha-Výstaviště, dělicí stěna**	**44 dny**	**01.10. 24**	**13.11. 24**			**Ne**	**0 dny**
1486		SO 03-30-01.2	výkopy, podkladní beton	5 dny	01.10. 24	05.10. 24	1485SS	1487	Ne	0 dny
1487		SO 03-30-01.2	opěrná zídka, armatura, bednění, betonáž	28 dny	06.10. 24	02.11. 24	1486	1488	Ne	0 dny
1488		SO 03-30-01.2	stěryp	1 den	03.11. 24	03.11. 24	1487	1489	Ne	0 dny
1489		SO 03-30-01.2	Zábradlí	10 dny	04.11. 24	13.11. 24	1488		Ne	0 dny
1490		SO 03-30-02	**SO 03-30-02 - Chodníky Praha-Výstaviště**	**32 dny**	**01.10. 24**	**01.11. 24**			**Ne**	**0 dny**
1491		SO 03-30-02	zemní práce	7 dny	01.10. 24	07.10. 24	1485SS	1492	Ne	0 dny
1492		SO 03-30-02	obruby	15 dny	08.10. 24	22.10. 24	1491	1493	Ne	0 dny
1493		SO 03-30-02	podkladní vrstvy	5 dny	23.10. 24	27.10. 24	1492	1494	Ne	0 dny
1494		SO 03-30-02	pokládka asfaltu	5 dny	28.10. 24	01.11. 24	1493		Ne	0 dny
1495		SO 03-30-03	**SO 03-30-03 - Chodníky Stromovka**	**55 dny**	**25.08. 24**	**18.10. 24**			**Ne**	**0 dny**
1496		SO 03-30-03	Zemní práce	12 dny	25.08. 24	05.09. 24		1497;1275SS	Ne	0 dny
1497		SO 03-30-03	Obruby	14 dny	06.09. 24	19.09. 24	1496	1498	Ne	0 dny
1498		SO 03-30-03	Podkladní vrstvy	8 dny	20.09. 24	27.09. 24	1497	1499	Ne	0 dny
1499		SO 03-30-03	Pokládka krytu	21 dny	28.09. 24	18.10. 24	1498		Ne	0 dny
1500		D.2.1.9	**D.2.1.9 - Kabelovody, kolektory**	**399 dny**	**13.06. 24**	**16.07. 25**			**Ano**	**180 dny**
1501		SO 01-40-01	**SO 01-40-01 - Praha - Bubny, sdružené kabelové trasy**	**273 dny**	**17.10. 24**	**16.07. 25**			**Ano**	**180 dny**
1502		SO 01-40-01	nástupiště v DC 1, 2 a 3	14 dny	17.10. 24	30.10. 24	463FS-20 dny	464;1505	Ano	0 dny
1503		SO 01-40-01	dilatační celky 4 a 5	7 dny	15.12. 24	21.12. 24	468FS-8 dny	469;1505;2058FS-14 dny;2065	Ano	0 dny
1504		SO 01-40-01	Montáž lce kabelovodu v kolejišti	10 dny	07.07. 25	16.07. 25	409;408;407;405;404;403	1505;1535-5 dny	Ano	180 dny
1505		SO 01-40-01	Připravenost kabelovodu pro zatažení kabelů - Bubny	0 dny	16.07. 25	16.07. 25	1504;1503;1502	1047FS+14 dny;30	Ano	180 dny
1506		SO 02-40-01	**SO 02-40-01 - TÚ Praha - Bubny - Praha - Výstaviště, sdružené kabelové trasy**	**40 dny**	**22.11. 24**	**31.12. 24**			**Ano**	**0 dny**
1507		SO 02-40-01	Montáž kabelových žlabů	35 dny	22.11. 24	26.12. 24	1181;1507	1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1576;1577;1578;1579;1580;1581;1582;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1805;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1872;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1880;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;1891;1892;1893;1894;1895;1896;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024;2025;2026;2027;2028;2029;2030;2031;2032;2033;2034;2035;2036;2037;2038;2039;2040;2041;2042;2043;2044;2045;2046;2047;2048;2049;2050;2051;2052;2053;2054;2055;2056;2057;2058;2059;2060;2061;2062;2063;2064;2065;2066;2067;2068;2069;2070;2071;2072;2073;2074;2075;2076;2077;2078;2079;2080;2081;2082;2083;2084;2085;2086;2087;2088;2089;2090;2091;2092;2093;2094;2095;2096;2097;2098;2099;2100;2101;2102;2103;2104;2105;2106;2107;2108;2109;2110;2111;2112;2113;2114;2115;2116;2117;2118;2119;2120;2121;2122;2123;2124;2125;2126;2127;2128;2129;2130;2131;2132;2133;2134;2135;2136;2137;2138;2139;2140;2141;2142;2143;2144;2145;2146;2147;2148;2149;2150;2151;2152;2153;2154;2155;2156;2157;2158;2159;2160;2161;2162;2163;2164;2165;2166;2167;2168;2169;2170;2171;2172;2173;2174;2175;2176;2177;2178;2179;2180;2181;2182;2183;2184;2185;2186;2187;2188;2189;2190;2191;2192;2193;2194;2195;2196;2197;2198;2199;2200;2201;2202;2203;2204;2205;2206;2207;2208;2209;2210;2211;2212;2213;2214;2215;2216;2217;2218;2219;2220;2221;2222;2223;2224;2225;2226;2227;2228;2229;2230;2231;2232;2233;2234;2235;2236;2237;2238;2239;2240;2241;2242;2243;2244;2245;2246;2247;2248;2249;2250;2251;2252;2253;2254;2255;2256;2257;2258;2259;2260;2261;2262;2263;2264;2265;2266;2267;2268;2269;2270;2271;2272;2273;2274;2275;2276;2277;2278;2279;2280;2281;2282;2283;2284;2285;2286;2287;2288;2289;2290;2291;2292;2293;2294;2295;2296;2297;2298;2299;2300;2301;2302;2303;2304;2305;2306;2307;2308;2309;2310;2311;2312;2313;2314;2315;2316;2317;2318;2319;2320;2321;2322;2323;2324;2325;2326;2327;2328;2329;2330;2331;2332;2333;2334;2335;2336;2337;2338;2339;2340;2341;2342;2343;2344;2345;2346;2347;2348;2349;2350;2351;2352;2353;2354;2355;2356;2357;2358;2359;2360;2361;2362;2363;2364;2365;2366;2367;2368;2369;2370;2371;2372;2373;2374;2375;2376;2377;2378;2379;2380;2381;2382;2383;2384;2385;2386;2387;2388;2389;2390;2391;2392;2393;2394;2395;2396;2397;2398;2399;2400;2401;2402;2403;2404;2405;2406;2407;2408;2409;2410;2411;2412;2413;2414;2415;2416;2417;2418;2419;2420;2421;2422;2423;2424;2425;2426;2427;2428;2429;2430;2431;2432;2433;2434;2435;2436;2437;2438;2439;2440;2441;2442;2443;2444;2445;2446;2447;2448;2449;2450;2451;2452;2453;2454;2455;2456;2457;2458;2459;2460;2461;2462;2463;2464;2465;2466;2467;2468;2469;2470;2471;2472;2473;2474;2475;2476;2477;2478;2479;2480;2481;2482;2483;2484;2485;2486;2487;2488;2489;2490;2491;2492;2493;2494;2495;2496;2497;2498;2499;2500;2501;2502;2503;2504;2505;2506;2507;2508;2509;2510;2511;2512;2513;2514;2515;2516;2517;2518;2519;2520;2521;2522;2523;2524;2525;2526;2527;2528;2529;2530;2531;2532;2533;2534;2535;2536;2537;2538;2539;2540;2541;2542;2543;2544;2545;2546;2547;2548;2549;2550;2551;2552;2553;2554;2555;2556;2557;2558;2559;2560;2561;2562;2563;2564;2565;2566;2567;2568;2569;2570;2571;2572;2573;2574;2575;2576;2577;2578;2579;2580;2581;2582;2583;2584;2585;2586;2587;2588;2589;2590;2591;2592;2593;2594;2595;2596;2597;2598;2599;2600;2601;2602;2603;2604;2605;2606;2607;2608;2609;2610;2611;2612;2613;2614;2615;2616;2617;2618;2619;2620;2621;2622;2623;2624;2625;2626;2627;2628;2629;2630;2631;2632;2633;2634;2635;2636;2637;2638;2639;2640;2641;2642;2643;2644;2645;2646;2647;2648;2649;2650;2651;2652;2653;2654;2655;2656;2657;2658;2659;2660;2661;2662;2663;2664;2665;2666;2667;2668;2669;2670;2671;2672;2673;2674;2675;2676;2677;2678;2679;2680;2681;2682;2683;2684;2685;2686;2687;2688;2689;2690;2691;2692;2693;2694;2695;2696;2697;2698;2699;2700;2701;2702;2703;2704;2705;2706;2707;2708;2709;2710;2711;2712;2713;2714;2715;2716;2717;2718;2719;2720;2721;2722;2723;2724;2725;2726;2727;2728;2729;2730;2731;2732;2733;2734;2735;2736;2737;2738;2739;2740;2741;2742;2743;2744;2745;2746;2747;2748;2749;2750;2751;2752;2753;2754;2755;2756;2757;2758;2759;2760;2761;2762;2763;2764;2765;2766;2767;2768;2769;2770;2771;2772;2773;2774;2775;2776;2777;2778;2779;2780;2781;2782;2783;2784;2785;2786;2787;2788;2789;2790;2791;2792;2793;2794;2795;2796;2797;2798;2799;2800;2801;2802;2803;2804;2805;2806;2807;2808;2809;2810;2811;2812;2813;2814;2815;2816;2817;2818;2819;2820;2821;2822;2823;2824;2825;2826;2827;2828;2829;2830;2831;2832;2833;2834;2835;2836;2837;2838;2839;2840;2841;2842;2843;2844;2845;2846;2847;2848;2849;2850;2851;2852;2853;2854;2855;2856;2857;2858;2859;2860;2861;2862;2863;2864;2865;2866;2867;2868;2869;2870;2871;2872;2873;2874;2875;2876;2877;2878;2879;2880;2881;2882;2883;2884;2885;2886;2887;2888;2889;2890;2891;2892;2893;2894;2895;2896;2897;2898;2899;2900;2901;2902;2903;2904;2905;2906;2907;2908;2909;2910;2911;2912;2913;2914;2915;2916;2917;2918;2919;2920;2921;2922;2923;2924;2925;2926;2927;2928;2929;2930;2931;2932;2933;2934;2935;2936;2937;2938;2939;2940;2941;2942;2943;2944;2945;2946;2947;2948;2949;2950;2951;2952;2953;2954;2955;2956;2957;2958;2959;2960;2961;2962;2963;2964;2965;2966;2967;2968;2969;2970;2971;2972;2973;2974;2975;2976;2977;2978;2979;2980;2981;2982;2983;2984;2985;2986;2987;2988;2989;2990;2991;2992;2993;2994;2995;2996;2997;2998;2999;3000;3001;3002;3003;3004;3005;3006;3007;3008;3009;3010;3011;3012;3013;3014;3015;3016;3017;3018;3019;3020;3021;3022;3023;3024;3025;3026;3027;3028;3029;3030;3031;3032;3033;3034;3035;3036;3037;3038;3039;3040;3041;3042;3043;3044;3045;3046;3047;3048;3049;3050;3051;3052;3053;3054;3055;3056;3057;3058;3059;3060;3061;3062;3063;3064;3065;3066;3067;3068;3069;3070;3071;3072;3073;3074;3075;3076;3077;3078;3079;3080;3081;3082;3083;3084;3085;3086;3087;3088;3089;3090;3091;3092;3093;3094;3095;3096;3097;3098;3099;3100;3101;3102;3103;3104;3105;3106;3107;3108;3109;3110;3111;3112;3113;3114;3115;3116;3117;3118;3119;3120;3121;3122;3123;3124;3125;3126;3127;3128;3129;3130;3131;3132;3133;3134;3135;3136;3137;3138;3139;3140;3141;3142;3143;3144;3145;3146;3147;3148;3149;3150;3151;3152;3153;3154;3155;3156;3157;3158;3159;3160;3161;3162;3163;3164;3165;3166;3167;3168;3169;3170;3171;3172;3173;3174;3175;3176;3177;3178;3179;3180;3181;3182;3183;3184;3185;3186;3187;3188;3189;3190;3191;3192;3193;3194;3195;3196;3197;3198;3199;3200;3201;3202;3203;3204;3205;3206;3207;3208;3209;3210;3211;3212;3213;3214;3215;3216;3217;3218;3219;3220;3221;3222;3223;3224;3225;3226;3227;3228;3229;3230;3231;3232;3233;3234;3235;3236;3237;3238;3239;3240;3241;3242;3243;3244;3245;3246;3247;3248;3249;3250;3251;3252;3253;3254;3255;3256;3257;3258;3259;3260;3261;3262;3263;3264;3265;3266;3267;3268;3269;3270;3271;3272;3273;3274;3275;3276;3277;3278;3279;3280;3281;3282;3283;3284;3285;3286;3287;3288;3289;3290;3291;3292;3293;3294;3295;3296;3297;3298;3299;3300;3301;3302;3303;3304;3305;3306;3307;3308;3309;3310;3311;3312;3313;3314;3315;3316;3317;3318;3319;3320;3321;3322;3323;3324;3325;3326;3327;3328;3329;3330;3331;3332;3333;3334;3335;3336;3337;3338;3339;3340;3341;3342;3343;3344;3345;3346;3347;3348;3349;3350;3351;3352;3353;3354;3355;3356;3357;3358;3359;3360;3361;3362;3363;3364;3365;3366;3367;3368;3369;3370;3371;3372;3373;3374;3375;3376;3377;3378;3379;3380;3381;3382;3383;3384;3385;3386;3387;3388;3389;3390;3391;3392;3393;3394;3395;3396;3397;3398;3399;3400;3401;3402;3403;3404;3405;3406;3407;3408;3409;3410;3411;3412;3413;3414;3415;3416;3417;3418;3419;3420;3421;3422;3423;3424;3425;3426;3427;3428;3429;3430;3431;3432;3433;3434;3435;3436;3437;3438;3439;3440;3441;3442;3443;3444;3445;3446;3447;3448;3449;3450;3451;3452;3453;3454;3455;3456;3457;3458;3459;3460;3461;3462;3463;3464;3465;3466;3467;3468;3469;3470;3471;3472;3473;3474;3475;3476;3477;3478;3479;3480;3481;3482;3483;3484;3485;3486;3487;3488;3489;3490;3491;3492;3493;3494;3495;3496;3497;3498;3499;3500;3501;3502;3503;3504;3505;3506;3507;3508;3509;3510;3511;3512;3513;3514;3515;3516;3517;3518;3519;3520;3521;3522;3523;3524;3525;3526;3527;3528;3529;3530;3531;3532;3533;3534;3535;3536;3537;3538;3539;3540;3541;3542;3543;3544;3545;3546;3547;3548;3549;3550;3551;3552;3553;3554;3555;3556;3557;3558;3559;3560;3561;3562;3563;3564;3565;3566;3567;3568;3569;3570;3571;3572;3573;3574;3575;3576;3577;3578;3579;3580;3581;3582;3583;3584;3585;3586;3587;3588;3589;3590;3591;3592;3593;3594;3595;3596;3597;3598;3599;3600;3601;3602;3603;3604;3605;3606;3607;3608;3609;3610;3611;3612;3613;3614;3615;3616;3617;3618;3619;3620;3621;3622;3623;3624;3625;3626;3627;3628;3629;3630;3631;3632;3633;3634;3635;3636;3637;3638;3639;3640;3641;3642;3643;3644;3645;3646;3647;3648;3649;3650;3651;3652;3653;3654;3655;3656;3657;3658;3659;3660;3661;3662;3663;3664;3665;3666;3667;3668;3669;3670;3671;3672;3673;3674;3675;3676;3677;3678;3679;3680;3681;3682;3683;3684;3685;3686;3687;3688;3689;3690;3691;3692;3693;3694;3695;3696;3697;3698;3699;3700;3701;3702;3703;3704;3705;3706;3707;3708;3709;3710;3711;3712;3713;3714;3715;3716;3717;3718;3719;3720;3721;3722;3723;3724;3725;3726;3727;3728;3729;3730;3731;3732;3733;3734;3735;3736;3737;3738;3739;3740;3741;3742;3743;3744;3745;3746;3747;3748;3749;3750;3751;3752;3753;3754;3755;3756;3757;3758;3759;3760;3761;3762;3763;3764;3765;3766;3767;3768;3769;3770;3771;3772;3773;3774;3775;3776;3777;3778;3779;3780;3781;3782;3783;3784;3785;3786;3787;3788;3789;3790;3791;3792;3793;3794;3795;3796;3797;3798;3799;3800;3801;3802;3803;3804;3805;3806;3807;3808;3809;3810;3811;3812;3813;3814;3815;3816;3817;3818;3819;3820;3821;3822;3823;3824;3825;3826;3827;3828;3829;3830;3831;3832;3833;3834;3835;3836;3837;3838;3839;3840;3841;3842;3843;3844;3845;3846;3847;3848;3849;3850;3851;3852;3853;3854;3855;3856;3857;3858;3859;3860;3861;3862;3863;3864;3865;3866;3867;3868;3869;3870;3871;3872;3873;3874;3875;3876;3877;3878;3879;3880;3881;3882;3883;3884;3885;3886;3887;3888;3889;3890;3891;3892;3893;3894;3895;3896;3897;3898;3899;3900;3901;3902;3903;3904;3905;3906;3907;3908;3909;3910;3911;3912;3913;3914;3915;3916;3917;3918;3919;3920;3921;3922;3923;3924;3925;3926;3927;3928;3929;3930;3931;3932;3933;3934;3935;3936;3937;3938;3939;3940;3941;3942;3943;3944;3945;3946;3947;3948;3949;3950;3951;3952;3953;3954;3955;3956;3957;3958;3959;3960;3961;3962;3963;3964;3965;3966;3967;3968;3969;3970;3971;3972;3973;3974;3975;3976;3977;3978;3979;3980;3981;3982;3983;3984;3985;3986;3987;3988;3989;3990;3991;3992;3993;3994;3995;3996;3997;3998;3999;4000;4001;4002;4003;4004;4005;4006;4007;4008;4009;4010;4011;4012;4013;4014;4015;4016;4017;4018;4019;4020;4021;4022;4023;4024;4025;4026;4027;4028;4029;4030;4031;4032;4033;4034;4035;4036;4037;4038;4039;4040;4041;4042;4043;4044;4045;4046;4047;4048;4049;4050;4051;4052;4053;4054;4055;4056;4057;4058;4059;4060;4061;4062;4063;4064;4065;4066;4067;4068;4069;4070;4071;4072;4073;4074;4075;4076;4077;4078;4079;4080;4081;4082;4083;4084;4085;4086;4087;4088;4089;4090;4091;4092;4093;4094;4095;4096;4097;4098;4099;4100;4101;4102;4103;4104;4105;4106;4107;4108;4109;4110;4111;4112;4113;4114;4115;4116;4117;4118;4119;4120;4121;4122;4123;4124;4125;4126;4127;4128;4129;4130;4131;4132;4133;4134;4135;4136;4137;4138;4139;4140;4141;4142;4143;4144;4145;4146;4147;4148;4149;4150;4151;4152;4153;4154;4155;4156;4157;4158;4159;4160;4161;4162;4163;4164;4165;4166;4167;4168;4169;4170;4171;4172;4173;4174;4175;4176;4177;4178;4179;4180;4181;4182;4183;4184;4185;4186;4187;4188;4189;4190;4191;4192;4193;4194;4195;4196;4197;4198;4199;4200;4201;4202;4203;4204;4205;4206;4207;4208;4209;4210;4211;4212;4213;4214;4215;4216;4217;4218;4219;4220;4221;4222;4223;4224;4225;4226;4227;4228;4229;4230;4231;4232;4233;4234;4235;4236;4237;4238;4239;4240;4241;4242;4243;4244;4245;4246;4247;4248;4249;4250;4251;4252;4253;4254;4255;4256;4257;4258;4259;4260;4261;4262;4263;4264;4265;4266;4267;4268;4269;4270;4271;4272;4273;4274;4275;4276;4277;4278;4279;4280;4281;4282;4283;4284;4285;4286;4287;4288;4289;4290;4291;4292;4293;4294;4295;4296;4297;4298;4299;4300;4301;4302;4303;4304;4305;4306;4307;4308;4309;4310;4311;4312;4313;4314;4315;4316;4317;4318;4319;4320;4321;4322;4323;4324;4325;4326;4327;4328;4329;4330;4331;4332;4333;4334;4335;4336;4337;4338;4339;4340;4341;4342;4343;4344;4345;4346;4347;4348;4349;4350;4351;4352;4353;4354;4355;4356;4357;4358;4359;4360;4361;4362;4363;4364;4365;4366;4367;4368;4369;4370;4371;4372;4373;4374;4375;4376;4377;4378;4379;4380;4381;4382;4383;4384;4385;4386;4387;4388;4389;4390;4391;4392;4393;4394;4395;4396;4397;4398;4399;4400;4401;4402;4403;4404;4405;4406;4407;4408;4409;4410;4411;4412;4413;4414;4415;4416;4417;4418;4419;4420;4421;4422;4423;4424;4425;4426;4427;4428;4429;4430;4431;4432;4433;4434;4435;4436;4437;4438;4439;4440;4441;4442;4443;4444;4445;4446;4447;4448;4449;4450;4451;4452;4453;4454;4455;4456;4457;4458;4459;4460;4461;4462;4463;4464;4465;4466;4467;4468;4469;4470;4471;4472;4473;4474;4475;4476;4477;4478;4479;4480;4481;4482;4483;4484;4485;4486;4487;4488;4489;4490;4491;4492;4493;4494;4495;4496;4497;4498;4499;4500;4501;4502;4503;4504;4505;4506;4507;4508;4509;4510;4511;4512;4513;4514;4515;4516;4517;4518;4519;4520;4521;4522;4523;4524;4525;4526;4527;4528;4529;4530;4531;4532;4533;4534;4535;4536;4537;4538;4539;4540;4541;4542;4543;4544;4545;4546;4547;4548;4549;4550;4551;4552;4553;4554;4555;4556;4557;4558;4559;4560;4561;4562;4563;4564;4565;4566;4567;4568;4569;4570;4571;4572;4573;4574;4575;4576;4577;4578;4579;4580;4581;4582;4583;4584;4585;4586;4587;4588;4589;4590;4591;4592;4593;4594;4595;4596;4597;4598;4599;4600;4601;4602;4603;4604;4605;4606;4607;4608;4609;4610;4611;4612;4613;4614;4615;4616;4617;4618;4619;4620;4621;4622;4623;4624;4625;4626;4627;4628;4629;4630;4631;4632;4633;4634;4635;4636;4637;4638;4639;4640;4641;4642;4643;4644;4645;4646;4647;4648;4649;4650;4651;4652;4653;4654;4655;4656;4657;4658;4659;4660;4661;4662;4663;4664;4665;4666;4667;4668;4669;4670;4671;4672;4673;4674;4675;4676;4677;4678;4679;4680;4681;4682;4683;4684;4685;4686;4687;4688;4689;4690;4691;4692;4693;4694;4695;4696;4697;4698;4699;4700;4701;4702;4703;4704;4705;4706;4707;4708;4709;4710;4711;4712;4713;4714;4715;4716;4717;4718;4719;4720;4721;4722;4723;4724;4725;4726;4727;4728;4729;4730;4731;4732;4733;4734;4735;4736;4737;4738;4739;4740;4741;4742;4743;4744;4745;4746;4747;4748;4749;4750;4751;4752;4753;4754;4755;4756;4757;4758;4759;4760;4761;4762;4763;4764;4765;4766;4767;4768;4769;4770;4771;4772;4773;4774;4775;4776;4777;4778;4779;4780;4781;4782;4783;4784;4785;4786;4787;4788;4789;4790;4791;4792;4793;4794;4795;4796;4797;4798;4799;4800;4801;4802;4803;4804;4805;4806;4807;4808;4809;4810;4811;4812;4813;4814;4815;4816;4817;4818;4819;4820;4821;4822;4823;4824;4825;4826;4827;4828;4829;4830;4831;4832;4833;4834;4835;4836;4837;4838;4839;4840;4841;4842;4843;4844;4845;4846;4847;4848;4849;4850;4851;4852;4853;4854;4855;4856;4857;4858;4859;4860;4861;4862;4863;4864;4865;4866;4867;4868;4869;4870;4871;4872;4873;4874;4875;4876;4877;4878;4879;4880;4881;4882;4883;4884;4885;4886;4887;4888;4889;4890;4891;4892;4893;4894;4895;4896;4897;4898;4899;4900;4901;4902;4903;4904;4905;4906;4907;4908;4909;4910;4911;4912;4913;4914;4915;4916;4917;4918;4919;4920;4921;4922;4923;4924;4925;4926;4927;4928;4929;4930;4931;4932;4933;4934;4935;4936;4937;4938;4939;4940;4941;4942;4943;4944;4945;4946;4947;4948;4949;4950;4951;4952;4953;4954;4955;4956;4957;4958;4959;4960;4961;4962;4963;4964;4965;4966;4967;4968;4969;4970;4971;4972;4973;4974;4975;4976;4977;4978;4979;4980;4981;4982;4983;4984;4985;4986;4987;4988;4989;4990;4991;4992;4993;4994;4995;4996;4997;4998;4999;5000;5001;5002;5003;5004;5005;5006;5007;5008;5009;5010;5011;5012;5013;5014;5015;5016;5017;5018;5019;5020;5021;5022;5023;5024;5025;5026;5027;5028;5029;5030;5031;5032;5033;5034;5035;5036;5037;5038;5039;5040;5041;5042;5043;5044;5045;5046;5047;5048;5049;5050;5051;5052;5053;5054;5055;5056;5057;5058;5059;5060;5061;5062;5063;5064;5065;5066;5067;5068;5069;5070;5071;5072;5073;5074;5075;5076;5077;5078;5079;5080;5081;5082;5083;5084;5085;5086;5087;5088;5089;5090;5091;5092;5093;5094;5095;5096;5097;5098;5099;5100;5101;5102;5103;5104;5105;5106;5107;5108;5109;5110;5111;5112;5113;5114;5115;5116;5117;5118;5119;5120;5121;5122;5123;5124;5125;5126;5127;5128;5129;5130;5131;5132;5133;5134;5135;5136;5137;5138;5139;5140;5141;5142;5143;5144;5145;5146;5147;5148;5149;5150;5151;5152;5153;5154;5155;5156;5157;5158;5159;5160;5161;5162;5163;5164;5165;5166;5167;5168;5169;5170;5171;5172;5173;5174;5175;5176;5177;5178;5179;5180;5181;5182;5183;5184;5185;5186;5187;5188;5189;5190;5191;5192;5193;5194;5195;5196;5197;5198;5199;5200;5201;5202;5203;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5213;5214;5215;5216;5217;5218;5219;5220;5221;5222;5223;5224;5225;5226;5227;5228;5229;5230;5231;5232;5233;5234;5235;5236;5237;5238;5239;5240;5241;5242;5243;5244;5245;5246;5247;5248;5249;5250;5251;5252;5253;5254;5255;5256;5257;5258;5259;5260;5261;5262;5263;5264;5265;5266;5267;5268;5269;5270;5271;5272;5273;5274;5275;5276;5277;5278;5279;5280;5281;5282;5283;5284;5285;5286;5287;5288;5289;5290;5291;5292;5293;5294;5295;5296;5297;5298;5299;5300;5301;5302;5303;5304;5305;5306;5307;5308;5309;5310;5311;5312;5313;5314;5315;5316;5317;5318;5319;5320;5321;5322;5323;5324;5325;5326;5327;5328;5329;5330;5331;5332;5333;5334;5335;5336;5337;5338;5339;5340;5341;5342;5343;5344;5345;5346;5347;5348;5349;5350;5351;5352;5353;5354;5355;5356;5357;5358;5359;5360;5361;5362;5363;5364;5365;5366;5367;5368;5369;5370;5371;5372;5373;5374;5375;5376;5377;5378;5379;5380;5381;5382;5383;5384;5385;5386;5387;5388;5389;5390;5391;5392;5393;5394;5395;5396;5397;5398;5399;5400;5401;5402;5403;5404;5405;5406;5407;5408;5409;5410;5411;5412;5413;5414;5415;5416;5417;5418;5419;5420;5421;5422;5423;5424;5425;5426;5427;5428;5429;5430;5431;5432;5433;5434;5435;5436;5437;5438;5439;5440;5441;5442;5443;5444;5445;5446;5447;5448;5449;5450;5451;5452;5453;5454;5455;5456;5457;5458;5459;5460;5461;5462;5463;5464;5465;5466;5467;5468;5469;5470;5471;5472;5473;5474;5475;5476;5477;5478;5479;5480;5481;5482;5483;5484;5485;5486;5487;5488;5489;5490;5491;5492;5493;5494;5495;5496;5497;5498;5499;5500;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5517;5518;5519;5520;5521;5522;5523;5524;5525;5526;5527;5528;5529;5530;5531;5532;5533;5534;5535;5536;5537;5538;5539;5540;5541;5542;5543;5544;5545;5546;5547;5548;5549;5550;5551;5552;5553;5554;5555;5556;5557;5558;5559;5560;5561;5562;5563;5564;5565;5566;5567;5568;5569;5570;5571;5572;5573;5574;5575;5576;5577;5578;5579;5580;5581;5582;5583;5584;5585;5586;5587;5588;5589;5590;5591;5592;5593;5594;5595;5596;5597;5598;5599;5600;5601;5602;5603;5604;5605;5606;5607;5608;5609;5610;5611;5612;5613;5614;5615;5616;5617;5618;5619;5620;5621;5622;5623;5624;5625;5626;5627;5628;5629;5630;5631;5632;5633;5634;5635;5636;5637;5638;5639;5640;5641;5642;5643;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;5663;5664;5665;5666;5667;5668;5669;5670

Harmonogram stavby "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)"

Aktualizovaný harmonogram

TBR + OHLA + EŽ – BUBNY

ID	Řadič	Řadič SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Kritický	Odchylka dokončení
1575	MS	3010-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	22.06. 23	23.06. 23	1574	1576	Ano	0 dny
1576	MS	3010-01-01	podkladní beton	5 dny	24.06. 23	28.06. 23	1575	1577	Ano	0 dny
1577	MS	3010-01-01	odbourání pilot	7 dny	29.06. 23	05.07. 23	1576	1578	Ano	0 dny
1578	MS	3010-01-01	izolace	5 dny	06.07. 23	10.07. 23	1577	1579PS+1 den;1565	Ano	0 dny
1579	MS	3010-01-01	ochrana izolace	4 dny	12.07. 23	15.07. 23	1578PS+1 den	1580;1744	Ano	0 dny
1580	MS	3010-01-01	výztuž ZD	25 dny	16.07. 23	09.08. 23	1579;1606	1581SS+15 dny;1582;1721;1567	Ano	0 dny
1581	MS	3010-01-01	bednění ZD	14 dny	31.07. 23	13.08. 23	1580SS+15 dny	1582	Ano	0 dny
1582	MS	3010-01-01	betonáž ZD	3 dny	14.08. 23	16.08. 23	1580;1581	1753;1754	Ano	0 dny
1583	MS	30-01-02-01	**Dilatační celek 2**	**230 dny**	**25.05. 23**	**09.01. 24**			**Ano**	**0 dny**
1584	MS	30-01-02-01	**část 2-1**	**111 dny**	**09.06. 23**	**27.09. 23**			**Ano**	**0 dny**
1585	MS	3010-01-01	zemní práce 2-1 (PR)	2 dny	09.06. 23	10.06. 23	1545	1586PS+31 dny;1710	Ano	0 dny
1586	MS	3010-01-01	piloty 2-1	6 dny	12.07. 23	17.07. 23	1585PS+31 dny;1572	1587	Ano	0 dny
1587	MS	3010-01-01	odkopání na základovou spáru	3 dny	18.07. 23	20.07. 23	1586	1588	Ano	0 dny
1588	MS	3010-01-01	kanalizace	14 dny	21.07. 23	03.08. 23	1587	1589	Ano	0 dny
1589	MS	3010-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	04.08. 23	05.08. 23	1588	1590	Ano	0 dny
1590	MS	3010-01-01	podkladní beton	10 dny	06.08. 23	15.08. 23	1589	1591	Ano	0 dny
1591	MS	3010-01-01	odbourání pilot	4 dny	16.08. 23	19.08. 23	1590	1592	Ano	0 dny
1592	MS	3010-01-01	izolace	15 dny	20.08. 23	08.09. 23	1591	1593PS+1 den	Ano	0 dny
1593	MS	3010-01-01	ochrana izolace	4 dny	05.09. 23	08.09. 23	1592PS+1 den	1594	Ano	0 dny
1594	MS	3010-01-01	výztuž ZD	15 dny	06.09. 23	23.09. 23	1593	1595SS+7 dny;1596	Ano	0 dny
1595	MS	3010-01-01	bednění ZD	11 dny	16.09. 23	26.09. 23	1594SS+7 dny	1596	Ano	0 dny
1596	MS	3010-01-01	betonáž ZD	1 den	27.09. 23	27.09. 23	1594;1595	1767;1768	Ano	0 dny
1597	MS	30-01-02-01	**část 2-2**	**45 dny**	**05.06. 23**	**19.07. 23**			**Ano**	**0 dny**
1598	MS	3010-01-01	zemní práce 2-2 (PR)	2 dny	05.06. 23	06.06. 23	1558PS-1 den	1599;1571PS-4 dny	Ano	0 dny
1599	MS	3010-01-01	piloty 2-2	2 dny	07.06. 23	08.06. 23	1598	1600	Ano	0 dny
1600	MS	3010-01-01	odkopání na základovou spáru	3 dny	09.06. 23	11.06. 23	1599	1601	Ano	0 dny
1601	MS	3010-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	12.06. 23	13.06. 23	1600	1602	Ano	0 dny
1602	MS	3010-01-01	podkladní beton	5 dny	14.06. 23	18.06. 23	1601	1603	Ano	0 dny
1603	MS	3010-01-01	odbourání pilot	4 dny	19.06. 23	22.06. 23	1602	1604	Ano	0 dny
1604	MS	3010-01-01	izolace	5 dny	23.06. 23	27.06. 23	1603	1605PS+1 den	Ano	0 dny
1605	MS	3010-01-01	ochrana izolace	2 dny	29.06. 23	30.06. 23	1604PS+1 den	1606;1730	Ano	0 dny
1606	MS	3010-01-01	výztuž ZD	14 dny	01.07. 23	14.07. 23	1605	1607PS-4 dny;1608;1580	Ano	0 dny
1607	MS	3010-01-01	bednění ZD	8 dny	11.07. 23	18.07. 23	1606PS-4 dny	1608	Ano	0 dny
1608	MS	3010-01-01	betonáž ZD	1 den	19.07. 23	19.07. 23	1606;1607	1767;1768	Ano	0 dny
1609	MS	30-01-02-01	**část 2-3**	**230 dny**	**25.05. 23**	**09.01. 24**			**Ano**	**0 dny**
1610	MS	3010-01-01	zemní práce 2-3 (PR)	2 dny	25.05. 23	26.05. 23	1538PS-1 den	1611;1688	Ano	0 dny
1611	MS	3010-01-01	piloty 2-3	3 dny	27.05. 23	29.05. 23	1610	1612;1620;1559	Ano	0 dny
1612	MS	3010-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	04.12. 23	05.12. 23	1611;1754;1670	1613	Ne	0 dny
1613	MS	3010-01-01	podkladní beton	5 dny	06.12. 23	10.12. 23	1612	1614	Ne	0 dny
1614	MS	3010-01-01	odbourání pilot	4 dny	11.12. 23	14.12. 23	1613	1615	Ne	0 dny
1615	MS	3010-01-01	výztuž ZD	19 dny	15.12. 23	02.01. 24	1614	1616SS+2 dny;1617	Ne	0 dny
1616	MS	3010-01-01	bednění ZD	22 dny	17.12. 23	07.01. 24	1615SS+2 dny	1617	Ne	0 dny
1617	MS	3010-01-01	betonáž ZD	2 dny	08.01. 24	09.01. 24	1615;1616		Ne	0 dny
1618	MS	30-01-02-01	**část 2-4**	**226 dny**	**25.05. 23**	**05.01. 24**			**Ne**	**0 dny**
1619	MS	3010-01-01	zemní práce 2-4 (PR)	1 den	25.05. 23	25.05. 23	1538PS-1 den	1620	Ne	0 dny
1620	MS	3010-01-01	piloty 2-4	3 dny	30.05. 23	01.06. 23	1619;1611	1621	Ne	0 dny
1621	MS	3010-01-01	odkopání na základovou spáru	3 dny	02.06. 23	04.06. 23	1620	1622	Ne	0 dny
1622	MS	3010-01-01	kanalizace	7 dny	22.08. 23	28.08. 23	1621;1634	1623	Ne	0 dny
1623	MS	3010-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	02.12. 23	03.12. 23	1622;1656	1624	Ne	0 dny
1624	MS	3010-01-01	podkladní beton	3 dny	04.12. 23	06.12. 23	1623	1625	Ne	0 dny
1625	MS	3010-01-01	odbourání pilot	4 dny	07.12. 23	10.12. 23	1624	1626	Ne	0 dny
1626	MS	3010-01-01	výztuž ZD	7 dny	11.12. 23	17.12. 23	1625	1627SS+2 dny;1628	Ne	0 dny
1627	MS	3010-01-01	bednění ZD	10 dny	13.12. 23	22.12. 23	1626SS+2 dny	1628	Ne	0 dny
1628	MS	3010-01-01	betonáž ZD	3 dny	03.01. 24	05.01. 24	1626;1627		Ne	0 dny
1629	MS	30-01-02-01	**Dilatační celek 3**	**167 dny**	**20.06. 23**	**03.12. 23**			**Ano**	**0 dny**
1630	MS	30-01-02-01	**část 3-1**	**123 dny**	**20.06. 23**	**20.10. 23**			**Ano**	**0 dny**
1631	MS	3010-01-01	zemní práce 3-1 (PR)	14 dny	20.06. 23	03.07. 23	1739	1632;1644	Ano	0 dny
1632	MS	3010-01-01	piloty 3-1	4 dny	04.07. 23	07.07. 23	1631	1633	Ano	0 dny
1633	MS	3010-01-01	odkopání na základovou spáru	3 dny	08.07. 23	10.07. 23	1632	1634PS+28 dny	Ano	0 dny
1634	MS	3010-01-01	kanalizace	14 dny	08.08. 23	21.08. 23	1633PS+28 dny	1635;1647;1622	Ano	0 dny
1635	MS	3010-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	22.08. 23	23.08. 23	1634	1636	Ano	0 dny
1636	MS	3010-01-01	podkladní beton	10 dny	24.08. 23	02.09. 23	1635	1637	Ano	0 dny
1637	MS	3010-01-01	odbourání pilot	4 dny	03.09. 23	06.09. 23	1636	1638	Ano	0 dny
1638	MS	3010-01-01	izolace	20 dny	07.09. 23	26.09. 23	1637	1639PS+1 den	Ano	0 dny
1639	MS	3010-01-01	ochrana izolace	4 dny	28.09. 23	01.10. 23	1638PS+1 den	1640	Ano	0 dny
1640	MS	3010-01-01	výztuž ZD	15 dny	02.10. 23	16.10. 23	1639	1641SS+7 dny;1642	Ano	0 dny
1641	MS	3010-01-01	bednění ZD	10 dny	09.10. 23	18.10. 23	1640SS+7 dny	1642	Ano	0 dny
1642	MS	3010-01-01	betonáž ZD	2 dny	19.10. 23	20.10. 23	1640;1641	1783;1786;1787	Ano	0 dny
1643	MS	30-01-02-01	**část 3-2**	**151 dny**	**04.07. 23**	**01.12. 23**			**Ano**	**0 dny**
1644	MS	3010-01-01	zemní práce 3-2 (PR)	4 dny	04.07. 23	07.07. 23	1631	1645	Ano	0 dny
1645	MS	3010-01-01	piloty 3-2	15 dny	08.07. 23	22.07. 23	1644;1740	1646	Ano	0 dny
1646	MS	3010-01-01	odkopání na základovou spáru	3 dny	23.07. 23	25.07. 23	1645	1647	Ano	0 dny
1647	MS	3010-01-01	kanalizace	7 dny	22.08. 23	28.08. 23	1646;1634	1648;1661	Ano	0 dny
1648	MS	3010-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	29.08. 23	30.08. 23	1647	1649PS+14 dny	Ano	0 dny
1649	MS	3010-01-01	podkladní beton	20 dny	14.09. 23	03.10. 23	1648PS+14 dny	1650	Ano	0 dny
1650	MS	3010-01-01	odbourání pilot	10 dny	04.10. 23	13.10. 23	1649	1651	Ano	0 dny
1651	MS	3010-01-01	izolace	10 dny	14.10. 23	23.10. 23	1650	1652PS-1 den	Ano	0 dny
1652	MS	3010-01-01	ochrana izolace	3 dny	23.10. 23	25.10. 23	1651PS-1 den	1653PS-5 dny	Ano	0 dny
1653	MS	3010-01-01	výztuž ZD	15 dny	21.10. 23	04.11. 23	1652PS-5 dny	1654SS+5 dny;1655	Ano	0 dny
1654	MS	3010-01-01	bednění ZD	15 dny	26.10. 23	09.11. 23	1653SS+5 dny	1655	Ano	0 dny
1655	MS	3010-01-01	betonáž ZD	2 dny	10.11. 23	11.11. 23	1653;1654	1656;1783;1786;1787	Ano	0 dny
1656	MS	3010-01-01	stěny	20 dny	12.11. 23	01.12. 23	1655	1623	Ne	0 dny
1657	MS	30-01-02-01	**část 3-3**	**155 dny**	**02.07. 23**	**03.12. 23**			**Ano**	**0 dny**
1658	MS	3010-01-01	zemní práce 3-3 (PR)	12 dny	02.07. 23	13.07. 23	1675	1659	Ano	0 dny
1659	MS	3010-01-01	piloty 3-3	9 dny	14.07. 23	22.07. 23	1658;1713	1660	Ano	0 dny
1660	MS	3010-01-01	odkopání na základovou spáru	3 dny	23.07. 23	25.07. 23	1659	1661	Ano	0 dny
1661	MS	3010-01-01	kanalizace	3 dny	29.08. 23	31.08. 23	1660;1647	1662	Ano	0 dny
1662	MS	3010-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	01.09. 23	02.09. 23	1661	1663PS+10 dny	Ano	0 dny
1663	MS	3010-01-01	podkladní beton	20 dny	13.09. 23	02.10. 23	1662PS+10 dny;1747	1664PS+3 dny	Ano	0 dny
1664	MS	3010-01-01	odbourání pilot	10 dny	06.10. 23	15.10. 23	1663PS+3 dny	1665	Ano	0 dny
1665	MS	3010-01-01	izolace	10 dny	16.10. 23	25.10. 23	1664	1666PS-1 den	Ano	0 dny
1666	MS	3010-01-01	ochrana izolace	3 dny	25.10. 23	27.10. 23	1665PS-1 den	1667PS-5 dny	Ano	0 dny
1667	MS	3010-01-01	výztuž ZD	15 dny	23.10. 23	06.11. 23	1666PS-5 dny	1668SS+5 dny;1669	Ano	0 dny
1668	MS	3010-01-01	bednění ZD	15 dny	28.10. 23	11.11. 23	1667SS+5 dny	1669	Ano	0 dny
1669	MS	3010-01-01	betonáž ZD	2 dny	12.11. 23	13.11. 23	1667;1668	1670;1783;1786;1787	Ano	0 dny
1670	MS	3010-01-01	stěny	20 dny	14.11. 23	03.12. 23	1669	1702;1612	Ne	0 dny
1671	MS	30-01-02-01	**Dilatační celek 4**	**233 dny**	**27.05. 23**	**14.01. 24**			**Ano**	**0 dny**
1672	MS	30-01-02-01	**část 4-1**	**123 dny**	**13.06. 23**	**13.10. 23**			**Ano**	**0 dny**
1673	MS	3010-01-01	zemní práce 4-1 - 1. fáze (kotevní úr.)	1 den	13.06. 23	13.06. 23	1710	1674;1725	Ano	0 dny
1674	MS	3010-01-01	převázka + kotvení proviz. koleje	10 dny	14.06. 23	23.06. 23	1673	1675	Ano	0 dny
1675	MS	3010-01-01	zemní práce 4-1 - 2. fáze (PR)	7 dny	25.06. 23	01.07. 23	1674;1712	1676;1658	Ano	0 dny
1676	MS	3010-01-01	piloty 4-1	3 dny	02.07. 23	04.07. 23	1675	1677	Ano	0 dny

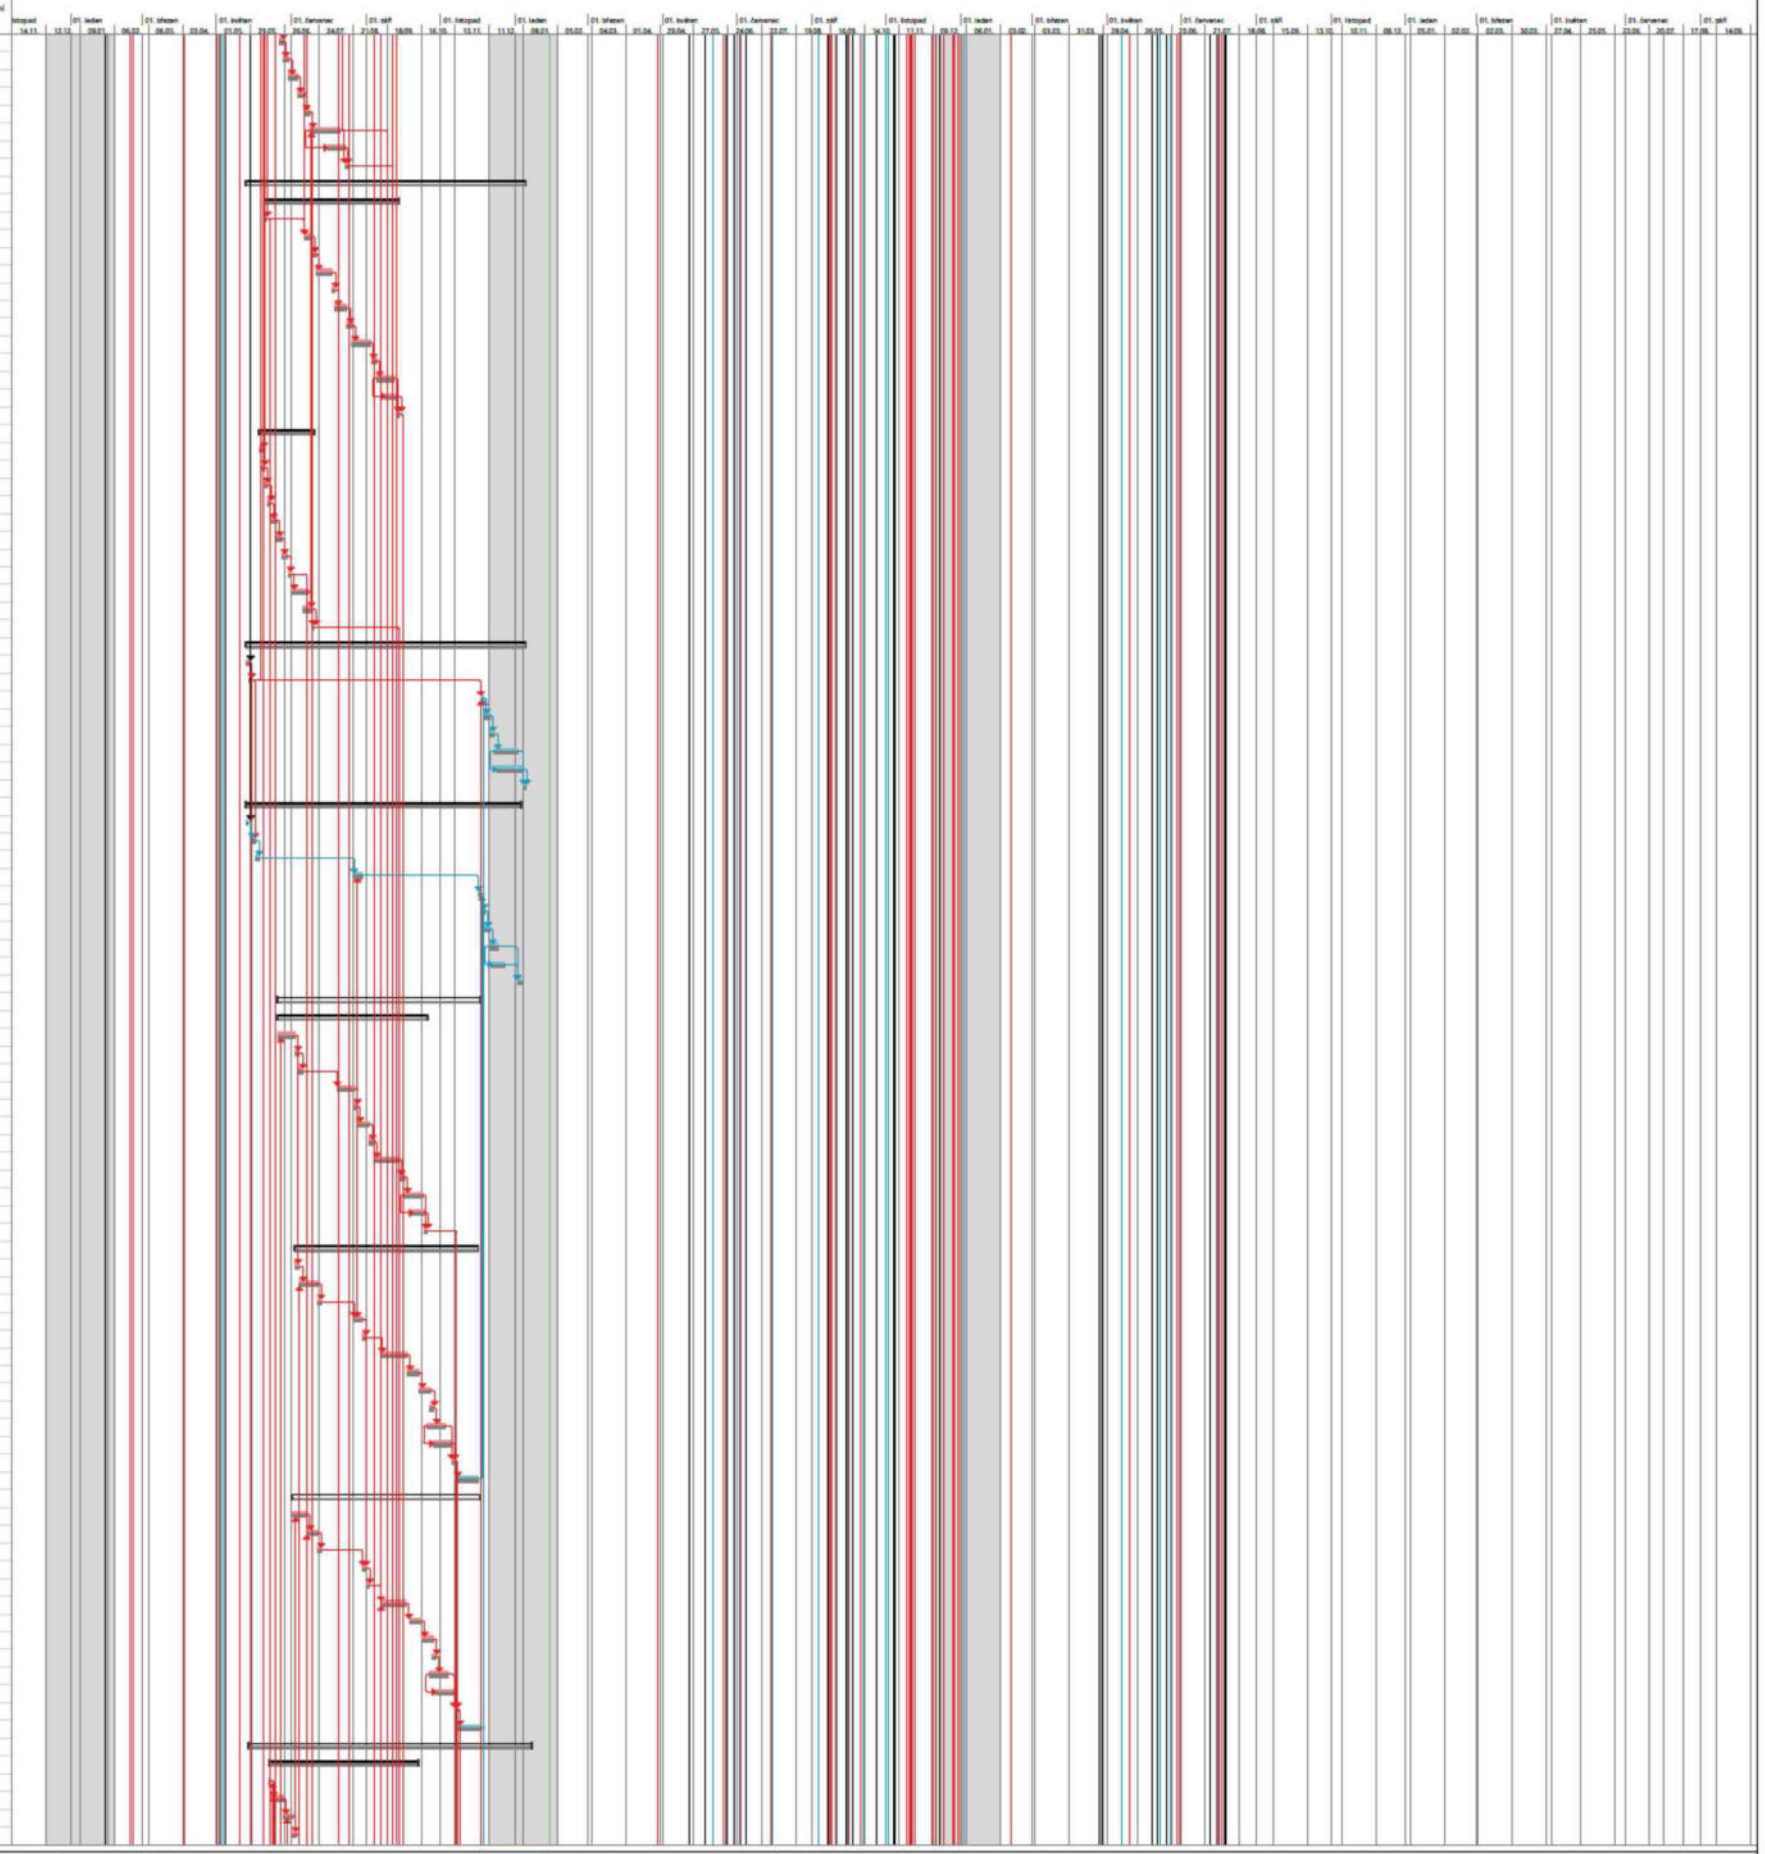

Strana 14 / 19

ID		Režim úkolu	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Kritický	Odchylka dokončení
1677			SO101-01-01	odkopání na základovou spáru	3 dny	05.07. 23	07.07. 23	1676	1678	Ano	0 dny
1678			SO101-01-01	kanalizace	30 dny	08.07. 23	06.08. 23	1677	1679	Ano	0 dny
1679			SO101-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	07.08. 23	08.08. 23	1678	1680	Ano	0 dny
1680			SO101-01-01	podkladní beton	15 dny	09.08. 23	23.08. 23	1553;1679	1681	Ano	0 dny
1681			SO101-01-01	odbourání pilot	5 dny	24.08. 23	28.08. 23	1680	1682	Ano	0 dny
1682			SO101-01-01	izolace	20 dny	29.08. 23	17.09. 23	1681	1683FS+1 den	Ano	0 dny
1683			SO101-01-01	ochrana izolace	4 dny	19.09. 23	22.09. 23	1682FS+1 den	1684	Ano	0 dny
1684			SO101-01-01	výztuž ZD	15 dny	23.09. 23	07.10. 23	1683	1685SS+5 dny;1686	Ano	0 dny
1685			SO101-01-01	bednění ZD	15 dny	28.09. 23	12.10. 23	1684SS+5 dny	1686	Ano	0 dny
1686			SO101-01-01	betonáž ZD	1 den	13.10. 23	13.10. 23	1684;1685	1800FS+15 dny;1801FS+10 dny	Ano	0 dny
1687			SO101-01-01	**část 4-2**	**199 dny**	**27.05. 23**	**11.12. 23**			**Ne**	**0 dny**
1688			SO101-01-01	zemní práce 4-2 (PR)	5 dny	27.05. 23	31.05. 23	1610	1689;1699SS	Ne	0 dny
1689			SO101-01-01	piloty 4-2	12 dny	01.06. 23	12.06. 23	1688	1690	Ne	0 dny
1690			SO101-01-01	odkopání na základovou spáru	3 dny	13.06. 23	15.06. 23	1689	1691	Ne	0 dny
1691			SO101-01-01	kanalizace	10 dny	16.06. 23	25.06. 23	1690	1692	Ne	0 dny
1692			SO101-01-01	dosypání štěrkodrtí	4 dny	06.11. 23	12.11. 23	1691;1737	1693	Ne	0 dny
1693			SO101-01-01	podkladní beton	7 dny	13.11. 23	19.11. 23	1692	1694	Ne	0 dny
1694			SO101-01-01	odbourání pilot	5 dny	20.11. 23	24.11. 23	1693	1695	Ne	0 dny
1695			SO101-01-01	výztuž ZD	14 dny	25.11. 23	08.12. 23	1694	1696SS+2 dny;1697	Ne	0 dny
1696			SO101-01-01	bednění ZD	10 dny	27.11. 23	06.12. 23	1695SS+2 dny	1697	Ne	0 dny
1697			SO101-01-01	betonáž ZD	3 dny	09.12. 23	11.12. 23	1695;1696		Ne	0 dny
1698			SO101-01-01	**část 4-3**	**233 dny**	**27.05. 23**	**14.01. 24**			**Ne**	**0 dny**
1699			SO101-01-01	zemní práce 4-3 (PR)	6 dny	27.05. 23	01.06. 23	1688SS	1700	Ne	0 dny
1700			SO101-01-01	piloty 4-3	14 dny	02.06. 23	15.06. 23	1699	1701	Ne	0 dny
1701			SO101-01-01	odkopání na základovou spáru	3 dny	16.06. 23	18.06. 23	1700	1702	Ne	0 dny
1702			SO101-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	04.12. 23	05.12. 23	1670;1701;1751	1703	Ne	0 dny
1703			SO101-01-01	podkladní beton	5 dny	06.12. 23	10.12. 23	1702	1704	Ne	0 dny
1704			SO101-01-01	odbourání pilot	5 dny	11.12. 23	15.12. 23	1703	1705	Ne	0 dny
1705			SO101-01-01	výztuž ZD	26 dny	16.12. 23	10.01. 24	1704	1706FS-8 dny;1707	Ne	0 dny
1706			SO101-01-01	bednění ZD	10 dny	08.01. 24	12.01. 24	1705FS-8 dny	1707	Ne	0 dny
1707			SO101-01-01	betonáž ZD	2 dny	13.01. 24	14.01. 24	1705;1706		Ne	0 dny
1708			SO101-01-01	**Dilatační celek 5**	**151 dny**	**11.06. 23**	**08.11. 23**			**Ano**	**0 dny**
1709			SO101-01-01	**část 5-1**	**135 dny**	**11.06. 23**	**23.10. 23**			**Ano**	**0 dny**
1710			SO101-01-01	zemní práce 5-1 - 1.fáze (kotevní úr.)	2 dny	11.06. 23	12.06. 23	1585	1711;1673	Ano	0 dny
1711			SO101-01-01	převěska + kotvení proviz. koleje	10 dny	13.06. 23	22.06. 23	1710	1712	Ano	0 dny
1712			SO101-01-01	zemní práce 5-1 - 2. fáze (PR)	2 dny	23.06. 23	24.06. 23	1711	1713;1675	Ano	0 dny
1713			SO101-01-01	piloty 5-1	7 dny	25.06. 23	01.07. 23	1712	1714;1659	Ano	0 dny
1714			SO101-01-01	odkopání na základovou spáru	3 dny	02.07. 23	04.07. 23	1713	1715	Ano	0 dny
1715			SO101-01-01	kanalizace	7 dny	05.07. 23	11.07. 23	1714	1716	Ano	0 dny
1716			SO101-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	12.07. 23	13.07. 23	1715	1717	Ano	0 dny
1717			SO101-01-01	podkladní beton	5 dny	14.07. 23	18.07. 23	1716	1718	Ano	0 dny
1718			SO101-01-01	odbourání pilot	5 dny	19.07. 23	23.07. 23	1717	1719	Ano	0 dny
1719			SO101-01-01	izolace	45 dny	24.07. 23	06.09. 23	1718	1720FS+1 den	Ano	0 dny
1720			SO101-01-01	ochrana izolace	10 dny	08.09. 23	17.09. 23	1719FS+1 den	1721	Ano	0 dny
1721			SO101-01-01	výztuž ZD	29 dny	18.09. 23	16.10. 23	1720;1580	1722SS+20 dny;1723	Ano	0 dny
1722			SO101-01-01	bednění ZD	14 dny	08.10. 23	21.10. 23	1721SS+20 dny	1723	Ano	0 dny
1723			SO101-01-01	betonáž ZD	2 dny	22.10. 23	23.10. 23	1721;1722	1816;1817	Ano	0 dny
1724			SO101-01-01	**část 5-2**	**148 dny**	**14.06. 23**	**08.11. 23**			**Ano**	**0 dny**
1725			SO101-01-01	zemní práce 5-2 (PR)	3 dny	14.06. 23	16.06. 23	1673	1726;1739	Ano	0 dny
1726			SO101-01-01	piloty 5-2	15 dny	17.06. 23	01.07. 23	1725;1546	1727	Ano	0 dny
1727			SO101-01-01	odkopání na základovou spáru	3 dny	02.07. 23	04.07. 23	1726	1728	Ano	0 dny
1728			SO101-01-01	kanalizace	7 dny	05.07. 23	11.07. 23	1727	1729	Ano	0 dny
1729			SO101-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	12.07. 23	13.07. 23	1728	1730	Ano	0 dny
1730			SO101-01-01	podkladní beton	5 dny	14.07. 23	18.07. 23	1729;1605	1731	Ano	0 dny
1731			SO101-01-01	odbourání pilot	5 dny	19.07. 23	23.07. 23	1730	1732	Ano	0 dny
1732			SO101-01-01	izolace	21 dny	17.08. 23	06.09. 23	1731;1746	1733FS+1 den	Ano	0 dny
1733			SO101-01-01	ochrana izolace	10 dny	08.09. 23	17.09. 23	1732FS+1 den	1734	Ano	0 dny
1734			SO101-01-01	výztuž ZD	28 dny	18.09. 23	15.10. 23	1733	1735SS+16 dny;1736	Ano	0 dny
1735			SO101-01-01	bednění ZD	14 dny	04.10. 23	17.10. 23	1734SS+16 dny	1736	Ano	0 dny
1736			SO101-01-01	betonáž ZD	2 dny	18.10. 23	19.10. 23	1734;1735	1737;1816;1817	Ano	0 dny
1737			SO101-01-01	stěny	20 dny	20.10. 23	08.11. 23	1736	1692	Ne	0 dny
1738			SO101-01-01	**část 5-3**	**120 dny**	**17.06. 23**	**14.10. 23**			**Ano**	**0 dny**
1739			SO101-01-01	zemní práce 5-3 (PR)	3 dny	17.06. 23	19.06. 23	1725	1740;1631	Ano	0 dny
1740			SO101-01-01	piloty 5-3	10 dny	20.06. 23	29.06. 23	1739	1741;1645	Ano	0 dny
1741			SO101-01-01	odkopání na základovou spáru	3 dny	30.06. 23	02.07. 23	1740	1742	Ano	0 dny
1742			SO101-01-01	kanalizace	7 dny	03.07. 23	09.07. 23	1741	1743	Ano	0 dny
1743			SO101-01-01	dosypání štěrkodrtí	2 dny	10.07. 23	11.07. 23	1742	1744	Ano	0 dny
1744			SO101-01-01	podkladní beton	5 dny	16.07. 23	20.07. 23	1743;1579	1745	Ano	0 dny
1745			SO101-01-01	odbourání pilot	7 dny	21.07. 23	27.07. 23	1744	1746	Ano	0 dny
1746			SO101-01-01	izolace	20 dny	28.07. 23	16.08. 23	1745	1747FS+1 den;1732	Ano	0 dny
1747			SO101-01-01	ochrana izolace	5 dny	18.08. 23	22.08. 23	1746FS+1 den	1748;1663	Ano	0 dny
1748			SO101-01-01	výztuž ZD	28 dny	23.08. 23	19.09. 23	1747	1749SS+16 dny;1750	Ano	0 dny
1749			SO101-01-01	bednění ZD	14 dny	08.09. 23	21.09. 23	1748SS+16 dny	1750	Ano	0 dny
1750			SO101-01-01	betonáž ZD	2 dny	22.09. 23	23.09. 23	1748;1749	1751;1816;1817	Ano	0 dny
1751			SO101-01-01	stěny	21 dny	24.09. 23	14.10. 23	1750	1702	Ne	0 dny
1752			SO101-01-01	**Dilatační celek 1**	**371 dny**	**13.09. 23**	**17.09. 24**		[illegible]	**Ano**	**0 dny**
1753			SO101-01-01	sloupy (40a)	35 dny	13.09. 23	17.10. 23	1556FS-10 dny;1569;1582	1755SS-8 dny	Ano	0 dny
1754			SO101-01-01	stěny	25 dny	23.09. 23	17.10. 23	1556;1569;1582	1755SS-8 dny;1612	Ano	0 dny
1755			SO101-01-01	výstavba skruže stropu	15 dny	10.10. 23	24.10. 23	1753FS-8 dny;1754FS-8 dny	1756FS-9 dny	Ano	0 dny
1756			SO101-01-01	bednění stropu	12 dny	16.10. 23	27.10. 23	1755FS-9 dny	1757FS-9 dny	Ano	0 dny
1757			SO101-01-01	výztuž stropu (290 t)	30 dny	19.10. 23	17.11. 23	1756FS-9 dny	1758	Ano	0 dny
1758			SO101-01-01	betonáž stropu (1443 m3)	3 dny	18.11. 23	20.11. 23	1757	1759FS+62 dny;1761FS+5 dny;17	Ano	0 dny
1759			SO101-01-01	schodiště 1	30 dny	22.01. 24	20.02. 24	1758FS+62 dny	1760SS+10 dny	Ne	0 dny
1760			SO101-01-01	schodiště 2	30 dny	01.02. 24	01.03. 24	1759SS+10 dny	1780	Ne	0 dny
1761			SO101-01-01	zdění příček - výplňové zdivo, zdivo příček bez instalačních předstěn	42 dny	15.01. 24	25.02. 24	1758FS+5 dny	1762FS+10 dny	Ne	0 dny
1762			SO101-01-01	vnitřní vybavení - práce HSV + hrubé rozvody řemesel	90 dny	07.03. 24	04.06. 24	1761FS+10 dny	1763FS-30 dny	Ne	0 dny
1763			SO101-01-01	podlahy - skladby bez finálních povrchů	45 dny	06.05. 24	19.06. 24	1762FS-30 dny	1765;1848;1849	Ne	0 dny
1764			SO101-01-01	kamenné dlažby	30 dny	19.08. 24	17.09. 24	1765FS-20 dny		Ne	0 dny
1765			SO101-01-01	stavební dokončovací práce - práce PSV bez finální kompletace	80 dny	20.06. 24	07.09. 24	1763	1764FS-20 dny;1845	Ne	0 dny
1766			SO101-01-01	**Dilatační celek 2**	**186 dny**	**28.09. 23**	**31.03. 24**		[illegible]	**Ano**	**0 dny**
1767			SO101-01-01	sloupy (8a)	25 dny	28.09. 23	22.10. 23	1596;1608	1769	Ano	0 dny
1768			SO101-01-01	stěny	30 dny	28.09. 23	27.10. 23	1596;1608	1769	Ano	0 dny
1769			SO101-01-01	výstavba skruže stropu	15 dny	28.10. 23	11.11. 23	1767;1768	1770	Ano	0 dny
1770			SO101-01-01	bednění stropu	7 dny	12.11. 23	18.11. 23	1769	1771FS-5 dny	Ano	0 dny
1771			SO101-01-01	výztuž stropu (73 t)	10 dny	14.11. 23	23.11. 23	1770FS-5 dny	1772	Ano	0 dny
1772			SO101-01-01	betonáž stropu (364 m3)	3 dny	24.11. 23	26.11. 23	1771	1773;1780;1781FS+5 dny;1864	Ano	0 dny
1773			SO101-01-01	záklopy u stěn	5 dny	28.01. 24	01.02. 24	1758;1772;1791	1774;1777	Ano	0 dny
1774			SO101-01-01	tepelný kolektor západní část	7 dny	02.02. 24	08.02. 24	1773	1775	Ano	0 dny
1775			SO101-01-01	ochrana kolektoru	3 dny	09.02. 24	11.02. 24	1774	1776	Ano	0 dny
1776			SO101-01-01	mezizákladová stěna (5 patek)	30 dny	12.02. 24	12.03. 24	1775	1864	Ano	0 dny
1777			SO101-01-01	základy 2. úroveň (2 patky)	20 dny	02.02. 24	21.02. 24	1773	1778;1864	Ano	0 dny
1778			SO101-01-01	záklopy základů	7 dny	22.02. 24	28.02. 24	1777	1779	Ne	0 dny

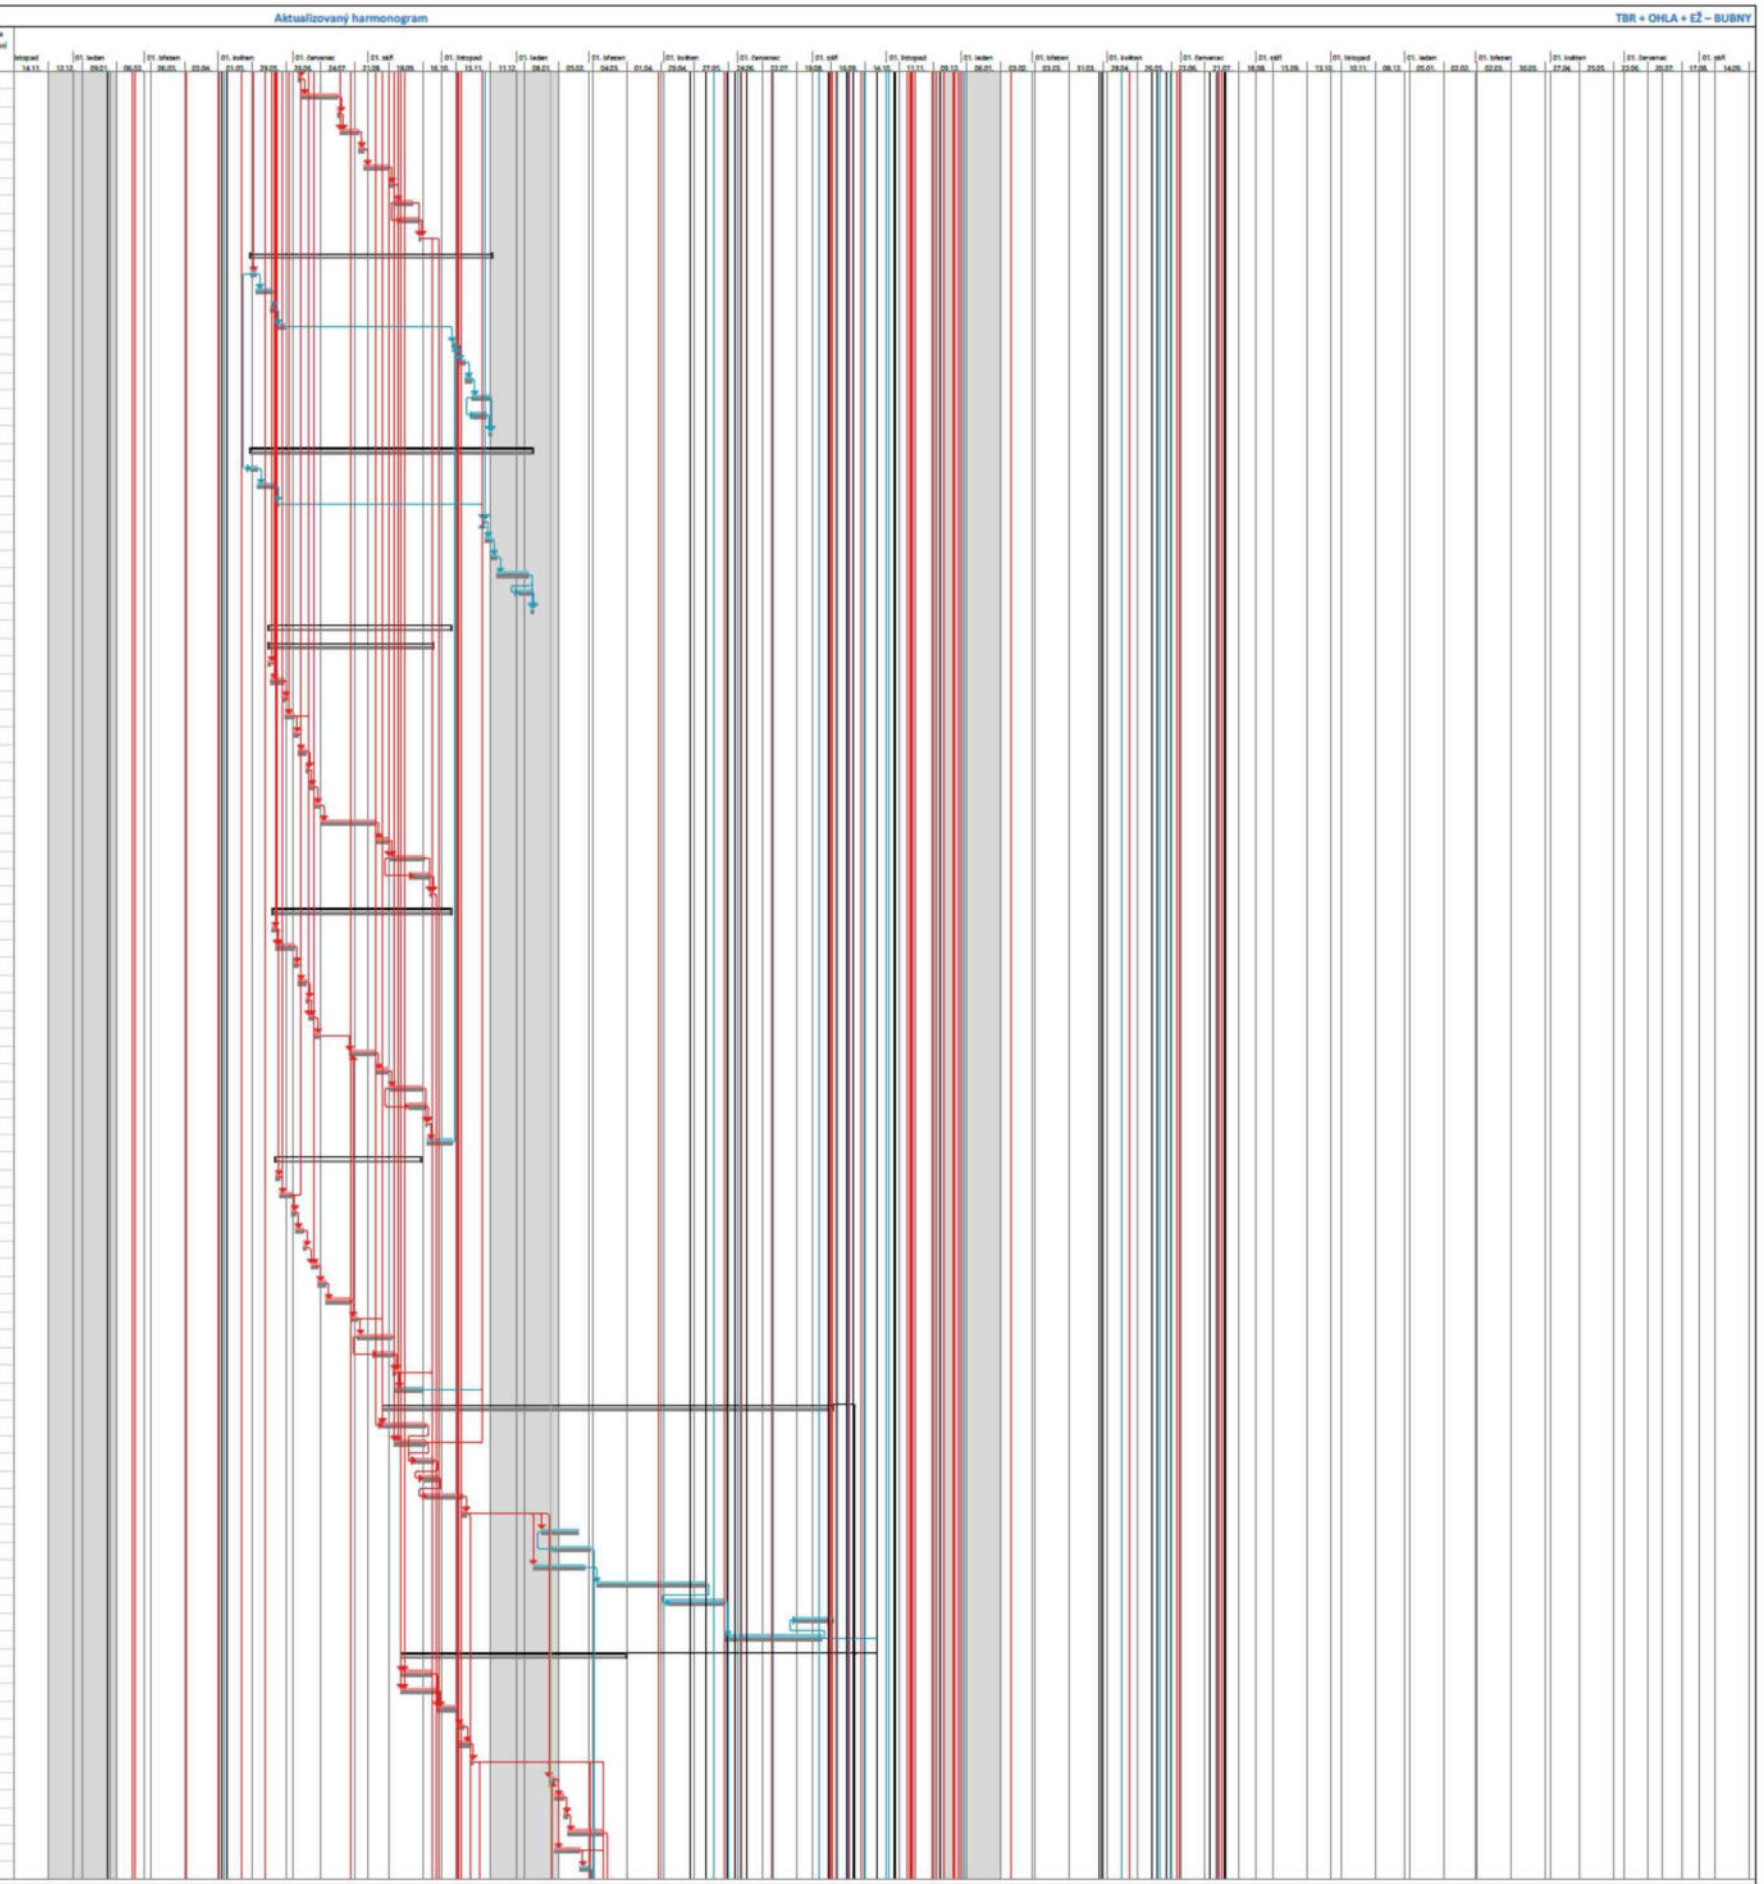

Harmonogram stavby "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)"

Aktualizovaný harmonogram

TBB + OHLA + EZ – BUDNY

ID		Řadí skok	SO/PS	Název skoku	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Kritický	Odchylka dokončení
1779		MS	SO01-01-01	tepelný kolektor střední část	7 dny	29.02.24	06.03.24	1778		Ne	0 dny
1780		MS	SO01-01-01	schodiště 3	30 dny	02.03.24	31.03.24	1760;1772	1792	Ne	0 dny
1781		MS	SO01-01-01	stavební práce	102 dny	02.12.23	12.03.24	1772FS+5 dny		Ne	0 dny
1782		MS	SO 01-01-01	**Dilatační celek 3**	**327 dny**	**14.11.23**	**05.10.24**			**Ano**	**0 dny**
1783		MS	SO01-01-01	mezizákladová stěna	20 dny	14.11.23	03.12.23	1642;1655;1669	1784	Ano	0 dny
1784		MS	SO01-01-01	zásypy základů	7 dny	04.12.23	10.12.23	1783	1785	Ano	0 dny
1785		MS	SO01-01-01	základy 2. úroveň	32 dny	11.12.23	11.01.24	1784	1791	Ano	0 dny
1786		MS	SO01-01-01	sloupy (16x)	25 dny	14.11.23	08.12.23	1642;1655;1669	1788	Ano	0 dny
1787		MS	SO01-01-01	stěny	25 dny	14.11.23	08.12.23	1642;1655;1669	1788	Ano	0 dny
1788		MS	SO01-01-01	výstavba skruže stropu	27 dny	09.12.23	04.01.24	1786;1787	1789FS-5 dny	Ano	0 dny
1789		MS	SO01-01-01	bednění stropu	10 dny	31.12.23	09.01.24	1788FS-5 dny	1790FS-5 dny	Ano	0 dny
1790		MS	SO01-01-01	výztuž stropu (182 t)	20 dny	05.01.24	24.01.24	1789FS-5 dny	1791	Ano	0 dny
1791		MS	SO01-01-01	betonáž stropu (902 m3)	3 dny	25.01.24	27.01.24	1790;1785	1792;1794FS+5 dny;1773;1806;1	Ano	0 dny
1792		MS	SO01-01-01	schodiště 4	30 dny	01.04.24	30.04.24	1791;1780	1793SS+10 dny	Ne	0 dny
1793		MS	SO01-01-01	schodiště 5	30 dny	11.04.24	10.05.24	1792SS+10 dny	1823	Ne	0 dny
1794		MS	SO01-01-01	zdění příček - výplňové zdivo, zdivo příček bez instalačních předstěn	42 dny	02.02.24	14.03.24	1791FS+5 dny	1795SFS+10 dny	Ne	0 dny
1795		MS	SO01-01-01	vnitřní vybavení - práce MSV + hrubé rozvody řemesel	90 dny	25.03.24	22.06.24	1794FS+10 dny	1796FS-30 dny	Ne	0 dny
1796		MS	SO01-01-01	podlahy - skladby bez finálních povrchů	45 dny	24.05.24	07.07.24	1795FS-30 dny	1798	Ne	0 dny
1797		MS	SO01-01-01	kamenné dlažby	30 dny	06.09.24	05.10.24	1798FS-20 dny		Ne	0 dny
1798		MS	SO01-01-01	stavební dokončovací práce - práce PSV bez finální kompletace	80 dny	08.07.24	25.09.24	1796	1797FS-20 dny;1845	Ne	0 dny
1799		MS	SO 01-01-01	**Dilatační celek 4**	**161 dny**	**24.10.23**	**01.04.24**			**Ano**	**0 dny**
1800		MS	SO01-01-01	sloupy (6x)	20 dny	26.10.23	17.11.23	1686FS+15 dny	1802	Ano	0 dny
1801		MS	SO01-01-01	stěny	30 dny	24.10.23	22.11.23	1686FS+10 dny	1802FS+6 dny	Ano	0 dny
1802		MS	SO01-01-01	výstavba skruže stropu	10 dny	29.11.23	08.12.23	1801FS+6 dny;1800	1803	Ano	0 dny
1803		MS	SO01-01-01	bednění stropu	5 dny	09.12.23	13.12.23	1802	1804FS-5 dny	Ano	0 dny
1804		MS	SO01-01-01	výztuž stropu (40 t)	7 dny	09.12.23	15.12.23	1803FS-5 dny	1805	Ano	0 dny
1805		MS	SO01-01-01	betonáž stropu (201 m3)	3 dny	16.12.23	18.12.23	1804	1806;1813;1888;1814FS+5 dny	Ano	0 dny
1806		MS	SO01-01-01	zásypy u stěn	5 dny	28.01.24	01.02.24	1805;1791	1807;1810	Ano	0 dny
1807		MS	SO01-01-01	tepelný kolektor západní část	7 dny	02.02.24	08.02.24	1806	1808	Ano	0 dny
1808		MS	SO01-01-01	ochrana kolektoru	3 dny	09.02.24	11.02.24	1807	1809	Ano	0 dny
1809		MS	SO01-01-01	mezizákladová stěna (5 patek)	30 dny	12.02.24	12.03.24	1808	1888	Ano	0 dny
1810		MS	SO01-01-01	základy 2. úroveň (4 patky)	30 dny	02.02.24	02.03.24	1806	1811;1888	Ano	0 dny
1811		MS	SO01-01-01	zásypy základů	7 dny	03.03.24	09.03.24	1810	1812	Ne	0 dny
1812		MS	SO01-01-01	tepelný kolektor střední část	7 dny	10.03.24	16.03.24	1811		Ne	0 dny
1813		MS	SO01-01-01	schodiště 6	30 dny	19.12.23	17.01.24	1805		Ne	0 dny
1814		MS	SO01-01-01	stavební práce	100 dny	24.12.23	01.04.24	1805FS+5 dny		Ne	0 dny
1815		MS	SO 01-01-01	**Dilatační celek 5**	**425 dny**	**24.10.23**	**21.12.24**			**Ano**	**0 dny**
1816		MS	SO01-01-01	stěny	30 dny	24.10.23	22.11.23	1723;1736;1750	1818SS;1819FS-6 dny	Ano	0 dny
1817		MS	SO01-01-01	sloupy (38x)	40 dny	24.10.23	02.12.23	1723;1736;1750		Ne	0 dny
1818		MS	SO01-01-01	opěra mostu	45 dny	24.10.23	07.12.23	1816SS		Ne	0 dny
1819		MS	SO01-01-01	výstavba skruže stropu	15 dny	17.11.23	01.12.23	1816FS-6 dny	1820FS-5 dny	Ano	0 dny
1820		MS	SO01-01-01	bednění stropu	10 dny	27.11.23	06.12.23	1819FS-5 dny	1821FS-8 dny	Ano	0 dny
1821		MS	SO01-01-01	výztuž stropu (293 t)	42 dny	29.11.23	09.01.24	1820FS-8 dny	1822	Ano	0 dny
1822		MS	SO01-01-01	betonáž stropu (1457 m3)	3 dny	10.01.24	12.01.24	1821	1823;1826FS+5 dny;1900	Ano	0 dny
1823		MS	SO01-01-01	schodiště 7	30 dny	11.05.24	09.06.24	1822;1793	1824SS+10 dny	Ne	0 dny
1824		MS	SO01-01-01	schodiště 8	30 dny	21.05.24	19.06.24	1823SS+10 dny	1825SS+10 dny	Ne	0 dny
1825		MS	SO01-01-01	schodiště 9	30 dny	31.05.24	29.06.24	1824SS+10 dny		Ne	0 dny
1826		MS	SO01-01-01	zdění příček - výplňové zdivo, zdivo příček bez instalačních předstěn	42 dny	21.01.24	02.03.24	1822FS+5 dny	1827FS+10 dny	Ano	0 dny
1827		MS	SO01-01-01	vnitřní vybavení - práce MSV + hrubé rozvody řemesel	90 dny	13.03.24	10.06.24	1826FS+10 dny	1828FS-30 dny	Ano	0 dny
1828		MS	SO01-01-01	podlahy - skladby bez finálních povrchů	45 dny	12.05.24	25.06.24	1827FS-30 dny	1830;1848;1849	Ano	0 dny
1829		MS	SO01-01-01	kamenné dlažby	30 dny	25.08.24	23.09.24	1830FS-20 dny	1831	Ne	0 dny
1830		MS	SO01-01-01	stavební dokončovací práce - práce PSV bez finální kompletace	80 dny	26.06.24	13.09.24	1828	1829FS-20 dny;1846SS;1847	Ano	0 dny
1831		MS	SO01-01-01	dokončovací práce na vybavení SO 61	77 dny	06.10.24	21.12.24	1829;1799;1782;1766;1752	1448SS;1845FS-59 dny	Ne	0 dny
1832		MS	SO 01-61-01.1	**SO 01-61-01.1 - ŽST Praha-Bubny, doplňkové konstrukce a stavební výrobky**	**157 dny**	**11.05.24**	**14.10.24**			**Ne**	**0 dny**
1833		MS	SO01-61-01.1	DC1	30 dny	03.06.24	02.07.24	1859		Ne	0 dny
1834		MS	SO01-61-01.1	DC2	30 dny	15.07.24	13.08.24	1870		Ne	0 dny
1835		MS	SO01-61-01.1	DC3	30 dny	11.05.24	09.06.24	1882		Ne	0 dny
1836		MS	SO01-61-01.1	DC4	30 dny	15.09.24	14.10.24	1894		Ne	0 dny
1837		MS	SO01-61-01.1	DC5	30 dny	26.08.24	24.09.24	1906		Ne	0 dny
1838		MS	SO01-61-01.3	SO 01-61-01.3 - Praha-Bubny, vytápění a chlazení	145 dny	12.04.24	03.09.24	1840SF+50 dny		Ne	0 dny
1839		MS	SO01-61-01.4	SO 01-61-01.4 - ŽST Praha-Bubny, VZT	145 dny	12.04.24	03.09.24	1840SF+50 dny		Ne	0 dny
1840		MS	SO01-61-01.5	SO 01-61-01.5 - Praha-Bubny, ZTI	95 dny	01.06.24	03.09.24	1840SF+50 dny		Ne	0 dny
1841		MS	SO01-61-01.6	SO 01-61-01.6 - Praha-Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení	180 dny	08.03.24	03.09.24	1840SF+50 dny	115	Ne	0 dny
1842		MS	SO01-61-01.7	SO 01-61-01.7 - Praha-Bubny, vnitřní rozvody slaboproud	180 dny	08.03.24	03.09.24	1840SF+50 dny	146;141	Ne	0 dny
1843		MS	SO01-61-01.8	SO 01-61-01.8 - Praha-Bubny, hromosvod a uzemnění	57 dny	16.07.24	30.09.24	1850FS-48 dny	1850FS+30 dny;1850SS+30 dny;1840SS+50 d	Ne	0 dny
1844		MS	SO01-61-01.9	SO 01-61-01.9 - Praha-Bubny, MaR	56 dny	10.07.24	03.09.24	1840SF+50 dny		Ne	0 dny
1845		MS	SO01-61-01	Dokončovací práce	100 dny	24.10.24	31.01.25	**1799;1766;1765;1798;1831FS-59**	2	Ne	0 dny
1846		MS	SO01-61-01	Stavební připravenost části budovy pro montáže zab.zař. M.C. 44, 46	0 dny	26.06.24	26.06.24	1830SS	234;238;7;1;146;184;182	Ano	0 dny
1847		MS	SO01-61-01	Stavební připravenost části budovy pro montáže technologie	0 dny	13.09.24	13.09.24	1830	234;238;7;1;146;;305;351;116;190;159	Ano	0 dny
1848		MS	SO01-61-01	Stavební připravenost pro montáž eskalátorů	0 dny	25.06.24	25.06.24	1743;1828		Ne	0 dny
1849		MS	SO01-61-01	Stavební připravenost pro montáž výtahů	0 dny	25.06.24	25.06.24	1743;1828	240	Ne	0 dny
1850		MS	SO 01-62-01	**SO 01-62-01 - ŽST Praha-Bubny, zastřešení, architektonicko - stavební řešení + konstrukční**	**363 dny**	**21.11.23**	**17.11.24**		**1863FS-48 dny**	**Ano**	**0 dny**
1851		MS	SO 01-62-01	**Dilatační celek 1**	**225 dny**	**21.11.23**	**02.07.24**			**Ano**	**0 dny**
1852		MS	SO01-62-01	Sloupy (30x)	72 dny	21.11.23	31.01.24	1758	1853FS-10 dny	Ano	0 dny
1853		MS	SO01-62-01	výstavba skruže zastřešení	30 dny	22.01.24	20.02.24	1852FS-10 dny	1854FS-5 dny	Ano	0 dny
1854		MS	SO01-62-01	bednění zastřešení	14 dny	16.02.24	29.02.24	1853FS-5 dny	1855	Ano	0 dny
1855		MS	SO01-62-01	výztuž zastřešení (331 t)	35 dny	01.03.24	04.04.24	1854	1856	Ano	0 dny
1856		MS	SO01-62-01	betonáž zastřešení - etapa I (678 m3)	3 dny	05.04.24	07.04.24	1855	1857	Ano	0 dny
1857		MS	SO01-62-01	bednění pro etapu II	14 dny	08.04.24	21.04.24	1856	1858	Ano	0 dny
1858		MS	SO01-62-01	betonáž zastřešení - etapa II (678 m3)	3 dny	22.04.24	24.04.24	1857	1859FS+14 dny;1860	Ano	0 dny
1859		MS	SO01-62-01	odstranění skruže	25 dny	09.05.24	02.06.24	1858FS+14 dny	1861;1862;1863FS-10 dny	Ano	0 dny
1860		MS	SO01-62-01	montáž světlíků	30 dny	25.04.24	24.05.24	1858	1861SS+10 dny	Ne	0 dny
1861		MS	SO01-62-01	střešní souvrství	30 dny	05.05.24	03.06.24	1860SS+10 dny		Ne	0 dny
1862		MS	SO01-62-01	izolační souvrství nástupiště	30 dny	03.06.24	02.07.24	1859	462	Ano	0 dny
1863		MS	SO 01-62-01	**Dilatační celek 2**	**188 dny**	**13.03.24**	**16.09.24**			**Ano**	**0 dny**
1864		MS	SO01-62-01	Sloupy (18x)	40 dny	13.03.24	21.04.24	1772;1776;1777	1865FS-5 dny;1866	Ano	0 dny
1865		MS	SO01-62-01	výstavba skruže zastřešení	25 dny	17.04.24	11.05.24	1864FS-5 dny	1866FS-5 dny	Ano	0 dny
1866		MS	SO01-62-01	bednění zastřešení	14 dny	07.05.24	20.05.24	1865FS-5 dny	1867	Ano	0 dny
1867		MS	SO01-62-01	výztuž zastřešení (349 t)	35 dny	21.05.24	24.06.24	1866	1868	Ano	0 dny
1868		MS	SO01-62-01	betonáž zastřešení - etapa I (707 m3)	3 dny	25.06.24	27.06.24	1867	1869	Ano	0 dny
1869		MS	SO01-62-01	bednění pro etapu II	14 dny	28.06.24	11.07.24	1868	1870	Ano	0 dny
1870		MS	SO01-62-01	betonáž zastřešení - etapa II (707 m3)	3 dny	12.07.24	14.07.24	1869	1874;1871FS+14 dny;1872	Ano	0 dny
1871		MS	SO01-62-01	odstranění skruže	20 dny	29.07.24	17.08.24	1870FS+14 dny	1874	Ano	0 dny
1872		MS	SO01-62-01	montáž světlíků	30 dny	15.07.24	13.08.24	1870	1873SS+10 dny	Ne	0 dny
1873		MS	SO01-62-01	střešní souvrství	30 dny	25.07.24	23.08.24	1872SS+10 dny		Ne	0 dny
1874		MS	SO01-62-01	izolační souvrství nástupiště	30 dny	18.08.24	16.09.24	1871	462	Ano	0 dny
1875		MS	SO 01-62-01	**Dilatační celek 3**	168 dny	**28.01.24**	**13.07.24**			**Ano**	**0 dny**
1876		MS	SO01-62-01	Sloupy (12x)	25 dny	28.01.24	21.02.24	1791	1877FS-5 dny	Ano	0 dny
1877		MS	SO01-62-01	výstavba skruže zastřešen	25 dny	17.02.24	12.03.24	1876FS-5 dny	1878FS-5 dny	Ano	0 dny
1878		MS	SO01-62-01	bednění zastřešení	14 dny	08.03.24	21.03.24	1877FS-5 dny	1879	Ano	0 dny
1879		MS	SO01-62-01	výztuž zastřešení (268 t)	30 dny	22.03.24	20.04.24	1878	1880	Ano	0 dny
1880		MS	SO01-62-01	betonáž zastřešení - etapa I (532 m3)	3 dny	21.04.24	23.04.24	1879	1881	Ano	0 dny

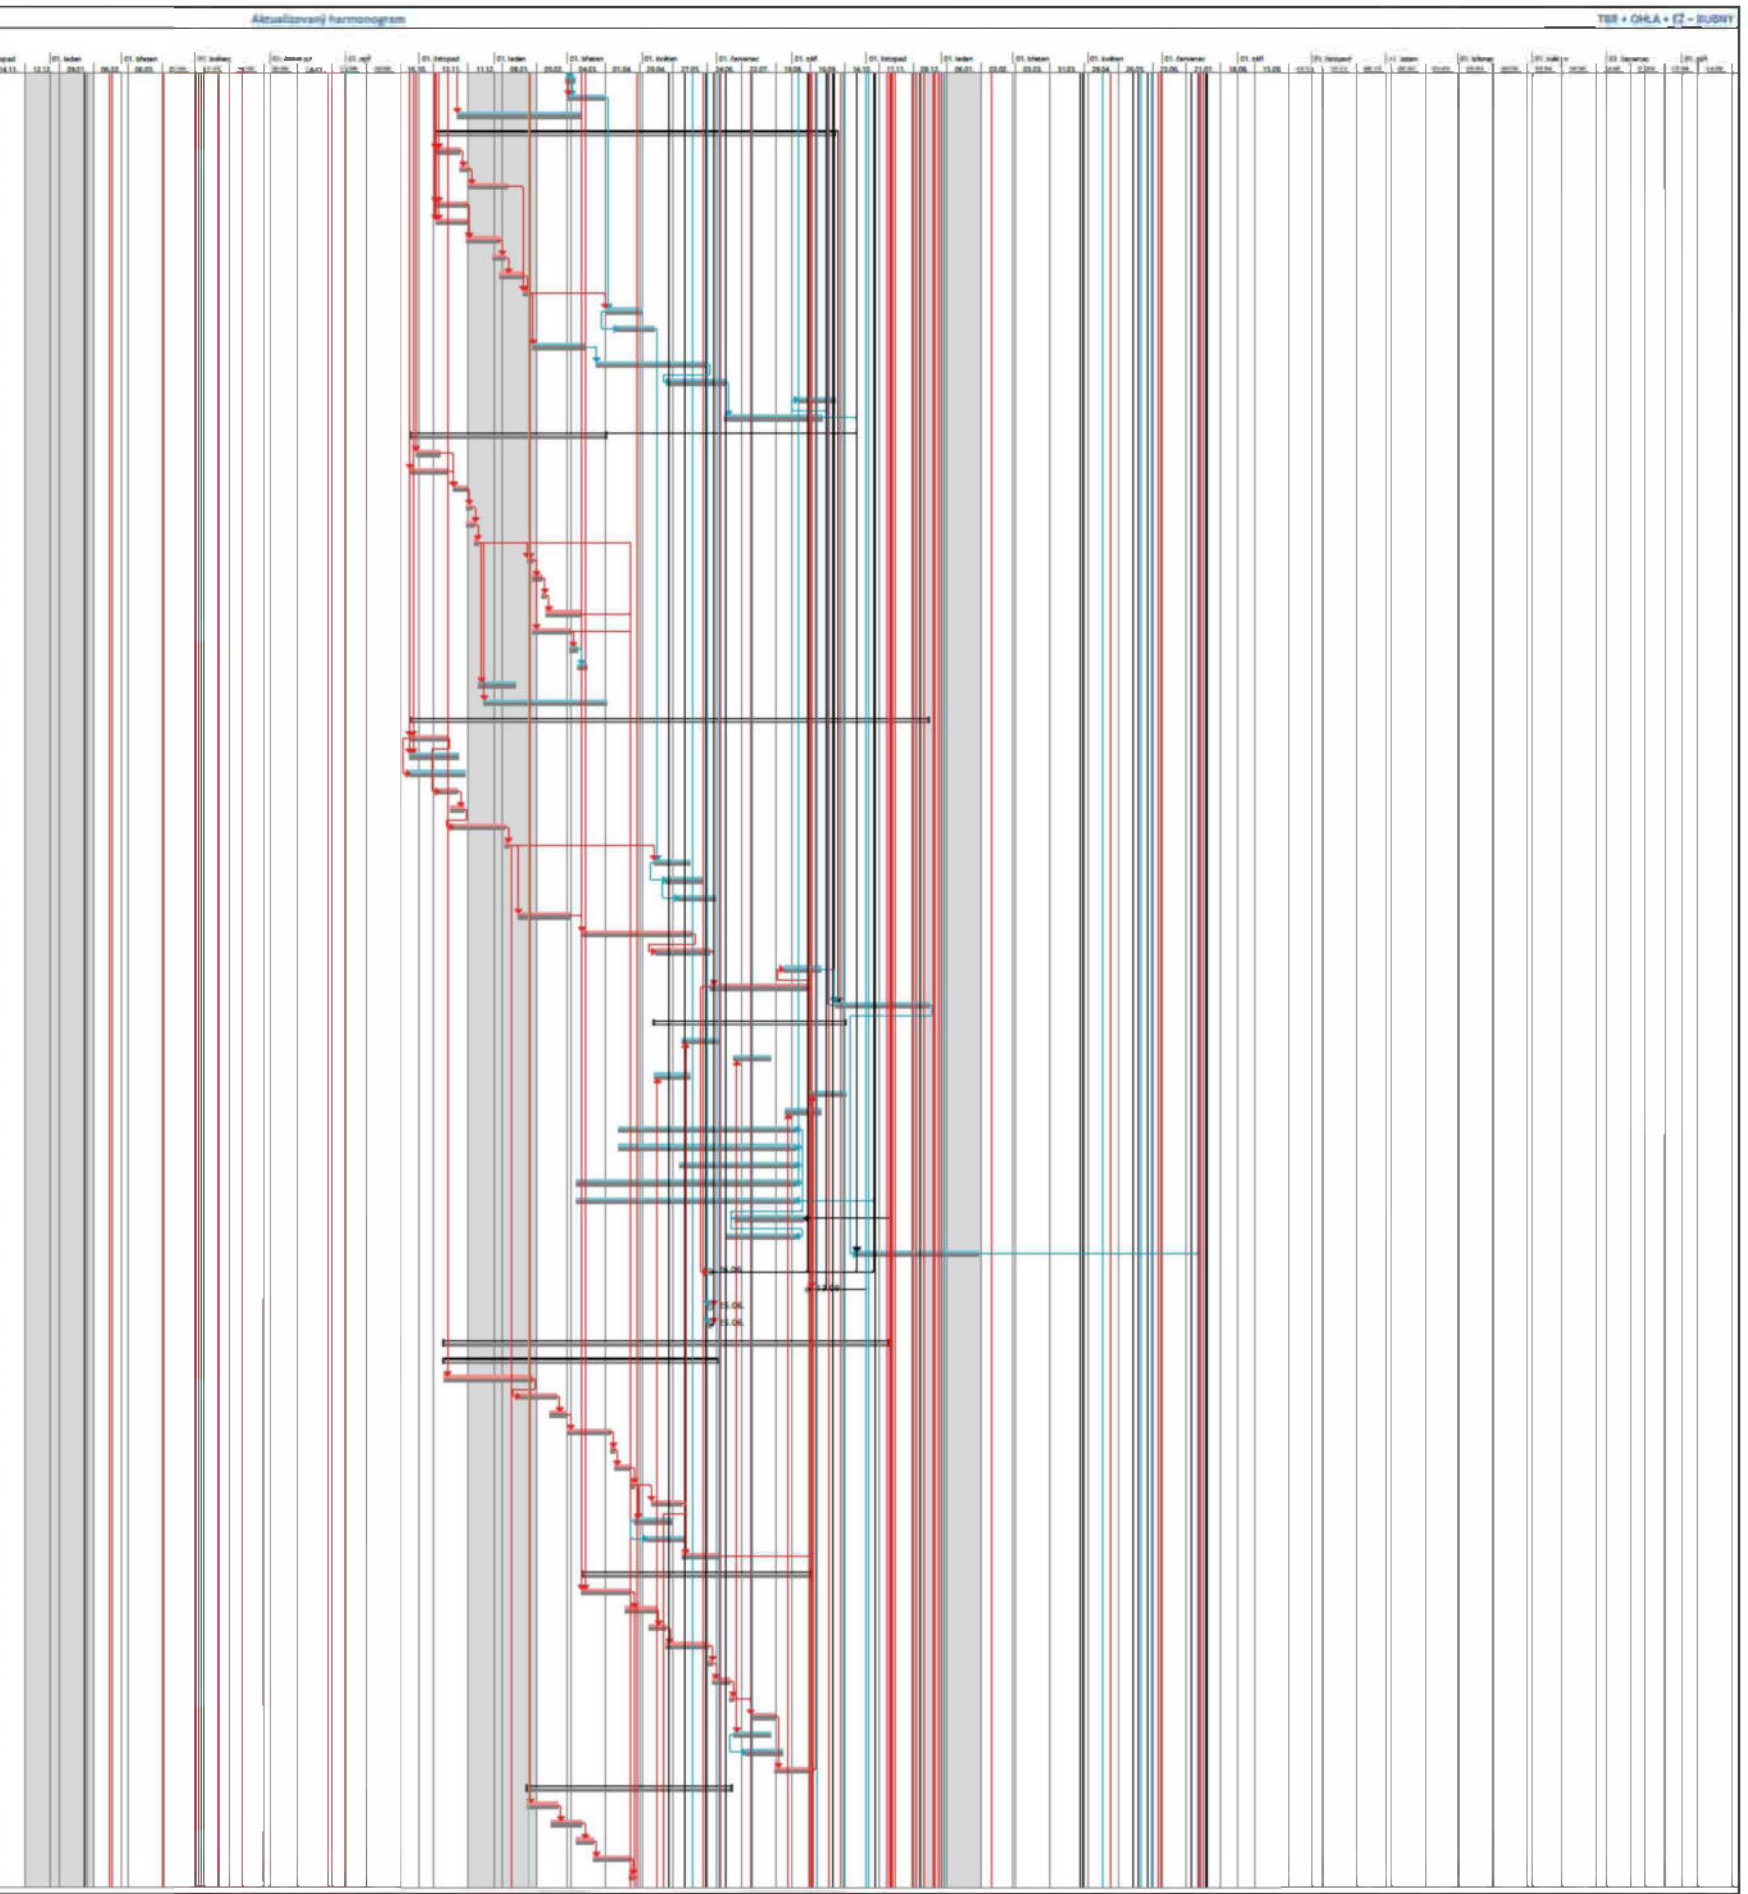

Harmonogram stavby "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)"

Aktualizovaný harmonogram

TBR + OHLA + EŽ – BUBNY

ID	Řadí/skrýt	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Kritický	Odchylka dokončení
1881		SO 01-62-01	bednění pro etapu II	14 dny	24.04. 24	07.05. 24	1880	1882	Ano	0 dny
1882		SO 01-62-01	betonáž zastřešení - etapa II (532 m3)	3 dny	08.05. 24	10.05. 24	1881	1883;1883FS+14 dny;1884	Ano	0 dny
1883		SO 01-62-01	odstranění skruže	20 dny	25.05. 24	13.06. 24	1882FS+14 dny	1886;1885FS-10 dny	Ano	0 dny
1884		SO 01-62-01	montáž světlíků	30 dny	11.05. 24	09.06. 24	1882	1885SS+10 dny	Ne	0 dny
1885		SO 01-62-01	střešní souvrství	30 dny	21.05. 24	19.06. 24	1884SS+10 dny		Ne	0 dny
1886		SO 01-62-01	izolační souvrství nástupiště	30 dny	14.06. 24	13.07. 24	1883	462	Ano	0 dny
1887		SO 01-62-01	**Dilatační celek 4**	**210 dny**	**22.04. 24**	**17.11. 24**			**Ano**	**0 dny**
1888		SO 01-62-01	Sloupy (15x)	30 dny	22.04. 24	21.05. 24	1809;1809;1810;1864	1889	Ano	0 dny
1889		SO 01-62-01	výstavba skruže zastřešení	25 dny	23.06. 24	17.07. 24	1888;1885FS-10 dny;1901	1890FS-5 dny	Ano	0 dny
1890		SO 01-62-01	bednění zastřešení	14 dny	18.07. 24	26.07. 24	1889FS-5 dny	1891	Ano	0 dny
1891		SO 01-62-01	výztuž zastřešení (289 t)	30 dny	27.07. 24	25.08. 24	1890	1892	Ano	0 dny
1892		SO 01-62-01	betonáž zastřešení - etapa I (585 m3)	3 dny	26.08. 24	28.08. 24	1891	1893	Ano	0 dny
1893		SO 01-62-01	bednění pro etapu II	14 dny	29.08. 24	11.09. 24	1892	1894	Ano	0 dny
1894		SO 01-62-01	betonáž zastřešení - etapa II (585 m3)	3 dny	12.09. 24	14.09. 24	1893	1896;1895FS+14 dny;1896	Ano	0 dny
1895		SO 01-62-01	odstranění skruže	20 dny	29.09. 24	18.10. 24	1894FS+14 dny	1897;1896	Ano	0 dny
1896		SO 01-62-01	montáž světlíků	30 dny	15.09. 24	14.10. 24	1894	1897SS+10 dny	Ne	0 dny
1897		SO 01-62-01	střešní souvrství	30 dny	25.09. 24	24.10. 24	1896SS+10 dny		Ne	0 dny
1898		SO 01-62-01	izolační souvrství nástupiště	30 dny	15.10. 24	17.11. 24	1895	467	Ano	0 dny
1899		SO 01-62-01	**Dilatační celek 5**	**295 dny**	**13.01. 24**	**02.11. 24**			**Ano**	**0 dny**
1900		SO 01-62-01	Sloupy (30x)	60 dny	13.01. 24	12.03. 24	1832	1901;FS-10 dny	Ano	0 dny
1901		SO 01-62-01	výstavba skruže zastřešení	30 dny	24.05. 24	22.06. 24	1900FS-10 dny;1870FS-10 dny	1902;FS-5 dny;1889	Ano	0 dny
1902		SO 01-62-01	bednění zastřešení	14 dny	18.06. 24	01.07. 24	1901FS-5 dny	1903	Ano	0 dny
1903		SO 01-62-01	výztuž zastřešení (350 t)	35 dny	02.07. 24	05.08. 24	1902	1904	Ano	0 dny
1904		SO 01-62-01	betonáž zastřešení - etapa I (708 m3)	3 dny	06.08. 24	08.08. 24	1903	1905	Ano	0 dny
1905		SO 01-62-01	bednění pro etapu II	14 dny	09.08. 24	22.08. 24	1904	1906	Ano	0 dny
1906		SO 01-62-01	betonáž zastřešení - etapa II (708 m3)	3 dny	23.08. 24	25.08. 24	1905	1907;1907FS+14 dny;1908	Ano	0 dny
1907		SO 01-62-01	odstranění skruže	25 dny	09.09. 24	03.10. 24	1906FS+14 dny	1910	Ano	0 dny
1908		SO 01-62-01	montáž světlíků	30 dny	26.08. 24	24.09. 24	1906	1909SS+10 dny	Ne	0 dny
1909		SO 01-62-01	střešní souvrství	30 dny	05.09. 24	04.10. 24	1908SS+10 dny		Ne	0 dny
1910		SO 01-62-01	izolační souvrství desky nástupiště	30 dny	04.10. 24	02.11. 24	1907	110;467	Ano	0 dny
1911		SO 01-64-01	**SO 01-64-01 - ŽST Praha-Bubny, orientační systém**	**62 dny**	**22.11. 24**	**22.01. 25**			**Ne**	**0 dny**
1912		SO 01-64-01	Montáž, kotvení sloupků v ploše nástupiště	14 dny	22.11. 24	06.12. 24	4650F	1913	Ne	0 dny
1913		SO 01-64-01	Montáže orientačního systému	48 dny	06.12. 24	22.01. 25	1912		Ne	0 dny
1914		SO 01-65-01	**SO 01-65-01 - Praha-Bubny, demolice**	**152 dny**	**01.02. 23**	**02.07. 23**			**Ne**	**0 dny**
1915		SO 01-65-01	SO 01-65-01 - Praha-Bubny, demolice	152 dny	01.02. 23	02.07. 23			Ne	0 dny
1916		SO 01-66-01	**SO 01-66-01 - ŽST Praha-Bubny - drobná architektura**	**46 dny**	**22.11. 24**	**06.01. 25**			**Ne**	**0 dny**
1917		SO 01-66-01	Založení, příprava kotvení	14 dny	22.11. 24	06.12. 24	4650F	1918	Ne	0 dny
1918		SO 01-66-01	Osazení prvků mobiliáře	32 dny	06.12. 24	06.01. 25	1917		Ne	0 dny
1919		SO 02-65-01	**SO 02-65-01 - TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, demolice**	**638 dny**	**01.02. 23**	**30.10. 24**			**Ne**	**0 dny**
1920		SO 02-65-01	SO 02-65-01 - TÚ Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, demolice	213 dny	01.02. 23	01.09. 23		1444	Ne	0 dny
1921		SO 02-65-01	demolice archivů	30 dny	01.10. 24	30.10. 24		1444	Ne	0 dny
1922		SO 02-66-01	**SO 02-66-01 - Oplocení areálu Omnipol**	**60 dny**	**02.06. 25**	**31.07. 25**			**Ne**	**180 dny**
1923		SO 02-66-01	Založení oplocení, brány	18 dny	02.06. 25	20.06. 25	1924SF		Ne	180 dny
1924		SO 02-66-01	Montáž sloupků, oplocení, brány	42 dny	20.06. 25	31.07. 25	23F	1923SF	Ne	180 dny
1925		SO 02-66-02	**SO 02-66-02 - Oplocení autobazaru**	**46 dny**	**16.06. 25**	**31.07. 25**			**Ne**	**180 dny**
1926		SO 02-66-02	Založení oplocení, brány	21 dny	16.06. 25	07.07. 25	1927SF		Ne	180 dny
1927		SO 02-66-02	Montáž sloupků, oplocení, brány	25 dny	07.07. 25	31.07. 25	23F	1926SF	Ne	180 dny
1928		SO 03-61-01	**SO 03-61-01 - zast. Praha-Výstaviště**	**555 dny**	**02.04. 23**	**08.10. 24**			**Ano**	**0 dny**
1929		SO 03-61-01	Předání pracoviště, přípravné práce	14 dny	02.04. 23	15.04. 23	363	1931;1930	Ano	0 dny
1930		SO 03-61-01	Zemní práce	35 dny	16.04. 23	20.05. 23	1929	1931	Ano	0 dny
1931		SO 03-61-01	Základání	100 dny	21.05. 23	28.08. 23	1930;1929	1932	Ano	0 dny
1932		SO 03-61-01	Svislé konstrukce	100 dny	29.08. 23	06.12. 23	1931	1933	Ano	0 dny
1933		SO 03-61-01	Úpravy povrchů	7 dny	07.12. 23	13.12. 23	1932	1934	Ano	0 dny
1934		SO 03-61-01	Izolace proti vodě	60 dny	14.12. 23	11.02. 24	1933	1935	Ano	0 dny
1935		SO 03-61-01	Ploché střechy	42 dny	12.02. 24	24.03. 24	1934	1936;1951;1943	Ano	0 dny
1936		SO 03-61-01	Izolace tepelné + ochrana	30 dny	25.03. 24	23.04. 24	1935	1937;471	Ano	0 dny
1937		SO 03-61-01	Výplně otvorů	14 dny	24.04. 24	07.05. 24	1936	1939;1944;1945;1947;1949	Ano	0 dny
1938		SO 03-61-01	Konstrukce zámečnické	21 dny	08.05. 24	28.05. 24	1937	1939;1940;1941;1942	Ano	0 dny
1939		SO 03-61-01	Podlahy	14 dny	29.05. 24	11.06. 24	1938		Ne	0 dny
1940		SO 03-61-01	Podlahy z kamene	28 dny	29.05. 24	25.06. 24	1938		Ne	0 dny
1941		SO 03-61-01	Dokončovací práce - obklady	35 dny	29.05. 24	02.07. 24	1938		Ne	0 dny
1942		SO 03-61-01	Dokončovací práce - nátěry	21 dny	29.05. 24	18.06. 24	1938	1943FS+17 dny	Ano	0 dny
1943		SO 03-61-01.3	SO 03-61-01.3 - zast. Praha-Výstaviště, pomocné kce (OK pro informační a orientační	28 dny	10.09. 24	08.10. 24	4755F;1935;1105	1815	Ne	0 dny
1944		SO 03-61-01.4	SO 03-61-01.4 - zast. Praha-Výstaviště, VZT a chlazení	21 dny	08.05. 24	28.05. 24	1937		Ne	0 dny
1945		SO 03-61-01.5	SO 03-61-01.5 - Praha-Výstaviště, ZTI	14 dny	08.05. 24	21.05. 24	1937		Ne	0 dny
1946		SO 03-61-01.5	SO 03-61-01.5 - odvodnění v nástupištích	50 dny	05.08. 24	23.09. 24	4730F		Ne	0 dny
1947		SO 03-61-01.6	SO 03-61-01.6 - Praha-Výstaviště, vnitřní rozvody NN a osvětlení	21 dny	08.05. 24	28.05. 24	1937		Ne	0 dny
1948		SO 03-61-01.8	SO 03-61-01.8 - Praha-Výstaviště, hromosvod a uzemnění	14 dny	08.05. 24	21.05. 24	1937		Ne	0 dny
1949		SO 03-61-01	Předání pracoviště pro montáž technologie	0 dny	05.07. 24	05.07. 24	1942FS+17 dny	1837;+90 dny;1887;+40 dny;1719;+40 dny;1	Ano	0 dny
1950		SO 03-62-01	**SO 03-62-01 - zast. Praha-Výstaviště, zastřešení**	**156 dny**	**02.06. 24**	**04.11. 24**			**Ne**	**0 dny**
1951		SO 03-62-01	Kotvení a montáž sloupů OK	21 dny	02.06. 24	22.06. 24	1935;1219	1943;1952	Ne	0 dny
1952		SO 03-62-01	Montáž střešní krytiny	7 dny	23.06. 24	29.06. 24	1951	1953;1717	Ne	0 dny
1953		SO 03-62-01	Montáž podhledů	28 dny	08.10. 24	04.11. 24	1952;1943	1954FS-14 dny	Ne	0 dny
1954		SO 03-64-01	**SO 03-64-01 - zast. Praha-Výstaviště, orientační systém**	**42 dny**	**01.10. 24**	**11.11. 24**			**Ne**	**0 dny**
1955		SO 03-64-01	Montáž, kotvení sloupků v ploše nástupiště	7 dny	01.10. 24	08.10. 24	4755F	1956	Ne	0 dny
1956		SO 03-64-01	Montáže orientačního systému	21 dny	22.10. 24	11.11. 24	1955;195;955-14 dny		Ne	0 dny
1957		SO 03-66-01	**SO 03-66-01 - zast. Praha-Výstaviště - drobná architektura**	**62 dny**	**24.09. 24**	**24.11. 24**			**Ne**	**0 dny**
1958		SO 03-66-01	Založení, příprava kotvení	14 dny	24.09. 24	08.10. 24	4755F	1959	Ne	0 dny
1959		SO 03-66-01	Osazení prvků mobiliáře	48 dny	08.10. 24	24.11. 24	1958		Ne	0 dny
1960		D.2.3.1	**D.2.3.1 - Trakční vedení**	**904 dny**	**06.02. 23**	**28.07. 25**			**Ano**	**180 dny**
1961		SO 01-71-01	**SO 01-71-01 - Praha-Bubny, TV**	**882 dny**	**06.02. 23**	**06.07. 25**			**Ano**	**180 dny**
1962		SO 01-71-01	**Úsek 01 ist.Praha Bubny (nkm 411,500 - nkm 412,226)**	**882 dny**	**06.02. 23**	**06.07. 25**			**Ano**	**180 dny**
1963		SO 01-71-01	Zahájení výluky, připravenost pracoviště	0 dny	06.02. 23	06.02. 23	1725	1964;1974	Ano	0 dny
1964		SO 01-71-01	Sneseni TV v SK č. 3a, 5, 5b, 7, 9, 15, 17, 8, 10, 12, 14	10 dny	06.02. 23	15.02. 23	1963	880;301	Ano	0 dny
1965		SO 01-71-01	Sneseni TV v SK č. 1, 2, 3, 11, 13; demontáž bran a stožárů, demolice základů	15 dny	03.05. 25	17.05. 25	1978	1966	Ne	180 dny
1966		SO 01-71-01	Budování základů TV	40 dny	18.05. 25	26.06. 25	1965		Ne	180 dny
1967		SO 01-71-01	Osazení stožárů na 01-20-01 a Podjezdu Bubny	21 dny	09.06. 25	29.06. 25	492	2047FS-14 dny;2052;2056;1971	Ano	180 dny
1968		SO 01-71-01	Sneseni TV na masaryk. zhlaví	2 dny	03.05. 25	04.05. 25	5232		Ne	180 dny
1969		SO 01-71-01	osazení stožárů na 01-20-02	21 dny	02.07. 24	22.07. 24	591	1972	Ano	0 dny
1970		SO 01-71-01	osazení stožárů na 01-20-03	21 dny	18.06. 24	08.07. 24	711	1972	Ano	0 dny
1971		SO 01-71-01	montáž závěsů trakce na zastřešení VB Bubny	14 dny	19.10. 24	01.11. 24	1935	1972	Ano	0 dny
1972		SO 01-71-01	Montáž a regulace TV na masaryk. zhlaví	7 dny	30.06. 25	06.07. 25	1969;1970;1971;1967;3285FS-2 dny	26	Ano	180 dny
1973		SO 01-71-01	**Provizorní kolej**	**824 dny**	**06.02. 23**	**08.05. 25**			**Ne**	**180 dny**
1974		SO 01-71-01	Budování proviz. základů TV (20 ks)	14 dny	06.02. 23	19.02. 23	1963	1975FS+20 dny	Ne	0 dny
1975		SO 01-71-01	Osazení stožárů, montáž a regulace TV	10 dny	12.03. 23	21.03. 23	1974FS+20 dny	1976	Ne	0 dny
1976		SO 01-71-01	Montáž a regulace TV - propojení do stáv. stavu	2 dny	08.05. 23	09.05. 23	3389FS+0 dny;1975	1977	Ne	0 dny
1977		SO 01-71-01	Ukončení výluky (proviz.)	0 dny	09.05. 23	09.05. 23	3410;1976		Ne	0 dny
1978		SO 01-71-01	Zahájení výluky (všechny směry)	0 dny	03.05. 25	03.05. 25	5232	1965;1979	Ne	180 dny
1979		SO 01-71-01	Sneseni provizorního TV vč. stožárů, demolice základů	7 dny	03.05. 25	09.05. 25	1978	4205FS-1 den	Ne	180 dny
1980		SO 01-71-02	**SO 01-71-02 - Praha-Bubny, připojení 5p5 na TV**	**35 dny**	**24.06. 25**	**28.07. 25**			**Ne**	**180 dny**
1981		SO 01-71-02	realizace napájecího vedení a úpravy zesilovacího vedení	35 dny	24.06. 25	28.07. 25	1992	2	Ne	180 dny
1982		SO 01-71-04.1	**SO 01-71-04.1 - Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, zárubní zeď u el. dělení**	**115 dny**	**26.07. 24**	**17.11. 24**			**Ano**	**0 dny**

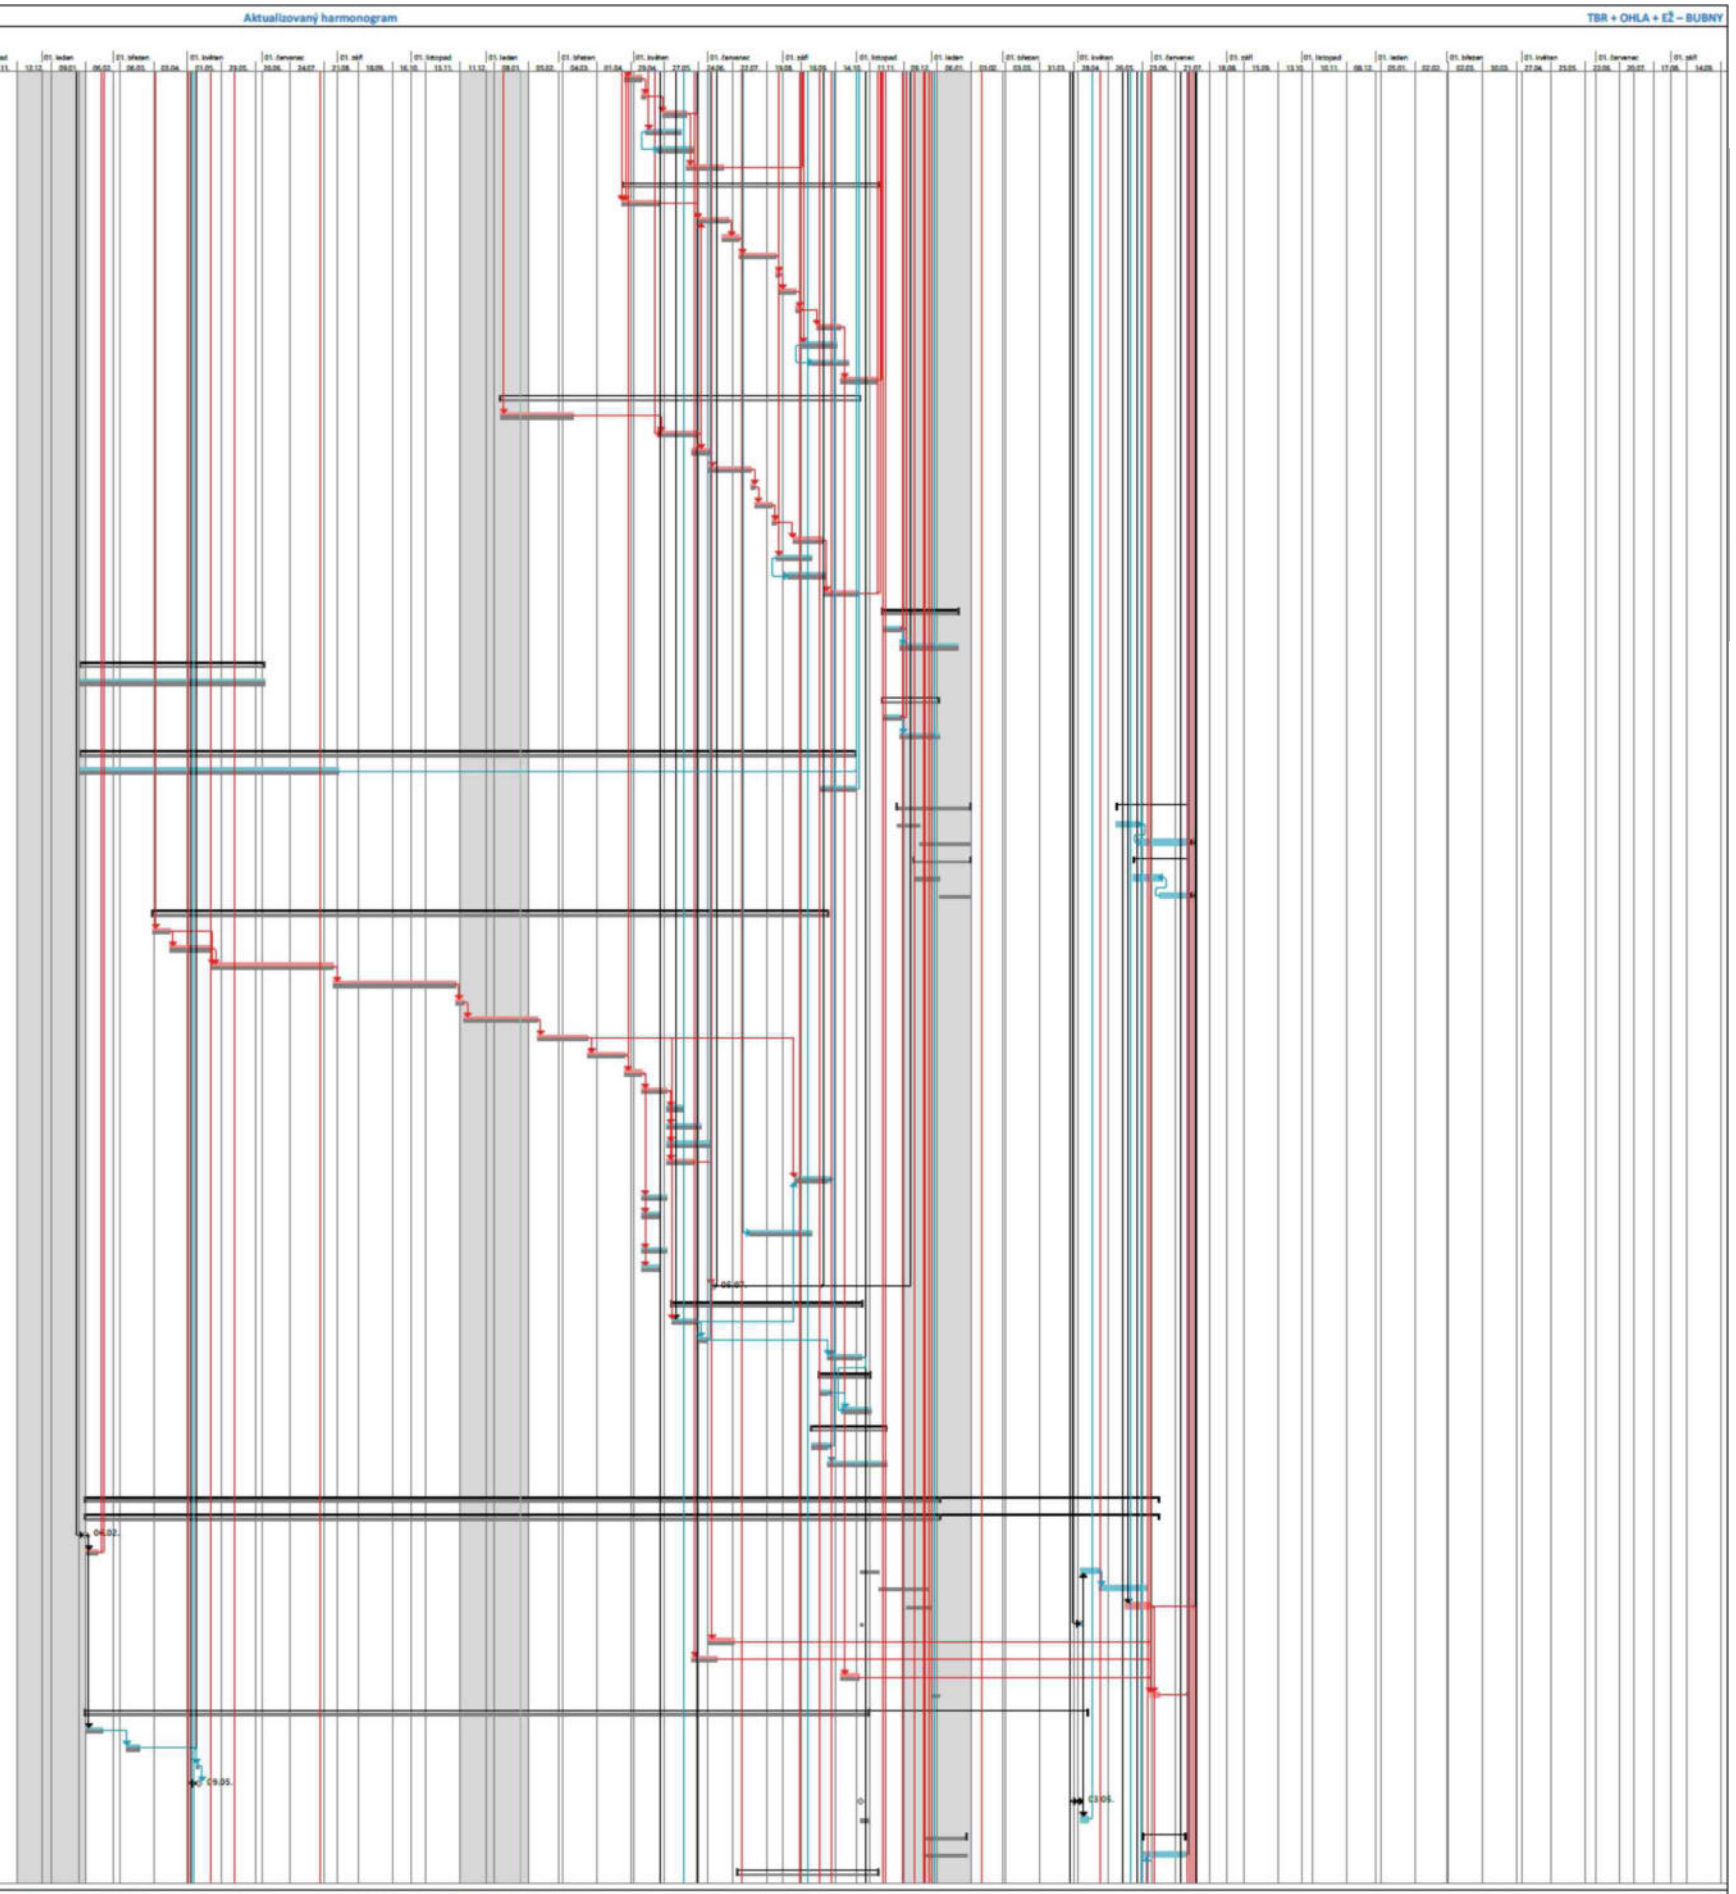

Legenda: Úkol, Rozdělení, Milník, Souhrnný, Souhrnný projekt, Nesoutřídit milníky, Nesoutřídit souhrn, Nesoutřídit úkol, Ruční úkol, Ruční souhrn, Pouze s datem trvání, Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu, Pouze s datem dokončení, Pouze zahájení, Vnější úkoly, Vnější milník, Konečný termín, Milník nasazeného, Souhrnný úkol nasazeného, Normální úkol nasazeného, Kritický, Kritické rozdělení, Milník podle směrného plánu, Souhrnný úkol směrného plánu, Průběh, Průběh nutné nadeného úkolu

Harmonogram stavby "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Vyšehrad (včetně)"

Aktualizovaný harmonogram

TSR 4 CHLA + IZ – BUBNY

ID	Typ	Název úkolu	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Následníci	Kritický	Dodatečná zahájení
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] dny	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] dny	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ano	0 dny
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] dny	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ne	0 dny
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] dny	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ano	0 dny
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] dny	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ne

Harmonogram stavby "Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)"

Aktualizovaný harmonogram

TBR + OHLA + EŽ – BUBNY

ID		Řadič úkolů	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Kritický	Odchylka dokončení
2085			D.2.4.1	**D.2.4.1 - Sadové úpravy a kácení zeleně**	**852 dny**	**01.02. 23**	**01.06. 25**			**Ano**	**180 dny**
2086			SO 91-83-01	**SO 91-83-01 - Kácení zeleně**	**59 dny**	**01.02. 23**	**31.03. 23**			**Ano**	**0 dny**
2087			SO 91-83-01	SO 91-83-01 - Kácení zeleně	59 dny	01.02. 23	31.03. 23		4001,4,4,4	Ano	0 dny
2088			SO 91-83-02	**SO 91-83-02 - Sadové úpravy**	**184 dny**	**30.11. 24**	**01.06. 25**			**Ne**	**180 dny**
2089			SO 91-83-02	SO 91-83-02 - Sadové úpravy	184 dny	30.11. 24	01.06. 25	4119F+30 dny		Ne	180 dny
2090			SO 91-83-02.1	**SO 91-83-02.1 - ŽST Praha-Bubny, sadové úpravy**	**217 dny**	**28.10. 24**	**01.06. 25**			**Ne**	**180 dny**
2091			SO 91-83-02.1	sadové úpravy	124 dny	29.01. 25	01.06. 25	2559F+30 dny	2061SF	Ne	180 dny
2092			SO 91-83-02.1	závlahový systém	93 dny	28.10. 24	29.01. 25	2091SF		Ne	180 dny
2093			SO 91-83-02.2	**SO 91-83-02.2 - Zast. Praha-Výstaviště, sadové úpravy**	**246 dny**	**29.09. 24**	**01.06. 25**			**Ne**	**180 dny**
2094			SO 91-83-02.2	sadové úpravy	153 dny	31.12. 24	01.06. 25	2559F+30 dny	2086SF	Ne	180 dny
2095			SO 91-83-02.2	závlahový systém	93 dny	29.09. 24	31.12. 24	2096SF		Ne	180 dny

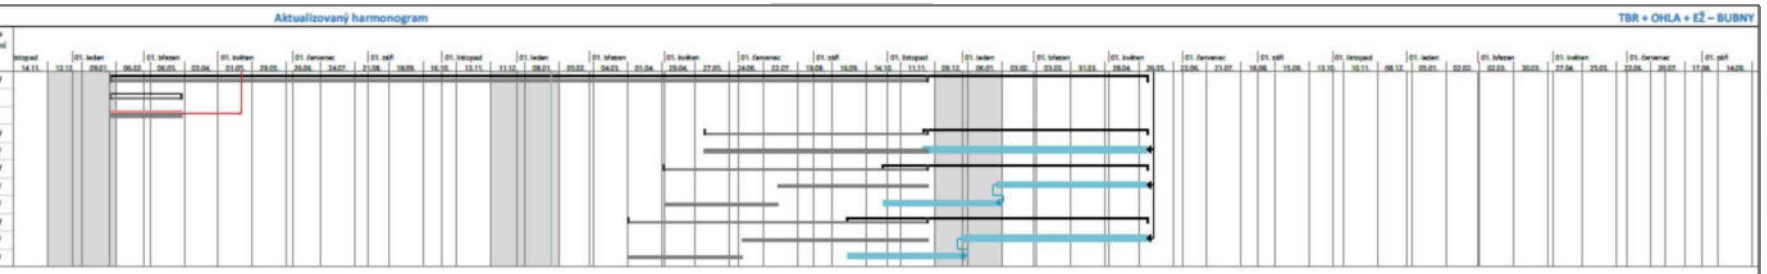

Úkol | Souhrnný | Neaktivní mílník | Pouze s dobou trvání | Pouze zahájení | Vnější mílník | Souhrnný úkol následníka | Kritická nezálivnost | Souhrnný úkol směrného plánu | Průběh
Rozdělení | Souhrn projektu | Neaktivní souhrn | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze s datem dokončení | Konečný termín | Normální úkol následníka | Směrný plán | Průběh ruční zadaného úkolu
Mílník | Neaktivní úkol | Ruční úkol | Ruční souhrn | Vnější úkoly | Mílník následníka | Kritický | Mílník podle směrného plánu
