F 2/6

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

**Dodavatel:** DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII
261 01 Příbram

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
**IČO:** 00002739 **DIČ:** CZ00002739
Banka: ČSOB, a.s.
Č.účtu: 217725563/0300

**Odběratel-plátce:**
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha

**IČO:** 00164801

Centrální podatelna MŽP
B002661987
Ev. č.: ENV/2024/333910
Listy/příl.: 2/8 Došlo: 24.9.2024 12:26
Číslo jednací:

| | |
|---|---|
| Číslo dokladu (VS): | **3324510031** |
| Smlouva-objednávka: | Y/NŘZ/KO/283/19/01 |
| Smlouva odběratele: | |
| Číslo odběratele: | 104910 |
| Konstantní symbol: | 0308 |

**Příjemce-adresa pro doručení:**

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha

| | |
|---|---|
| Datum uskutečnění zdan. plnění: | **06.09.2024** |
| Datum vystavení: | 16.09.2024 |
| Splatnost: | **19.10.2024** |
| Forma úhrady: | přev. příkazem |
| Měna: | CZK |
| Číslo zakázky: | 1324500007 |

## Fakturujeme:

Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2019-2023-část 1, název akce:

Zabezpečení SDD "šachtice Staré Sedlo (p.č. 53/17)" (č.o. 2910)včetně navazujících důlních děl v k. ú. Staré Sedlo u Sokolova,dle č. sml. MŽP-OG-16/24/SDD,CES: 190 070.

Přílohy:

1/ Zápis o odevzdání a převzetí

2/ Zjišťovací protokol k fakturaci

3/ Soupis provedených prací

4/ Faktura č. 74610042, GIS

Prosím o zaplacení fakturované částky na níže uvedený účet,

účet: 7536123000/5500

Název položky

| Jednotková cena | Množství | MJ | Daň. základ CZK | Sazba DPH | DPH CZK | Celkem CZK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Refakturace MŽP - neplátce** | | | | | | |
| 1.253.445,00 | 1 | JV | 1.253.445,00 | 21 % | 263.223,45 | 1.516.668,45 |

**Cena vč. DPH CZK** **1.516.668,45**

**K úhradě CZK** **1.516.668,45**

Daňová rekapitulace:

| Daň. základ CZK | Sazba DPH | DPH CZK | Celkem CZK |
|---|---|---|---|
| 1.253.445,00 | 21 % | 263.223,45 | 1.516.668,45 |

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

**Dodavatel:** DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII
261 01 Příbram

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
**IČO:** 00002739 **DIČ:** CZ00002739

**Odběratel-plátce:**
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha

**IČ:** 00164801 **DIČ:**

| | |
|---|---|
| Číslo dokladu (VS): | **3324510031** |
| Smlouva-objednávka: | Y/NŘZ/KO/283/19/01 |
| Smlouva odběratele: | |
| Číslo odběratele: | 104910 |
| Konstantní symbol: | 0308 |

**Příjemce-adresa pro doručení:**

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha

Vystavil(-a):
Telefon:
Email:

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci** číslo:

Sledované období: březen - srpen 2024 rok 2024 Počet příloh: 1

**I.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

| |
|---|
| **ZHOTOVITEL**: Společnost „Likvidace SDD-PKÚ + GIS – Oblast 1“ |

| | | |
|---|---|---|
| **OBJEDNATEL:** MŽP ČR | IČ: 00164801 | DIČ: |

| | | |
|---|---|---|
| **AKCE: Zabezpečení SDD „šachtice Staré Sedlo (p.č. 53/17)“ (č.o. 2910) včetně navazujících důlních děl v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova.** | Zahájení: 5. 3. 2024 | Dokončení: 31. 8. 2024 |
| Místo: Obec Staré Sedlo, k.ú. Staré Sedlo u Sokolova | Kraj: Karlovarský | |
| Smlouva – číslo ze dne: 8. 2. 2024 č.j. ENV/2024/121882 | č.sml.objednatele: MZP-OG-16/24/SDD | |

**II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Celková cena dle smlouvy (vč. DPH): | | | 1 566 225,21 Kč |
| 2. | Cena za provedené práce v Kč. | od zahájení do konce předchozího období | ve sledovaném období | od zahájení do konce sledovaného období |
| | Cena bez DPH | 0 | 1 253 445,- | 1 253 445,- |
| | Cena včetně DPH | 0 | 1 516 668,45 | 1 516 668,45 |
| | K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH). | | | 49 556,76 |

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

**Za zhotovitele:** Jméno: Ing. Karel Bureš

**Za objednatele:** Jméno: Ing. Petr Uldrych

**Za GDO:** Jméno: Ing. Daniel Prečuch

**Přílohy:** č. 1 - Soupis provedených prací

**Ekonomické zhodnocení akce**

**Zabezpečení SDD „šachtice Staré Sedlo (p.č. 53/17)“ (č.o. 2910) v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova**

**Ekonomické zhodnocení prací:**

Před zahájením prací byl vypracován plán zabezpečení SDD, včetně rozpočtu prací.

Během provádění prací došlo k drobným změnám v množství u některých položek. Jejich vlivem nedošlo ke zvýšení celkové ceny prací.

Celková cena bez DPH byla v rozpočtu stanovena na maximálně **1 294 401,- Kč.**

Celková cena včetně DPH byla v rozpočtu stanovena na maximálně **1 566 225,21 Kč.**

Podle soupisu prací bylo na akci vyčerpáno celkem bez DPH **1 253 445,- Kč**

Podle soupisu prací bylo na akci vyčerpáno celkem včetně DPH **1 516 668,45 Kč**

Změny se týkaly těchto položek:

| | |
|---|---|
| Položka č. 36 – byly provedeny je 2 kamerové prohlídky | - 40 000,- Kč |
| Položka č. 46b – procentuální | - 956,- Kč |

Celkem: - 40 956,- Kč bez DPH



V Plzni dne 4. 9. 2024

Ing. Karel Bureš
Projektant HČ



**Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.**

| | | |
|---|---|---|
| Objednatel:<br>Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha | Jména:<br><br>Ing. Petr Uldrych | Funkce:<br><br>Vedoucí oddělení |
| Zhotovitel:Společnost „Likvidace SDD-PKÚ+GIS-oblast 1“ | Ing. Karel Bureš | Na základě plné moci |
| Generální dozor objednatele (GDO):<br>GEOtest, a.s. | Ing. Daniel Prečuch | GDO Oblasti č. 1 |
| Subdodavatel: | | |

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD: Zabezpečení SDD „šachtice Staré Sedlo (p.č. 53/17)“ (č.o. 2910) včetně navazujících důlních děl v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, obec Staré Sedlo, okres Sokolov | Kraj: Karlovarský | | |
| Projektant: Ing. Karel Bureš<br>GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.<br>Plzeň | | Zahájení:<br>5. 3. 2024 | Dokončení:<br>31. 8. 2024 |

Smlouva – číslo ze dne: 8. 2. 2024 MZP-OG-16/24/SDD CES: 190 070

Č. j. prováděcí smlouvy ENV/2024/121882

Závěrečné převzetí: 6. 9. 2024

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD (včetně DPH): 1 566 225,21 Kč

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy (vč. DPH): 1 516 668,45 Kč

Prohlídkou zabezpečení SDD bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zajištění. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zajištění nebo likvidace, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:
Nebyly zjištěny

| |
|---|
| Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:<br>Nestanovují se |
| |
| Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel jako součást závěrečné zprávy:<br>15. 11. 2024 |
| |
| Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 6. 9. 2024 |
| |
| Pokyny a doporučení:<br>Nestanovují se |
| |
| Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy. |
| |
| Odběratel prohlašuje, že přejímá zabezpečené SDD dnem 6.9.2024 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.<br><br>Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 6. 9. 2027 |
| |
| Za zhotovitele: Za GDO: Za odběratele:<br>Ing. Karel Bureš Ing. Daniel Prečuch Ing. Petr Uldrych<br>Na základě plné moci |
| Přejímací řízení zahájeno dne: 6. 9. 2024 skončeno dne: 6. 9. 2024 |
| |
| Přílohy: Rozdělovník: Objednatel: 2x<br>Zhotovitel: 2x<br>GDO: 1x |

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ 2024/I

**Objednatel:** MŽP ČR, odbor geologie

**Objekt:** Staré Sedlo - dokončení **Zhotovitel:** GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.

| P.Č. | Kód položky | | MJ | Celkem MJ | Cena MJ | Cena celkem | Cena s podz.sníž. 42,3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **VRN** | **Příprava stavby** | | | | | |
| 1 | 119003131 | Výstražná páska - zřízení (4x50) | m | 200,00 | 36,80 | 7 360 Kč | 3 113 Kč |
| 2 | 119003132 | Výstražná páska - odstranění (4x50) | m | 200,00 | 15,20 | 3 040 Kč | 1 286 Kč |
| 3a | HZS4222 | Výpočet souřadnic a vytyčení vrtů - geodet odborný | hod | 16,00 | 750,00 | 12 000 Kč | 5 076 Kč |
| 3b | HZS4221 | Vytyčení vrtů - geodet | hod | 8,00 | 628 | 5 024 Kč | 2 125 Kč |
| | | **Příprava staveniště** | | | | | |
| 4a | 030001100 | Náklady na provoz, údržbu a vybavení staveniště | % | 2,50 | 2 621 930,0 Kč | 65 548 Kč | 0 Kč |
| 4b | 030001100 | Náklady na provoz, údržbu a vybavení staveniště | % | 2,50 | 1 109 611,0 Kč | 0 Kč | 27 740 Kč |
| 5 | 031203000 | Terénní úpravy pro zař.staveniště a přístup na lokalitu - úprava plochy pro další práce, zpevnění (HZS pomocný staveb.dělník 3x16 hod) | hod | 48,00 | 360,0 Kč | 17 280 Kč | 7 309 Kč |
| 6 | M58343930 | Drcené kamenivo 16/30 (400x0,15 m) = 60 m3 x 1,65 | t | 99,00 | 660,00 Kč | 65 340 Kč | 27 639 Kč |
| | **HSV** | **Technické práce** | | | | | |
| 7 | 225511114 | Vrty maloprofil do 40 stupňů 0-25 m, do 245 mm, kat. II (rozvolněné betonové nadloží s náhlými dutinami včetně manipul.výstroje) 4xchodby 1xjáma=5x19 m | m | 95,00 | 5 310,0 Kč | 504 450 Kč | 213 382 Kč |
| 8 | 283111113 | Zřiz.ocel.mikropilot prům.přes 100 mm def.výstroj pro injekt. 5x16 m | m | 80,00 | 1 540,0 Kč | 123 200 Kč | 52 114 Kč |
| 9 | M14011104 | Trubka ocel.bezešvá hladká 195x6,4 mm | m | 80,00 | 1 710,0 Kč | 136 800 Kč | 57 866 Kč |
| 10 | M58522110 | Cement portlandský CEMI 42,5 MPa (1250 kg/m3) 93 m3 x 1,25 | t | 116,25 | 4 630,0 Kč | 538 238 Kč | 227 674 Kč |
| 11 | 185851121 | Dovoz vody do 1000 m pro směs (600 l/m3) | m3 | 55,80 | 392,0 Kč | 21 874 Kč | 9 253 Kč |
| 12 | 282601122 | Injektování povrchové tlakem do 2 MPa 2 m3/hod sestupné 148,5x0,5 | hod | 75,00 | 2 010,0 Kč | 150 750 Kč | 63 767 Kč |
| 13 | 998231111 | Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných hor.činností (99 t kamenivo, 172 t směs, 1,2 t trubky | t | 272,20 | 2 400,0 Kč | 653 280 Kč | 276 337 Kč |
| 14 | 181311103 | Rozprostření a urovnání zeminy tloušťky do 200 mm 400 m2 | m2 | 400,00 | 225,0 Kč | 90 000 Kč | 38 070 Kč |
| 15 | M10364100 | Zemina pro terénní úpravy - tříděná (400x0,1x1,4) | t | 56,00 | 269,0 Kč | 15 064 Kč | 6 372 Kč |
| | | **Povalová deska** | | | | | |
| 16 | 131251100 | Hloubení nezapaž.zářezů strojně s urovnáním dna hornina tř. I sk. 3: 4,5x4,5x0,8 m | m3 | 16,20 | 605,0 Kč | 9 801 Kč | 4 146 Kč |
| 17 | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce ze štěrkopísku (4x4x0,5) = 8 m3 + 2,13 | m3 | 10,13 | 1 190,0 Kč | 12 055 Kč | 5 099 Kč |
| 18 | 273326231 | Deska z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 (4x4x0,45) | m3 | 7,20 | 5 160,0 Kč | 37 152 Kč | 15 715 Kč |
| 19 | 273361821 | Výztuž desek z betonář.oceli 10505 | t | 0,64 | 55 200,0 Kč | 35 052 Kč | 14 827 Kč |
| 20 | 273356021 | Bednění desek pro plochy rovinné - zřízení (4x4x0,6) | m2 | 9,60 | 511,0 Kč | 4 906 Kč | 2 075 Kč |
| 21 | 273356022 | Bednění desek pro plochy rovinné - odstranění | m2 | 9,60 | 125,0 Kč | 1 200 Kč | 508 Kč |
| 22 | 274351121 | Bednění základ.pasů rovné - zřízení (4x4x0,5+3x4x0,5) | m2 | 14,00 | 401,0 Kč | 5 614 Kč | 2 375 Kč |
| 23 | 274351122 | Bednění základ.pasů rovné - odstranění | m2 | 14,00 | 77,5 Kč | 1 085 Kč | 459 Kč |
| 24 | 274322511 | Pasy z betonu železového se zvýš.nároky na prostředí (4x0,5x0,5x2)+(3x0,5x0,5x2) | m3 | 3,50 | 4 470,0 Kč | 15 645 Kč | 6 618 Kč |
| 25 | 274361821 | Výztuž pasů z betonář.oceli 10505 | t | 0,36 | 55 200,0 Kč | 19 872 Kč | 8 406 Kč |
| 26 | 894812331 | Revizní a čistící šachta TEGRA PPDN 600 šaxhtová roura korugovaná sv.hl. 1000 mm | kus | 1,00 | 2 400,0 Kč | 2 400 Kč | 1 015 Kč |
| 27 | M28661792 | Konus plastový PAD 600 | kus | 1,00 | 2 000,0 Kč | 2 000 Kč | 846 Kč |
| 28 | M56230603 | Šachtový poklop z PU + rám HDPE 600x600x60 | kus | 1,00 | 5 590,0 Kč | 5 590 Kč | 2 365 Kč |
| 29 | M56230613 | Těsnění poklopu neoprenové 600x600 | kus | 1,00 | 372,0 Kč | 372 Kč | 157 Kč |
| 30 | 899121103 | Osazení poklopů plastových | kus | 1,00 | 500,0 Kč | 500 Kč | 212 Kč |
| 31 | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP/Dn 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 1,00 | 138,0 Kč | 138 Kč | 58 Kč |
| 32 | HZS2132 | Zámečník odborný - příprava materiálu na výztuž | hod | 24,00 | 510,0 Kč | 12 240 Kč | 5 178 Kč |
| 33 | HZS1442 | Svářeč kvalifikovaný - příprava materiálu na výztuž | hod | 16,00 | 538,0 Kč | 8 608 Kč | 3 641 Kč |
| 34a | VZOR 1 | Ohrazení ocel.sloupky + 2 linie břeven kolem povalu (4x4) | m | 16,00 | 2 129,0 Kč | 34 064 Kč | |
| 34b | VZOR 1 | Ohrazení ocel.sloupky + 2 linie břeven kolem povalu (4x4) | m | 16,00 | 934,0 Kč | | 14 944 Kč |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 998231111 | Přesun hmot na objektech rekult.úz.postiž.hor.čin. (10,13x1,65)+(10,7x2,3)+1,0+2,0)=44,32 | t | 44,32 | 2 400,0 Kč | 106 368 Kč | 44 994 Kč |
| | | **Ostatní náklady** | | | | | |
| 36 | 043203000 | Kamerové prohlídky vrtů | kus | 2,00 | 20 000,0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč |
| 37 | HZS4222 | Zaměření prací s vyhodnocením geodet odborný | hod | 12,00 | 750,0 Kč | 9 000 Kč | 3 807 Kč |
| 38 | HZS 4221 | Zaměření prací geodet | hod | 8,00 | 628,0 Kč | 5 024 Kč | 2 125 Kč |
| 39 | HZS1291 | Pomocný dělník - odstranění zhlaví vrtů 1 m pod terénem - 2 hod/vrt (11 vrtů) | hod | 22,00 | 360,0 Kč | 7 920 Kč | 3 350 Kč |
| 40 | HZS2132 | Zámečník odborný - odstranění zhlaví vrtů 1 m pod terénem - 1 hod/vrt (11 vrtů) | hod | 11,00 | 510,0 Kč | 5 610 Kč | 2 373 Kč |
| 41 | 181111121 | Závěrečná úprava terénu s urovnáním povrchu souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech do 200 mm | m2 | 400,00 | 46,8 Kč | 18 720 Kč | 7 919 Kč |
| 42 | 043134000 | Zátěžová zkouška - pevnost v prostém tlaku 2xsměs, 1xbeton | kus | 3 | 3 700,0 Kč | 11 100 Kč | 11 100 Kč |
| 43 | 93694221I | Tabulka informační na ohrazení | kus | 1,00 | 500,0 Kč | 500 Kč | 500 Kč |
| 44 | M73534510 | Tabulka bezpečnostní na ohrazení | kus | 3,00 | 39,3 Kč | 118 Kč | 50 Kč |
| 45 | 767995111 | Montáž atyp.zámeč.výrobku - podklad pod tabulku | kg | 3,00 | 159,0 Kč | 477 Kč | 202 Kč |
| 46a | 013254820 | Dokumentace skuteč.provedení stavby, ZZ | % | 2,28 | 2 822 379,0 Kč | 64 350 Kč | 0 |
| 46b | 013254820 | Dokumentace skuteč.provedení stavby, ZZ | % | 2,39 | 1 224 187,0 Kč | 0 Kč | 29 258 Kč |
| | | **CELKEM STAVBA bez DPH** | | | | **2 886 729 Kč** | **1 253 445 Kč** |

Poznámka: Kalkulace nákladů zpracována s využitím ceníku stavebních prací CS ÚRS Praha čú 2024/1, programu KROS a ceníku inženýrských prací UNIKA

Legenda:

Položky neoznačené představují položky z ceníku stavebních prací ÚRS Praha bez modifikace jednotkové ceny (převzatá jednotková cena z ÚRS Praha)

Položky označené olivově zelenou jsou položky obsažené v CS ÚRS Praha představující vedlejší rozpočtové náklady VRN dle ÚRS Praha neoceněné v CS ÚRS Praha, tyto položky byly naceněny cenikem inženýrských prací UNIKA 2013 nebo platnými cenami v místě obvyklé
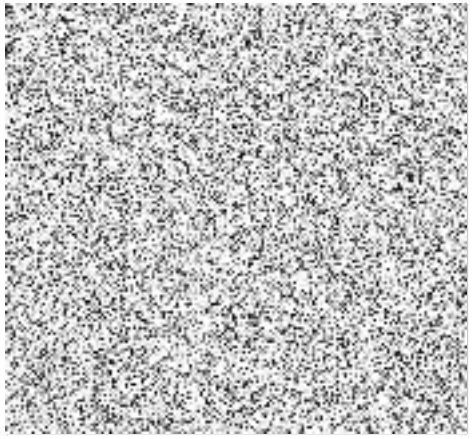
Položky označené červeně jsou položky mimo CS ÚRS Praha neobsažené v CS ÚRS Praha, nebo položky agregované, nebo tzv. R - položky
