Rekonstrukce stanice metra
Varianta 2 - Finální Varianta

ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání
1		**Rekonstrukce stanice metra Českomoravská**	**516 dny**
2		**Projektové práce a autorský dozor**	**516 dny**
3		**Stavební dozor Investora**	**516 dny**
4		**Rekonstrukce vestibulu stanice – opční právo**	341 dny
5		**Zahájení stavby**	**0 dny**
6		**Časové milníky stavby**	**427 dny**
7		**uzavření stanice Českomoravská**	**0 dny**
8		**otevření stanice Českomoravská**	**0 dny**
9		**celkové uzavření stanice**	**341 dny**
10		**stanice v provozu, dokončující stavební úpravy**	**96 dny**
11		**finální dokončení a předání stanice Českomoravská**	**0 dny**
12		**Dočasné zábory stavby**	**427 dny**
13		**Eskalátorový tunel**	**273 dny**
14		**Úroveň stanice**	**341 dny**
15		**Úroveň vestibulu včetně obchodní vybavenosti**	**341 dny**
16		**Úroveň terénu (vyhrazení dopravní stání pro stavbu)**	**427 dny**
17		**předrealizační fáze**	**88 dny**
18		uzavření smlouvy zhotovitel x DPP	0 dny
19		uzavření smlouvy zhotovitel x dodavatel (spékaného vrstveného skla)	0 dny
20		zahájení výroby spékaného vrstveného skla	0 dny
21		**výroba skleněných odpadů**	**420 dny**
22		**výběr zhorovitele**	**90 dny**
23		**výroba skleněných obkladů**	**330 dny**
24		**Úroveň nástupiště, Eskalátorový tunel, Úroveň vestibulu**	**9 dny**
25		Zábor - zařízení staveniště - oplocení kolem vestibulu	3 dny
26	SO 01	Stavební část - ochrana stávajících povrchů stanice, vestibul, ET	8 dny
27	**SO 04**	**Informační systém**	**6 dny**
28	SO 06	Montáž provizorního informačního systému	2 dny
29	SO 06	Demontáž stávajícího informačního systému	2 dny
30	SO 06	Reklamní systém - demontáž	2 dny
31	**SO 01-03**	**STAVEBNÍ ÚPRAVY - STANICE (NÁSTUPIŠTĚ)**	**390 dny**
32	**SO 01-03**	**stavební řešení stanice - demontáž**	**74 dny**
33		Zařízení staveniště - osvětlení - montáž	5 dny
34	SO 02	Osvětlení stanice - demontáž stávajícího osvětlení	14 dny
35	PS 93-1	Slaboproud - demontáž stávajícího slaboproudého vedení	8 dny
36	SO 01-03	Demontáž a uskladnění stáv. Nerez. Svodidel a likvidace ocel. Stojek	10 dny
37	SO 01-03	Demontáž zontů (včetně oblouků) - LK - práce v noční přepravní výluce	35 dny
38	SO 01-03	Demontáž zontů (včetně oblouků) - PK - práce v noční přepravní výluce	35 dny
39	SO 01-03	Demontáž zontů (včetně oblouků) - SST	10 dny
40	SO 01-03	Demontáž částí zontů - trubky - cca 50 % - LK - práce v noční přepravní výluce	20 dny
41	SO 01-03	Demontáž částí zontů - trubky - cca 50 % - PK - práce v noční přepravní výluce	20 dny
42	SO 01-03	Demontáž částí zontů - trubky - cca 50 % - SST	10 dny
43	SO 01-03	Demontáž zontů - žlaby	10 dny
44	SO 01-03	Demontáž a uskladnění poklopů na nástupišti	2 dny
45	SO 01-03	Demontáž a likvidace kameného soklu	20 dny
46	SO 01-03	Demontáž a likvidace keramického obkladu	20 dny
47	SO 01-03	Demontáž a uskladnění lavic a branek na koncích nastupišť	2 dny
48	SO 01-03	Demontáž a uskladnění hydrantových skříní, maskovacího zařízení	2 dny
49	SO 01-03	Vybourání ocelové části místnosti 202	14 dny
50	**SO 01-03**	**Sanace stropu naad UPN střední částí stanice - 1.část**	**75 dny**
51	SO 01-03	Sanace 1/2 betonového stropu - uzavřená část (směrem k ET)	75 dny
52	**SO 01-03**	**Sanace stropu nad UPN střední částí stanice - 2.část**	**95 dny**
53	SO 01-03	Sanace 2/2 betonového stropu - uzavřená část (směrem k MDT)	95 dny
54	**SO 01-03**	**Stavební řešení stanice - nový stav**	**256 dny**
55	SO 01-03	Montáž zontů - nových nosných trubek LK - práce v noční přepravní výluce	40 dny
56	SO 01-03	Montáž zontů - nových nosných trubek PK - práce v noční přepravní výluce	40 dny
57	SO 01-03	Montáž zontů - nových nosných trubek SST - 1.část	15 dny
58		Montáž zontů - nových nosných trubek SST - 2.část	15 dny
59	SO 01-03	Montáž zonty - žlaby	30 dny
60	SO 01-03	Montáž zontů (včetně oblouků) - LK - práce v noční přepravní výluce	45 dny
61	SO 01-03	Montáž zontů (včetně oblouků) - PK - práce v noční přepravní výluce	45 dny
62	SO 01-03	Montáž zontů (včetně oblouků) - SST	70 dny
63	SO 01-03	Montáž nerez. Svodidel a ocel. Stojek	10 dny
64	SO 01-03	Chemické čistění dlažby	25 dny
65	SO 01-03	Oprava poškozuené dlažby	15 dny
66	SO 01-03	Repase a montáž hydrantových skříní	4 dny
67	SO 01-03	Nové smaltové obklady včetně nosného rastru	20 dny
68	SO 01-03	Motnáž žulového soklu	20 dny
69	SO 01-03	Repase a montáž lavic	4 dny
70	SO 01-03	Úprava nové hrany nástupišť	20 dny

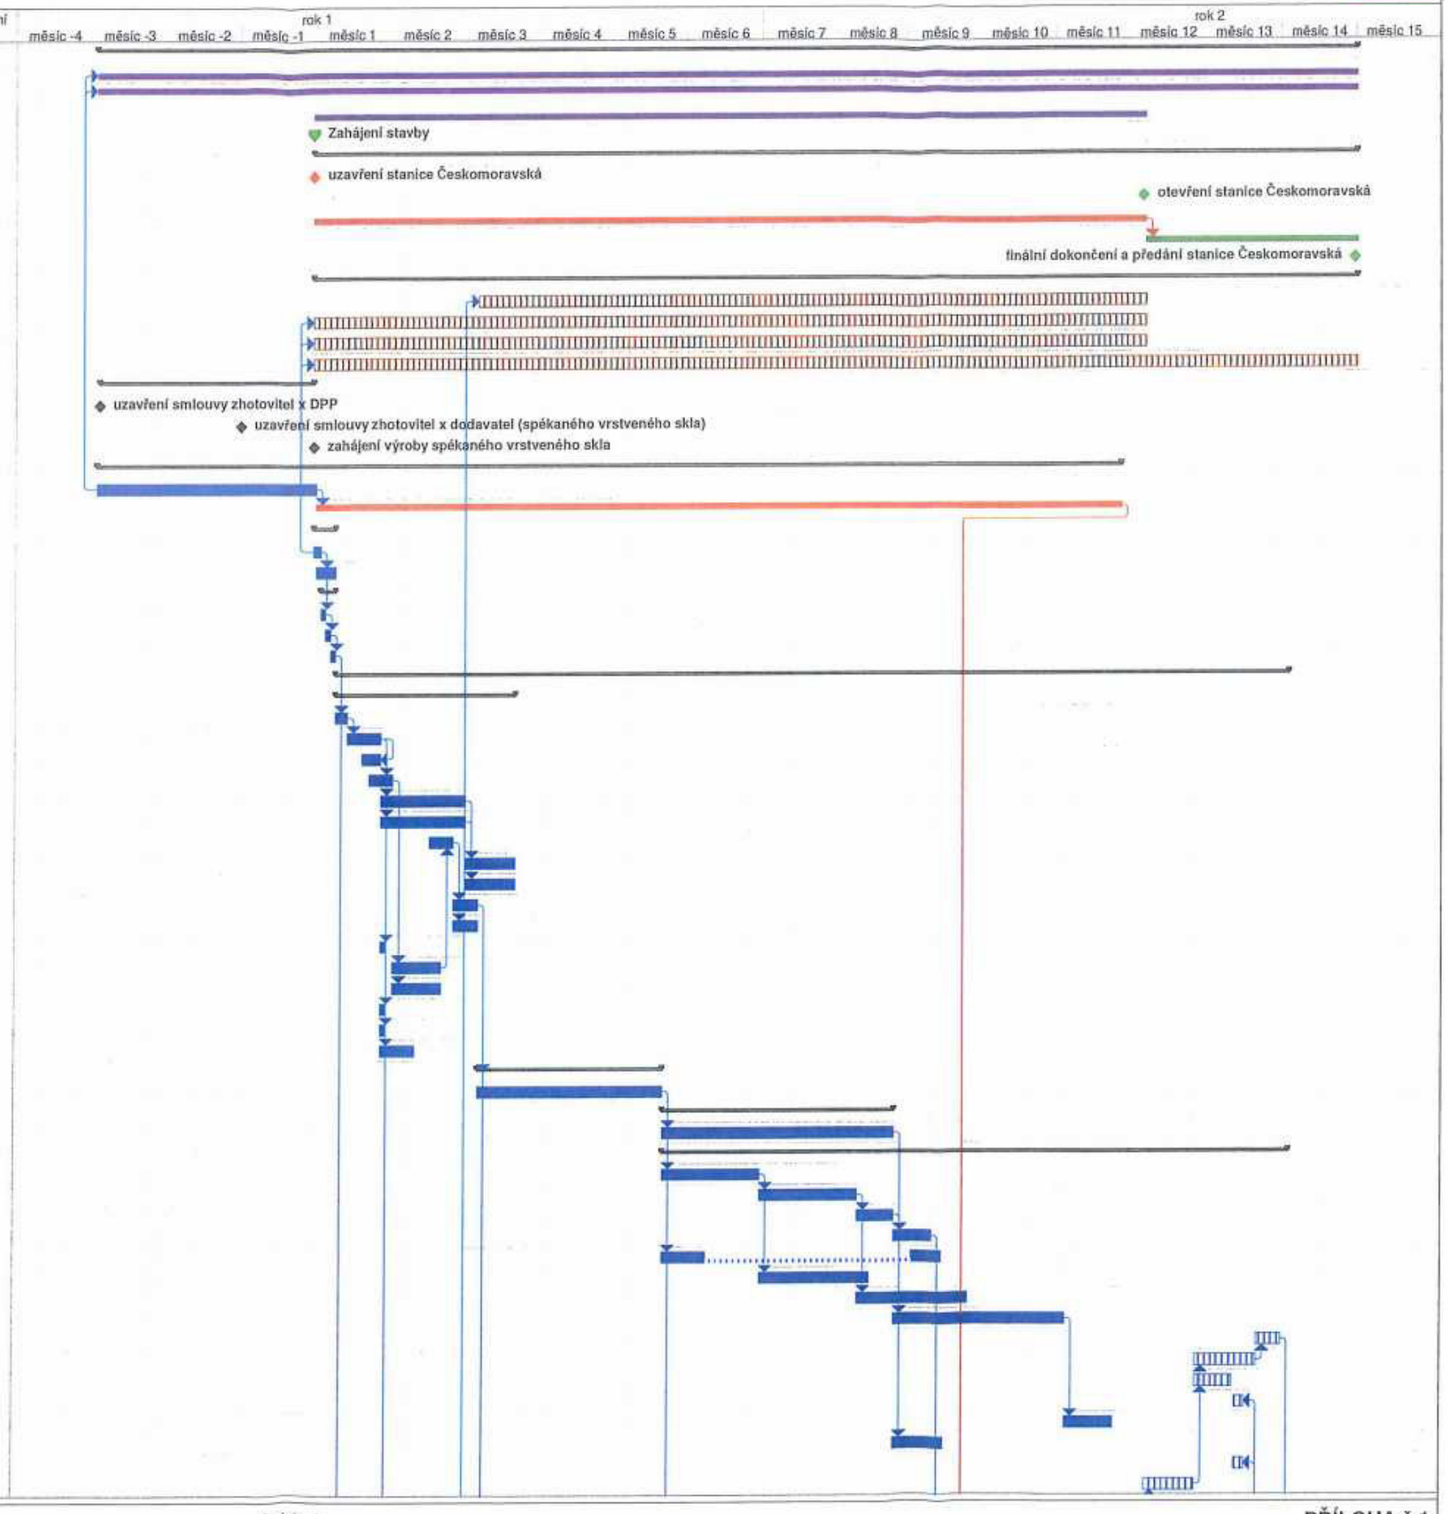

Rekonstrukce stanice metra
Varianta 2 - Finální Varianta

ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání
71	SO 01-03	Repase branek	4 dny
72	SO 01-03	Montáž skleněného obkladu včetně nosného rastru (LK, PK) - práce v noční výluce metra	70 dny
73	SO 01-03	Montáž akustického obkladu v úrovni koleji (LK,PK) - práce v noční výluce metra	30 dny
74	SO 01-03	Repase a montáž poklopů na nástupišti	5 dny
75	SO 01-03	Očista a omyvatelný nátěr kolejiště (LK,PK) - práce v noční výluce metra	40 dny
76	PS 93-1	Slaboproud - montáž slaboproudého vedení	120 dny
77	SO 02	Osvětlení stanice - montáž nového osvětlení	45 dny
78		Zařízení staveniště - osvětlení - demontáž	3 dny
79		**Sanace tybinek PK,LK - práce v noční výluce metra**	**240 dny**
80	SO 01-03	Sanace, čištění, přetěsnění tybinků LK - směr Palmovka	120 dny
81	SO 01-03	Sanace, čištění, přetěsnění tybinků LK - směr Vysočanská	120 dny
82	SO 01-03	Sanace, čištění, přetěsnění tybinků PK - směr Palmovka	120 dny
83	SO 01-03	Sanace, čištění, přetěsnění tybinků PK - směr Vysočanská	120 dny
84	**SO 01-01**	**STAVEBNÍ ÚPRAVY - VESTIBUL**	**339 dny**
85	**SO 01-01**	**Stavební řešení vestibul - demontáž**	**269 dny**
86	SO 02	Osvětlení stanice - demontáž stávajícího osvětlení	4 dny
87	PS 93-1	Slaboproud - demontáž stávajícího slaboproudého vedení	7 dny
88		Zařízení staveniště - osvětlení - montáž	2 dny
89	SO 01-01	Demontáž a likvidace vnitřní prosklené stěny OV	8 dny
90	SO 01-01	Demontáž zábradlí, repase a uložení	3 dny
91	SO 01-01	Demontáž, repase sloupků, demontáž odbavovací čáry	1 den
92	SO 01-01	demontáž a likvidace hydrantové skříně a nerez dvířek	2 dny
93	SO 01-01	Vybourání částí dlažby	7 dny
94	SO 01-01	Bourací práce zděných kce	14 dny
95	SO 01-01	Bourací práce keramických obkladů	5 dny
96	SO 01-01	Bourání VZT šachet a kojí telefonů	9 dny
97	SO 01-01	Demontáž a likvidace stěny PM včetně dvěří	7 dny
98	SO 01-01	Demontáž zdvojené podlahy	5 dny
99		**Milník pro Developera - stavební činnost**	**0 dny**
100	**SO 01-01**	**Stavební řešení Vestibul - nový stav**	**70 dny**
101		**Nová výstavba PM**	**60 dny**
102	SO 01-01	Nová výstavba stěny tl. 200 mm - z porobetonu	21 dny
103	SO 01-01	Nová výstavba stěny tl. 250 mm - z porobetonu	21 dny
104	SO 01-01	Nová výstavba vláknocementové příčky	10 dny
105	SO 01-01	Montáž keramické podlahy + 100 mm soklu	14 dny
106	SO 01-01	Montáž žulové dlažby + 100 soklu	14 dny
107	SO 01-01	Montáž žulového soklu + protipožární obložení sloupů	10 dny
108	SO 01-01	Montáž zdvojené podlahy	10 dny
109	SO 01-01	Montáž prosklené stěny PM včetně dveří a VZT mřížek	20 dny
110	SO 02	Osvětlení PM - montáž nového osvětlení	14 dny
111	PS 93-1	Slaboproud - montáž stávajícího slaboproudého vedení	10 dny
112	PS 91-1	Silové rozvody - nový stav	14 dny
113		dokončovací práce + práce PSV	12 dny
114		**Vestibul - veřejná část**	**70 dny**
115	SO 01-01	Montáž kameného obkladu prodloženého soklu	15 dny
116	SO 01-01	Montáž skleněných panelů	20 dny
117	SO 01-01	Montáž skleněných panelů nerez povrch	20 dny
118	SO 01-01	Odborné restaurování uměleckého díla	25 dny
119	SO 01-01	Montáž kotvení odbavovací čáry a sloupků	5 dny
120	SO 01-01	Montáž protipožární obložení sloupů	12 dny
121	SO 01-01	Montáž žulové dlažby včetně dilatačních lišt	14 dny
122	SO 01-01	montáž stojanů por IS a reklamy	5 dny
123	SO 01-01	Montáž svodidel	4 dny
124	SO 01-01	Montáž nového zábradlí	4 dny
125	SO 02	Osvětlení - montáž nového osvětlení	14 dny
126	PS 93-1	Slaboproud - montáž stávajícího slaboproudého vedení	14 dny
127		dokončovací práce - podhledy a apod.	7 dny
128	**SO 01-02**	**STAVEBNÍ ÚPRAVY - ET**	**256 dny**
129	**SO 01-02**	**Stavební část - ET demontáž**	**62 dny**
130	SO 01-02	Demontáž obkladů - esk. tunel	10 dny
131	SO 01-02	Demontáž podhledových lamel - ÚV	6 dny
132		montáž lešení	14 dny
133	PS 94-1	Strojní zařízení - kompletní demontáž esk. Ev. Č. 613-1-316, 317,318	35 dny
134	SO 02	Elektroinstalace, osvětlení - demontáž	7 dny
135	PS 93-1	Slaboproudá zařízení - demontáž	7 dny
136		Zařízení staveniště - osvětlení - montáž	7 dny
137	**SO 01-02**	**Stavební část - ET - montáž**	**212 dny**
138	SO 01-02	Vybourání úložných boků v esk. tunelu	14 dny
139	SO 01-02	Vybourání původních esk. základů	7 dny
140	SO 01-02	Demontáž zontů	10 dny

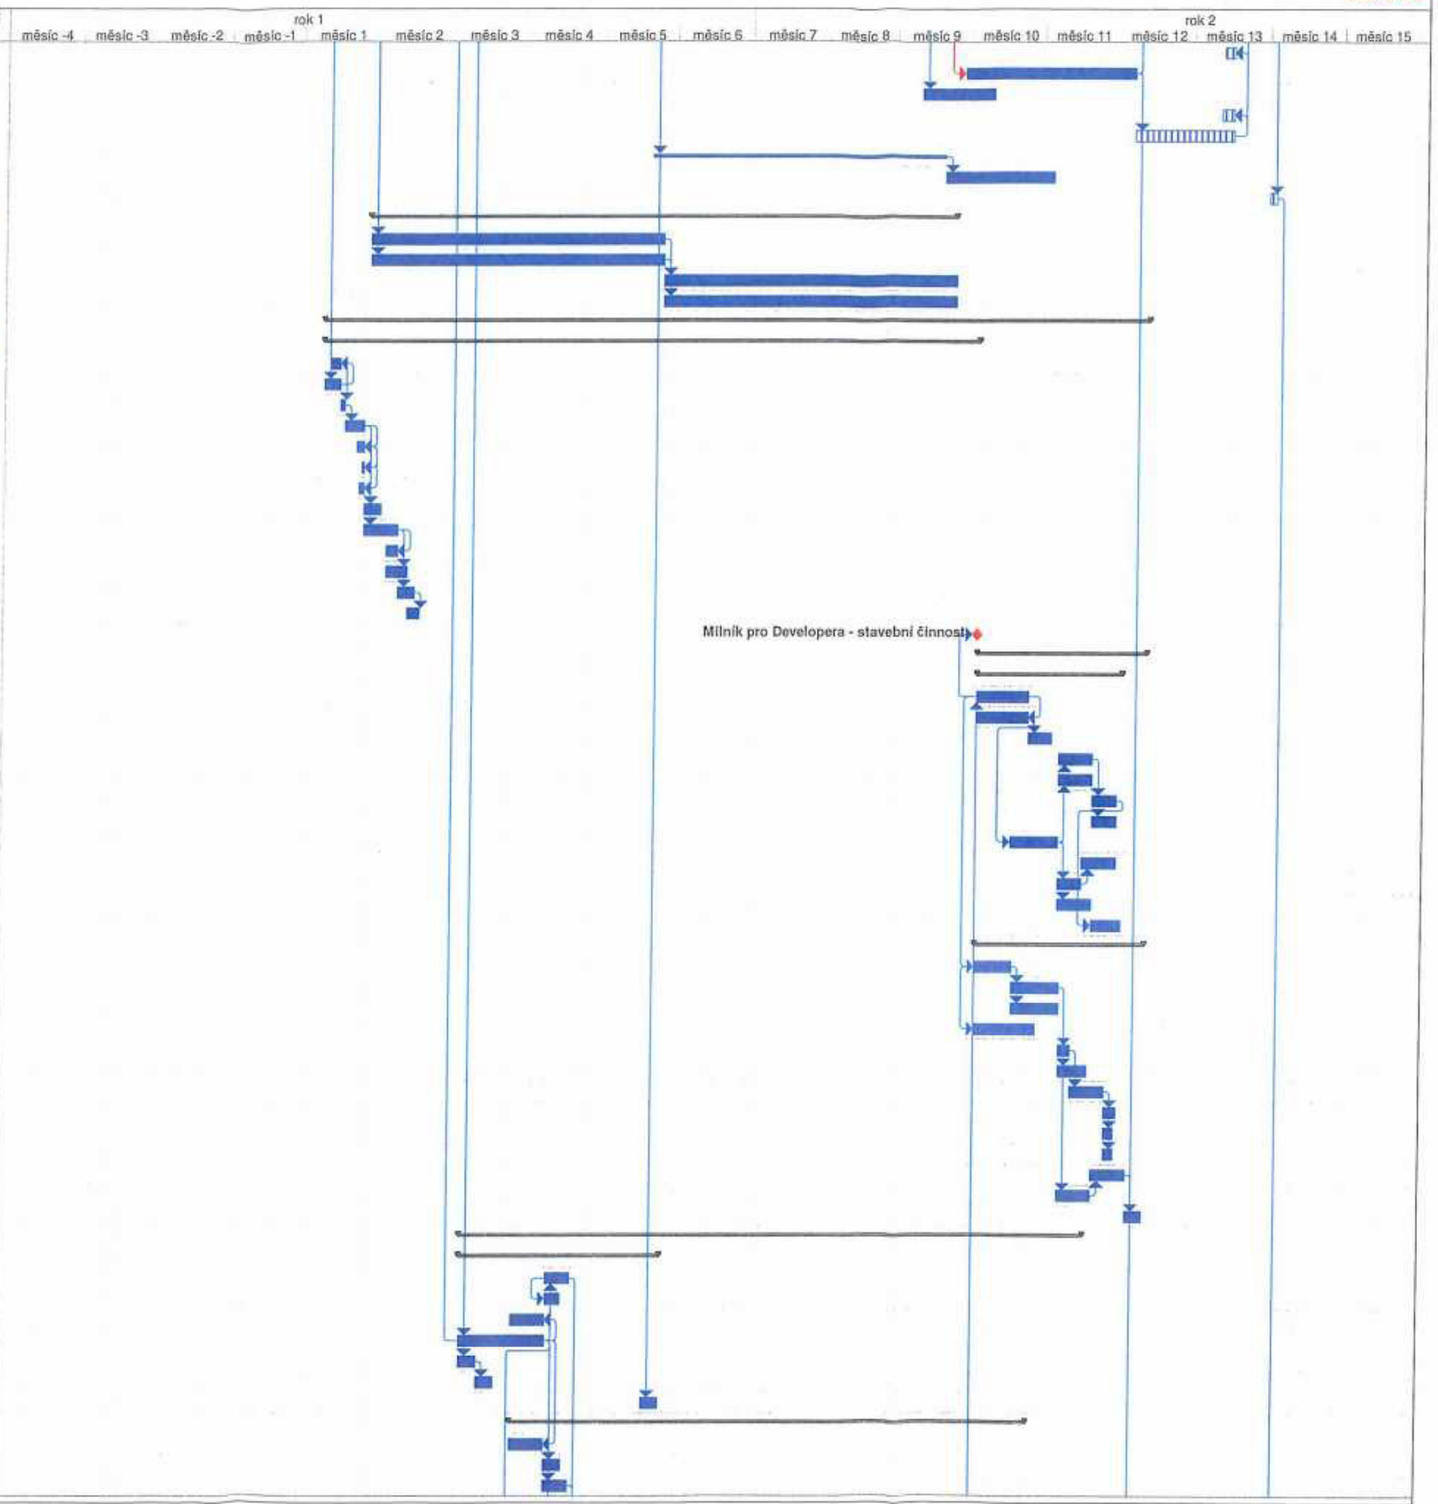

Rekonstrukce stanice metra
Varianta 2 - Finální Varianta
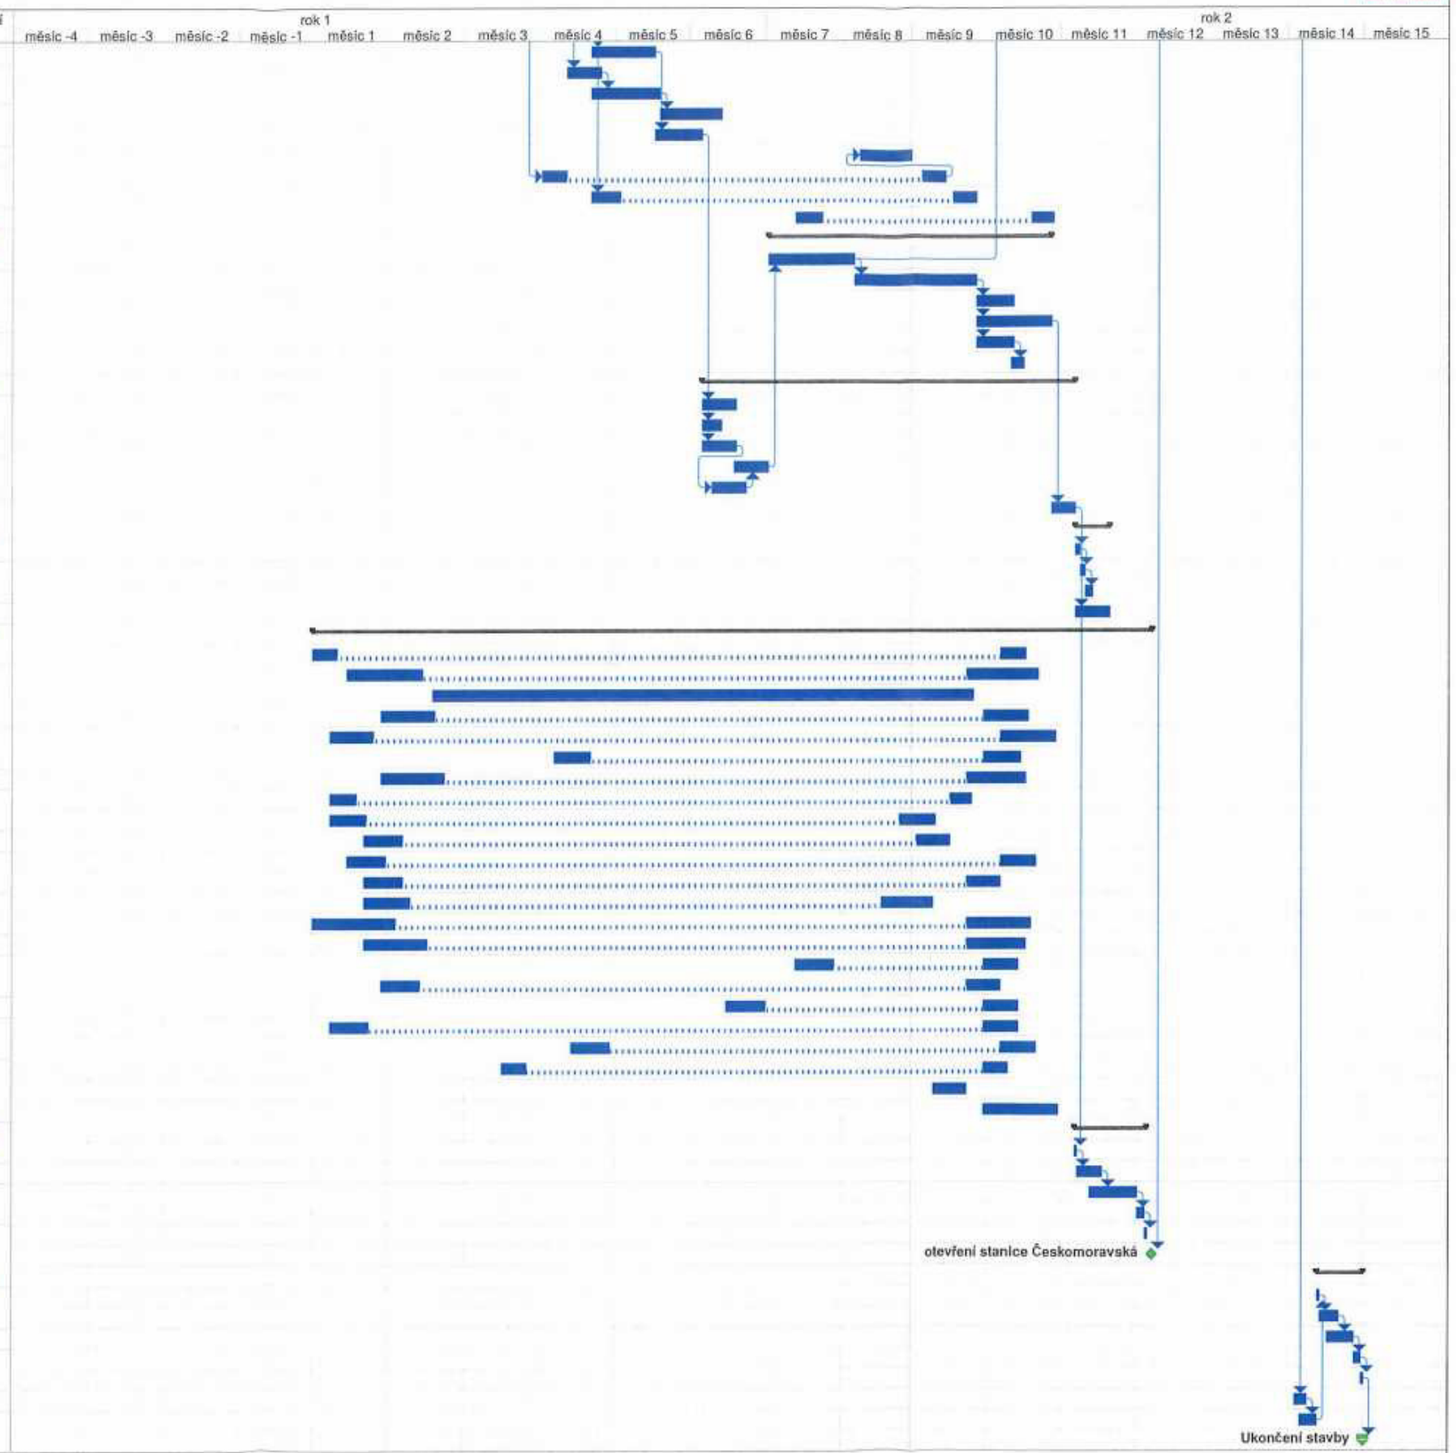
ID	SO, PS	Název úkolu	Doba trvání
141	SO 01-02	Sanace tybinek	26 dny
142	SO 01-02	Stávající konstrukce - sanace	14 dny
143	SO 01-02	Nosné konstrukce	28 dny
144	SO 01-02	Stavební připravenost pro montáž nových eskalátorů	25 dny
145	SO 01-02	Zpětná montáž zontů	19 dny
146	SO 01-02	Lokální výměna dlažby	21 dny
147	PS 91-1	Silové rozvody	20 dny
148	PS 95	VZT	22 dny
149	SO 03	ZTI	20 dny
150	**PS 94-1**	**Strojní zařízení - eskalátory ev. Č. 316, 317, 318**	**115 dny**
151	PS 94-1	hrubá montáž: transport na místo, spojení, vyrovnání	35 dny
152	PS 94-1	Montážní práce: spoje drah, řetězů, madlové cesty, oplechování	50 dny
153		Rozjíždění + odstraňování VaN	15 dny
154	SO 01-02	Elektroinstalace, osvětlení - montáž	30 dny
155	PS 93-1	Slaboproudá zařízení - montáž	15 dny
156		Zařízení staveniště - osvětlení - demontáž	5 dny
157	**SO 01-02**	**Stavební část - nový stav**	**152 dny**
158	SO 01-02	Montáž obkladů - esk. tunel	14 dny
159	SO 01-02	Montáž podhledových lamel - ÚV	8 dny
160	SO 04	ASDŘ-O	14 dny
161	PS 96-3	ASDŘ-T	14 dny
162	PS 93-2	EPS	14 dny
163	PS 97-2	Tlakové těsnění	10 dny
164	**SO 06**	**Informační systém - vestibul**	**14 dny**
165	SO 06	Montáž definitivního informačního systému	2 dny
166	SO 06	Demontáž provizorního informačního systému	2 dny
167	SO 06	Reklamní systém - montáž	3 dny
168	SO 01	Stavební část - dokončovací práce	14 dny
169		**STAVEBNÍ ÚPRAVY - NEVEŘEJNÉ PROSTORY (MDT, OV, UPN apod.)**	**341 dny**
170		Ochrana stávajících technologických zařízení	20 dny
171	SO 04	Stavební část - práce HSV + PSV	60 dny
172	SO 04	Očista tubinek, sanace hran betonových tubinků, přečištění	220 dny
173	SO 02	Osvětlení stanice	40 dny
174	SO 03	Zdravotně technické instalace	40 dny
175	SO 04	ASDŘ - O	30 dny
176	SO 05	Vytápění	50 dny
177	PS82	DOS+OSM	20 dny
178	PS91-1	Silové rozvody	30 dny
179	PS91-13	Úprava trakčních zařízení	30 dny
180	PS91-80	MDT	30 dny
181	PS92	Zabezpečovací zařízení	30 dny
182	PS93-1	Slaboproudé zařízení	40 dny
183	PS93-2	EPS	60 dny
184	PS94-1	Strojní zařízení	50 dny
185	PS94-1-1	Technologická část	30 dny
186	PS94-1-2	Elektro část	30 dny
187	PS94-2	Čerpací stanice	30 dny
188	PS95	VZT	30 dny
189	PS96-2	ASDŘ-E	30 dny
190	PS96-3	ASDŘ-T	20 dny
191	PS97-1	Tlakové těsnění	14 dny
192	PS97-2	Požární těsnění	30 dny
193		**Schvalování, přejímky, eskalátor**	**29 dny**
194		Předání výchozích revizí	1 den
195		Komplexní vyzkoušení	10 dny
196		Vydání průkazu způsobilosti	19 dny
197		Schvalovací řízení	3 dny
198		Přejímací řízení	1 den
199		**otevření stanice Českomoravská**	**0 dny**
200		**Schvalování, přejímky**	**19 dny**
201		Předání výchozích revizí	1 den
202		Komplexní vyzkoušení	8 dny
203		Vydání průkazu způsobilosti	11 dny
204		Schvalovací řízení	3 dny
205		Přejímací řízení	1 den
206		Zábor - zařízení staveniště - likvidace	5 dny
207		Úklid po stavbě	7 dny
208		**Ukončení stavby**	**0 dny**
