Datum skutečného zahájení projektu / podpis PD: 10.3.2016 / 8.3.2016
Dokončení realizace dle PD: únor 2018

22799 Obnova karuselů K11, K12, K13, Terminál 1 přílety; zadávací harmonogram pro postupnou montáž

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
0	**22799 Obnova karuselů K11, K12, K13, Terminál 1 přílety; zadávací harmonogram pro postupnou montáž**	**288 d**	**2.8. 17**	**7.9. 18**	
1	**1 Realizační projektová dokumentace vč. schválení**	9 t	2.8. 17	3.10. 17	
2	**2 Stavební příprava v 1PP**	**266 d**	**2.8. 17**	**8.8. 18**	
3	2.1 Realizace stavebních úprav, příprava montáží BHS	13 t	2.8. 17	31.10. 17	1SS
4	2.2 Dokončovací stavební práce	3 t	19.7. 18	8.8. 18	14FF+5 d
5	**3 Karusel K13**	**115 d**	**4.10. 17**	**13.3. 18**	
6	3.1 Výroba karuselů, dopravníků a komponent BHS; příprava montáže = externí činnost	20 t	4.10. 17	20.2. 18	1
7	3.2 Demontáž stávajícího karuselu, vykládací linky, zábory staveniště	2 t	3.1. 18	16.1. 18	6FF-5 t
8	3.3 Montáž karuselu na LP a vykládací linky, zkoušky, přejímka díla, demontáž záborů	8 t	17.1. 18	13.3. 18	7
9	**4 Karusel K12**	**45 d**	**27.3. 18**	**28.5. 18**	
10	4.1 Demontáž stávajícího karuselu, zábor staveniště	1 t	27.3. 18	2.4. 18	8FS+9 d
11	4.2 Montáž karuselu na LP, zkoušky, přejímka díla, demontáž záboru	8 t	3.4. 18	28.5. 18	10
12	**5 Karusel K11**	**45 d**	**31.5. 18**	**1.8. 18**	
13	5.1 Demontáž stávajícího karuselu, zábor staveniště	1 t	31.5. 18	6.6. 18	11FS+2 d
14	5.2 Montáž karuselu na LP, zkoušky, přejímka díla, demontáž záboru	8 t	7.6. 18	1.8. 18	13
15	**6 Propojení karusel K11 a K12**	**25 d**	**6.8. 18**	**7.9. 18**	
16	6.1 Demontáž části stávajících karuselů, zábor staveniště	1 t	6.8. 18	10.8. 18	14FS+2 d
17	6.2 Montáž propojení karuselů na LP, zkoušky, přejímka díla, demontáž záboru	4 t	13.8. 18	7.9. 18	16

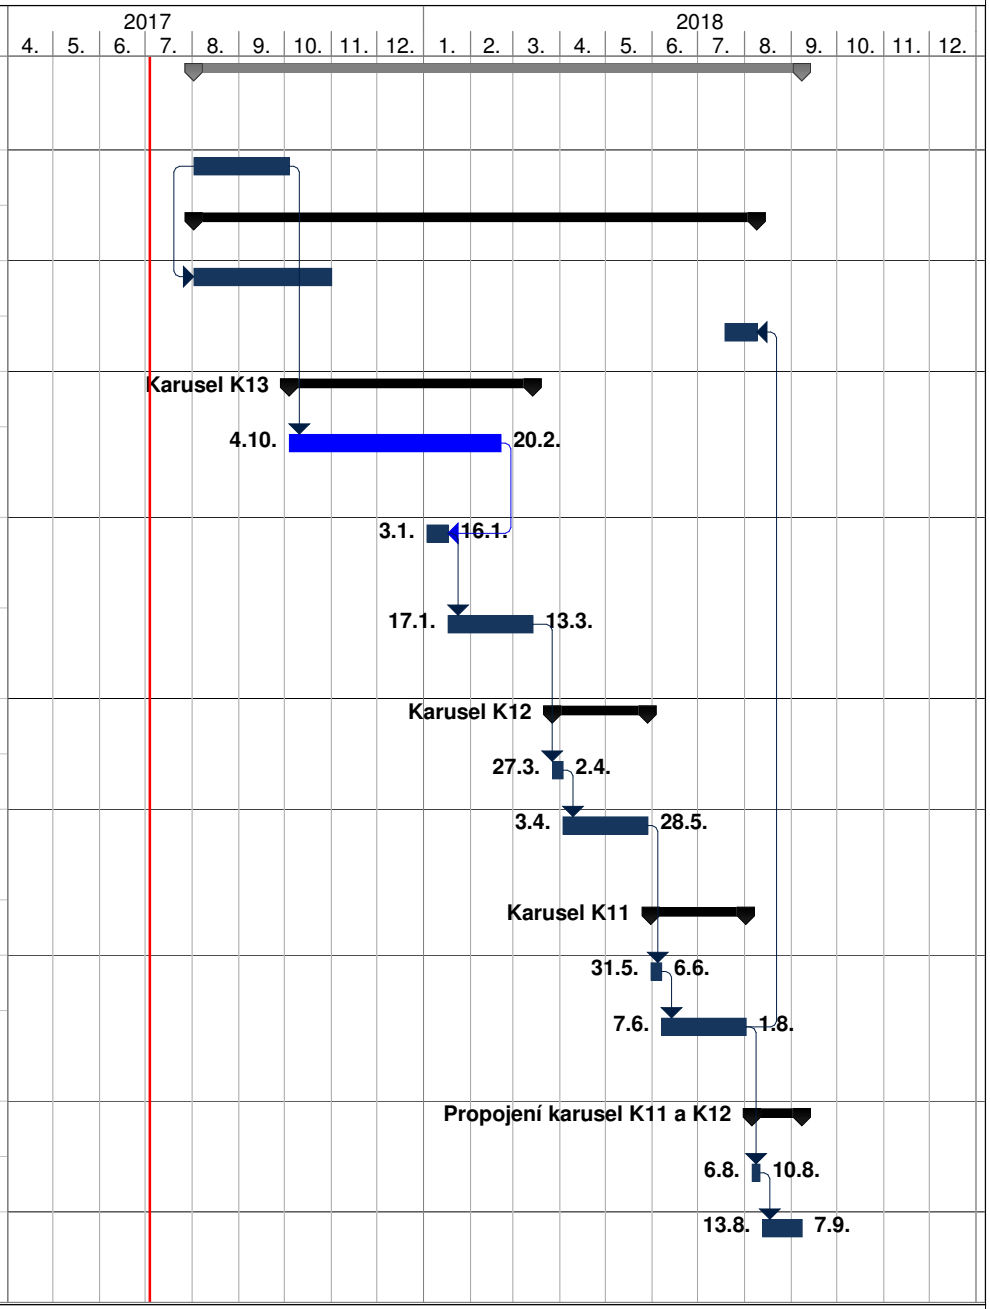

Název projektu: 22799 Obnova karuselů K11, K12, K13, Terminál 1 přílety; zadávací harmonogram pro postupnou montáž, Autor harmonogramu: [redacted]
Datum: 4.7. 17, Čas tisku: 12:38
Název souboru: 20170704_Přílety_K11-12-13_zadávací.mpp
