Příloha č. 10:
Harmonogram

Rekonstrukce LD Petřín - orientační harmonogram

Předpokládaná celková doba výstavby je ~50 týdnů (cca 350 dní)
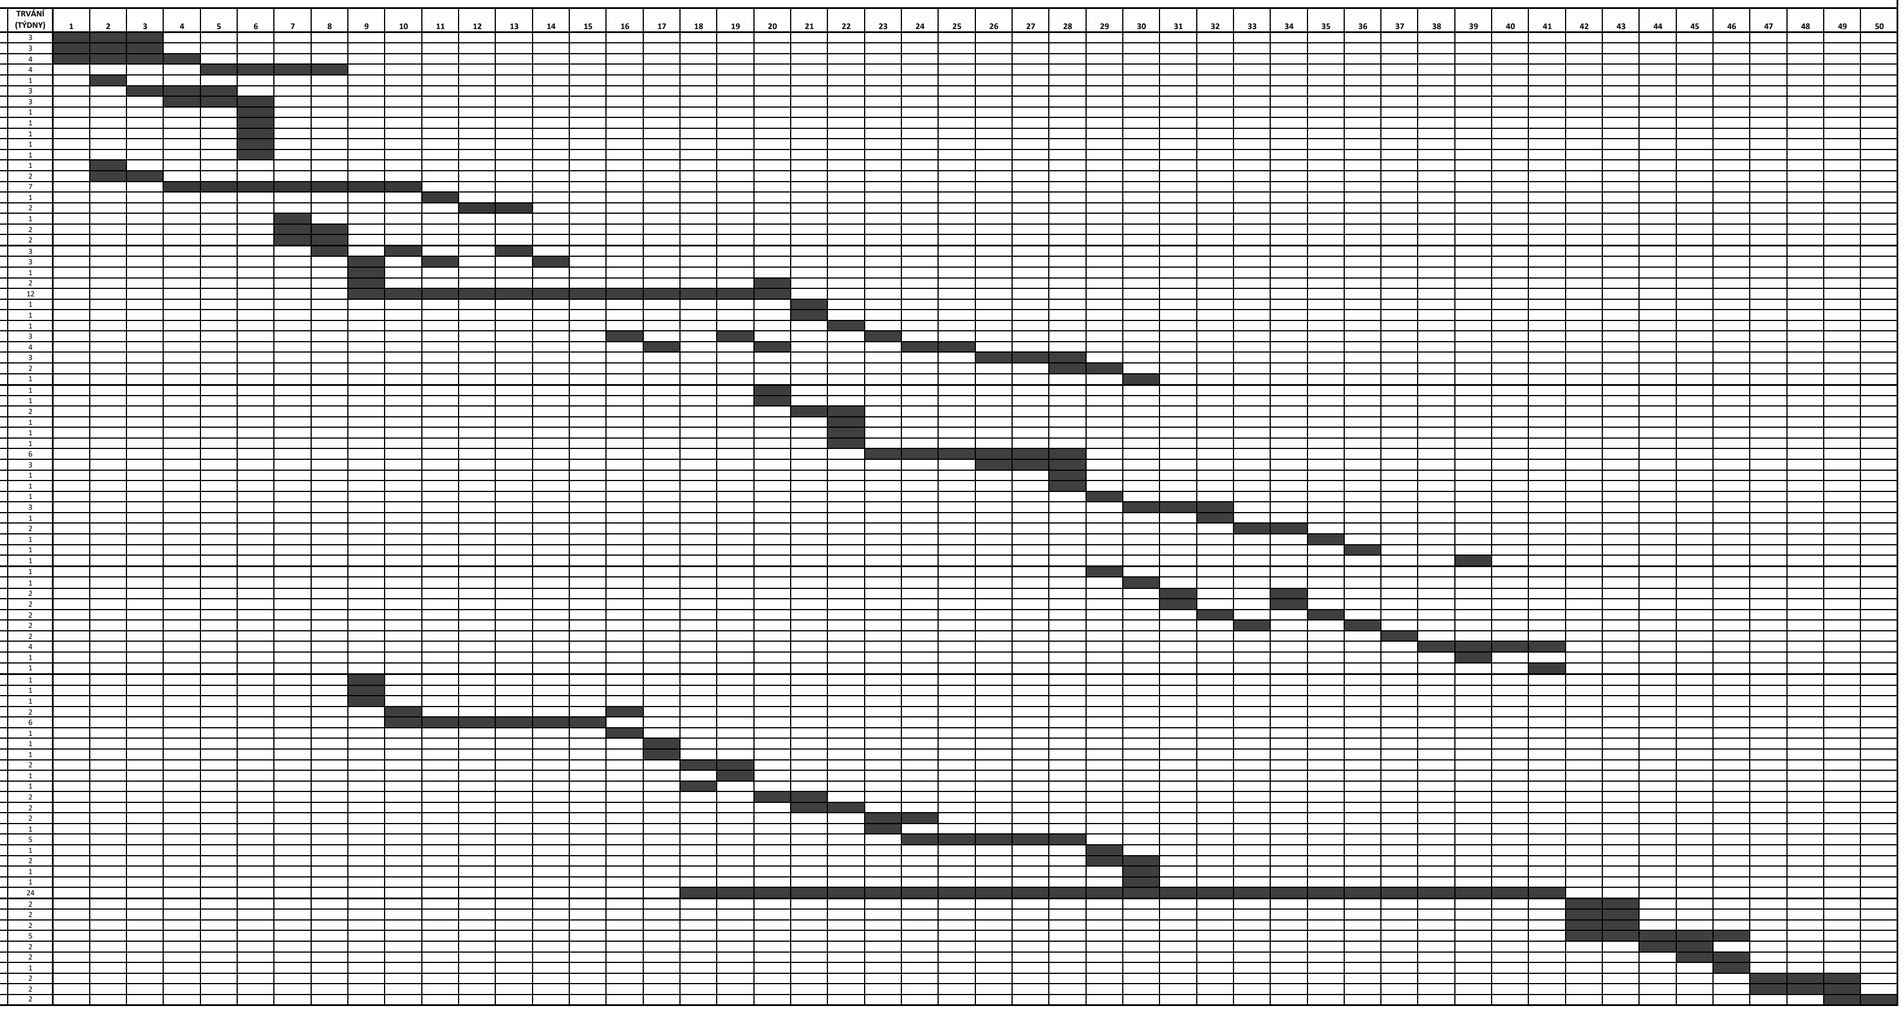
FÁZE	SO	POLOŽKA	TRVÁNÍ (TÝDNY)
PŘÍPRAVNÁ FÁZE	příprava	Přípravné práce, přístupy na cizí pozemky, pasportizace okolí před zahájením stavby, apod.	3
	příprava	Osazení geodetických bodů na sledované objekty, provedení měření 0. etapy	3
	příprava	Vypracování VTD a RDS 1. část	4
	příprava	Vypracování VTD a RDS 2. část	4
	příprava	Vytyčení + vyznačení tras inženýrských sítí	1
	SO 400	Stávající sítě - přeložky potřebných sítí, odpojení ostatních sítí	3
	příprava + SO 801	Zajištění a zabezpečení příjezdových tras pro techniku (např. úprava dřevin, zpevnění cest apod.)	3
	příprava	Vytvoření zařízení staveniště Č. 1 (včetně odstranění potřebné části stávajícího oplocení LD)	1
	příprava	Vytvoření zařízení staveniště Č. 2 (včetně odstranění potřebné části stávajícího oplocení LD)	1
	příprava	Vytvoření mezideponie v oblasti pod klenbovými mostky (včetně odstranění potřebné části stávajícího oplocení LD)	1
	příprava	Vytvoření mezideponie v oblasti horního mostu nad LD (včetně odstranění potřebné části stávajícího oplocení LD)	1
	příprava	Vytvoření mezideponie v oblasti opěry 9 u horní části mostu na Nebozízku	2
	SO 001	Demontáž tažného lana, kladek, kolejnic a schodiště v části výhybny, kde bude betonován zkušební blok	1
	SO 001	Vybourání části desky pro zkušební blok, provedení potřebného výkopu	2
	SO 662	Betonáž zkušebního bloku + zrání betonu	7
	SO 662	provedení potřebných zkoušek na zkušebním bloku	1
	SO 662	Vybourání a odvoz zkušebního bloku	2
	SO 001	Demontáž stožárů veřejného osvětlení v dráze	1
	SO 001	Demontáž vodicích kladek pro lana včetně jejich upevnění v celé dráze	2
	SO 001	Demontáž kolejnic a jejich odstranění z celé trasy dráhy	2
1. FÁZE - ÚSEK VÝHYBNY - cca km 0.17 - 0.28	SO 001	Odstranění obslužného schodiště v dané části	3
	SO 001	Rozřezání betonové desky po částech v daném úseku	3
	SO 001	Zhotovení pracovních plošin pro vrtnou pilotovou soupravu	1
	SO 001	Odvoz nepotřebných částí betonové desky	2
	SO 600	Zhotovení pilotových stěn 2, 3, 4 včetně jejich ukotvení trvalými kotvami	12
	SO 600	Odstranění pracovních plošin pro vrtnou pilotovou spouravu	1
	SO 301	Provedení výkopů pro výměnu potrubí odvodnění včetně dočasného přeložení potrubí	1
	SO 301	Výměna potrubí včetně řádného zasypání výkopu	1
	SO 600	Úprava podkladních vrstev dle geologického vyhodnocení do fáze přípravy povrchu pro vybetonování podkladní betonové vrstvy	3
	SO 662	Betonáž podkladní vrstvy	4
	SO 662	Příprava bednění, osazení/betonáž obrub, osazení chrániček, armatura	3
	SO 662	Betonáž nové desky LD v daném úseku	2
	SO 301	Kompletace systému odvodnění (osazení vpustí, odvodňovací žlab č. 3)	1
2. FÁZE - ÚSEK KLENBOVÉ MOSTY - cca km 0.11 - 0.17	SO 001	Odstranění obslužného schodiště v dané části	1
	SO 001	Odstranění zábradlí v oblasti mostků	1
	SO 001	Rozřezání betonové desky po částech v daném úseku	2
	SO 201	Obnažení rubu klenbových mostků	1
	SO 001	Zhotovení pracovní plošiny pro vrtnou pilotovou soupravu	1
	SO 001	Odvoz nepotřebných částí betonové desky a materiálu za rubem kleneb	1
	SO 600	Zhotovení pilotové stěny 1 včetně jejího ukotvení trvalými kotvami	6
	SO 201	Rekonstrukce klenbových mostků až do fáze přípravy povrchu pro vybetonování podkladní betonové vrstvy	3
	SO 600	Odstranění pracovní plošiny pro vrtnou pilotovou soupravu	1
	SO 301	Provedení výkopů pro výměnu odvodnění od odvodňovacího žlabu č. 2	1
	SO 301	Výměna potrubí včetně řádného zasypání výkopu	1
	SO 600	Úprava podkladních vrstev dle geologického vyhodnocení do fáze přípravy povrchu pro vybetonování podkladní betonové vrstvy	3
	SO 662	Betonáž podkladní vrstvy	1
	SO 662	Příprava bednění, osazení/betonáž obrub, osazení chrániček, armatura	2
	SO 662	Betonáž nové desky LD v daném úseku	1
	SO 301	Kompletace systému odvodnění (osazení vpustí, odvodňovací žlab č. 2)	1
	SO 701	Osazení nového zábradlí v oblasti klenbových mostků do zralého betonu	1
3. FÁZE - DOLNÍ ÚSEK - cca km 0.02 - 0.11	SO 001	Odstranění obslužného schodiště v dané části	1
	SO 202	Zhotovení provizorního rozepření zárubních zdí	1
	SO 001	Rozřezání betonové desky po částech v daném úseku	2
	SO 001	Odvoz části betonové desky	2
	SO 600	Úprava podkladních vrstev dle geologického vyhodnocení do fáze přípravy povrchu pro vybetonování podkladní betonové vrstvy	2
	SO 662	Betonáž podkladní vrstvy	2
	SO 662	Příprava bednění, osazení/betonáž obrub, osazení chrániček, armatura	2
	SO 662	Betonáž nové desky LD v daném úseku	4
	SO 201	Odstranění provizorního rozepření zárubních zdí	1
	SO 202	Rekonstrukce lice zárubních zdí	1
4. FÁZE - HORNÍ ÚSEK - cca km 0.37 - 0.49 + most na Nebozízku	SO 001	Odstranění obslužného schodiště v dolní části úseku a odstranění zábradlí	1
	SO 001	Rozřezání betonové desky po částech v dolní části daného úseku	1
	SO 001	Zhotovení pracovní plošiny pro vrtnou mikropilotovou soupravu	1
	SO 001	Odvoz části betonové desky	2
	SO 600	Zhotovení mikropilotové stěny včetně jejícho ukotvení (vč. dopravy soupravy)	6
	SO 600	Odvoz vrtné soupravy a odstranění pracovní plošiny pro vrtnou pilotovou spouravu	1
	SO 202	Zhotovení provizorního rozepření zárubních zdí	1
	SO 301	Provedení výkopu pro výměnu odvodnění od odvodňovacího žlabu Č. 4	1
	SO 001	Rozřezání betonové desky po částech mezi zárubními zdmi	2
	SO 001	Odvoz části betonové desky	1
	SO 301	Výměna potrubí včetně řádného zasypání výkopu	1
	SO 600	Úprava podkladních vrstev dle geologického vyhodnocení do fáze přípravy povrchu pro vybetonování podkladní betonové vrstvy	2
	SO 662	Betonáž podkladní vrstvy	2
	SO 662	Příprava bednění, osazení/betonáž obrub, osazení chrániček, chrániček, armatura	2
	SO 202	Oprava opěrných zdí nad mostem Nebozízek+C74	1
	SO 662	Betonáž nové desky LD v daném úseku	5
	SO 201	Odstranění provizorního rozepření zárubních zdí	1
	SO 202	Rekonstrukce lice zárubních zdí	2
	SO 701	Osazení nového zábradlí v oblasti nad mostem Nebozízek	1
	SO 301	Kompletace systému odvodnění (osazení vpustí, odvodňovací žlab č. 4)	1
	SO 203	Rekonstrukce mostu Nebozízek	24
5. FÁZE - CELÁ DRÁHA	SO řady 400	Inženýrské sítě do chrániček	2
	SO 403	Montáž stožárů osvětlení včetně zapojení	2
	SO 701	Demontáž a osazení nového oplocení podél celé levé strany LD po částech	2
	SO 661	Osazení nového kolejového svršku vč. vodicích kladek a ostatních technologických zařízení	5
	SO 701	Osazení nového obslužného schodiště v celé dráze	2
	SO 701	Demontáž a osazení nového oplocení podél celé pravé strany LD po částech	2
	SO 801	Úprava terénu podél LD uvnitř oploceného areálu	1
	dokončení	Odstranění zařízení staveniště a mezideponií	2
	SO 801	Úprava terénu a sadové úpravy vně LD, odstranění zpevnění cest apod.	2
	dokončení	Oprava komunikací poškozených stavbou	2
