HMG výstavby TDI a SO Holásky - ul. Výmlatiště, K Jezerům ze dne 15.3.2024
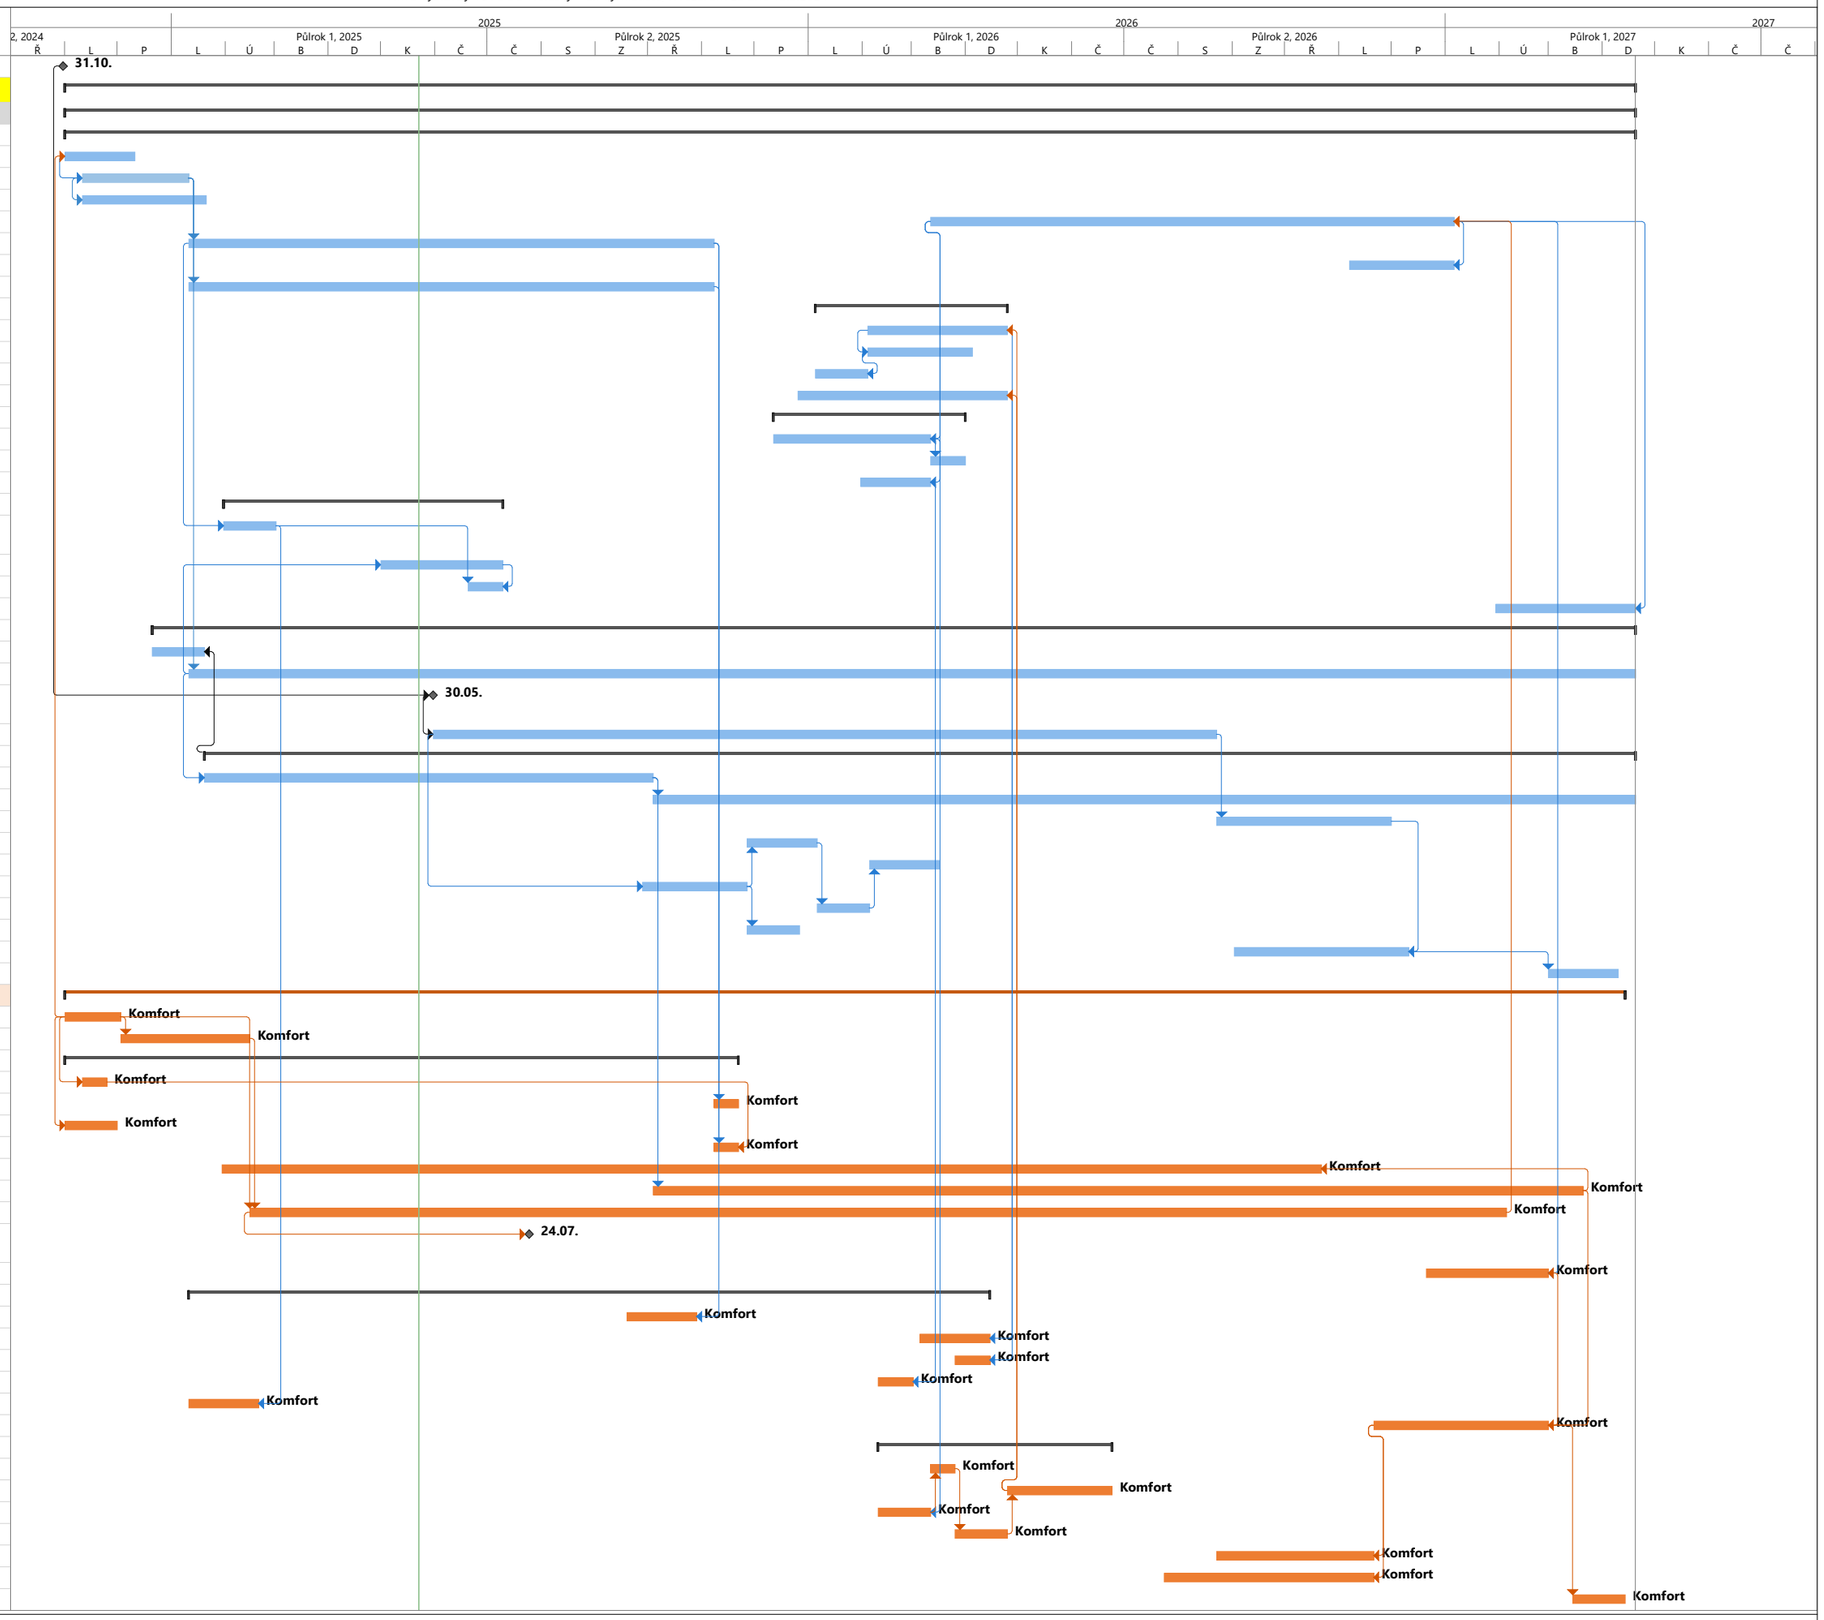
ID	Režim úkolu	Task Name	Doba trvání
1		Předání staveniště zhotoviteli	0 dní
2		**HMG výstavby TDI a SO Holásky - ul. Výmlatiště, K Jezerům**	**900 dní**
3		**Stavební objekty město Brno**	**900 dní**
4		**Dopravní a technická infrastruktura**	**900 dní**
5		SO001 - Příprava území vč. kácení stromů - vegační klid	40 dní
6		Záchranný archeologický průzkum pod DPS SO 02	61 dní
7		Záchranný archeologický průzkum pod Sjezdem SO 06	71 dní
8		SO101_102 - Komunikace, chodníky, parkoviště úsek A2; B; C	300 dní
9		SO 301_302 - Vodovod úsek A2; B; C	301 dní
10		SO 303_304 - Povrchové odvodnění úsek A2; B; C	60 dní
11		SO 305_306 - Kanalizace splašková úsek B; C	301 dní
12		**SO - Rozvody silové elektřiny**	**110 dní**
13		SO 401 - Rozvody NN úsek A2; B; C	80 dní
14		SO 402 - Rozvody VN úsek A2; C	60 dní
15		SO 403 - Trafostanice úsek B	30 dní
16		SO 404 - Rozvody slaboproudu úsek A2; B; C	120 dní
17		**SO - Veřejné osvětlení**	**110 dní**
18		SO 405 - Rozvody veřejného osvětlení úsek A2; B; C	90 dní
19		SO 405.1 - Přeložka veřejného osvětlení - úsek D	20 dní
20		SO 406 - Rozvody veřejného osvětlení - úsek C	40 dní
21		**SO - Plynovod**	**160 dní**
22		SO 501 - Předimenzování stávajícího STL plynovodu úsek A2 větev P1	30 dní
23		SO 502 - Plynovod - úsek B větev P2, P3	70 dní
24		SO 503 - Plynovod - úsek C větev P4	20 dní
25		SO 801 - Terénní a sadové úpravy úsek A2, B, C, D	80 dní
26		**Stavební objekty**	**850 dní**
27		SO 01 - Příprava území	30 dní
28		SO 02 - Dům s pečovatelskou službou	829 dní
29		Milník dokončení stropů nad 1.pp DPS SO 02 - pro zahájení MS SO 03	0 dní
30		SO 03 - Mateřská škola	449 dní
31		**SO 06 - Krytý vjezd do podzemních garází**	**820 dní**
32		SO 06 - ŽB konstrukce	257 dní
33		SO 06 dokončení	563 dní
34		SO 07 - Zpevněné plochy	100 dní
35		SO 09 -Přípojky vody	40 dní
36		SO 10 - Přípojky NN	40 dní
37		SO 11 - Přípojky splaškové kanalizace	60 dní
38		SO 12 - Přípojky plynu	30 dní
39		SO 13 - likvidace dešťových vod	30 dní
40		SO 14 - Venkovní úpravy	100 dní
41		SO 15 - Sadové úpravy	40 dní
42		**Stavení objekty Komfort**	**894 dní**
43		SO 01 - Příprava území vč. kácení stromů - vegační klid	32 dní
44		Záchranný archeologický průzkum	74 dní
45		**Zařízení staveniště**	**386 dní**
46		Buňkoviště	14 dní
47		Staneništní vodovod - přípojka z hydrantu Hn	14 dní
48		Staveništní elektro - stažení kabelů ze vzdušného vedení	30 dní
49		Staveništní kanalizace splašková - napojení na stoku S1 - 1	14 dní
50		Stavební jeřáb	630 dní
51		SO 04 - Bytový dům	533 dní
52		SO 05 - Bytový dům s garážemi	720 dní
53		SO 05 - Stavební připravenost pro napojení objektu SO 06 strop nad 1.pp	0 dní
54		SO101_102 - Komunikace, chodníky, parkoviště v úseku A1	70 dní
55		**Inženýrské sítě**	**459 dní**
56		SO 301_302 - Vodovod část větve V1 v úseku A1	40 dní
57		SO 401 - Rozvody NN úsek A1	40 dní
58		SO 404 Rozvody slaboproudu v úseku A1	20 dní
59		SO 405 - Rozvody veřejného osvětlení v úseku A1	20 dní
60		SO 502 - Plynovod část větve P1 v úseku A1	40 dní
61		SO 07 - Zpevněné plochy	100 dní
62		**Přípojky**	**134 dní**
63		SO 09 -Přípojky vody	14 dní
64		SO 10 - Přípojky NN	60 dní
65		SO 11 - Přípojky splaškové kanalizace	30 dní
66		SO 12 - Přípojky plynu	30 dní
67		SO 13 - likvidace dešťových vod	90 dní
68		SO 14 - Venkovní úpravy	120 dní
69		SO 15 - Sadové úpravy	30 dní
