ID	Název úkolu	Doba trvání
1	***093 2016_05_13jk TISK HARM-CAS KSUS III-154-ORECH***	**172 dny**
2	**PODPIS SOD, PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ**	7 dny
3	***ZAHÁJENÍ REALIZACE, PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ***	0 dny
4	**DIO, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, GEODETICKÉ PRÁCE - MONTÁŽ, ÚPRAVA BĚHEM ETAPIZACE STAVY, DEMONTÁŽ**	121 dny
5	**REALIZACE STAVBY**	**119 dny**
6	**1 ETAPA**	**18 dny**
7	1-ET - FRÉZOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ ASFALTŮ - odvoz na skládky a mezideponie	3 dny
8	1-ET SEŘÍZNUTÍ A UROVNÁNÍ KRAJNIC	8 dny
9	1-ET - OBRUBNÍKY, OPRAVA DLAŽBY - vytrhání, výškové urovnání, výměna	8 dny
10	1-ET - CHODNÍKY - úprava u přechodů a vjezdů	8 dny
11	1-ET - VÝŠKOVÉ UROVNÁNÍ POKLOPŮ, VPUSTÍ, UZÁVĚRU	8 dny
12	1-ET - ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ	8 dny
13	1-ET - OPRAVA TRHLIN VÝTLUKŮ - prořiznutí, zalití, štěrkové vrstvy	8 dny
14	1-ET - ZAMETENÍ PODKLADU	1 den
15	1-ET - KOM - ASF - postřiky na podkladní kci	1 den
16	1-ET - KOM - KOMPOZIT GEOMŘÍŽ	2 dny
17	1-ET - KOM - ASF - ACP	1 den
18	1-ET - KOM - ASF - postřiky na ACP	1 den
19	1-ET - KOM - ASF - ACL	2 dny
20	1-ET - KOM - ASF - postřiky na ACL	1 den
21	1-ET - KOM - ASF - BBTM	2 dny
22	**2 ETAPA**	**12 dny**
23	2-ET - FRÉZOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ ASFALTŮ - odvoz na skládky a mezideponie	2 dny
24	2-ET - OBRUBNÍKY, OPRAVA DLAŽBY - vytrhání, výškové urovnání, výměna	5 dny
25	2-ET - CHODNÍKY - úprava u přechodů a vjezdů	5 dny
26	2-ET - VÝŠKOVÉ UROVNÁNÍ POKLOPŮ, VPUSTÍ, UZÁVĚRU	5 dny
27	2-ET - ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ	5 dny
28	2-ET - OPRAVA TRHLIN VÝTLUKŮ - prořiznutí, zalití, štěrkové vrstvy	5 dny
29	2-ET - ZAMETENÍ PODKLADU	1 den
30	2-ET - KOM - ASF - postřiky na podkladní kci	1 den
31	2-ET - KOM - KOMPOZIT GEOMŘÍŽ	1 den
32	2-ET - KOM - ASF - ACP	1 den
33	2-ET - KOM - ASF - postřiky na ACP	1 den
34	2-ET - KOM - ASF - ACL	1 den
35	2-ET - KOM - ASF - postřiky na ACL	1 den
36	2-ET - KOM - ASF - BBTM	1 den
37	**3 ETAPA**	**12 dny**
38	3-ET - FRÉZOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ ASFALTŮ - odvoz na skládky a mezideponie	2 dny
39	3-ET - OBRUBNÍKY, OPRAVA DLAŽBY - vytrhání, výškové urovnání, výměna	5 dny
40	3-ET - CHODNÍKY - úprava u přechodů a vjezdů	5 dny
41	3-ET - VÝŠKOVÉ UROVNÁNÍ POKLOPŮ, VPUSTÍ, UZÁVĚRU	5 dny
42	3-ET - ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ	5 dny
43	3-ET - OPRAVA TRHLIN VÝTLUKŮ - prořiznutí, zalití, štěrkové vrstvy	5 dny
44	3-ET - ZAMETENÍ PODKLADU	1 den
45	3-ET - KOM - ASF - postřiky na podkladní kci	1 den
46	3-ET - KOM - KOMPOZIT GEOMŘÍŽ	1 den
47	3-ET - KOM - ASF - ACP	1 den
48	3-ET - KOM - ASF - postřiky na ACP	1 den
49	3-ET - KOM - ASF - ACL	1 den
50	3-ET - KOM - ASF - postřiky na ACL	1 den
51	3-ET - KOM - ASF - BBTM	1 den
52	**4 ETAPA**	**19 dny**
53	4-ET - FRÉZOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ ASFALTŮ - odvoz na skládky a mezideponie	3 dny
54	4-ET - OBRUBNÍKY, OPRAVA DLAŽBY - vytrhání, výškové urovnání, výměna	7 dny
55	4-ET - CHODNÍKY - úprava u přechodů a vjezdů	7 dny
56	4-ET - VÝŠKOVÉ UROVNÁNÍ POKLOPŮ, VPUSTÍ, UZÁVĚRU	7 dny
57	4-ET - ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ	7 dny
58	4-ET - OPRAVA TRHLIN VÝTLUKŮ - prořiznutí, zalití, štěrkové vrstvy	7 dny
59	4-ET - ZAMETENÍ PODKLADU	1 den
60	4-ET - KOM - ASF - postřiky na podkladní kci	1 den

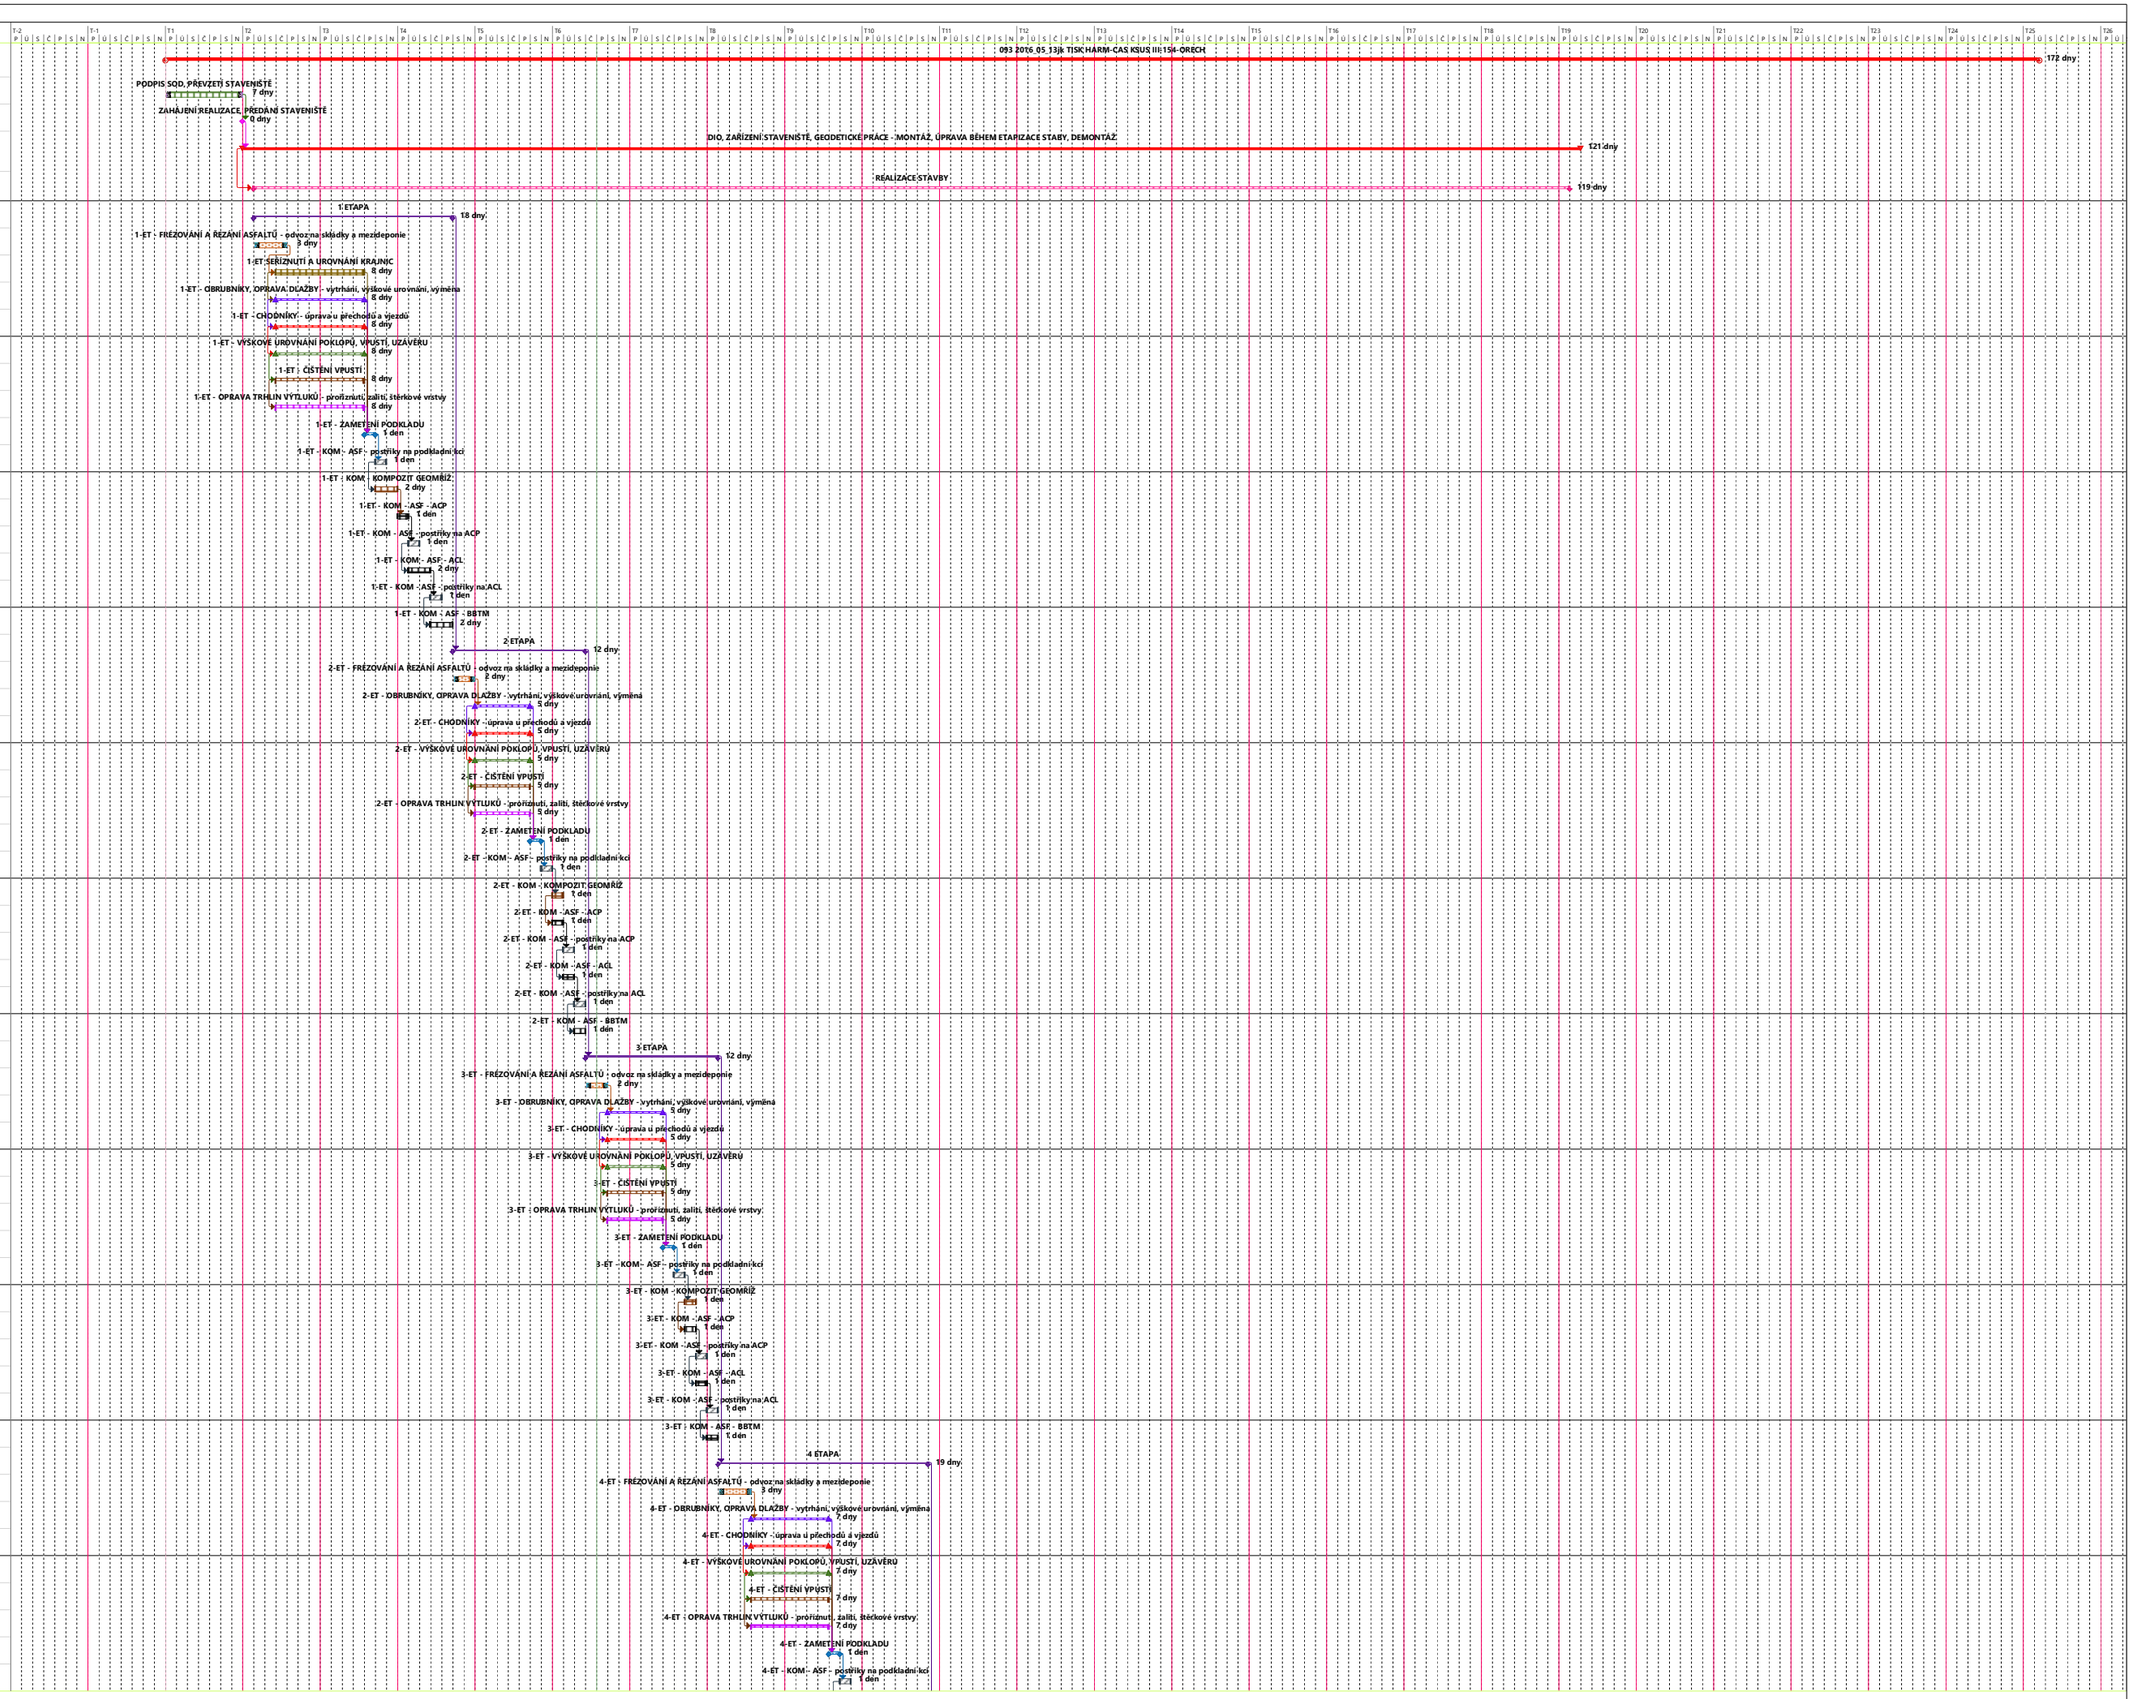

Projekt: 093 2016_05_13jk TISK HARM-CAS KSUS III-154
Datum: 13.5. 16

Úkol · Rozdělení · Milník · Souhrnný · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Neaktivní milník · Neaktivní souhrn · Ruční úkol · Pouze s dobou trvání · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Ruční souhrn · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Vnější úkoly · Vnější mílník · Konečný termín · Průběh · Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání
61		4-ET - KOM - KOMPOZIT GEOMŘÍŽ	2 dny
62		4-ET - KOM - ASF - ACP	2 dny
63		4-ET - KOM - ASF - postřiky na ACP	1 den
64		4-ET - KOM - ASF - ACL	2 dny
65		4-ET - KOM - ASF - postřiky na ACL	1 den
66		4-ET - KOM - ASF - BBTM	2 dny
67		**5 ETAPA**	**21 dny**
68		5-ET - FRÉZOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ ASFALTŮ - odvoz na skládky a mezideponie	3 dny
69		5-ET SEŘÍZNUTÍ A UROVNÁNÍ KRAJNIC	8 dny
70		5-ET - OBRUBNÍKY, OPRAVA DLAŽBY - vytrhání, výškové urovnání, výměna	8 dny
71		5-ET - CHODNÍKY - úprava u přechodů a vjezdů	8 dny
72		5-ET - VÝŠKOVÉ UROVNÁNÍ POKLOPŮ, VPUSTÍ, UZÁVĚRU	8 dny
73		5-ET - ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ	8 dny
74		5-ET - OPRAVA TRHLIN VÝTLUKŮ - prořiznutí, zalití, štěrkové vrstvy	8 dny
75		5-ET - ZAMETENÍ PODKLADU	1 den
76		5-ET - KOM - ASF - postřiky na podkladní kci	1 den
77		5-ET - KOM - KOMPOZIT GEOMŘÍŽ	2 dny
78		5-ET - KOM - ASF - ACP	1 den
79		5-ET - KOM - ASF - postřiky na ACP	1 den
80		5-ET - KOM - ASF - ACL	2 dny
81		5-ET - KOM - ASF - postřiky na ACL	1 den
82		5-ET - KOM - ASF - BBTM	2 dny
83		**6 ETAPA**	**15 dny**
84		6-ET - FRÉZOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ ASFALTŮ - odvoz na skládky a mezideponie	2 dny
85		6-ET SEŘÍZNUTÍ A UROVNÁNÍ KRAJNIC	6 dny
86		6-ET - OBRUBNÍKY, OPRAVA DLAŽBY - vytrhání, výškové urovnání, výměna	6 dny
87		6-ET - CHODNÍKY - úprava u přechodů a vjezdů	6 dny
88		6-ET - VÝŠKOVÉ UROVNÁNÍ POKLOPŮ, VPUSTÍ, UZÁVĚRU	6 dny
89		6-ET - ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ	6 dny
90		6-ET - OPRAVA TRHLIN VÝTLUKŮ - prořiznutí, zalití, štěrkové vrstvy	6 dny
91		6-ET - ZAMETENÍ PODKLADU	1 den
92		6-ET - KOM - ASF - postřiky na podkladní kci	1 den
93		6-ET - KOM - KOMPOZIT GEOMŘÍŽ	2 dny
94		6-ET - KOM - ASF - ACP	1 den
95		6-ET - KOM - ASF - postřiky na ACP	1 den
96		6-ET - KOM - ASF - ACL	2 dny
97		6-ET - KOM - ASF - postřiky na ACL	1 den
98		6-ET - KOM - ASF - BBTM	2 dny
99		**7 ETAPA**	**15 dny**
100		7-ET - FRÉZOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ ASFALTŮ - odvoz na skládky a mezideponie	2 dny
101		7-ET SEŘÍZNUTÍ A UROVNÁNÍ KRAJNIC	6 dny
102		7-ET - OBRUBNÍKY, OPRAVA DLAŽBY - vytrhání, výškové urovnání, výměna	6 dny
103		7-ET - CHODNÍKY - úprava u přechodů a vjezdů	6 dny
104		7-ET - VÝŠKOVÉ UROVNÁNÍ POKLOPŮ, VPUSTÍ, UZÁVĚRU	6 dny
105		7-ET - ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ	6 dny
106		7-ET - OPRAVA TRHLIN VÝTLUKŮ - prořiznutí, zalití, štěrkové vrstvy	6 dny
107		7-ET - ZAMETENÍ PODKLADU	1 den
108		7-ET - KOM - ASF - postřiky na podkladní kci	1 den
109		7-ET - KOM - KOMPOZIT GEOMŘÍŽ	2 dny
110		7-ET - KOM - ASF - ACP	1 den
111		7-ET - KOM - ASF - postřiky na ACP	1 den
112		7-ET - KOM - ASF - ACL	2 dny
113		7-ET - KOM - ASF - postřiky na ACL	1 den
114		7-ET - KOM - ASF - BBTM	2 dny
115		VDZ-BARVA - předznačení montáž a dodávka	5 dny
116		ÚKLID, PŘÍPRAVA PŘEDÁNÍ INVESTOROVI	2 dny
117		DOKONČENÍ REALIZACE	0 dny
118		*VYKLIZENÍ A ÚKLID STAVENIŠTĚ*	3 dny
119		**DOKONČENÍ CELÉ STAVBY, PŘEDÁNÍ INVESTOROVI**	2 dny
120		VDZ-PLAST - montáž a dodávka	7 dny

Projekt: 093 2016_05_13jk TISK HARM-CAS KSUS III-154
Datum: 13.5. 16

Úkol · Rozdělení · Milník · Souhrnný · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Neaktivní milník · Neaktivní souhrn · Ruční úkol · Pouze s dobou trvání · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Ruční souhrn · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Vnější úkoly · Vnější milník · Konečný termín · Průběh · Průběh ručně zadaného úkolu
