AKCE: "Oprava kolejí a výhybek na trati Měchenice - Dobříš"

HARMONOGRAM A TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Popis	nasazení strojů	objem prací
SO 01 - Oprava žel. svršku - Klínec		
Přípravné práce, návozy, vývozy kolejnic	MHS, AD 20, NAD...	
Demontáž nástupišť, přejezdů	MHS	155m, 6m
Demontáž KR / trhání	UK (PKP)+loko+podv.	2,38km
Výměna KL v tunelu	MHS	128,4m3
Samostatná úprava vrstvy KL	válec, grader	8330m2
Výměna pražců/montáž KR	MHS+loko+podv.,	3904ks
Výměna kolejnic, posun kolejnic	MHS	4260m,500m
Oprava rozchodu, ostatní práce na ž. svršku	MHS	3226 úl. ploch
Sypání štěrků+doplnění KL	loko+vozy	5999,4m3
Úprava GPK	ASP, SSP	2,1km
Zřízení BK		258ks, 4760m
Zřízení pražcových kotev	MHS	3226ks
Úprava stezek	MHS	3000m2
Čištění příkopů	MHS	2064m3
Svahování zemního tělesa	MHS	1500m3
Zřízení nástupišť, přejezdů	MHS	100m,6m
Montáž výstroje trati, zajišťovací značky	MHS	
Dokončovací práce, demontáže, odvozy	MHS, TRB, NAD...	
15-22/1 - Oprava propustku v km 11,729 - NK a Žel. svršek		
Přípravné práce, návozy	dle potřeby	
Snesení žel. svršku	MHS	8m+17m3
Zemní práce - odkopání	MHS	46m3
Demontáž stávajícího propustku	TRB/MHS, jeřáb	19m3
Zřízení propustku z ŽB trub	TRB/MHS, jeřáb	6ks trub
Zemní práce - zásypy	MHS	45m3
Zřízení KL	MHS	17m3
Vložení KR	MHS	8m
Úprava GPK vč. doplnění KL	ASP, SSP + loko+vůz	1,3km, 63t
Zřízení BK		4ks, 150m
Ostatní práce, práce mimo výluku	MHS	
Dokončovací práce, odvozy	MHS, TRB, NAD...	
Oprava propustku v km 12,180 trati Dobříš - Vrané nad Vltavou		
Přípravné práce, návozy	dle potřeby	
Snesení žel. svršku	MHS	8m+17m3
Zemní práce - odkopání	MHS	42m3
Demontáž stávajícího propustku	TRB/MHS, jeřáb	13,5m3
Zřízení propustku z ŽB trub	TRB/MHS, jeřáb	6ks trub
Zemní práce - zásypy	MHS	36m3
Zřízení KL	MHS	17m3
Vložení KR	MHS	8m
Úprava GPK vč. doplnění KL	ASP, SSP + loko+vůz	
Zřízení BK		4ks, 150m
Ostatní práce, práce mimo výluku	MHS	
Dokončovací práce, odvozy	MHS, TRB, NAD...	
SO-01,02 - Železniční most v km 26,931,km 27,077_Most + SO03		
Přípravné práce, návozy		
Demontáž žel. svršku na mostě, demontáž mostu		
Snesení ocelové konstrukce		
Opravy a úpravy ocelové konstrukce, PKO		
Demolice a sanace spodní stavby, betonáže		
Izolace		
Gabiony+zásypy		
Vložení ocelové konstrukce		
Montáže ostatních částí mostů, dobetonávky		
Zřízení mostnic a pozednic, zřízení žel. svršku v oblasti mostů		
Ostatní práce, práce mimo výluku		
Dokončovací práce, odvozy		

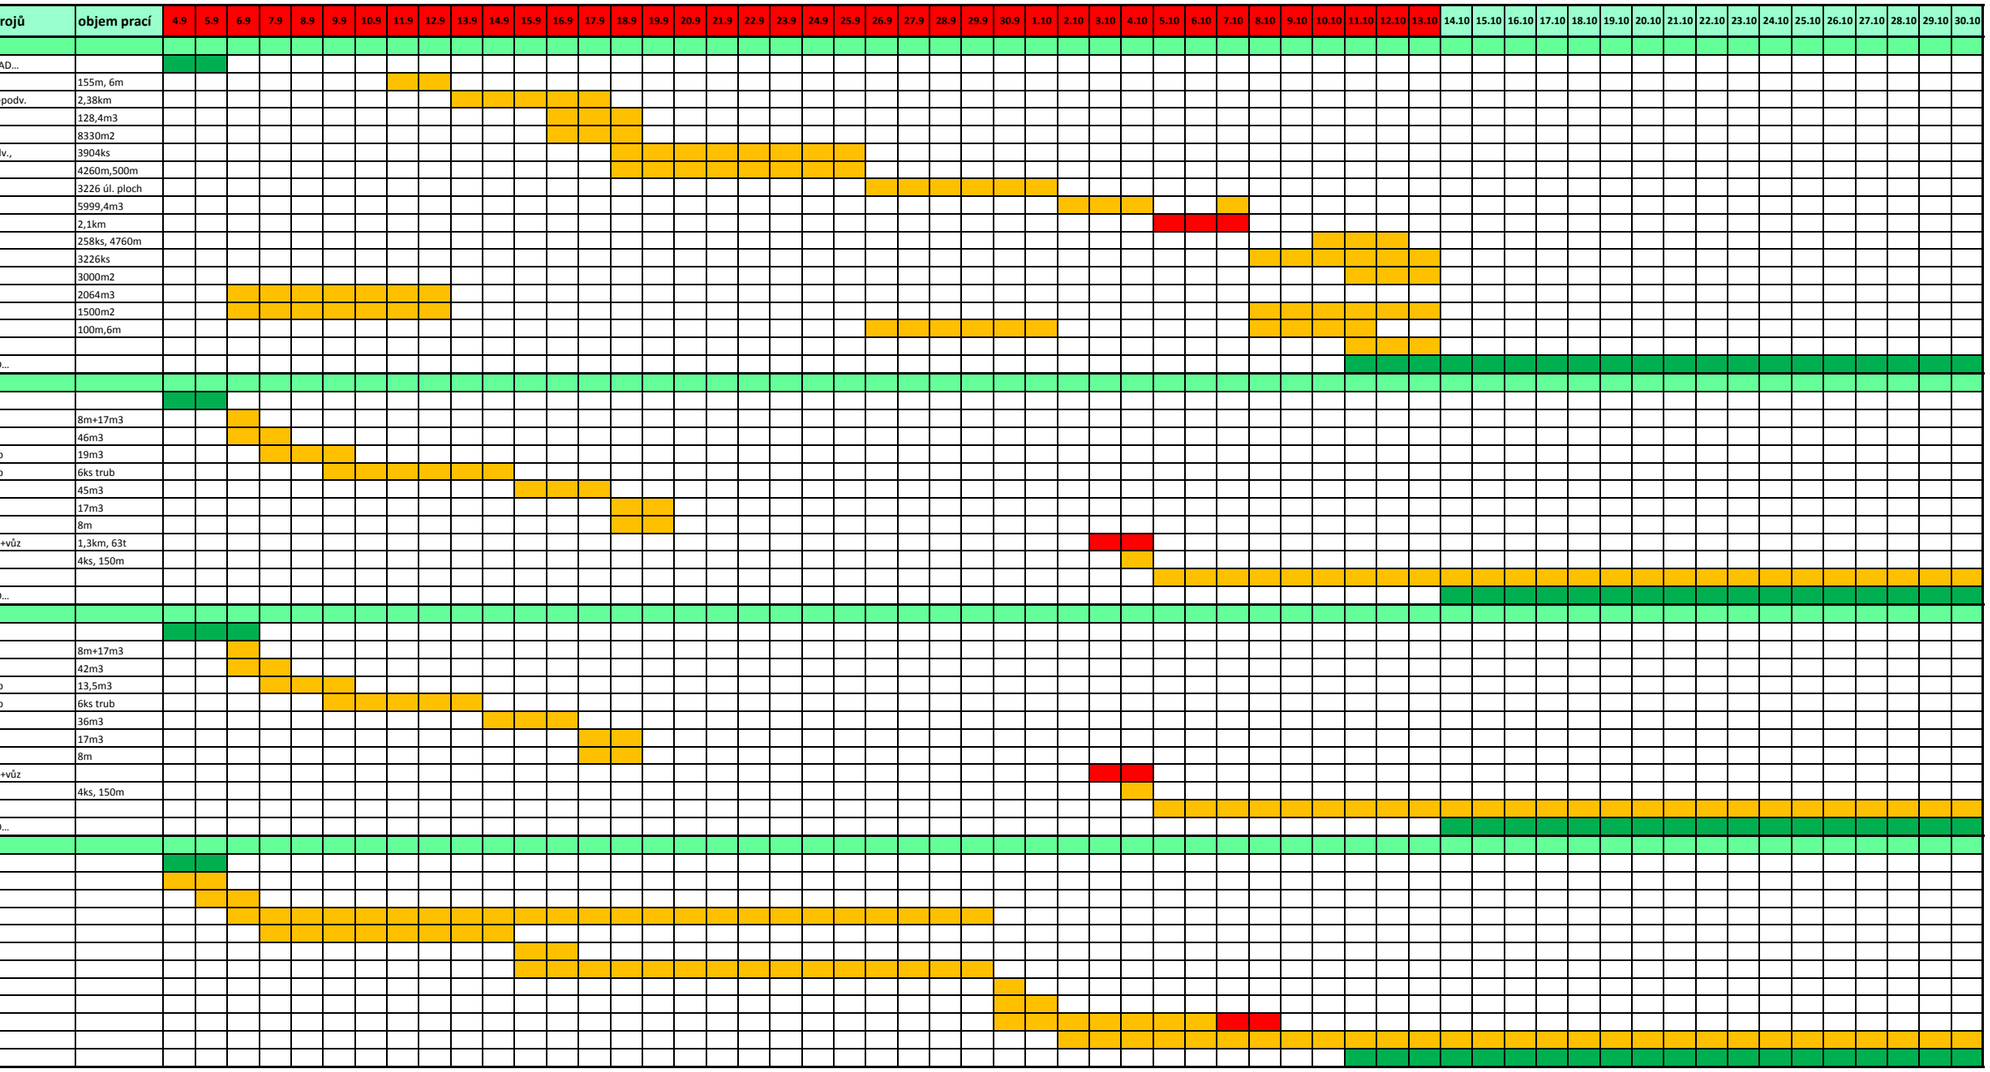

Zahájení prací: 4.9.2017
Výluky (40N): 4.9-13.10.2017
Ukončení prací: 30.10.2017
Předání DSPS: 10.11.2017
Ukončení díla: 20.12.2017
