2025_08_20_Bazén_Aš_HMG_V1_3_investor_k dod3

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	Poznámky	Následníci
1	Kompletní rekonstrukce plaveckého bazénu Aš	02.01. 25	24.06. 26	385 dny		
2	Smluvní milníky	02.01. 25	24.06. 26	384 dny		
3	Předání staveniště a zahájení stavebních prací	02.01. 25	02.01. 25	0 dny		
4	Předání a převzetí stavby a dokončení stavebních prací	30.09. 26	30.09. 26	0 dny		
5	Přípravné práce a zařízení staveniště	02.01. 25	14.02. 25	32 dny		
8	Bourací práce a demontáže	13.01. 25	15.06. 25	111 dny		
33	Demontáž střešního pláště na střeše 1np	01.04. 26	15.05. 26	33 dny	posun sezónních prací z Sod na jaro	
35	Zemní práce	03.03. 25	06.06. 25	70 dny		
42	Nosné konstrukce ŽB a zděné, zazdívky	03.03. 25	14.11. 25	185 dny		
52	Izolace proti vodě	25.08. 25	12.12. 25	80 dny		
55	Sanace železobetonových konstrukcí	15.07. 25	15.10. 25	67 dny	nové práce	
56	Oprava ocelových konstrukcí a nové opláštění střechy	01.09. 25	15.12. 25	76 dny	nové práce	
57	Profese	16.06. 25	22.06. 26	266 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
58	Vnitřní kanalizace	16.06. 25	22.06. 26	266 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
59	Rozvody vnitřní kanalizace	15.07. 25	21.07. 26	266 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
67	Kompletace, funkční zkoušky, uvedení do provozu	15.07. 26	21.09. 26	49 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
69	Vnitřní vodovod	30.09. 25	22.09. 26	256 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
70	Rozvody vnitřního vodovodu	30.09. 25	16.07. 26	208 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
78	Kompletace, funkční zkoušky, uvedení do provozu	15.07. 26	21.09. 26	49 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
80	Ústřední vytápění	30.09. 25	22.09. 26	256 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
81	Rozvody ÚT	30.09. 25	31.07. 26	219 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
89	Kompletace, funkční zkoušky, uvedení do provozu	01.08. 26	21.09. 26	37 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
91	Vzduchotechnika	30.09. 25	22.09. 26	256 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
92	Rozvody VZT	30.09. 25	31.07. 26	219 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
97	Koncové prvky, funkční zkoušky, uvedení do provozu	01.08. 26	21.09. 26	37 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
99	Elektroinstalace	30.09. 25	22.09. 26	256 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
100	Kabelové rozvody	30.09. 25	31.07. 26	219 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
106	Koncové prvky, funkční zkoušky, uvedení do provozu	01.08. 26	21.09. 26	37 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
108	Slaboproudé rozvody	30.09. 25	22.09. 26	256 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
109	Kabelové rozvody	30.09. 25	31.07. 26	219 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
115	Koncové prvky, funkční zkoušky, uvedení do provozu	01.08. 26	21.09. 26	37 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
117	Měření a regulace	30.09. 25	22.09. 26	256 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
118	Kabelové rozvody	30.09. 25	31.07. 26	219 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
124	Funkční zkoušky, uvedení do provozu	01.08. 26	21.09. 26	37 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
126	FVE	16.03. 26	15.06. 26	66 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
128	Povrchy vnitřní: obklady, malby; podlahy, dlažby, stěrky; podhledy	16.09. 25	22.09. 26	266 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
129	Stěny	16.09. 25	22.09. 26	266 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
130	Vnitřní omítky	16.09. 25	17.03. 26	131 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
134	Obklady stěn	12.04. 26	28.08. 26	101 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
137	Interiérové malby	09.06. 26	22.09. 26	76 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
141	Podlahy	01.12. 25	31.08. 26	196 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
142	Hrubé podlahy	01.12. 25	24.07. 26	170 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
146	Podlahové krytiny	26.04. 26	28.08. 26	91 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
153	Podhledy	29.03. 26	13.08. 26	100 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
157	Nátěry konstrukcí	15.01. 26	30.06. 26	119 dny		
159	Vnitřní výplně otvorů a vstupní dveře	29.03. 26	27.08. 26	110 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
163	Prvky PSV - vnitřní vybavení, vybavení baru a zázemí	26.04. 26	21.09. 26	107 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
169	Konstrukce zámečnické	10.06. 25	21.09. 26	335 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
172	Bazény a wellness	01.08. 25	17.09. 26	295 dny		
173	Stavební příprava pro bazénové vany	05.05. 25	01.09. 25	86 dny		
175	Bazénové vany a rozvody instalací pod vanami	01.08. 25	03.06. 26	219 dny		
181	Bazénová technologie (v technických místnostech převážně 1pp)	26.04. 26	17.09. 26	105 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
188	Wellness	09.06. 26	21.09. 26	75 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
193	Tvarované konstrukce	12.01. 26	06.03. 26	40 dny		
196	Plášť budovy	19.05. 25	30.04. 26	249 dny		
197	Střecha nad 1np	15.05. 26	30.09. 26	99 dny	posun sezónních prací z Sod na jaro	
202	Fasáda - KZS	19.05. 25	30.11. 25	141 dny		
209	Fasádní výplně otvorů, LOP	20.08. 25	21.01. 26	111 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
215	Provětrávaná fasáda z WPC lamel	15.01. 26	20.05. 26	90 dny	posun realizace o cca 3měsíce vlivem nových prací	
217	Venkovní terasa a drobné venkovní objekty	12.01. 26	19.06. 26	115 dny		
224	Dokončovací práce	24.08. 26	30.09. 26	28 dny		

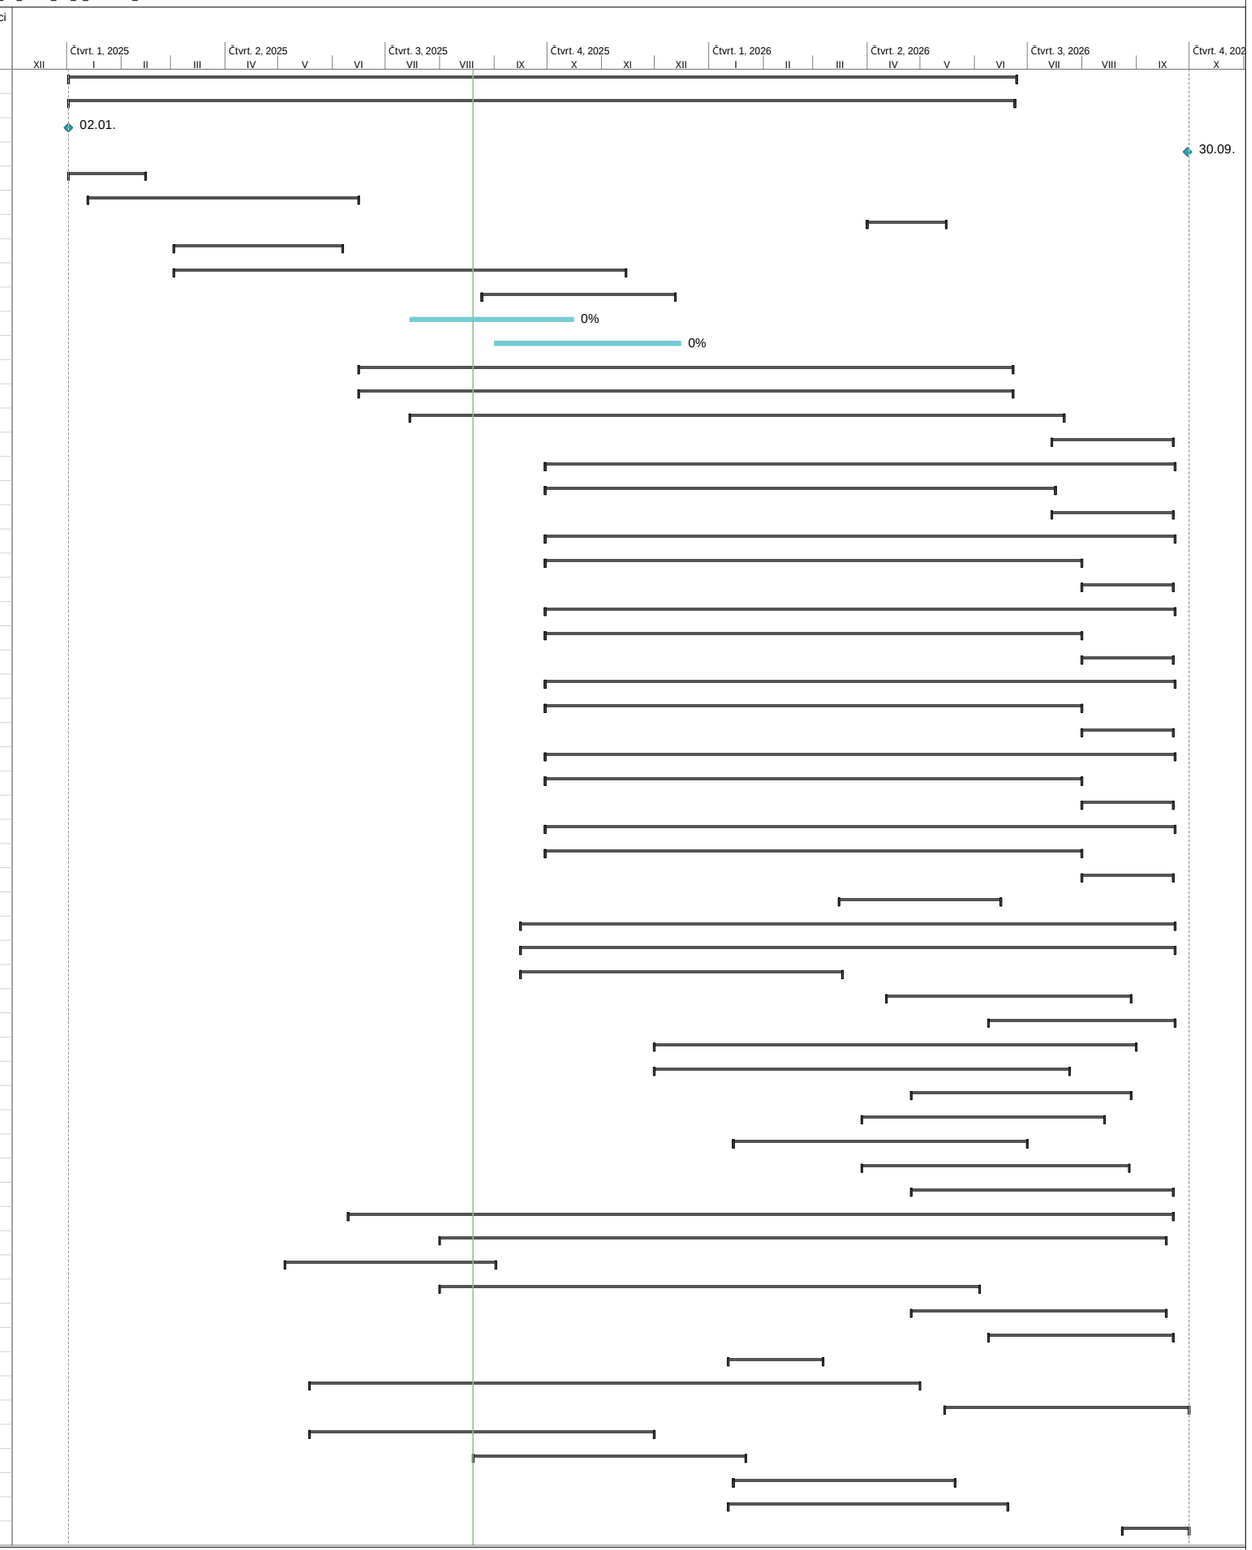

Kritický | Rozdělení kritického úkolu | Průběh kritického úkolu | Úkol | Rozdělení | Průběh úkolu | Ruční úkol | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Pouze s dobou trvání | Směrný plán | Rozdělení podle směrného plánu | Milník podle směrného plánu | Milník | Průběh souhrnného úkolu | Souhrnný | Ruční souhrn | Souhrn projektu | Vnější úkoly | Vnější milník | Neaktivní úkol | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Konečný termín
