ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Dům s pečovatelskou službou - Mlýnská**	**368 dny**	**9.5. 16**	**11.5. 17**
2	Předání staveniště	1 den	9.5. 16	9.5. 16
3	Zahájení prací HSV a PSV	1 den	16.6. 16	16.6. 16
4	Předání díla	1 den	11.5. 17	11.5. 17
5	**SO 01 Dům s pečovatelskou službou**	**363 dny**	**9.5. 16**	**6.5. 17**
6	1 - zemní práce	92 dny	4.7. 16	3.10. 16
7	27 - piloty	20 dny	18.7. 16	6.8. 16
8	31 - základy	20 dny	8.8. 16	27.8. 16
9	03 - Svislé a kompletní konstrukce	63 dny	28.8. 16	29.10. 16
10	31 - nosné konstrukce	84 dny	25.9. 16	18.12. 16
11	311 - sádrokartonové konstrukce	31 dny	2.2. 17	4.3. 17
12	34 - stěny a příčky	71 dny	18.12. 16	27.2. 17
13	41 - stropy a stropní konstrukce	92 dny	10.9. 16	11.12. 16
14	43 - schodiště	61 dny	10.9. 16	10.11. 16
15	61 - úprava povrchů vnitřních	70 dny	4.1. 17	14.3. 17
16	62 - úprava povrchů vnějších	71 dny	4.1. 17	15.3. 17
17	63 - podlahy a podlahové konstrukce	71 dny	18.12. 16	27.2. 17
18	64 - výplně otvorů	40 dny	1.3. 17	9.4. 17
19	89 - ostatní konstrukce na trubní vedení	13 dny	30.9. 16	12.10. 16
20	94 - lešení a stavební výtahy	163 dny	1.10. 16	13.3. 17
21	95 - dokončovcí konstrukce na pozemních stavbách	147 dny	18.11. 16	13.4. 17
22	99 - staveniště přesun hmot	340 dny	9.5. 16	13.4. 17
23	711 - izolace proti vodě	183 dny	5.9. 16	6.3. 17
24	712 - živičné krytiny	21 dny	5.1. 17	25.1. 17
25	713 - izolace tepelné	82 dny	4.1. 17	26.3. 17
26	720 zdravotně technická instalace	204 dny	20.6. 16	9.1. 17
27	724 - strojní vybavení	6 dny	2.1. 17	7.1. 17
28	730 - ústřední vytápění	92 dny	1.2. 17	3.5. 17
29	762 - konstrukce tesařské	28 dny	20.12. 16	16.1. 17
30	764 - konstrukce klempířské	31 dny	6.1. 17	5.2. 17
31	766 - konstrukce truhlářské	100 dny	2.1. 17	11.4. 17
32	766a - výrobky požární dřevěné	100 dny	2.1. 17	11.4. 17
33	767 - konstrukce zámečnické	71 dny	16.1. 17	27.3. 17
34	767a - kovové výrobky požární	100 dny	2.1. 17	11.4. 17
35	767b - konstrukce hliníkové	40 dny	1.11. 16	10.12. 16
36	769 - otvorové prvky z plastu	44 dny	1.11. 16	14.12. 16
37	771 - podlahy z dlaždic a obklady	55 dny	1.3. 17	24.4. 17
38	775 - podlahy vlysové a parketové	55 dny	1.3. 17	24.4. 17
39	776 - podlahy povlakové	55 dny	1.3. 17	24.4. 17
40	781 - obklady keramické	55 dny	1.3. 17	24.4. 17
41	783 - nátěry	20 dny	17.4. 17	6.5. 17
42	784 - malby	20 dny	17.4. 17	6.5. 17
43	M21 - elektromontáže	300 dny	1.7. 16	26.4. 17
44	M22 - montáž sdělovací a zabezpečovací techniky	101 dny	1.12. 16	11.3. 17
45	M24 - montáž vzduchotechnických zařízení	101 dny	1.12. 16	11.3. 17
46	M33 - montáž dopravních zařízení a vah-výtahy	28 dny	1.2. 17	28.2. 17
47	M36 - montáž měřicích a regulačních zařízení	101 dny	1.12. 16	11.3. 17
48	M99 - výměníková stanice	40 dny	1.11. 16	10.12. 16
49	SO 01.9 Parkoviště	60 dny	1.3. 17	29.4. 17
50	SO 02.2 Přípojka O2	40 dny	3.10. 16	11.11. 16
51	SO 03 Přípojka kanalizace	45 dny	6.7. 16	19.8. 16
52	SO 04 Přípojka vody	40 dny	6.7. 16	14.8. 16
53	SO 06 přeložka VO	40 dny	6.7. 16	14.8. 16
54	SO 08 Přípojka NN	31 dny	6.7. 16	5.8. 16
55	SO 09 Komunikace a zpevněné plochy	30 dny	1.4. 17	1.5. 17
56	SO 10 Rozšíření stávajícího chodníku	30 dny	1.4. 17	1.5. 17
57	SO 11 Sadové úpravy	30 dny	1.4. 17	1.5. 17
58	SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady	368 dny	9.5. 16	11.5. 17

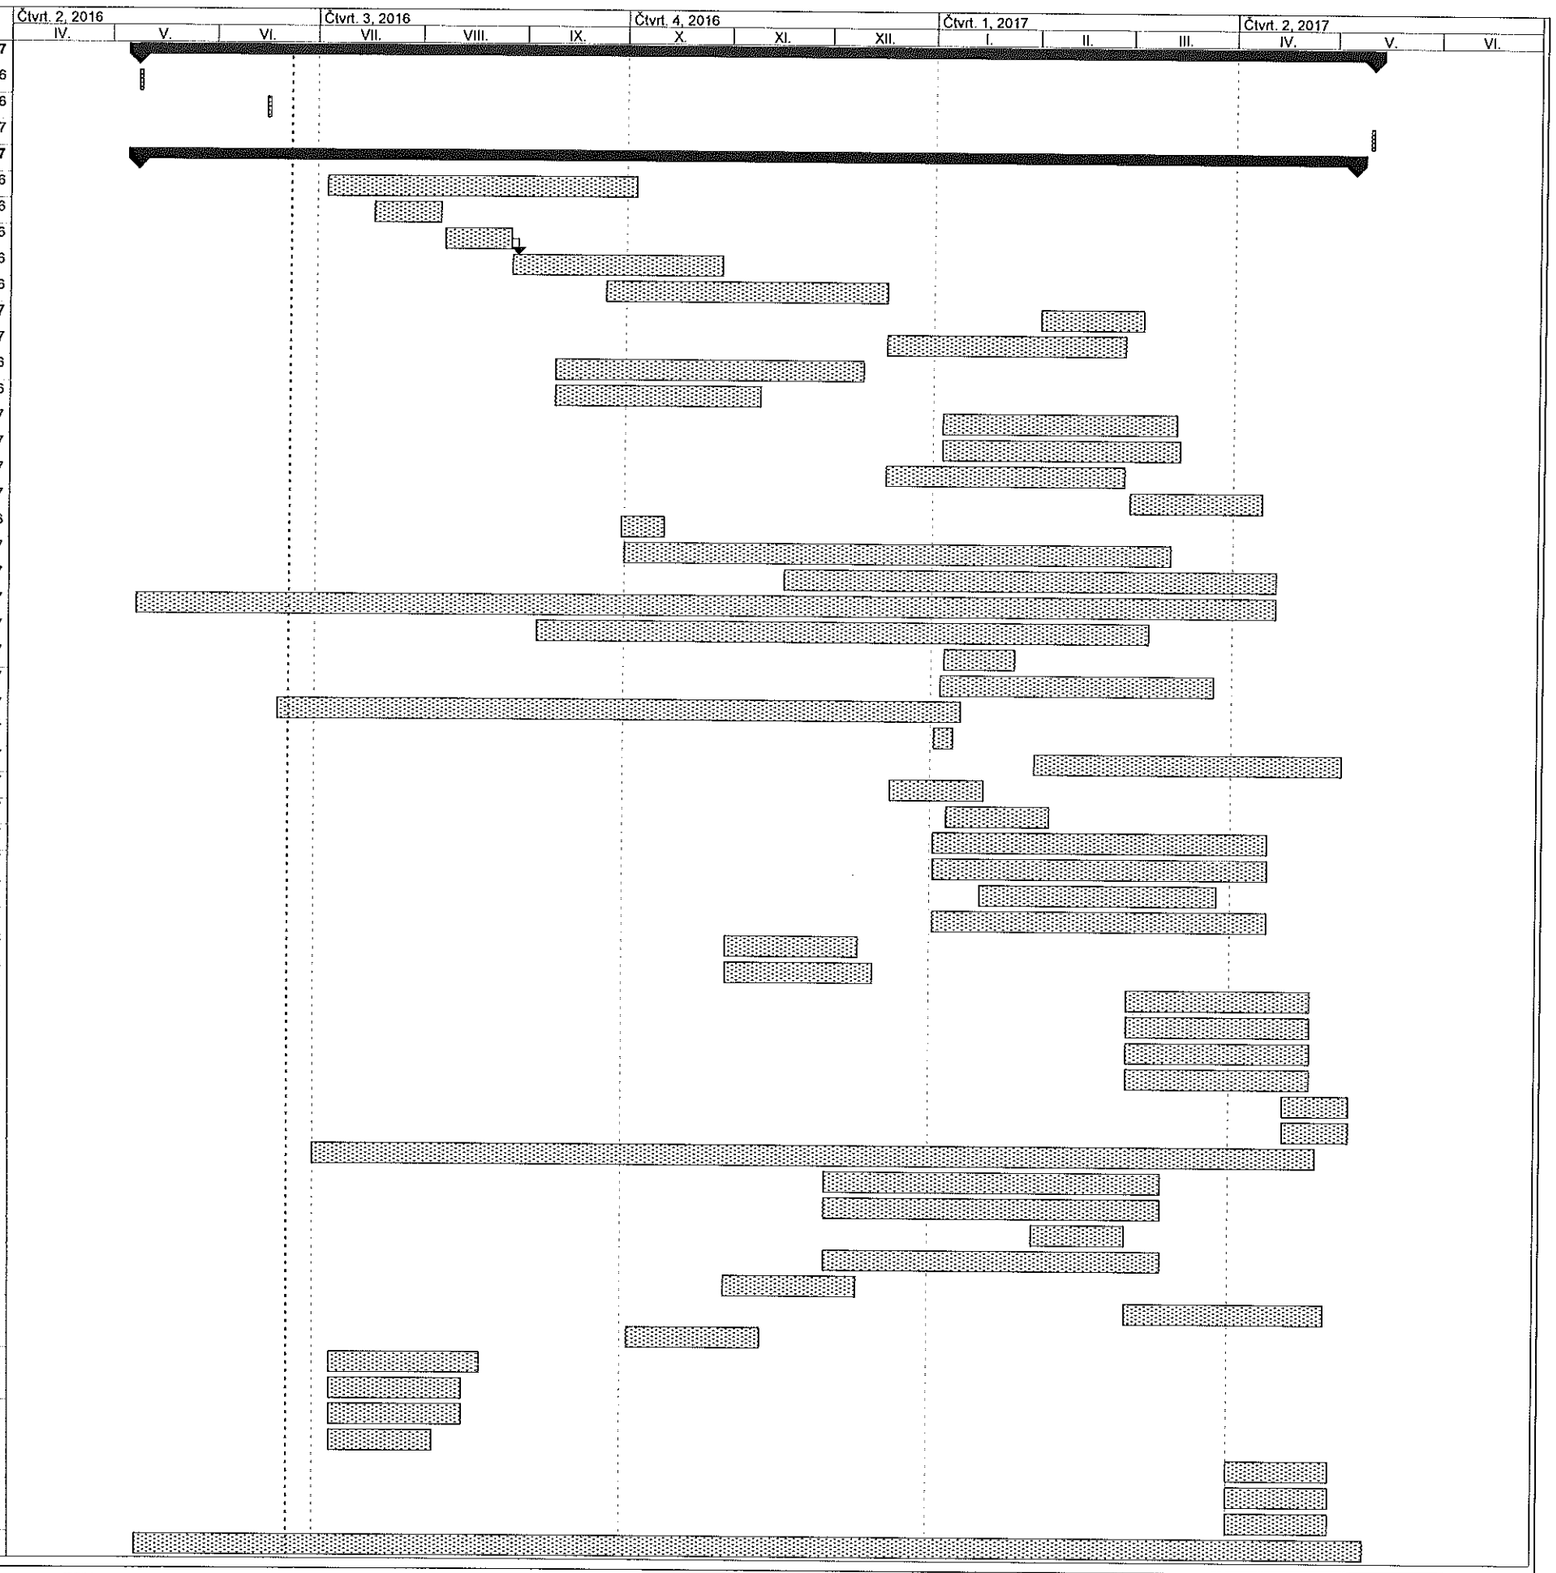

Projekt: HMG ke ZM.č.1 29.6.2016
Datum: 23.6. 16

Úkol | Průběh | Souhrnný | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení | Milník | Souhrn projektu | Vnější milník
