PŘÍLOHA č. 3
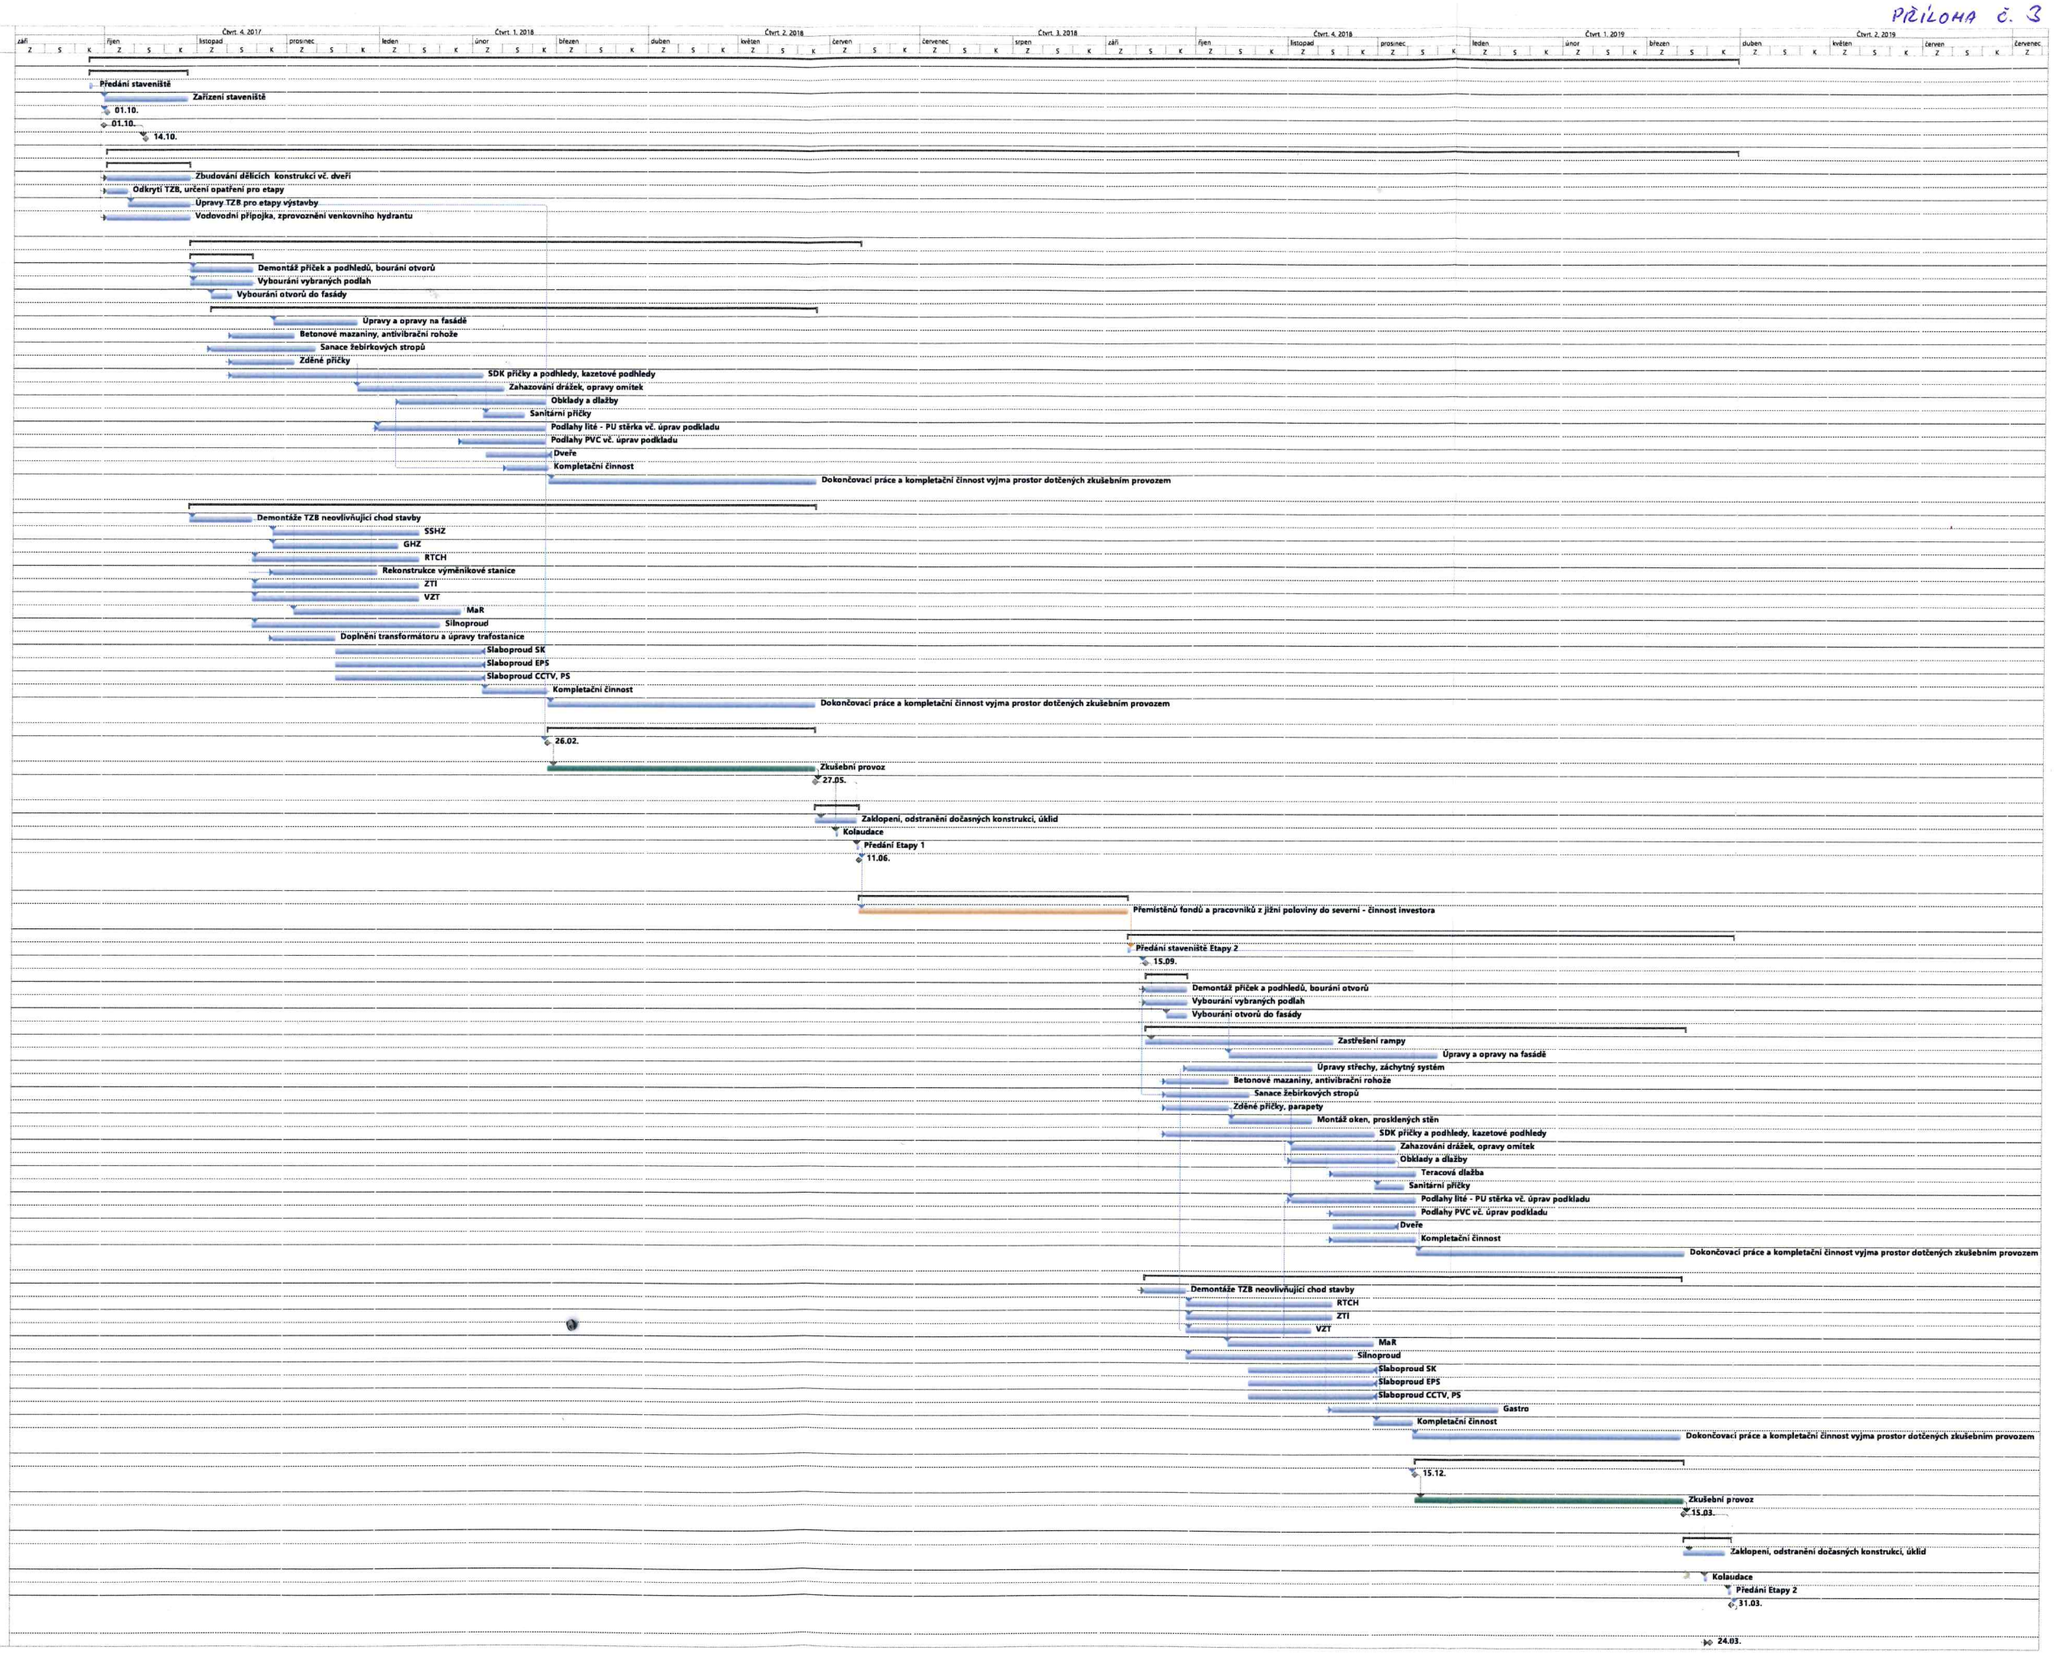
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři**	**78,85 týdny**	**26.09. 17**	**31.03. 19**
2	**Předrealizační fáze**	**4,71 týdny**	**26.09. 17**	**28.10. 17**
3	**Předání staveniště**	0,14 týdny	26.09. 17	26.09. 17
4	Zařízení staveniště	4 týdny	01.10. 17	28.10. 17
5	*1. Zahájení prací*	0 týdny	01.10. 17	01.10. 17
6	Předložení seznamu vzorků	0 týdny	01.10. 17	01.10. 17
7	Odsouhlasení seznamu vzorků	0 týdny	14.10. 17	14.10. 17
8	**Realizační fáze**	**77,99 týdny**	**02.10. 17**	**31.03. 19**
9	**Přípravná část - Etapa 0**	**4 týdny**	**02.10. 17**	**29.10. 17**
10	Zbudování dělicích konstrukcí vč. dveří	4 týdny	02.10. 17	29.10. 17
11	Odkrytí TZB, určení opatření pro etapy	1 týden	02.10. 17	08.10. 17
12	Úpravy TZB pro etapy výstavby	3 týdny	09.10. 17	29.10. 17
13	Vodovodní přípojka, zprovoznění venkovního hydrantu	4 týdny	02.10. 17	29.10. 17
14	**Severní část - Etapa 1**	**32,14 týdny**	**30.10. 17**	**11.06. 18**
15	**Bourací práce**	**3 týdny**	**30.10. 17**	**19.11. 17**
16	Demontáž příček a podhledů, bourání otvorů	3 týdny	30.10. 17	19.11. 17
17	Vybourání vybraných podlah	3 týdny	30.10. 17	19.11. 17
18	Vybourání otvorů do fasády	1 týden	06.11. 17	12.11. 17
19	**Stavební úpravy**	**29 týdny**	**06.11. 17**	**27.05. 18**
20	Úpravy a opravy na fasádě	4 týdny	27.11. 17	24.12. 17
21	Betonové mazaniny, antivibrační rohože	3 týdny	13.11. 17	03.12. 17
22	Sanace žebírkových stropů	5 týdny	06.11. 17	10.12. 17
23	Zděné příčky	3 týdny	13.11. 17	03.12. 17
24	SDK příčky a podhledy, kazetové podhledy	12 týdny	13.11. 17	04.02. 18
25	Zahazování drážek, opravy omítek	7 týdny	25.12. 17	11.02. 18
26	Obklady a dlažby	7 týdny	08.01. 18	25.02. 18
27	Sanitární příčky	2 týdny	05.02. 18	18.02. 18
28	Podlahy lité - PU stěrka vč. úprav podkladu	8 týdny	01.01. 18	25.02. 18
29	Podlahy PVC vč. úprav podkladu	4 týdny	29.01. 18	25.02. 18
30	Dveře	3 týdny	06.02. 18	26.02. 18
31	Kompletační činnost	2 týdny	13.02. 18	26.02. 18
32	Dokončovací práce a kompletační činnost vyjma prostor dotčených zkušebním provozem	3 měsíce	27.02. 18	27.05. 18
33	**Technologické úpravy**	**30 týdny**	**30.10. 17**	**27.05. 18**
34	Demontáže TZB neovlivňující chod stavby	3 týdny	30.10. 17	19.11. 17
35	SSHZ	7 týdny	27.11. 17	14.01. 18
36	GHZ	6 týdny	27.11. 17	07.01. 18
37	RTCH	8 týdny	20.11. 17	14.01. 18
38	Rekonstrukce výměníkové stanice	5 týdny	27.11. 17	31.12. 17
39	ZTI	8 týdny	20.11. 17	14.01. 18
40	VZT	8 týdny	20.11. 17	14.01. 18
41	MaR	8 týdny	04.12. 17	28.01. 18
42	Silnoproud	9 týdny	20.11. 17	21.01. 18
43	Doplnění transformátoru a úpravy trafostanice	3 týdny	27.11. 17	17.12. 17
	Slaboproud SK	7 týdny	18.12. 17	04.02. 18
	Slaboproud EPS	7 týdny	18.12. 17	04.02. 18
46	Slaboproud CCTV, PS	7 týdny	18.12. 17	04.02. 18
47	Kompletační činnost	22 dny	05.02. 18	26.02. 18
48	Dokončovací práce a kompletační činnost vyjma prostor dotčených zkušebním provozem	3 měsíce	27.02. 18	27.05. 18
49	**Zkušební provoz**	**12,86 týdny**	**26.02. 18**	**27.05. 18**
50	*2. Dokončení severní poloviny hal depozitáře a zahájení 3-měsíčního zkušebního provozu*	0 týdny	26.02. 18	26.02. 18
51	Zkušební provoz	3 měsíce	27.02. 18	27.05. 18
52	*3. Ukončení zkušebního provozu severní poloviny hal depozitáře*	0 týdny	27.05. 18	27.05. 18
53	**Dokončovací práce**	**2,14 týdny**	**28.05. 18**	**11.06. 18**
54	Zaklopení, odstranění dočasných konstrukcí, úklid	2 týdny	28.05. 18	10.06. 18
55	Kolaudace	0,14 týdny	04.06. 18	04.06. 18
56	Předání Etapy 1	0,14 týdny	11.06. 18	11.06. 18
57	*4. Dokončení rekonstrukce zbývající části severní poloviny a 1. PP, předání zrekonstruované části objednateli, kolaudace*	0 týdny	11.06. 18	11.06. 18
58	**Stěhování Etapa 1-2**	**12,86 týdny**	**11.06. 18**	**09.09. 18**
59	Přemístění fondů a pracovníků z jižní poloviny do severní - činnost investora	3 měsíce	11.06. 18	09.09. 18
60	**Jižní část - Etapa 2**	**28,99 týdny**	**09.09. 18**	**31.03. 19**
61	Předání staveniště Etapy 2	0,14 týdny	09.09. 18	10.09. 18
62	*5. Zahájení prací*	0 týdny	15.09. 18	15.09. 18
63	**Bourací práce**	**2 týdny**	**15.09. 18**	**29.09. 18**
64	Demontáž příček a podhledů, bourání otvorů	2 týdny	15.09. 18	29.09. 18
65	Vybourání vybraných podlah	2 týdny	15.09. 18	29.09. 18
66	Vybourání otvorů do fasády	1 týden	22.09. 18	29.09. 18
67	**Stavební úpravy**	**25,86 týdny**	**15.09. 18**	**15.03. 19**
68	Zastřešení rampy	9 týdny	15.09. 18	17.11. 18
69	Úpravy a opravy na fasádě	10 týdny	13.10. 18	22.12. 18
70	Úpravy střechy, záchytný systém	6 týdny	29.09. 18	10.11. 18
71	Betonové mazaniny, antivibrační rohože	3 týdny	22.09. 18	13.10. 18
72	Sanace žebírkových stropů	4 týdny	22.09. 18	20.10. 18
73	Zděné příčky, parapety	3 týdny	22.09. 18	13.10. 18
74	Montáž oken, prosklených stěn	4 týdny	13.10. 18	10.11. 18
75	SDK příčky a podhledy, kazetové podhledy	10 týdny	22.09. 18	01.12. 18
	Zahazování drážek, opravy omítek	5 týdny	03.11. 18	08.12. 18
	Obklady a dlažby	5 týdny	03.11. 18	08.12. 18
78	Teracová dlažba	4 týdny	17.11. 18	15.12. 18
79	Sanitární příčky	10 dny	01.12. 18	11.12. 18
80	Podlahy lité - PU stěrka vč. úprav podkladu	6 týdny	03.11. 18	15.12. 18
81	Podlahy PVC vč. úprav podkladu	4 týdny	17.11. 18	15.12. 18
82	Dveře	3 týdny	17.11. 18	08.12. 18
83	Kompletační činnost	28 dny	17.11. 18	15.12. 18
84	Dokončovací práce a kompletační činnost vyjma prostor dotčených zkušebním provozem	3 měsíce	15.12. 18	15.03. 19
85	**Technologické úpravy**	**25,71 týdny**	**15.09. 18**	**14.03. 19**
86	Demontáže TZB neovlivňující chod stavby	2 týdny	15.09. 18	29.09. 18
87	RTCH	7 týdny	29.09. 18	17.11. 18
88	ZTI	7 týdny	29.09. 18	17.11. 18
89	VZT	6 týdny	29.09. 18	10.11. 18
90	MaR	7 týdny	13.10. 18	01.12. 18
91	Silnoproud	8 týdny	29.09. 18	24.11. 18
92	Slaboproud SK	6 týdny	20.10. 18	01.12. 18
93	Slaboproud EPS	6 týdny	20.10. 18	01.12. 18
94	Slaboproud CCTV, PS	6 týdny	20.10. 18	01.12. 18
95	Gastro	8 týdny	17.11. 18	12.01. 19
96	Kompletační činnost	13 dny	01.12. 18	14.12. 18
97	Dokončovací práce a kompletační činnost vyjma prostor dotčených zkušebním provozem	3 měsíce	14.12. 18	14.03. 19
98	**Zkušební provoz**	**12,86 týdny**	**15.12. 18**	**15.03. 19**
99	*6. Dokončení jižní poloviny hal depozitáře a zahájení 3-měsíčního zkušebního provozu*	0 týdny	15.12. 18	15.12. 18
100	Zkušební provoz	3 měsíce	15.12. 18	15.03. 19
101	*7. Ukončení zkušebního provozu jižní poloviny hal depozitáře*	0 týdny	15.03. 19	15.03. 19
102	**Dokončovací práce**	**2,28 týdny**	**15.03. 19**	**31.03. 19**
103	Zaklopení, odstranění dočasných konstrukcí, úklid	2 týdny	15.03. 19	29.03. 19
104	Kolaudace	0,14 týdny	22.03. 19	23.03. 19
105	Předání Etapy 2	0,14 týdny	30.03. 19	31.03. 19
106	*8. Dokončení rekonstrukce zbývající části jižní poloviny, předání zrekonstruované části objednateli, kolaudace*	0 týdny	31.03. 19	31.03. 19
107	*9. Dokončení DSPS a její předání objednateli*	0 týdny	24.03. 19	24.03. 19
