Harmonogram - Rekonstrukce mostu v km 55,529 na trati Horažďovice př. – Klatovy

ŽS OHLA

Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Počet dní
Výběr zhotovitele	23.4.26	**23.6.26**	**60**
Den zahájení stavebních prací, předání staveniště zhotoviteli- předpoklad	24.6.26		
Přípravné práce 1. Stavební postup			
Výroba nosné konstrukce	**24.6.26**	**14.10.26**	**113**
Zpracování VTD OK, schválení	24.6.26	23.7.26	30
Dodávka materiálu OK	24.7.26	22.8.26	30
Výroba OK v mostárně, PKO, izolace žlabu, přeprava OK na stavbu	23.8.26	14.10.26	53
Zřízení zařízení staveniště	24.6.26		
Vytyčení inženýrských sítí, uvolnění drážních kabelů			
Vyvěšení sdělovacích drážních kabelů na provizorní převěsy			
Uzavření podjezdu pro dopravu	**27.7.26**	**23.11.26**	**120**
Nickolejný provoz - výluka koleje na mostě - realizace prací ve výluce - 2.SP	**3.8.26**	**16.11.26**	**106**
Demontáž zábradlí, podlah			
Snesení železničního svršku na mostě a v předpolích			
Demontáž NK mostního provizoria pomocí jeřábu			
Odtěžení štěrkového lože a potřebné výkopy za oběma opěrami			
Odbourání kamenných křídel a spodní stavby stávajívího mostu			
Odbourání NK, spodní stavby a křídel betonového podchodu			
Hlubinné zakládání nové spodní stavby (vrtané VP piloty)			
Výkopy pro založení nových opěr, podkladní beton			
Armování, bednění a betonáž základů opěr			
Armování, bednění a betonáž dříků opěr včet. podložiskových bločků			
Armování a betonáž křídel, závěr. zdí			
Tvrdnutí a ošetřování betonu spodní stavby			
Montáž OK nosné konstrukce pomocí jeřábu			
Hydroizolace spodní stavby			
Zásypy rubu opěr, křídel, obsypy líců základů, zřízení ZKPP			
Zaštěrkování, zřízení železničního svršku			
Uložení sítí vedoucích po mostě do finální polohy, montáž zábradlí			
Hlavní prohlídka			
Konec nickolejného provozu	**3.8.26**	**16.11.26**	**106**
Zahájení zkušebního provozu	17.11.26	17.11.26	1
Nový chodník pod mostem, příp. opravy obrubníků, komunikace	16.11.26	29.11.26	14
Konec uzavření podjezdu pro silniční dopravu	**27.7.26**	**23.11.26**	**120**
Dokončovací práce	**24.11.26**	**23.12.26**	**30**
Dokonč. práce, terénní úpravy a odláždění, likvidace zařízení staveniště	24.11.26	23.12.26	30
Dokončení stavebních prací			
SO 111-11-01.02 (Železniční svršek, následná úprava)			
SO 98-98			
Dokončení díla			

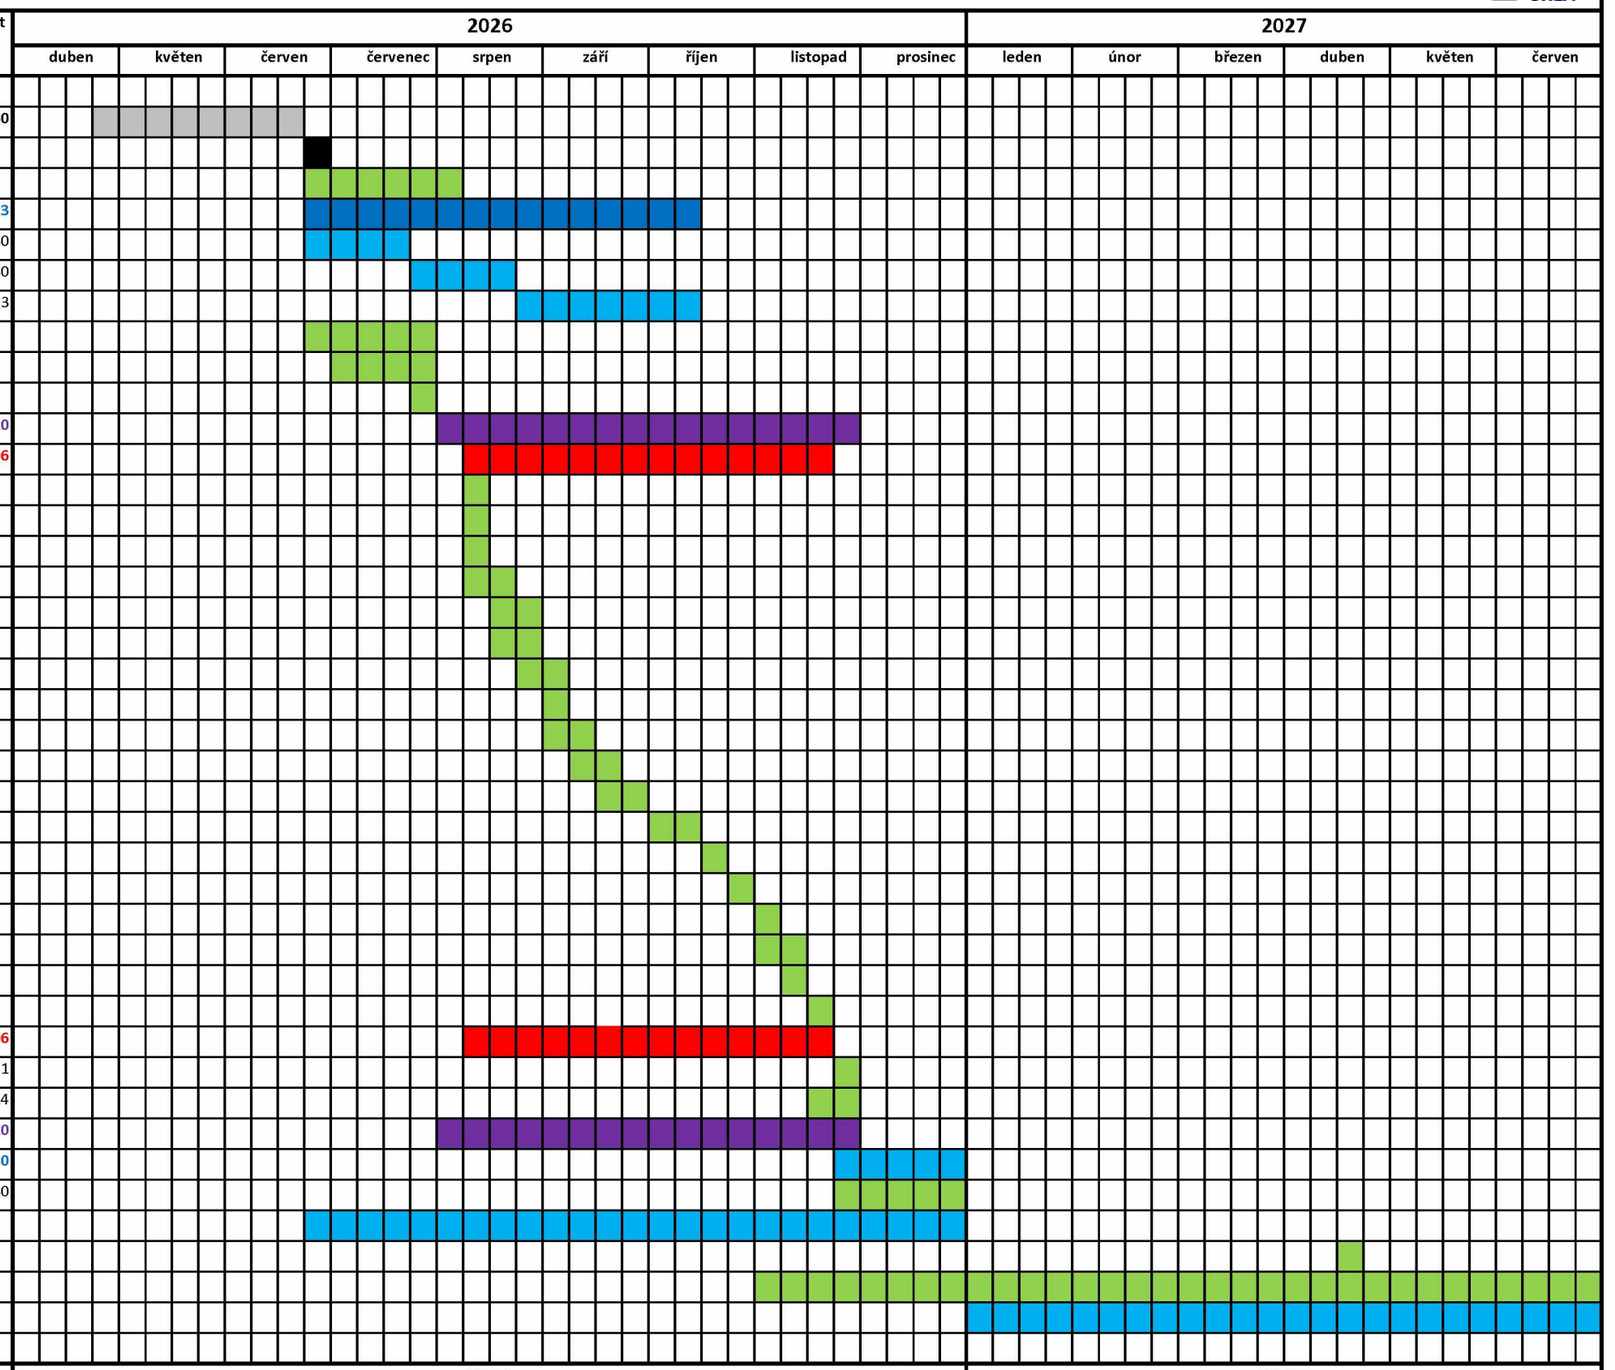

Finanční měsíční harmonogram	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
Nabídková cena celkem v Kč :	**44 770 000**														
Finanční HMG po měsících v Kč :			[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					[redacted]		[redacted]

[redacted]
