Tramvajová trať Olšanská – Habrová – výběr zhotovitele

Harmonogram
výstavby

firesta

ID	Název úkolu	Doba trvání
1	**Doba plnění**	**365 dny**
2	1. Etapa: Křižovatka Olšanská – Jana Želivského	153 dny
3	2. Etapa: Nová TT	334 dny
4	3. Etapa: Nová měnírna	334 dny
5	***Termín zahájení realizace, předání a převzetí staveniště***	***0 dny***
6	Přípravné práce	2 dny
7	PS011.1 Rozvodna 22kV	91 dny
8	PS011.2 Trakční technologie	91 dny
9	PS011.3 Vlastní spotřeba	85 dny
10	PS011.4 Dálkové ovládání	77 dny
11	PS011.5 Zařízení na detekci požáru	77 dny
12	PS011.6 Stavební elektroinstalace	84 dny
13	PS011.7 Uzemnění a hromosvod	77 dny
14	PS011.8.1 Elektronická kontrola vstupu - EKV	53 dny
15	PS011.8.2 Elektronická kontrola vstupu - PTV	53 dny
16	PS 012 MR Červený dvůr - technologická část - část PRE	90 dny
17	PS 020 Zabezpečení jednokolejného úseku	90 dny
18	PS 020.1 Zabezpečení jednokolejného úseku – kamerový systém	90 dny
19	SO 101 Místní komunikace	258 dny
20	SO 110.0 Chodníky	180 dny
21	SO 110.1 Přístupové chodníky - zastávka Habrová - schodiště, palisáda a zábradlí	180 dny
22	SO 110.2 Přístupové chodníky - zastávka Pod kapličkou - schodiště, palisáda a zábradlí	165 dny
23	SO 120 Přístupová komunikace	77 dny
24	SO 130 Definitivní dopravní značení	14 dny
25	SO 150 DIO	325 dny
26	SO 160 Provizorní komunikace	325 dny
27	SO 170 Opravy (obnova) komunikací využívaných stavbou	10 dny
28	SO 301.0 Povrchové vrstvy - komunikace	21 dny
29	SO 301.1 Odvodnění místních komunikací, chodníků a TT - hlavní stoky	315 dny
30	SO 301.2 Odvodnění místních komunikací, chodníků a TT - přípojky	305 dny
31	SO 303.0 Vodovodní přípojky pro AN01 a AN02 vč. VŠ1, VŠ2, AŠ-Z1, AŠ-Z2	77 dny
32	SO 303.1 Závlahové systémy	35 dny
33	SO 305 Vodovodní přípojka pro MR	35 dny
34	SO 306.0 Povrchové vrstvy - komunikace	7 dny
35	SO 306.1 Kanalizační přípojka pro MR	45 dny
36	SO 307 Přeložka vodovodu v km 1.280	91 dny
37	SO 308 Vodovodní přípojka sociálního zázemí pro řidiče	35 dny
38	SO 309 Kanalizační přípojka sociálního zázemí pro řidiče	45 dny
39	SO 310.0 Povrchové vrstvy - komunikace	15 dny
40	SO 310.1 Výměna vodovodniho potrubí v km 0,840	55 dny
41	SO 401 Veřejné osvětlení místních komunikací	220 dny
42	SO 411 Osvětlení tramvajových zastávek	49 dny
43	SO 422 Přeložky a ochrana kabelů PRE DISTRIBUCE - VN	45 dny
44	SO 424 Přeložky a ochrana kabelů PRE DISTRIBUCE - NN	35 dny
45	SO 426 Přeložky a ochrana kabelů PRE DISTRIBUCE - SDK	35 dny
46	SO 428 Přípojka 22k V pro MR Červený dvůr	56 dny
47	SO 429 Přípojka 400V pro MR Červený dvůr	21 dny
48	SO 430 Přeložky a ochrana kabelů TELCO PRO	55 dny
49	SO 431 Přeložky a ochrana kabelů CETIN	55 dny
50	SO 432 přeložky a ochrana kebelů SITEL	55 dny
51	SO 433 Přeložky a ochrana kabelů VODAFONE	55 dny
52	SO 434 Přeložky a ochrana kabelů NET4GAS	55 dny
53	SO 435 Telefonní přípojka pro MR	28 dny
54	SO 436 Přípojka sociálního zázemí pro řidiče	21 dny
55	SO 437 Přeložky a ochrana kabelů QUANTCOM	55 dny
56	SO 450 SSZ Olšanská - Jana Želivského	21 dny
57	SO 501 Přeložka STL plynovodu	61 dny
58	**SO 661.1 Tramvajová trať - křižovatka**	**151 dny**
59	Postup 2	45 dny
60	Postup 3a	31 dny
61	Postup 3b	30 dny
62	Postup 4	45 dny
63	**SO 661.2 Tramvajová trať - nová trať**	**325 dny**
64	podzemní sítě, úprava pláně	175 dny
65	podkladní vrstvy	121 dny
66	montáž kolejí	137 dny
67	SO 661.3 demolice objektu	30 dny
68	SO 663 Nástupiště zastávek	125 dny
69	SO 671.1 Trakční vedení - křižovatka	121 dny
70	SO 671.2 Trakční vedení - nová trať	275 dny
71	SO 681.1 Trakční kabely - křižovatka	121 dny
72	SO 681.2 Trakční kabely - nová trať	300 dny
73	SO 691 Přeložka DK Správy Železnic s.o. SŽT	28 dny
74	SO 692 Přeložka kabelu ČD Telematika	28 dny
75	SO 693.1 Elektrické ovládání výhybek - křižovatka	42 dny
76	SO 693.2 Elektrické ovládání výhybek - nová trať	42 dny
77	SO 695 Elektrické zařízení zastávek	90 dny
78	SO 701 Přístřešky na zastávkách	42 dny
79	**SO 710 Budova trakční měnírny**	**325 dny**
80	SO 710.1 Architektonicko stavební řešení	310 dny
81	SO 710.2 Zdravotechnická instalace	30 dny
82	SO 710.3 Oplocení	30 dny
83	**SO 720 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ŘIDIČE**	**80 dny**
84	SO 720.1 Architektonicko stavební řešení	60 dny
85	SO 720.2 Elektroinstalace - silnoproud	21 dny
86	SO 720.3 ZTI, VZT, vytápění	28 dny
87	SO 720.4 Slaboproud	14 dny
88	SO 801 Sadové úpravy	35 dny
89	Dokončovací práce	7 dny
90	***Termín dokončení díla***	***0 dny***
91	***Termín předání díla***	***0 dny***

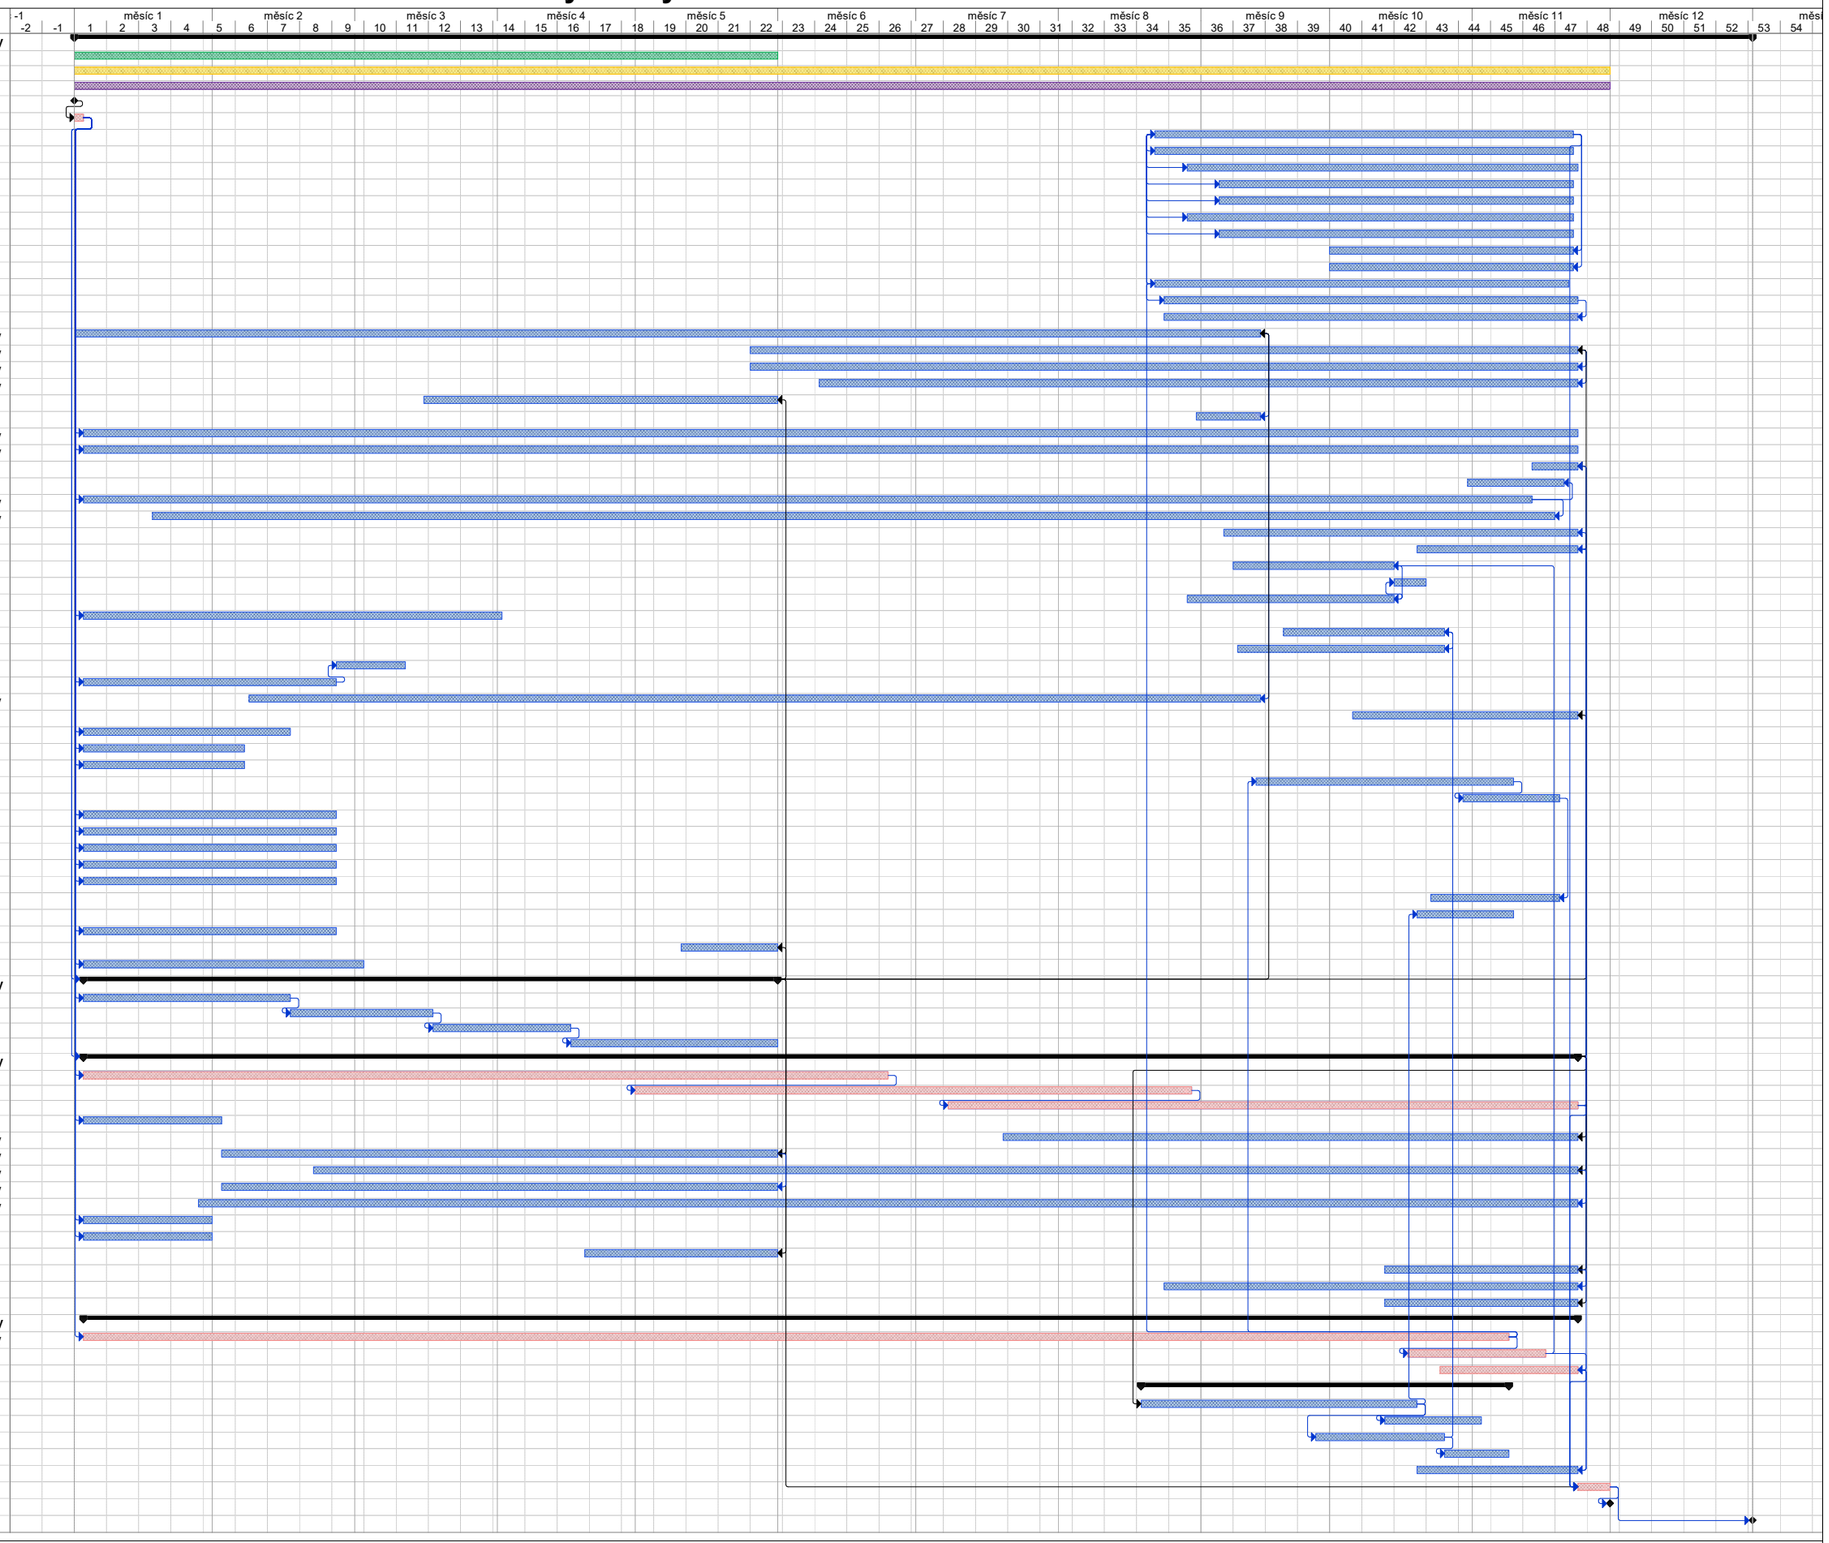

Datum: 19.12. 25

Milník podle směrného plánu | Souhrnný úkol směrného plánu | Kritické rozdělení | Úkol | Přerušení | Milník | Souhrnný | Kritický | Směrný plán
